
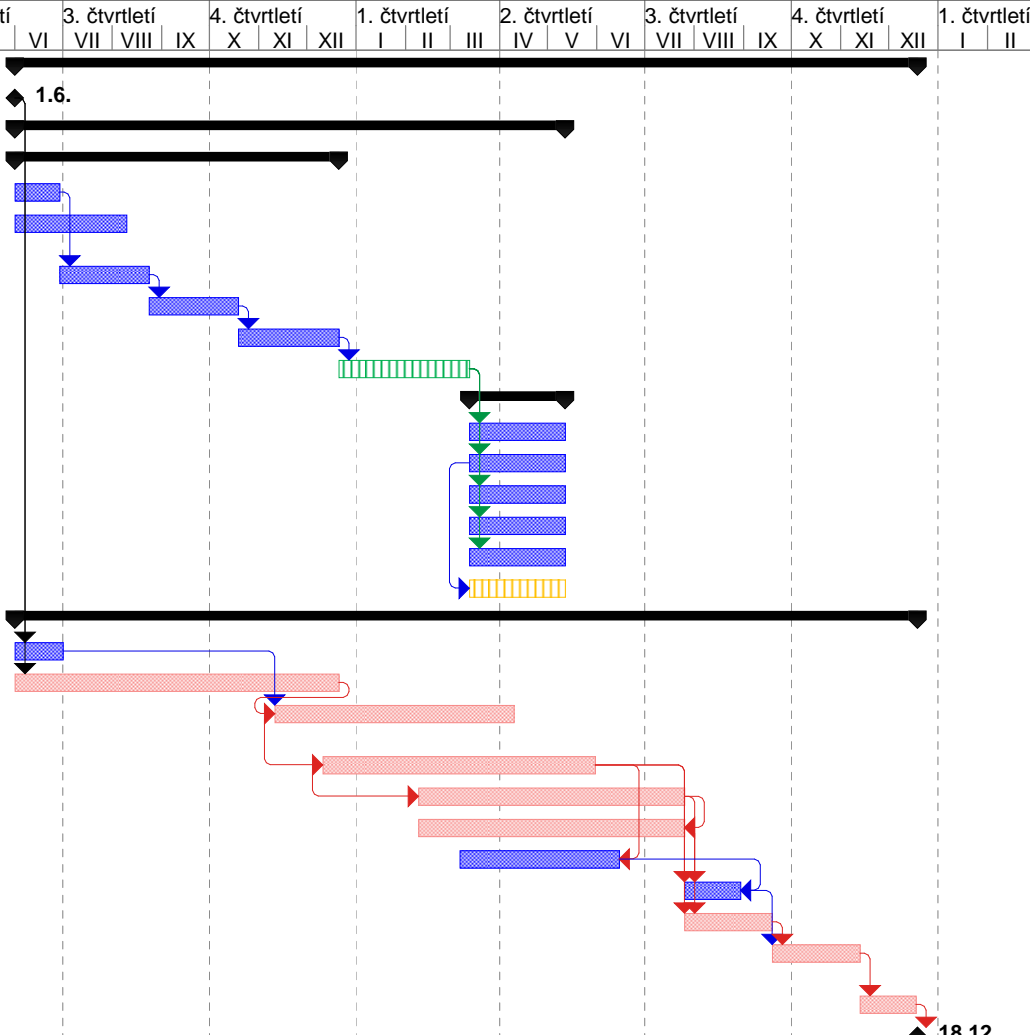






























ID		Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení																												
1		Revitalizace trati Kostelec-Telč-Slavonice	566 dny	1.6. 22	18.12. 23																												
2		Zahájení stavby	0 dny	1.6. 22	1.6. 22																												
3		Stavební část stavby	345 dny	1.6. 22	11.5. 23																												
4		Práce mimo nepřetržitou výluku	203 dny	1.6. 22	20.12. 22																												
5		SP 1 ŽST Dačice	28 dny	1.6. 22	28.6. 22																												
6		SP 2 ŽST Slaviboř práce mimo traťovou kolej	70 dny	1.6. 22	9.8. 22																												
7		SP 3 ŽST Telč	56 dny	29.6. 22	23.8. 22																												
8		SP 4 ŽST Sedlejov	56 dny	24.8. 22	18.10. 22																												
9		SP 5 ŽST Třešť	63 dny	19.10. 22	20.12. 22																												
10		Technologická přestávka	82 dny	21.12. 22	12.3. 23																												
11		Práce v nepřetržité výluce	60 dny	13.3. 23	11.5. 23																												
12		SP 11 Slavonice(mimo) - Dačice(četně)	60 dny	13.3. 23	11.5. 23																												
13		SP 12 Dačice (mimo) - Telč (včetně)	60 dny	13.3. 23	11.5. 23																												
14		SP 13 ŽST Slaviboř	60 dny	13.3. 23	11.5. 23																												
15		SP 14 Telč (mimo) - Sedlejov (včetně)	60 dny	13.3. 23	11.5. 23																												
16		SP 15 Sedlejov(mimo) - Třešť (včetně)	60 dny	13.3. 23	11.5. 23																												
17		NAD Slavonice - Kostelec	60 dny	13.3. 23	11.5. 23																												
18		Technologická část stavby	566 dny	1.6. 22	18.12. 23																												
19		Příprava stavby a staveniště	30 dny	1.6. 22	30.6. 22																												
20		Projekt a výroba technologických zařízení	203 dny	1.6. 22	20.12. 22																												
21		Kabelové trasy pro trať.a stanič.zab.a sděl.zař.	150 dny	11.11. 22	9.4. 23																												
22		Venkovní prvky sděl.a zab.zař.	171 dny	11.12. 22	30.5. 23																												
23		Vnitřní montáže sděl.zař.v kontejnerech	167 dny	9.2. 23	25.7. 23																												
24		Vnitřní montáže staničního zab.zař.	167 dny	9.2. 23	25.7. 23																												
25		Přípojky a rozvody nn, osvětlení	100 dny	7.3. 23	14.6. 23																												
26		Zprovoznění trať.a dálkových opt.kabelů	35 dny	26.7. 23	29.8. 23																												
27		Aktivace a zkoušky staničních zab.zař	55 dny	26.7. 23	18.9. 23																												
28		Aktivace a zkoušky traťového a přejezd.zab.zař.	55 dny	19.9. 23	12.11. 23																												
29		Dokončovací práce a likvidace staveniště	35 dny	13.11. 23	17.12. 23																												
30		Ukončení stavby	0 dny	18.12. 23	18.12. 23	
