


Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

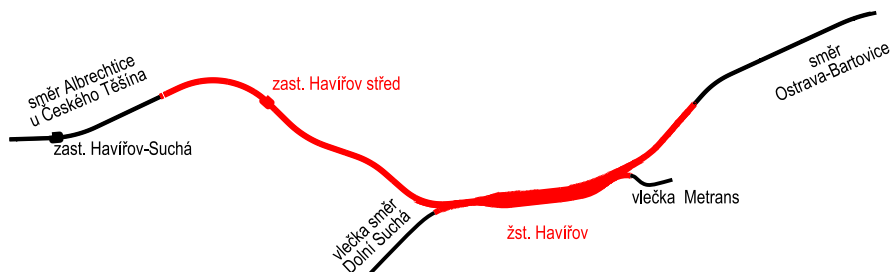

Podpis:

Datum:

| Revize: | Datum: | Popis: | Kontroloval: |
|---------|-------------|-----------------------------------|--------------------|
| 000 | 30. 4. 2022 | Definitivní odevzdání dokumentace | Ing. Petr Libosvár |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Stavebník / investor:

Adresa:
Zástupce investora:
Adresa:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Stavební správa východ
Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

Zhotovitel díla:

Adresa:
Kontakt:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc
T: +420 585 570 444
E: moravia@moravia.cz

Zhotovitel části / objektu:

Adresa:
Kontakt:

BP System s.r.o.

Štefánikova 61, 612 00 Brno
T: +420 777 695 929
E: mail@bp-system.cz

Hlavní projektant (HIP):

Ing. Pavel Kučera

Specialista:

Jiří Kaiserlich

Název stavby/akce:
**Optimalizace traťového úseku
Havířov (včetně) – zastávka Havířov střed (mimo)**
Označení investora:

S621700033

Zakázka:

20-110-230-US

Název části:

Souhrnná technická zpráva

Označení části:
B.8.8
Název objektu / dílčí části:
Plán BOZP
Číslo objektu/komplexu:
Název přílohy:

—

Číslo přílohy:

—

Název dílčí části přílohy:

—

Odpovědný projektant:
Jiří Kaiserlich

Zpracovatel přílohy:
Jiří Kaiserlich

Měřítko: —
Formáty: 46 x A4

Stupeň dokumentace:
PDPS

Kraj:
Moravskoslezský

Katastrální území:
viz textová část

TUDU:
2521 B1

Smluvní datum zpracování:
30. 4. 2022

| S-kód: | Stupeň dokumentace: | Část: | Objekt: | Podobjekt: | Příloha: | Revize: |
|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|------------|---------------|---------|
| S 6 2 1 7 0 0 0 3 3 | — P D P S | — B 8 8 X X | — X X X X X X X X | — X X | — X X X X X X | — 0 0 0 |

Prostor pro další informace

OBSAH:

| | | |
|---|---|----|
| 1. | Identifikační údaje o stavbě..... | 2 |
| 2. | Účel stavby | 3 |
| 3. | Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení | 4 |
| 4. | Základní předpoklady výstavby | 9 |
| 5. | Hodnocení stavby z hlediska povinností zadavatele stavby | 9 |
| 6. | Situační náskres – viz PD situace ZOV..... | 10 |
| 7. | PŘEHLED vybraných ustanovení | 11 |
| 8. | Obslužnost území a předpokládané úpravy staveniště..... | 13 |
| 9. | Ochranná pásma nebo prostor vymezený ČSN 736005..... | 16 |
| 10. | Obecné požadavky bezpečnosti práce na stavbě | 18 |
| 11. | Činnosti spojené s potenciálními nebezpečími..... | 20 |
| 12. | Osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP) | 20 |
| 13. | Bezpečnost ručního náradí | 21 |
| 14. | Bezpečnost životního prostředí | 22 |
| 15. | Postupy a opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci..... | 22 |
| 16. | Opatření při pracích za mimořádných podmínek a řešení mimořádných událostí..... | 37 |
| 17. | Údaje o bezpečnostních opatřeních, které se zavádějí | 38 |
| 18. | Plán – popis kontrol v průběhu výstavby | 39 |
| 19. | Seznam požadované základní dokumentace BOZP a PO: | 40 |
| 20. | Údržba a opravy..... | 40 |
| Příloha 1: Provozní řád stavby..... | | 41 |
| Příloha 2: Osvědčení | | 43 |
| Příloha 3: Seznámení odovědných pracovníků..... | | 45 |

Stavebník má za povinnost zajistit, aby byl průběžně plán aktualizován. Plán se aktualizuje přinejmenším při přechodu mezi nejdůležitějšími hlavními fázemi průběhu stavby. Všechny změny v organizaci staveniště nebo posuny v časovém plánu stavby se musí do plánu zapracovat.

Plán nenahrazuje znalost a dodržování všech platných předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, technologických a pracovních postupů, místních provozních předpisů a návodů výrobců.

1. Identifikační údaje o stavbě

| | |
|--------------------|--|
| Název stavby: | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně)-zastávka Havířov střed (mimo) |
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Okres: | Frýdek -Místek |
| Katastrální území: | Parc.č.2687/7, k.ú. Prostřední Suchá, Parc.č.2736/7, k.ú. Dolní Suchá, Parc.č.3705/1, k.ú. Havířov-město, Parc.č.3705/6, k.ú. Havířov-město, Parc.č.3705/6, k.ú. Havířov-město, Parc.č.3751/1, k.ú. Havířov-město, Parc.č.284/1, k.ú. Šumbark, Parc.č.2481, k.ú. Šumbark, Parc.č.3873, k.ú. Havířov-město, Parc.č.3613/6, k.ú. Šenov u Ostravy, Parc.č.3908, k.ú. Šenov u Ostravy. |
| Termín zpracování: | listopad 2021 |

Údaje o stavebníkovi rekonstrukce

| | |
|------------|------------------------------------|
| Stavebník: | Správa železnic, státní organizace |
| Sídlo: | Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 |
| IČ: | 709 94 234 |

Údaje o zpracovateli PD

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Projektant: | MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. |
| Sídlo: | Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc |
| IČ: | 64610357 |
| Hlavní inženýr projektu: | Ing. Pavel Kučera |
| ČKAIT: | 1201149 |

Údaje o zpracovateli plánu BOZP

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Zpracovatel: | BP System s.r.o. |
| Sídlo: | Štefánikova 61, 612 00 Brno |
| IČ: | 27724433 |
| Koordinátor BOZP: | Jiří Kaiserlich |
| Evidenční číslo: | ZEKA/624/KOO/2017 |

2. Úvod

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen Plán BOZP) je stanovení pravidel spolupráce při realizaci na projektu v otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Plán BOZP vychází ze současných znalostí z projektové dokumentace. Tento dokument je zpracováván v souladu s požadavky legislativy podle §14 odstavec 3 zákona č. 309/2006 a §15 téhož zákona. Dokument stanovuje základní pravidla pro koordinaci na stavbě a popis základních povinností zadavatele a zhotovitelů podílejících na tomto projektu. Plán BOZP žádným způsobem nenahrazuje právní předpisy v oblasti BOZP, pouze je doplňuje vzhledem ke specifickým podmínkám a rizikům konkrétní stavby. Plán BOZP bude v průběhu výstavby a postupu prací aktualizován o nové skutečnosti, které se v průběhu výstavby vyskytnou. Aktualizace bude provedena formou zápisů z kontrolních dnů BOZP (dále jen KD BOZP) na staveništi. Platnost tohoto plánu se vztahuje na všechna pracoviště stavby a na všechny její zhotovitele a zaměstnance. Tímto plánem jsou povinni se přiměřeně řídit i zaměstnanci jiných organizací, pracující-li v prostoru stavby nebo na jejích zařízeních a to v rozsahu, v jakém byli odpovědným vedoucím zaměstnancem pověřeni k výkonu činnosti. Tento plán BOZP bude vycházet z informací a skutečností známých v jednotlivých fázích stavby. Nebude postihovat definitivní stav, který bude ovlivněn zvolenými technologickými postupy a prostředky ve fázi realizace. Plán BOZP se aktualizuje při každém KD BOZP změnami v organizaci staveniště nebo posuny v časovém plánu stavby a bude uložen u SD na staveništi.

3. Účel stavby

Obsahem stavby je optimalizace železniční trati v úseku Havířov (včetně)- zastávka Havířov střed (mimo), jsou navrženy práce v obou traťových kolejích včetně železniční stanice, propustků a mostních objektů (most II/475 Orlovská, most U Nádraží, nový centrální podchod ve stanici, most I/11 Ostravská, most Lučina), zřízení nových nástupišť nových technologických zařízení.

Stavba se nachází výhradně v ochranném pásmu dráhy dle zákona o drahách. Jedná se o dvoukolejnou elektrizovanou železniční trať Český Těšín – Opava východ a částečně i vlečky č. 6009 „Vlečková síť OKD, Doprava, a. s. – Vlečka Báňská“ směr vlečková stanice

Prostřední Suchá a vlečku č. 6014 „METRANS – Šenov“.

Stavba "Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) – zastávka Havířov střed (mimo)" kolejově začíná v km 16,070 a končí v km 20,306. Stavba se nachází na území Moravskoslezského kraje v k. ú.: Prostřední Suchá [637742], Dolní Suchá [637777], Havířov-město [637556], Šumbark [637734], Šenov u Ostravy [762342]

Stavbou dotčené kolejiště je napojeno na dosavadní technické vybavení území. Liniová část stavby, stavební objekty a provozní soubory, až na výjimky, jsou realizovány ve stávajícím obvodu dráhy, na pozemcích Správy železnic, s.o. a Českých drah, a.s.

4. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

1. Staniční zabezpečovací zařízení

PS 12-01-11 Žst. Havířov, staniční zabezpečovací zařízení

PS 12-01-11.01 Žst. Havířov, definitivní SZZ

PS 12-01-11.02 Žst. Havířov, provizorní SZZ

2. Traťové zabezpečovací zařízení

PS 11-01-21 Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, úprava traťového zabezpečovacího zařízení

PS 11-01-21.01 Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, definitivní úprava TZZ

PS 11-01-21.02 Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, provizorní úprava TZZ

PS 13-01-21 Havířov – Ostrava Bartovice, úprava traťového zabezpečovacího zařízení

PS 13-01-21.01 Havířov – Ostrava Bartovice, definitivní úprava TZZ

PS 13-01-21.02 Havířov – Ostrava Bartovice, provizorní úprava TZZ

2.1.1.1 SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Místní kabelizace

PS 12-02-11 Žst. Havířov, místní kabelizace

3. Rozhlasové zařízení

PS 12-02-21 Žst. Havířov, rozhlasové zařízení

4. Integrovaná telekomunikační zařízení

PS 12-02-31 Žst. Havířov, sdělovací zařízení

5. Elektrická požární a zabezpečovací signalizace

PS 12-02-41 Žst. Havířov, PZTS

6. Dálková, optická, závěsná kabelizace (DK, DOK, ZOK)

PS 12-02-51 Žst. Havířov, DOK a TK

PS 00-02-51 Albrechtice u Českého Těšína – Ostrava Bartovice, DOK ČD-T

7. Informační systém pro cestující

PS 12-02-61 Žst. Havířov, informační zařízení

8. Jiné sdělovací zařízení

PS 12-02-71 Žst. Havířov, kamerový systém SŽ

PS 12-02-72 Žst. Havířov, kamerový systém městské policie

9. Přenosový systém

PS 12-02-81 Žst. Havířov, doplnění přenosového systému

10. Rádiové systémy

PS 12-02-91 Žst. Havířov, úprava MRS

11. DOZ a další nadstavbové systémy (DDTS ŽDC...)

PS 00-02-01 Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, DDTS ŽDC

11.1.1.1 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DISPEČERSKÉ ŘÍDICÍ TECHNIKY

Dispečerská řídicí technika

PS 11-03-11 Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, zast. Havířov střed, zřízení DŘT

PS 12-03-11 Žst. Havířov, zařízení DŘT

PS 12-03-12 Žst. Havířov, SpS Havířov, úprava DŘT

PS 09-03-11 ED Ostrava, doplnění řídicího systému

12. Silnoproudá technologie trakčních spínacích stanic

PS 12-03-41 Žst. Havířov, úprava SpS

13. Technologie transformačních stanic VN/NN (energetika)

PS 11-03-51 Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, systém ochrany trafostanic

PS 11-03-52 Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, TS 7003, zast. Havířov střed, 22/0,4kV

PS 12-03-51 Žst. Havířov, TS 7004, Havířov (EOV), 22/0,4kV

PS 12-03-52 Žst. Havířov, TS 7005, Havířov, 22/0,4kV

PS 12-03-53 Žst. Havířov, demontáž trafostanice 22/0,4kV ve VB, přechodové stavy

14. Silnoproudá technologie elektrických stanic 6kV

PS 11-03-61 Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, přeložka TTS 6/0,4kV č. 806

PS 11-03-62 Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, přeložka TTS 6/0,4kV č. 808

PS 12-03-61 Žst. Havířov, přeložka TTS 6/0,4kV č. 812, 813

PS 12-03-62 Žst. Havířov, STS 6/0,4kV u technologické budovy

15. Provozní rozvod silnoproudu

PS 11-03-71 Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, zast. Havířov střed, úprava stávající rozvodny nn

PS 12-03-71 Žst. Havířov, úprava rozvodny nn ve VB

PS 12-03-72 Žst. Havířov, rozvodna nn v TS 7004

PS 12-03-73 Žst. Havířov, rozvodna nn v TS 7005 v technologické budově

16. Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ)

PS 12-03-91 Žst. Havířov, rozvodna EPZ

16.1.1.1 OSTATNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Osobní výtahy, schodišťové výtahy

PS 12-04-11 Žst. Havířov, technologie výtahů

17. Ostatní technologická zařízení

PS 12-04-51 Žst. Havířov, technologie čerpání

17.1.1.1 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

Kolejový svršek a spodek

- SO 11-10-01 Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, železniční svršek
- SO 11-11-01 Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, železniční spodek
- SO 12-10-01 Žst. Havířov, železniční svršek
- SO 12-11-01 Žst. Havířov, železniční spodek
- SO 00-14-01 Žst. Havířov, výstroj trati
- SO 12-11-02 Žst. Havířov, hloubkové odvodnění objektu VB – drén
- SO 12-11-03 Žst. Havířov, stavební jáma pro čerpací šachtu
- SO 12-11-04 Žst. Havířov, čerpací šachta
- SO 12-11-05 Žst. Havířov, monitoring

18. Nástupiště

- SO 12-12-01 Žst. Havířov, nástupiště

19. Mosty, propustky a zdi

- SO 11-21-01 Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, propustek v ev. km 17,120 – zrušení propustku
- SO 11-21-02 Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, propustek v ev. km 17,257
- SO 11-20-01 Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, most v ev. km 17,965
- SO 11-20-02 Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, most v ev. km 18,120
- SO 12-21-01 Žst. Havířov, propustek v ev. km 18,527
- SO 12-21-02 Žst. Havířov, propustek v ev. km 18,606 – zrušení propustku
- SO 12-21-03 Žst. Havířov, propustek v ev. km 18,924
- SO 12-22-01 Žst. Havířov, propustek pod místní komunikací
- SO 12-20-01 Žst. Havířov, most v ev. km 18,969
- SO 12-20-02 Žst. Havířov, most v ev. km 19,127 – zrušení stávajícího podchodu
- SO 12-20-03 Žst. Havířov, most v ev. km 19,141 – podchod
- SO 12-20-03.01 Žst. Havířov, most v ev. km 19,141 – výstupní objekt
- SO 12-21-04 Žst. Havířov, propustek v ev. km 0,206, vlečka Metrans
- SO 12-22-02 Žst. Havířov, propustek v ev. 19,700 před drážní příkop
- SO 12-20-04 Žst. Havířov, most v ev. km 19,992
- SO 12-20-05 Žst. Havířov, most v ev. km 20,259

20. Ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě a hydrotechnické objekty)

- SO 12-30-01 Žst. Havířov, ochrana stávajícího DK
- SO 00-30-01 Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, ochrana kabelů CETIN

21. Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)

- SO 12-31-01 Žst. Havířov, odvodnění nástupišť
- SO 12-31-02 Žst. Havířov, odvodnění podchodu
- SO 12-31-03 Žst. Havířov, odvodnění technologického objektu
- SO 12-31-04 Žst. Havířov, odvodnění trafostanice
- SO 12-31-05 Žst. Havířov, kanalizační přípojka splaškových vod
- SO 12-31-06 Žst. Havířov, přeložka jednotné kanalizace SmVaK, DN300
- SO 12-32-01 Žst. Havířov, vodovodní přípojka

- SO 12-32-02 Žst. Havířov, ochrana vodovodu SMVaK
- SO 12-32-03 Žst. Havířov, přeložka vodovodu SmVaK DN 200 v ev. km 18,606
- SO 12-32-04 Žst. Havířov, přeložka vodovodní přípojky
- SO 12-32-05 Žst. Havířov, přeložka horkovodu VEOLIA v ev. km 18.969
- SO 12-32-06 Žst. Havířov, přeložka horkovodní přípojky v ev. km 18.969
- SO 12-32-07 Žst. Havířov, podpurná konstrukce přípojky horkovodu v ev. km 18.969
- SO 12-33-01 Žst. Havířov, ochrana STL plynovodu v ev. km 18.969

22. Pozemní komunikace, zpevněné plochy

- SO 12-50-01 Žst. Havířov, zpevněná plocha u technologického objektu
- SO 12-50-02 Žst. Havířov, zpevněná plocha u trafostanice TS 7004
- SO 12-50-03 Žst. Havířov, přístupový chodník a zpevněná plocha podél VB

23. Kabelovody, kolektory

- SO 12-60-01 Žst. Havířov, kabelovod

23.1.1.1 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A TECHNICKÉ VYBAVENÍ POZEMNÍCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

Pozemní objekty budov (provozní, technologické, skladové)

- SO 12-71-01 Žst. Havířov, stavební úpravy výpravní budovy
- SO 12-72-01 Žst. Havířov, technologická budova
- SO 12-72-02 Žst. Havířov, trafostanice TS 7004
- SO 12-72-03 Žst. Havířov, EPZ

24. Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích

- SO 12-74-01 Žst. Havířov, zastřešení nástupišť
- SO 12-74-02 Žst. Havířov, zastřešení výstupu z podchodu

25. Orientační systém

- SO 12-77-01 Žst. Havířov, orientační systém

26. Drobná architektura a oplocení

- SO 12-79-01 Žst. Havířov, mobiliář

26.1.1.1 TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ

Trakční vedení

- SO 11-81-01 Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, úprava trakčního vedení
- SO 11-81-02 Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, zavěšení kabelu 22kV na TP
- SO 12-81-01 Žst. Havířov, trakční vedení
- SO 12-81-02 Žst. Havířov, zavěšení kabelu 22kV na TP
- SO 12-81-03 Žst. Havířov, SpS Havířov, úprava připojení napájecího vedení 3kV
- SO 12-81-04 Žst. Havířov, SpS Havířov, úprava připojení zpětného vedení 3kV
- SO 12-81-05 Žst. Havířov, EPZ, připojení na TV

27. Ohřev výměn (elektrický – EOv, plynový – POv)

- SO 12-84-01 Žst. Havířov, EOv

28. Elektrické předtápěcí zařízení

SO 12-85-01 Žst. Havířov, kabelové rozvody EPZ
je součástí SO trakce.

29. Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládaní odpojovačů

SO 11-86-01 Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, přeložky kabelu 6kV
SO 11-86-02 Albrechtice u Českého Těšína – žst. Havířov, závěsný kabel vn 22 kV
SO 11-86-03 Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, DOÚO
SO 11-86-04 Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, kabelové rozvody a přeložky nn
SO 12-86-01 Žst. Havířov, venkovní osvětlení
SO 12-86-02.01 Žst. Havířov, osvětlení podchodu a nástupišť, část Správa železnic
SO 12-86-02.02 Žst. Havířov, osvětlení podchodu a nástupišť, část TS Havířov
SO 12-86-03 Žst. Havířov, kabelové rozvody 6kV
SO 12-86-04 Žst. Havířov, přeložky kabelu 6kV
SO 12-86-05 Žst. Havířov, kabelové rozvody vn 22kV
SO 12-86-06 Žst. Havířov, přípojka 22kV
SO 12-86-07 Žst. Havířov, DOÚO
SO 12-86-08 Žst. Havířov, kabelové rozvody nn
SO 12-86-09 Žst. Havířov, přeložky kabelových rozvodů nn
SO 12-86-10 Žst. Havířov, provizorní stanoviště – přípojky nn
SO 12-86-11 Žst. Havířov, elektrická přípojka k čerpadlu v čerpací šachtě

30. Ukolejnění kovových konstrukcí

SO 11-87-01 Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, ukolejnění
SO 12-87-01 Žst. Havířov, ukolejnění

31. Vnější uzemnění

SO 11-88-01 Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, uzemnění TS 7003
SO 11-88-02 Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, uzemnění TTS č. 806
SO 11-88-03 Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, uzemnění TTS č. 808
SO 12-88-01 Žst. Havířov, uzemnění EPZ
SO 12-88-02 Žst. Havířov, uzemnění TS 7004
SO 12-88-03 Žst. Havířov, uzemnění technologického objektu
SO 12-88-04 Žst. Havířov, uzemnění TTS č. 812, 813
SO 12-88-05 Žst. Havířov, uzemnění STS 6/0,4kV u technologického objektu

32. Ostatní kabelizace

SO 11-86-51 Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, přeložka NN ČEZ v km 16,140 – 16,160
SO 11-86-52 Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, přeložka NN ČEZ v km 17,600
SO 12-86-51 Žst. Havířov, přeložka odběrného místa ČEZ Distribuce
SO 12-86-52 Žst. Havířov, ul. U Nádraží, přeložka VO TS Havířov v km 18,991 – 19,041
SO 12-86-53 Žst. Havířov, ul. U Nádraží, přeložka VN ČEZ v km 18,993 – 19,039
SO 12-86-54 Žst. Havířov, ul. Ostravská, přeložka VO TS Havířov v km 19,982 – 20,004

32.1.1.1 OSTATNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY

Příprava území a kácení

SO 00-92-01 Kácení dřevin

33. Náhradní výsadba

SO 00-96-01 Náhradní výsadby

34. statní

SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy

5. Základní předpoklady výstavby

Předpokládané termíny zahájení a ukončení stavby:

Stavba je uvažována v období

- Začátek stavby: 10/2022
- Konec stavby: 08/2025

Popis postupu stavby, předpokládané termíny zahájení a ukončení stavby.

viz příloha číslo 3 B.8 Zásady organizace výstavby

Uvedené termíny však mohou být ze strany objednatele upřesněny.

Seznam vstupních podkladů:

- Záměr akce
- Projektová dokumentace
- Příslušné normy, vyhlášky a zákony
- Konzultace s projektantem

6. Hodnocení stavby z hlediska povinností zadavatele stavby

Předpokládá se, že s ohledem na rozsah prací a lhůtu výstavby bude na stavbě pracovat cca 40 - 60 pracovníků.

Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi: 10 - 15

Stavba splňuje podmínky pro podání žádosti o stavební povolení případně ohlášení stavby.

Práce a činnosti podle přílohy č. 5 nařízení vlády číslo 591/2006 Sb.:

- práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.
- práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení.
- práce vystavující zaměstnance nebezpečí sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m,
- práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí,
- studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, pokud nepodléhají doзору orgánů státní báňské správy,

Z výše uvedeného **vyplývá povinnost** zadavatele (podle § 14 až § 18 zákona č. 309/2006 Sb.)

1. **určit potřebný počet koordinátorů** bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi jeho realizace (určí-li zadavatel stavby více koordinátorů, kteří působí při přípravě nebo realizaci stavby současně, vymezí pravidla jejich vzájemné spolupráce);
2. **doručit oznámení o zahájení prací** oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště
3. **zajistit**, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Koordinátorem ve fázi přípravy stavby byl určen pan:
Jiří Kaiserlich ZEKA/624/KOO/2017

7. Situační náčrt – viz PD situace ZOV

Za doplnění situačního náčrtu stavby (přesné umístění buňkoviště, únikových cest, míst pro poskytování první pomoci a umístění PHP, hlavních vypínačů apod.) pro potřeby BOZP dle konkrétních podmínek v průběhu výstavby odpovídá hlavní zhotovitel stavby.

Orientační schéma:



| 8. PŘEHLED vybraných ustanovení zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., NV č. 591/2006 Sb., NV č. 362/2005 Sb. a souvisejících předpisů sloužících k identifikaci rizik Od 1/1/2007 - Nová právní úprava | |
|---|---|
| 1. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací | Zákon č. 309/2006 Sb., vyhláška č. 499/2006 Sb., zákoník práce §104 |
| 2. Příprava staveb | Zákon č. 183/2006 Sb., vyhl.č. 499/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb, NV č. 591/2006 Sb. |
| 3. Povinnosti při odevzdání staveniště | NV č. 591/2006 Sb., Vyhl.č. 499/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb. |
| 4. Prerušování stavebních prací | NV č. 591/2006 Sb., NV č. 362/2005 Sb. |
| 5. Stavební práce v mimořádných podmínkách | Zákoník práce § 102, zákon č. 309/2006 Sb., NV č. 591/2006 Sb., příloha č. 1 |
| 6. Stavební práce v nebezpečném prostředí | Zákoník práce § 102, zákon č. 309/2006 Sb. , NV č. 591/2006 Sb., příloha č. 1 |
| 7. Povinnosti dodavatele stav. prací | Zákoník práce § 102, zákon č. 309/2006 Sb. |
| 8. Povinnosti pracovníků | Zákoník práce § 106, zákon č. 309/2006 Sb. |
| 9. Vymezení a příprava staveniště | NV č. 591/2006 Sb., příloha č. 1 |
| 10. Vnitrostaveništní komunikace | NV č. 101/2005 Sb. |
| 11. Zajištění otvorů a jam | NV č. 101/2005 Sb. |
| 12. Vertikální komunikace | NV č. 101/2005 Sb, NV č. 362/2005 Sb. |
| 13. Skladování – základní ustanovení | NV č. 591/2006 Sb. |
| 14. Způsoby skladování | NV č. 591/2006 Sb. |
| 15. Průzkum staveniště | NV č. 591/2006 Sb. |
| 16. Vyznačení inženýrských sítí | NV č. 591/2006 Sb., vyhláška č. 499/2006 Sb. |
| 17. Zajištění výkopových prací | NV č. 591/2006 Sb., vyhláška č. 499/2006 Sb. |
| 18. Výkopové práce | NV č. 591/2006 Sb. |
| 19. Zajištění stability stěn výkopů | NV č. 591/2006 Sb. |
| 20. Svahování výkopů | NV č. 591/2006 Sb. |
| 21. Vrtné práce | NV č. 591/2006 Sb., NV č. 378/2001 Sb. |
| 22. Bednění, podpěrné konstrukce a podpěrná lešení | NV č. 591/2006 Sb. |
| 23. Doprava a ukládání betonové směsi | NV č. 591/2006 Sb. |
| 24. Odbedňování a uvolňování konstrukcí | NV č. 591/2006 Sb. |
| 25. Práce železářské | NV č. 591/2006 Sb., NV č. 101/2005 Sb. |
| 26. Výroba, zpracování a doprava malt | NV č. 591/2006 Sb. |
| 27. Zdění | NV č. 591/2006 Sb. |
| 28. Příprava montáže | NV č. 591/2006 Sb., vyhl.č. 499/2006 Sb. |
| 29. Montážní pracoviště | NV č. 591/2006 Sb. |
| 30. Dílce pro montáž | NV č. 591/2006 Sb., NV č. 378/2001 Sb. |
| 31. Montážní a bezpečnostní přípravky a vázací prostředky | NV č. 591/2006 Sb., NV č. 163/2002 Sb. |
| 32. Komunikace při montáži | NV č. 591/2006 Sb. |
| 33. Manipulace s břemeny | NV č. 591/2006 Sb. |
| 34. Osazování dílců | NV č. 591/2006 Sb., NV č. 362/2005 Sb. |
| 35. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou | NV č. 362/2005 Sb. |
| 36. Zajištění proti pádu | NV č. 362/2005 Sb. |
| 37. Kolektivní zajištění | NV č. 362/2005 Sb. |
| 38. Osobní zajištění | NV č. 362/2005 Sb. |
| 39. Zajištění pro pádu předmětů a materiálu | NV č. 362/2005 Sb. |
| 40. Zajištění pod místem práce ve výšce | NV č. 362/2005 Sb. |
| 41. Práce na střeše | NV č. 362/2005 Sb. |
| 42. Konstrukce ke zvyšování místa práce | NV č. 362/2005 Sb. |
| 43. Předání a převzetí konstrukcí | NV č. 362/2005 Sb. |
| 44. Výstupy | NV č. 362/2005 Sb. |
| 45. Práce nad sebou | NV č. 362/2005 Sb. |
| 46. Práce na vysokých objektech | NV č. 362/2005 Sb. |
| 47. Shazování předmětů a materiálu | NV č. 362/2005 Sb. |

| | |
|--|--|
| 48. Přerušování práce ve výškách | NV č. 362/2005 Sb. |
| 49. Krátkodobé práce ve výškách | NV č. 362/2005 Sb. |
| 50. Bourací a rekonstrukční práce | NV č. 591/2006 Sb., vyhláška č. 499/2006 Sb. |
| 51. Průzkum stavu objektů | NV č. 591/2006 Sb., vyhláška č. 499/2006 Sb. |
| 52. Přípravné práce | NV č. 591/2006 Sb., vyhláška č. 499/2006 Sb. |
| 53. Zajištění místa bourání | NV č. 591/2006 Sb., vyhláška č. 499/2006 Sb. |
| 54. Vstupy a vjezdy do bouraného objektu | NV č. 591/2006 Sb., vyhláška č. 499/2006 Sb. |
| 55. Bourání střešních konstrukcí | NV č. 591/2006 Sb., vyhláška č. 499/2006 Sb. |
| 56. Bourání svislých konstrukcí | NV č. 591/2006 Sb., vyhláška č. 499/2006 Sb. |
| 57. Bourání podlah, stropů a jiných vodorovných konstrukcí | NV č. 591/2006 Sb., vyhláška č. 499/2006 Sb. |
| 58. Práce nad sebou | NV č. 591/2006 Sb. |
| 59. Stroje a strojní zařízení | Zákon č. 309/2006 Sb., NV č. 378/2001 Sb. |
| 60. Obsluha | Zákon č. 309/2006 Sb., NV č. 378/2001 Sb. |
| 61. Provozní podmínky strojů | Zákon č. 22/1997 Sb., 309/2006 Sb., NV č. 378/2001 Sb., |
| 62. Opravy a údržba | Zákon č. 309/2006 Sb., NV č. 378/2001 Sb. |
| 63. Zakázané činnosti | Zákoník práce, Zákon č. 309/2006 Sb., NV č. 378/2001 Sb. |
| 64. Stroje pro zemní práce | NV č. 591/2006 Sb. |
| 65. Stroje a zařízení pro výrobu, dopravu a zpracování směsi | NV č. 591/2006 Sb. |
| 66. Čerpadla směsí a strojní omítačky | NV č. 591/2006 Sb. |
| 67. Vibrátory | NV č. 591/2006 Sb. |
| 68. Stavební elektrické vrátky | NV č. 591/2006 Sb. |
| 69. Jednoduché kladky | NV č. 591/2006 Sb. |
| 70. Stavební výtahy | NV č. 591/2006 Sb. |
| 71. Zabezpečení stroje při přerušování a ukončení práce | NV č. 591/2006 Sb. |
| 72. Manipulace | Zákoník práce, NV č. 361/2007 Sb., NV č. 591/2006 Sb. |
| 73. Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce | NV č. 591/2006 Sb. |
| 74. Sklenářské práce | NV č. 591/2006 Sb. |
| 75. Malířské a natěračské práce | NV č. 591/2006 Sb. |
| 76. Svařování | NV č. 591/2006 Sb. |
| 77. Budování objektů zařízení staveniště - zákon č. 309/2006 Sb., NV č. 591/2006 Sb., NV č. 101/2005 Sb. | |
| 78. ČSN 73 8101 Lešení – společné ustanovení | |
| 79. Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí | |
| 80. Zákon 251/2005 Sb., o inspekci práce | |
| 81. NV č. 362/2005 Sb., o požadavcích na BOZP pro provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou | |
| 82. Vyhláška č. 398/2009 Sb. o požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb | |
| TKP staveb státních drah, kap. 1 a dotčené speciální kapitoly | |
| SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní organizací. | |
| SŽ Bp3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v prostorách Správy železnic, státní organizace | |
| SŽDC D1 Dopravní a návěsní předpis | |
| SŽDC D7/2 Organizování výlukových činností | |
| SŽ Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy | |
| SŽDC Ob1 Vydávání povolení ke vstupu do prostor Správy železniční dopravní cesty.... | |
| R1/14 Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic | |
| ČSN EN 50 110-1-ed. 3 – obsluha a práce na elektrických zařízeních | |
| TNŽ 34 3109 Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na železničních drahách celostátních, regionálních a vlečkách | |
| ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky | |
| ČSN EN 50 119 ed.2 Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – El. trakční nadzemní trolejová vedení | |
| EP ESČ 00.01.12 První pomoc při úrazu elektrickou energií | |

9. Obslužnost území a předpokládané úpravy staveniště

Příjezdy a přístupy na staveniště

Přístup na staveniště pro staveništní dopravu bude zajištěn stávající silniční sítí, tedy silnice I. až III. třídy, dále po místních a účelových komunikacích, částečně pojezdem po upraveném stávajícím šterkovém loži, po pláni a po nově zřízených nebo zpevněných přístupových cestách. Zpevnění nebo zřízení přístupových cest bude provedeno pomocí šterku nebo v kombinaci se silničními panely. Veřejné komunikace místní, městské, účelové a silnice I., II. a III. třídy budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu a v míře poškození vyspraveny na náklady stavby. K tomu provede zhotovitel stavby spolu s majiteli (správcí) těchto komunikací místní šetření ke zjištění stavu před jejich využíváním a po ukončení využívání. Při úpravě stávajících komunikací či při zřizování nových přístupových cest je třeba dbát na stávající a nové inženýrské sítě a vyvarovat se jejich poškození.

Detailní výpis uvažovaných přístupových cest pro staveništní dopravu je uveden v části B.8. ZOV

Železniční doprava

Stavba bude realizována za výluky železniční dopravy.

Detailní výpis uvažovaných výluk je uveden v části B.8. příloha 3 Zásady organizace výstavby

Silniční doprava

Stavební práce v jednotlivých SP si vyžádají uzavírky.

V místech vjezdu vozidel stavby na veřejné komunikace budou v rámci provizorního dopravního značení instalovány dopravní značky IP22 Pozor výjezd vozidel stavby v obou směrech.

Detailní výpis uvažovaných uzavírek je uveden v části B.8. příloha 3 Zásady organizace výstavby



Trvalé deponie a mezideponie

Neuvažuje se se vznikem deponií. Případné mezideponie výkopových zemin budou udržovány v bezplevelném stavu. Ty, které nebudou bezprostředně využity od vlastní skrývky, budou osety travinami.

Zajištění obvodu staveniště

- Dočasné objekty a zařízení staveniště budou provedeny dle potřeby a kapacity dodavatele - mobilní objekt sociálního zařízení, sklady drobného materiálu.
- Maximální rozsah zařízení staveniště bude v souladu s požadavky ZOV. Je uvažována skládka materiálu, kontejner na nářadí a mobilní WC.
- Rozsah staveniště je vyznačen v PD (situace ZOV).
- Při stavební činnosti budou dílčí pracoviště a všechny výkopy ohrazeny a osvětleny v souladu s požadavky NV 591/2006 Sb. Exponovaná pracoviště musí být na jejich hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m.
- Na ohrazené staveniště nebudou mít přístup nepovolané osoby. Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace nebudou na staveništi zaměstnány. Proto nebudou v tomto smyslu na staveništi provedeny žádné úpravy.

- Práce budou probíhat výhradně v denní době od 7:00 do 19:00 a to po nezbytně nutnou dobu.
- Stroje které nebudou v činnosti budou vypínat motory.
- V nočních hodinách bude staveniště osvětleno dle platné legislativy.
- Dále je nutné během provádění stavebních prací v maximální možné míře eliminovat zvýšenou prašnost při provádění stavebních prací např. klopením.
- „Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám“ příp. „Zákaz vstupu na staveniště“ osadí zhotovitel na všechny vstupy do prostoru staveniště



Plochy navržené pro zařízení staveniště (ZS)

Věcné využití ploch zařízení staveniště je specifikováno pouze rámcově. Přesná specifikace je odvislá od možností (kapacita, mechanizace, technologie atd.) budoucího zhotovitele stavby.

Pro hygienické zázemí zaměstnanců a skladovací a kancelářské prostory zhotovitele se předpokládá na plochách zařízení staveniště umístit mobilní staveništní buňky se sociálním zázemím (chemické WC, sprchy). K uskladnění materiálu a nářadí využít mobilní plechové sklady. Předpokládá se, že tato zařízení budou zřizována dle zvážení dodavatele zejména na navržených plochách staveniště. Dle jejich polohy a rozsahu stavební činnosti budována buď samostatně, nebo společně pro všechny objekty.

Zřízení zázemí stavby bude záležitostí dodavatele stavby. Předpokládá se využití staveništních buněk a kontejnerů, mobilních kancelářských prostor a hygienických zařízení.

ZS1 v km 17,95 Plocha 85 m² , na pozemku → Parc.č.2687/7, k.ú. Prostřední Suchá, ostatní plocha,

ZS2 v km 18,10 Plocha 55 m² , na pozemku → Parc.č.2736/7, k.ú. Dolní Suchá, silnice, ostatní plocha,

ZS3 v km 18,80 Plocha 905 m² , na pozemku Parc.č.3705/1, k.ú. Havířov-město, ostatní plocha,

ZS Dren v km 18,80 Plocha 905 m² , na pozemku → Parc.č.3705/6, k.ú. Havířov-město, ostatní plocha,

ZS4 v km 19,20 Plocha 140 m² , na pozemku → Parc.č.3705/6, k.ú. Havířov-město, ostatní plocha,

ZS5 v km 19,30-19,40 Plocha 1110 m² , na pozemku → Parc.č.3751/1, k.ú. Havířov-město, ostatní plocha,.

ZS6 v km 19,55 Plocha 520 m² , na pozemku → Parc.č.284/1, k.ú. Šumbark, ostatní plocha,.

ZS7 v km 19,58 Plocha 295 m² , na pozemku → Parc.č.284/1, k.ú. Šumbark, ostatní plocha,.

ZS8 v km 19,64-19,73 Plocha 755 m² , na pozemku → Parc.č.3751/1, k.ú. Havířov-město, ostatní plocha,

ZS9 v km 20,23 Plocha 400 m² , na pozemcích → Parc.č.2481, k.ú. Šumbark, → Parc.č.3873, k.ú. Havířov-město, ostatní plocha,

ZS10 v km 20,30 Plocha 1665 m² , na pozemcích Parc.č.3613/6, k.ú. Šenov u Ostravy, trvalý travní porost, → Parc.č.3908, k.ú. Šenov u Ostravy, ostatní komunikace, ostatní plocha,.

Další podmínky pro zřizování ploch zařízení staveniště:

Na plochách zařízení staveniště budou stavební mechanismy vybaveny dostatečným množstvím sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných látek; v průběhu krátkodobé odstávky mechanismů budou tyto podloženy vanami pro případné zachycení uniklých produktů; v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna, odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům;

- Na všech ZS nesmí být provozována jakákoliv manipulace s ropnými látkami, ani jejich skladování, dále zde nesmějí být opravovány žádné mechanismy (stavební stroje či vozidla), rovněž zde není přípustné jejich parkování.
- Pro parkování a opravy těchto mechanismů musí být v rámci stavebních prací zřízen stavební dvůr.
- Na plochách zařízení staveniště nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM pro stavební mechanismy.
- Všechny mechanismy v bezprostředním okolí vodotečí, musí být v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude kontrolovat je zejména z hlediska možných úkapů ropných látek - kontrola bude prováděna pravidelně, vždy před zahájením prací.
- Pro zařízení staveniště v blízkosti vodoteče bude dodavatelem stavby zpracován havarijní plán

POZN.: Přístup na staveniště v ose koleje znamená pohyb kolejové techniky po stávající koleji nebo koleji v novém stavu a silniční techniky po upraveném šterkovém loži. Jízda silniční technikou pouze po nové zemní pláni nebo pláni železničního spodku není možná.

Voda pro potřeby stavby

Zajištění přívodu vody ke staveništi a na zařízení staveniště je možné ze stávajících veřejných vodovodních řádů a hydrantů. Jejich místa, odběr vody, způsob napojení musí být před realizací projednán s majitelem a správcem odběrného místa a mluvně ošetřen. Do lokalit bez stávající vodovodní sítě bude voda podle potřeby dovážena. Průběh vodovodních řádů v obvodu staveniště a bezprostředním okolí je zakreslen v koordinační situaci..

Elektrická energie

Zařízení staveniště a staveniště v železniční stanici budou připojena dle potřeby na stávající rozvody nn stanic. Průběh kabelových tras je zřejmý ze situací stavby. U stavenišť ležících v mezistaničních úsecích lze podle místních podmínek využít stávajících veřejných rozvodů. Každé odběrné místo bude projednáno s dodavatelem elektrické energie. V místech, kde se dodavateli stavby nepodaří zajistit připojení elektrické energie je nutné použít mobilní elektrocentrály. Odběry elektrické energie, maximální povolený příkon a způsob napojení musí být při realizaci projednán se správcem a majitelem odběrného místa..

Napojení na kanalizaci

Odtok vody ze staveniště předpokládá řešit do stávajících místních odvodňovacích zařízení za podmínky neznečištění využívaných zařízení, vodních zdrojů a pozemků škodlivými látkami. Budování kanalizace, respektive žump pro WC a sociální zařízení v rámci zařízení staveniště se nepředpokládá. V místech, kde není možné připojení na stávající kanalizační řád a budování žump (např. plastových) je neekonomické, zejména na odlehlých místech, použijí se suchá WC s chemickou likvidací exkrementů.

Minimální počet záchodů se stanoví podle nejpočetněji zastoupené směny takto:

1 sedadlo na 10 mužů, 2 sedadla na 11 až 50 mužů, na každých dalších 50 mužů 1 sedadlo.

Zajištění požární ochrany

Zhotovitel prací je zejména povinen na staveništi obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích věcné prostředky požární ochrany, případně požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu.

Dále je povinen vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení, označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení.

Pravidelně musí kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika požární ochrany nebo preventisty požární ochrany dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady a umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany v souladu s tímto zákonem a ve stanovených lhůtách splnit jím uložená opatření. Zároveň je povinen bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje každý požár vzniklý při činnostech, které provozují, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají.

- Je zakázáno vypalování travních porostů. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství je zhotovitel povinen se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření je povinen předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.
- Všechny fyzické osoby, vyskytující se na staveništi jsou povinny počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení.

Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru:

- provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,
- uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření,
- ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení,
- poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce.
- Zhotovitel je povinen na staveništi dodržet podmínky požární bezpečnosti, jako např. vybavit zařízení staveniště a pracoviště věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostním zařízením, vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné akce a plnit lhůty pravidelných kontrol dodržování předpisů o PO.
- Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živců v tavných nádobách musí být dodrženy podmínky požární bezpečnosti.

10. Ochranná pásma

Ochranné pásmo dráhy

Ochranné pásmo dráhy je definováno Zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách. Ten stanovuje rozsah tohoto pásma dle typu dráhy a dále upravuje práva a povinnosti vlastníků a dalších osob v souvislosti s nemovitostmi v tomto ochranném pásmu a činnostmi, které v něm lze provádět.

Ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy 60 m od osy krajní koleje, ale nejméně 30 m od hranic obvodu dráhy u drah celostátních a regionálních (100 m u drah celostátních budovaných pro rychlost nad 160 km/h), 30 m od osy krajní koleje u tramvajových drah a vleček. U lanovek je to 10 m od (krajního) lana. V tomto pásmu nelze bez souhlasu drážního správního úřadu stavět a provozovat stavby, vykonávat důlní činnost, skladovat nebezpečné odpady a výbušniny, provozovat střešníky a používat světelné zdroje a barevné plochy zaměnitelné se znaky návěstidel.

Ochranná pásma zařízení elektrizační soustavy

Ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti tohoto zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob. Ochrannými pásmy jsou chráněna nadzemní vedení, podzemní vedení, elektrické stanice, výrobní elektrárny a vedení měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky.

Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob, může provozovatel přenosové soustavy nebo příslušný provozovatel distribuční soustavy udělit písemný souhlas s činností v ochranném pásmu, se kterým musí být zhotovitel prací prokazatelně seznámen a musí jej při své práci dodržovat. Souhlas není součástí stavebního řízení u stavebního úřadu a musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen (§ 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb.).

Ochranná pásma plynárenských a plynových zařízení

Plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy k zajištění jejich bezpečného a spolehlivého provozu dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb.

Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedeními ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynárenského zařízení měřeno kolmo na jeho obrys, který činí:

- a) u plynovodů a plynovodních přípojek o tlakové úrovni do 4 bar včetně, umístěných v zastavěném území obce 1 m na obě strany a umístěných mimo zastavěné území obce 2 m na obě strany,
- b) u plynovodů a plynovodních přípojek nad 4 bar do 40 bar včetně 2 m na obě strany,
- c) u plynovodů nad 40 bar 4 m na obě strany,
- d) u technologických objektů 4 m na každou stranu od objektu,
- e) u sond zásobníku plynu 30 m od osy jejich ústí,
- f) u zásobníků plynu 30 m vně od jejich oplocení,
- g) u zařízení katodické protikoroze ochrany a vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m na obě strany.

V ochranném pásmu zařízení, které slouží pro výrobu, přepravu, distribuci a uskladňování plynu, i mimo něj je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu.

V ochranném pásmu zařízení, které slouží pro výrobu, přepravu, distribuci a uskladňování plynu, i mimo něj je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu.

Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob, lze stavební činnost, zemní práce a uskladňování materiálu v ochranném pásmu provádět pouze s předchozím písemným souhlasem držitele licence, který odpovídá za provoz příslušného plynárenského zařízení.

Souhlas není součástí stavebního řízení u stavebních úřadů a musí obsahovat podmínky, za kterých lze tyto činnosti provádět.

Ochranná pásma telekomunikačních zařízení

K ochraně telekomunikačních zařízení se zřizují ochranná pásma (viz. § 92 zákona č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích a o změně dalších zákonů). Ochranné pásmo podzemních telekomunikačních vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

Silniční ochranné pásmo

Silniční ochranné pásmo je definováno mimo souvisle zastavěné území u rychlostních komunikací do vzdálenosti 100 m od osy přilehlého jízdního pásu (pro reklamy, poutače a světelná zařízení 250 m), u ostatních komunikací I. třídy 50 m od osy přilehlého jízdního pásu (zpravidla vozovky), u silnic II. a III. třídy a místních komunikací II. třídy 15 m od osy přilehlého jízdního pásu.

V silničním ochranném pásmu podléhá stavební, reklamní i pěstební činnost přísnějším podmínkám, případně souhlasu silničního správního úřadu. Vlastníci pozemků v ochranném pásmu jsou povinni strpět nezbytné činnosti vlastníka komunikace.

Kanalizace

Ochranné pásmo kanalizace je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny kanalizační stoky a je stanoveno:

- a) 1,5 metru na každou stranu u kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně,
- b) 2,5 metru na každou stranu u kanalizačních stok nad průměr 500 mm.

Vodovod

Pro vodovodní potrubí jsou stanovena ochranná pásma od vnějšího líce potrubí, a to 1,5 metru pro

potrubí o průměru do DN 500 a 2,5 m pro potrubí o průměru nad DN 500, přičemž veřejnoprávní organ má právo stanovit jiný rozsah ochranného pásma. Při uložení do větší hloubky než 2,5m se ochranné pásmo vodovodu rozšiřuje o 1 metr.

11. Obecné požadavky bezpečnosti práce na stavbě

Při realizaci stavby platí v plném rozsahu právní předpisy v oblasti bezpečnosti práce platné v zemi dodavatele stavby a právní předpisy platné v zemi, kde se stavba realizuje. Při vlastní realizaci se použijí právní předpisy, které upravují danou oblast přesněji.

Základní přehled právních předpisů z oblasti BOZP uplatnitelných na výše uvedenou stavbu v České republice je uveden v kapitole č. 8 tohoto Plánu BOZP Přehled základních právních předpisů BOZP.

V průběhu výstavby se hlavní zhotovitel stavby a ostatní zúčastnění zhotovitelé dále řídí požadavky bezpečnosti práce obsaženými v projektové dokumentaci (zejména v části " Zásady organizace výstavby" dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění), v technologických postupech, v pracovních postupech jednotlivých prací, v návodech výrobců a vlastními řídicími dokumenty v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

Každý pracovník musí plnit na stavbě požadavky na bezpečnost práce, mezi které patří zejména:

- počínat si při práci tak, aby neohrozil zdraví své ani svých spolupracovníků, dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předepsané pracovní postupy,
- při práci vždy myslet na bezpečnost svého jednání a nepřeceňovat své schopnosti,
- neuvádět do chodu stroj nebo zařízení, pokud se nepřesvědčil, že tím neohrozí zdraví nebo život svůj či jiné osoby,
- neprovádět práce, pro něž není poučen ani vyškolen, zejména práce, které vyžadují zvláštní odbornou kvalifikaci (např. jeřábník, vazač, obsluha stavebního stroje ...),
- dodržovat pořádek na pracovištích a komunikacích na stavbě,
- každý úraz si dát řádně ošetřit a ihned jej hlásit nejbližší nadřízenému a koordinátorovi BOZP stavby
- při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, které zaměstnanec nemůže sám odstranit, informovat o nich neodkladně nadřízeného,
- používat při práci ochranná zařízení a předepsané osobní ochranné pracovní prostředky, včetně ochranné přilby a výstražné vesty
- dodržovat protipožární opatření, ochraňovat životní prostředí

Pracovníkům je na stavbě zakázáno především:

- vstupovat na stavbu pod vlivem alkoholu, požívat alkohol na stavbě a v průběhu pracovní doby i mimo areál stavby,
- odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní zařízení, kryty, značky,
- opravovat a čistit stroje, přístroje a jejich součásti, pokud jsou tyto v pohybu a pokud není spolehlivě zajištěno, že se nemohou samovolně rozběhnout,
- bez vědomí nadřízeného neopouštět pracoviště.

Před zahájením prací zabezpečí odpovědný zástupce hlavního zhotovitele (stavbyvedoucí) na stavbě:

- způsob přivolání rychlé lékařské pomoci viz. zpracovaný traumatologický plán hlavního zhotovitele stavby, vybavení stavby skříňkami první pomoci - lékárníčkami podle počtu pracovníků a jejich řádné označení,



- způsob přivolání hasičů viz. dokumentace požární ochrany (požární poplachové směrnice atd.) hlavního zhotovitele stavby, instalaci a označení hasičských přístrojů na stavbě,
- vytýčení všech inženýrských sítí - přívodů elektrického proudu, vody, plynu atd.,
- prokazatelné seznámení všech pracovníků (včetně pracovníků svých zhotovitelů) s riziky na dané stavbě v rozsahu stanoveném tímto Plánem BOZP a svou interní dokumentací BOZP,
- koordinaci jednotlivých prací s ostatními účastníky výstavby v průběhu stavby se zaměřením na BOZP a dle pokynů koordinátora BOZP stavby,
- zpracování technologického – pracovního postupu pro provedení (zejména pro provedení snesení a následné montáže mostního tělesa dále pak (zemních prací) otevřeným výkopem, zajištění stability stěn výkopových rýh)
- vymezení staveniště (ohrazení, oplocení, označení..) k zajištění ochrany stavby, zařízení a osob,

Ostatní

Stavební zakázka bude realizována na základě uzavřené smlouvy s hlavním zhotovitelem stavby. Kontroly BOZP a PO na stavbě budou prováděny průběžně pověřenými pracovníky hlavního zhotovitele stavby v rozsahu stanoveném v tomto Plánu BOZP.

Pracovníci

Hlavní zhotovitel stavby odpovídá, že realizaci vlastních prací budou provádět pracovníci (včetně pracovníků případných svých ostatních zhotovitelů), kteří jsou pro výkon příslušných prací zdravotně způsobilí a jsou prokazatelně seznámeni s příslušnými bezpečnostními předpisy. Pokud pracovníci prováděli práce k jejichž činnosti je třeba zvláštní odborné kvalifikace odpovídá zhotovitel, že tito pracovníci vlastní platné průkazy odborné způsobilosti.

Hlavní zhotovitel určí odpovědného pracovníka za realizaci vlastních prací na stavbě, který musí poskytovat ostatním zhotovitelům stavby součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů při realizaci stavby, zejména si včas předávat informace a podklady potřebné pro aktualizaci tohoto Plánu BOZP, tento Plán BOZP dodržovat, a postupovat podle dohodnutých opatření v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v Plánu BOZP.

Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel stavby (v tomto plánu je za zhotovitele stavby považován zhotovitel stavby dle § 160 stavebního zákona) projedná s každým zhotovitelem a prokazatelně mu předá aktualizovaný a s dalšími zhotoviteli projednaný plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to před zahájením prací jimi vykonávanými. O každé změně plánu budou zhotovitelé informováni koordinátorem.

Každý zhotovitel bude smluvně zavázán informovat zhotovitele stavby o všech okolnostech znemožňujících dodržení plánu. Zhotovitel stavby bude provádět kontroly dodržování plánu a před nástupem každého zhotovitele na pracoviště zkontroluje, zda je pracoviště vybaveno v souladu s plánem, aby mohla být činnost nastupujícího zhotovitele prováděna bezpečně.

Na staveništi bude zakázán vstup cizích osob. Každá osoba vstupující na stavenišť proto musí být považována za osobu, která se zdržuje na staveništi s vědomím jednotlivých zaměstnavatelů. Povinnosti každého z vedoucích zaměstnanců kteréhokoliv zhotovitele bude sledovat výskyt cizích osob na jemu svěřeném úseku stavby a zajistit této osobě bezpečný doprovod k zařízení staveniště, kde cizí osobu zkontaktuje se stavbyvedoucím HZ

Každý zhotovitel povede vlastní evidenci přítomnosti všech zaměstnanců a dalších fyzických osob, včetně vymezení jejich právního postavení (např. zaměstnanec, OSVČ) na části staveniště, která mu byla předána a tuto evidenci bude schopen poskytnout kdykoliv svému objednateli, stavbyvedoucímu a koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Přitom je nutné vzít v úvahu, že OSVČ, která nikoho nezaměstnává, nemá rozsah povinností stanovených zákonem v rozsahu zaměstnavatelů, nemá vlastní pracoviště, ale je na pracovišti zhotovitele – zaměstnavatele, na jehož pracovišti se pohybuje.

12. Činnosti spojené s potenciálními nebezpečími možného ohrožení bezpečnosti a zdraví pracovníků

Na stavbě se budou vyskytovat zejména tyto činnosti spojené s potencionálními nebezpečími ohrožení zdraví:

- bourací práce, demolice
- zemní práce,
- betonářské práce
- montážní práce,
- jeřábová doprava
- svářečské práce,
- manipulace s materiálem
- souběžná práce více zhotovitelů
- práce související se stavební činností

13. Osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP)

Hlavní zhotovitel odpovídá, že všichni jeho pracovníci a osoby zdržující se s jeho souhlasem na stavbě (včetně pracovníků jeho ostatních zhotovitelů) budou vybaveni příslušnými OOPP, a to vždy ochrannou pracovní obuví, ochrannou přilbou a výstražnou vestou s vysokou viditelností a dále podle rizika práce na příslušném pracovišti.

Jedná se o minimální seznam následujících prací a činností ve vazbě na OOPP hlavy, nohou, zraku, sluchu, dýchacích orgánů, těla, paží, rukou atd.

a) ochrana hlavy – ochranná přilba:

- stavební práce
- práce na lešení, pod ním nebo v jeho blízkosti
- práce ve výškách
- montážní a instalační práce

- stavění lešení a demoliční práce
 - práce v jamách, výkopech, šachtách
 - zemní práce
 - práce v blízkosti zdviží, zdvihacích zařízení, jeřábů a dopravníků
 - manipulace s materiálem
- b) ochrana nohou – obuv s podešví odolnou proti propíchnutí:
- veškeré stavební práce
 - lešenářské práce
 - ochranná obuv, kterou lze snadno vyzout:
 - svářečské práce
- c) ochrana zraku nebo obličeje – ochranné brýle, obličejové štíty:
- tváření, broušení, rozrušování
 - utěšňování a sekání
 - práce s motorovými pilami
 - svářečské práce (svářečská kukla)
- d) ochrana sluchu – chrániče sluchu:
- práce s kompresory a pneumatickými vrtačkami
 - obsluha zemních a stavebních strojů
 - práce s nastřelovacím náradím
- e) ochrana dýchacích orgánů – respirátory, dýchací přístroje:
- práce s nebezpečnými látkami
 - nanášení nátěrů stříkáním
 - bourací práce
- f) ochrana těla, paží a rukou – ochranné oděvy:
- veškeré stavební práce
 - svářečské práce
- g) kožené zástěry:
- svářečské práce,
- h) rukavice:
- veškeré stavební práce,
 - svářečské práce,
- i) bezpečnostní pásy, postroje a bezpečnostní lana:
- práce na lešeních a konstrukcích,
 - montáž stavebních prefabrikátů,
 - práce ve výškách, prohlubněmi a vodou

14. Bezpečnost ručního náradí

Hlavní zhotovitel odpovídá, že veškeré náradí a spotřebiče používané na stavbě splňují bezpečnostní kritéria podle příslušných technických norem a mají předepsané revizní zkoušky. Pracovníci, kteří jsou určeni k práci s ručním náradím musí být prokazatelně seznámeni s obsluhou tohoto náradí. Veškeré neodborné zásahy do konstrukce a elektrické instalace ručního náradí jsou zakázány. Vlastní náradí a pomůcky lze používat pouze se souhlasem stavbyvedoucího (odpovědného zástupce hlavního zhotovitele) a za předpokladu, že vlastní náradí a pomůcky splňují veškeré požadavky.

15. Bezpečnost životního prostředí

Hlavní zhotovitel stavby odpovídá, že stavební práce budou prováděny způsobem, který neohrozí životní prostředí. Hlavní zhotovitel odpovídá za průběžné odstraňování odpadu v souladu s příslušnými předpisy a technickými normami. Odpovědný pracovník stanoví místa parkování stavebních strojů na stavbě a zabezpečí způsob parkování stavebních strojů takovým způsobem, aby bylo zamezeno kontaminaci půdy únikem provozních náplní stavebních strojů a parkovaných vozidel.

Na vyhrazeném místě, které je upraveno k zachycení případného úniku ropných produktů lze skladovat provozní náplně stavebních strojů, které umožní jejich práci po dobu dvou dnů.

Na stavbě je zakázáno odstraňovat odpad spalováním, zavážením do výkopů atd.

16. Postupy a opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při výstavbě požadované právními předpisy a stanovené na základě předpokládaných rizik.

Kácení dřevin (náletů)

Před zahájením prací bude nutné kolem provést vykácení náletů.

Rizika poranění mohou nastat v důsledku:

- pádu stromů nebo větví na zaměstnance
- pořezání řetězem motorové pily
- vysoké hlučnosti při práci s pilou
- vibrací při práci s pilou.

Opatření stanovená na základě požadavků právních předpisů a vyhledaných rizik:

- Zhotovitel pověřený kácením určí vedoucího zaměstnance, který bude zajišťovat trvalý odborný dozor nad dodržováním správného postupu při kácení. Jeho úkolem bude rovněž kontrolovat, zda zhotovitelem pověřený zaměstnanec správně provádějí střežení ohroženého prostoru a sami se v něm nevyskytují.
- Zhotovitel pověřený kácením zajistí, aby všichni zaměstnanci, kteří se pohybují v prostoru, kde hrozí nebezpečí zejména pádu větví a stromů, používali ochranné přilby.
- S ohledem na rizika vykonávané pracovní činnosti, charakter pracoviště a počet zaměstnanců zaměstnavatel musí zajistit, aby zaměstnanci vykonávající práce s řetězovou pilou, křovinořezem nebo ručním nářadím s ostřím byli vybaveni prostředky pro poskytnutí první pomoci, včetně zajištění prostředků umožňujících přivolání poskytovatele zdravotnické záchranné služby.
- Podmínkou, aby byly ústupové cesty bezpečné je že v nich musí být odstraněny překážky. Postup kácení proto musí být volen zhotovitelem tak, aby ústupová cesta již byla volná.
- Zhotovitel provádějící kácení zajistí, aby zaměstnanci nebo jiné osoby pracující s pilou byli seznámeni a dodržovali pokyny výrobce uvedené v návodu na používání, údržbu a opravy, před začátkem a v průběhu práce podle potřeby kontrolovali stav bezpečnostních prvků řetězové pily; při startování drželi řetězovou pilu za přední rukojeť a přidržovali nohou, pilu měli položenou na pevném podkladu a ověřili si, že se řetěz nedotýká žádného předmětu, zastavovali chod motoru řetězové pily, pokud budou přecházet na vzdálenost větší než 150 m, pokud podmínky bezpečné práce nevyžadují zastavení chodu motoru již při menší vzdálenosti, při přecházení s řetězovou pilou s motorem v chodu zablokovali chod pilového řetězu bezpečnostní brzdou řetězu.
- O stavu řetězové pily a době používání po celou dobu provozu je zaměstnavatel povinen vést evidenci, která obsahuje zejména identifikační údaje pily, datum uvedení do provozu, počet hodin provozu za měsíc a záznamy o výsledcích kontrol a oprav.

Nakládka, vykládka a skladování materiálu

Rizika poranění mohou nastat v důsledku:

- zasažení břemenem nebo vozidly,
- zavalení materiálem,
- zřícení skladovaného materiálu

Opatření stanovená na základě požadavků právních předpisů a vyhledaných rizik:

- Materiál bude dopravován na staveniště na předem určenou plochu pro skládku daného materiálu.
- Během vykládky materiálu musí být v místech ohrožených manipulací s materiálem vyloučen provoz.
- Manipulaci s materiálem může provádět pouze způsobilá a náležitě poučená osoba.
- Vázat materiál na zdvihací zařízení může pouze osoba, která k této činnosti byla náležitě a prokazatelně proškolená.
- Nakládka a vykládka musí být provedena v co nejkratší době a nesmí při tom být ohrožen bezpečný provoz a bezpečnost osob v místě nakládky a vykládky.
- Při manipulaci s materiálem je vždy nutné určit náležitě poučenou a proškolenou osobu zodpovědnou za vyloučení provozu v místě práce. Tato osoba je oprávněna v rámci zajištění bezpečnosti zastavovat jiná vozidla a odklánět dopravu.
- Při ukládání materiálů musí být dodrženy zásady stohování materiálů.
- Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby.
- Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů.
- Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k jeho poškození.
- Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe.
- Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru skladovány do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. Vytvoří-li se stěna, upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 maximálního dosahu použitého nakládacího stroje.
- Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 m. Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad vyšších než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny nepřesáhla 1,5 m.
- Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní značkou se zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob. Fyzické osoby, které zabezpečují provádění odběru, se nesmějí zdržovat v ohroženém prostoru místa odběru.
- Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny například operami nebo stěny, musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu.

Bourací práce

Technologie demoličních prací:

Odpojení demolovaného objektu od inženýrských sítí bude provedeno v souladu s požadavky jejich správců. Po prokazatelném odpojení objektu od inženýrských sítí bude přistoupeno k demolicí. Demoliční práce budou probíhat formou postupného rozebírání (bez použití trhacích prací). Před vlastní demolicí bude provedeno vyklizení nepotřebných věcí a budou demontovány vnitřní rozvody.

Předpokládaný sled bouracích prací:

- ⇒ Zajištění nebezpečného prostoru kolem stavby (ohrazením, oplocením, jištěním náležitě poučenou osobou)
- ⇒ Demontáž dveřních a okenních křidel a následně vybourání dveřních a okenních rámu
- ⇒ Odstranění střešní krytiny
- ⇒ Demontáž prvků ploché střechy
- ⇒ Postupné rozebírání jednotlivých konstrukcí objektu
- ⇒ Vybourání nebo zarovnání základových konstrukcí Vybouraná suť bude přemísťována přímo na vozidla případně na dočasnou meziskládku maximálně na 8 hodin. Demolované konstrukce budou tříděny a separovány dle materiálového druhu a odváženy na skládku odpadu nebo k recyklaci. Suť vhodná k recyklaci bude oddělena.

Rizika poranění nebo poškození zdraví mohou nastat zejména v důsledku:

- zasažení padající suti
- zasažení zemními stroji, případně nákladními automobily,
- pád z výšky
- kontaminace azbestem

Opatření stanovená na základě požadavků právních předpisů a vyhledaných rizik:

- Před začátkem bouracích prací musí být nejprve uzavřeny a vypnuty přívody médií – vody a elektřiny. Demoliční práce se budou týkat vnitřních nosných konstrukcí – vodorovných i svislých, nenosných příček, výplní otvorů i střešní konstrukce
- Předem mohou být demontována technologická zařízení objektu (ZTI a pod).
- Při bourání stropních konstrukcí musí být tyto při ručním bourání pomocí pneumatických kladiv dostatečně podstojkovány a musí být prováděno bourání po jednotlivých konstrukčních částech, tak aby nikdy nemohlo dojít k neřízené destrukci konstrukce.
- Veškeré práce budou provádět pouze osoby k tomuto účelu určené s příslušnou kvalifikací odpovídající charakteru činnosti.
- Odstranění stavby bude probíhat bez použití trhavin.
- Stavební materiál bude při bourání tříděn a průběžně odvážen na skládky a k likvidaci dle nařízení o nakládání s odpady.
- V nebezpečném prostoru – min. 2 m od maximálního dosahu zemních strojů se nesmí nacházet žádné osoby. V případě, že některá osoba do tohoto prostoru vstoupí, strojník přeruší práci a osobu z nebezpečného prostoru vykáže.
- Rozsah a způsob odpojení technické infrastruktury a dalších zařízení ve stavbě bude specifikován před zahájením bouracích prací
- Zaměstnanci vykonávající práci na střeše budou chráněni proti pádu ze střešních plášťů na volných okrajích, sklouznutí z plochy střechy případně propadnutí střešní konstrukcí použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu a použitím žebříků upevněných v místě práce.
- demontáž krovu bude provedena z dílcového lešení umístěného v podkroví.

Hlavní zásady při bouracích pracích:

- Bourání nosných částí konstrukce se provádí zásadně od shora dolů.
- Při ručním bourání ze zvýšených pracovních podlah musí být provedena opatření stanovená pro práce ve výškách včetně používání předepsaných OOPP.
- Bourat se musí tak, aby nedošlo k ohrožení vedlejších objektů, zejména těch, které bouráním ztratily stabilitu.
- Pomocné konstrukce (lešení, podpěrné konstrukce) vybudované uvnitř objektu nebo na jeho vnějších stranách se nesmí zatěžovat vybouraným materiálem.
- Vybouraný materiál se musí průběžně odstraňovat, aby nedošlo k přetížení podlah a stropů.
- Vstupy, výstupy a vjezdy do prostoru bouraného objektu musí být zajištěny po celou dobu bouracích prací a viditelně označeny.

- Bourací práce nad sebou jsou zakázány, pokud nejsou v technologickém postupu stanoveny podmínky pro zajištění bezpečnosti pracovníků.
- Bourání nesmí být přerušeno, pokud není zajištěna stabilita bourané konstrukce nebo její části.
- V případě ohrožení pracovníků, dohodnout znamení nebo jiný pokyn všem pracovníkům k opuštění pracoviště.

Projektant upozorňuje na demolici prvků pozemních objektů s možností obsahu azbestu (části střešní krytiny, stará trubní vedení, apod). !!!!!

V souvislosti s odstraňováním staveb či jiných zařízení obsahující azbest upozorňujeme na nutnost striktního dodržování povinností stanovených pro práce s azbestem zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Likvidace nebezpečného odpadu – azbestocementové šablony a pod.

Pro odstranění a likvidaci je navržen následující postup prací:

1. Před zahájením stavebních prací bude provedeno ohraničení ochranného pásma kolem stavby výstražnou páskou s označením zákazu vstupu nepovolaným osobám. Objekt se nachází ve stávající rekreační zástavbě. Z boční a zadní strany není k objektu volný přístup osob. Z přední strany je pozemek stavby oplocen. Pracovníci přítomni na stavbě budou proškoleni a před nástupem bude provedena zdravotní prohlídka. Odstranění krytiny bude provedeno v jednom pracovním dni. Na stavbě budou přítomni 3 pracovníci. Kolem vlastní stavby chaty bude vymezeno kontrolované pásmo. Kontrolní měření bude provedeno akreditovanou kanceláří. Kontrolní měření (pracovního prostoru – ovzduší) bude provedeno v době prací. Při vstupu do kontrolovaného pásma bude vedena evidence osob. Na stavbě bude umístěn 3-komorová dekontaminační komora s prostorem pro špinavé oblečení, vysavač s HEPA filtrem + vzduchová pistole, pak bude oblečení vyslečeno a uloženo do plastových uzavíratelných pytlů. Bude používáno jednorázové oblečení.
2. Odstraňování krytiny bude prováděno ručně od hřebene k okapům v pásech cca 800mm. K odstraňování bude používáno dřevěných deskových žebříků, tak aby nášlapem nedocházelo k lámání krytiny. Před zahájením prací bude krytina včetně kotvicích prvků (hřebíky, šrouby, vruty apod.) postříkána přípravkem FIXO PLUS (zvlhčující prostředek pro fixování volných azbestových vláken a stabilizaci azbestových odpadů, pro nanášení je možno použít ručních nebo nízkotlakých stříkacích zařízení.), čímž dojde k uzavření povrchu krytiny. Připevňovací hřeby nebo šrouby budou uvolňovány kleštěmi, jakékoliv lámání krytiny nesmí být prováděno. Krytina bude ukládána do plastových uzavíratelných obalů a v těchto bude přemístěna na uzavřený plechový kontejner. Po naplnění bude kontejner odvezena na vyhrazenou skládku pro tyto materiály. Likvidaci zajistí firma, která má pro tuto likvidaci oprávnění.
3. Pracovníci při odstraňování krytiny musí být vybaveni vhodnými ochrannými prostředky a oblečením. Pro oblečení budou používány pogumované nebo igelitové kombinézy, gumová lehká obuv, rukavice a pokrývka hlavy. Ochranné pomůcky budou tvořit respirátory nebo polomasky s filtrem HEPA FFP3. Po dokončení prací bude oblečení včetně masek s filtrem uloženo do plastových uzavíratelných pytlů a odvezeno na skládku.
4. Při provádění prací je zakázáno jíst, pít a kouřit.
5. pracovníci budou mít k dispozici mobilní WC kabinu TOI. Hygienické zařízení bude v mobilní stavební buňce, vybavené sprchou a umyvadlem včetně teplé a studené vody.
6. Obyvatelé a vlastníci sousedních nemovitostí budou předem upozorněni na druh prováděných prací a možné nebezpečí kontaminovaného ovzduší. U vstupu na stavbu bude vyvěšena tabule o zákazu vstupu nepovolaným osobám.

7. odstranění eternitové krytiny bude provedeno s oprávněním na likvidaci nebezpečných odpadů.
8. Stavební práce při likvidaci azbestu budou nahlášeny 30 dní předem na KHS

V rámci přípravy stavby budou zhotovitelem vypracovány a předloženy investorovi ke schválení technologické předpisy a postupy v souladu s TKP staveb státních drah.

Zemní práce

Rizika poranění nebo poškození zdraví mohou nastat zejména v důsledku:


- zasažení padající zeminou a sutí
- zasažení zemními stroji, případně nákladními automobily
- pád do výkopů

Opatření stanovená na základě požadavků právních předpisů a vyhledaných rizik:

- V nebezpečném prostoru – min. 2 m od maximálního dosahu zemních strojů se nesmí nacházet žádné osoby. V případě, že některá osoba do tohoto prostoru vstoupí, strojník přeruší práci a osobu z nebezpečného prostoru vykáže.
- Řidiči nákladních vozů budou poučeni, že před couváním se přesvědčí o tom, že se v dráze vozidla nezdržují žádné osoby a upozorní zvukovým signálem počátek couvání.
- U nepažených rýh (do hloubky 1,3 m) bude provedeno dvoutyčové zábradlí se zarážkou ve vzdálenosti odpovídající polovině hloubky výkopu.
- Ostatní výkopy (úpravy terénu) budou provedeny se sklony svahů 1:1.
- Na ohrazené staveništi nebudou mít přístup nepovolané osoby. Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace nebudou na staveništi zaměstnány. Proto nebudou v tomto smyslu na staveništi provedeny žádné úpravy.
- Vytěžený materiál bude odvezen na skládku.

V případě, že bude nutnost výkopy zapažit:

- Pažit bude nutné výkopy hlubší než 1300 mm. Pro pažení rýh bude použito příložené pažení, jehož parametry odpovídají hloubce výkopů.
- Pažení výkopů bude prováděno již od hloubky 0,7m pokud bude zjištěna nesoudržnost zeminy (např. navážka, šterky apod.) nebo pokud v nich bude prováděna práce v kleče.
- Konstrukce tohoto pažení, zpravidla dřevěného, zajišťuje svislé stěny výkopu příkládanými pažnicemi, které budou přeloženy převázkami (svlaky) kolmými na směr příložených pažnic. Převázky (svlaky) se v rýhách zajišťují vodorovnými rozpěrami. Viz obrázek níže.
- Výkop bude opatřen zábradlím, aby bylo zabráněno pádu osob do výkopu.
- Zábradlí musí být přerušeno v místě nástupu na žebřík, který bude spuštěn do výkopu. Toto přerušení musí mít šířku rovnající se šířce žebříku + 60 cm.
- Žebřík bude přesahovat výstupní plošinu o 1,1 m.
- Aby nemohlo dojít k pádu osob do výkopu, proluka zábradlí z důvodů nástupu na žebřík bude zajištěna snímatelným zábradlím, které lze odstranit jen v době nástupu na žebřík, nebo při výstupu z žebříku. Po dobu, kdy se u jámy nebude pracovat, bude i toto snímatelné zábradlí doplněno zarážkou.
- Do doby dokončení zábradlí bude nezajištěná část výkopu střežena pověřenými zaměstnanci, kteří se nesmí k výkopu přiblížit na vzdálenost menší než 1,5 m

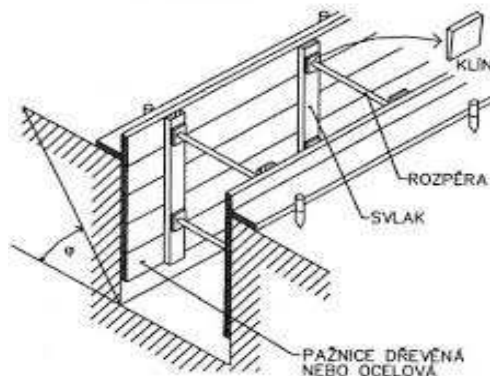

Ruční provádění výkopů

Při výkopu v blízkosti stávajících kabelů a dalších podzemních sítí je nutno provádět výkop ručně, aby nedošlo k jejich poškození.

Opatření stanovená na základě požadavků právních předpisů a vyhledaných rizik:

- Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším, než 24 hodin prohlédne osoba pověřená zhotovitelem stav stěn výkopu, pažení a přístupů.
- Při ručním provádění výkopových prací budou pracovníci při práci rozmístěni tak, aby se vzájemně neohrožovali.
- Před vstupem pracovníků do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin, provede odpovědný pracovník prohlídku stavu stěn výkopu, pažení a přístupů.
- Pracovníci ve výkopu budou opatřeni OOPP (přilba, rukavice, vesta).
- Dodržování používání OOPP ve výkopech bude přísně kontrolováno.
- Je zakázáno sestupovat nebo vystupovat z výkopů po konstrukci pažení a vstupovat do strojem vyhloubených výkopů, které nejsou zapaženy.
- V místech, kde bude potřeba vstoupit do zapaženého výkopu budou zřízeny bezpečné sestupy (výstupy) pomocí žebříků, které budou připevněny k pažení a zajištěny podle druhu použitého pažení, tak aby nemohlo dojít k uvolnění žebříku.
- Žebřík bude přesahovat horní hranu pažení min. o 1,1 m.

Upozornění na zvláštní rizika při opravách kanalizační sítě (SO 12-31)

Rizika spojená s prací v podzemních objektech dešťových zdrží, čerpacích stanic, rozdělovacích a odlehčovacích objektech na kanalizační síti, nebo v dalších podzemních prostorách a jímkách na stokové síti:

- pád při sestupu nebo výstupu z podzemních prostor
- pád materiálu, předmětů do podzemních prostor
- přítomnost odpadních vod, náhlé zatopení podzemních prostor, následně zranění proudem vody nebo utonutí
- výskyt výbušných nedýchatelných a toxických plynů
- nebezpečí úrazu el. proudem
- nákaza, infekce, nebezpeční hlodavci

| Název | Chemický vzorec | Mezní koncentrace | Výbušnost | Vlastnosti |
|---------------|------------------|-------------------|--------------|--|
| Metan | CH ₄ | 1, 5 % | 5 – 15 % | Nedýchatelný |
| Oxid uhelnatý | CO | 0, 013 % | 12, 5 – 74 % | Toxický |
| Oxid uhličitý | CO ₂ | 2, 5 % | Ne | Nedýchatelný |
| Sirovodík | H ₂ S | 0, 0018 % | Ne | Toxický, zápachá |
| Kyanovodík | HCN | 0, 0002 % | Ne | Toxický, zápach hořkých mandlí |
| Uhlovodíky | | | Ano | Narkotizující, hořlavé, zápach ředidel |

Opatření k minimalizaci zvláštních rizik

- Zaměstnanec nesmí použít k sestupu a výstupu žebřík nebo stupadla, která vykazují nějakou závadu (porušení pevnosti, stability apod.). Spouštět zaměstnance lze pomocí prostředků (OOPP) k tomu schválených (postroj, zdvihací zařízení).
- V okolí vstupu se nesmí odkládat žádný materiál a nástroje, poklop musí být odložen do min. vzdálenosti 1 m od hrany vstupu. Zaměstnanec vstupující do podzemí, musí mít nasazenou ochrannou přilbu (OOPP). Zaměstnanci na povrchu, musejí dbát zvýšené opatrnosti, aby nezapříčinili pád předmětů do podzemí. Spouštět předměty do podzemí, lze pouze pokud zaměstnanec uvnitř má možnost úkrytu mimo prostor spouštění, v žádném případě se nesmí nacházet pod zavěšeným břemenem.
- Podzemní prostor se musí před vstupem min. 20 min odvětrávat, pokud možno přes více otvorů. Po odvětrání se musí zkontrolovat, zda nejsou přítomny nebezpečné koncentrace výbušných, toxických a nedýchatelných plynů (detektory, detekční trubičky), kontrola se provádí spouštěním přístroje na provaze nebo pomocí hadičky. Pokud se nepodaří nebezpečné plyny odvětrat nebo dojde k náhlému výronu plynu, nesmí se do podzemí vstoupit (pouze s dýchacím přístrojem). Pokud se při pobytu v podzemí projeví u zaměstnance nevolnost nebo jiné změny, musí tento prostor okamžitě opustit. V okolí vstupu do podzemních prostor a v podzemí, platí přísný zákaz kouření, manipulace s ohněm a používání technologií, kde vzniká jiskření a teplo.
- Před vstupem do podzemního prostoru musí být vypnuto dvojím způsobem ponorné čerpadlo (pokud je zde instalováno). Při použití přenosného osvětlení, musí být použito zařízení pracující s bezpečným napětím. Zaměstnanec při sestupu a pobytu v podzemí musí dbát zvýšené opatrnosti. Je zakázáno opravovat el. část zařízení pod napětím uvnitř podzemního objektu, pro tento účel musí být zařízení vytaženo na povrch. Manipulovat s el. zařízením ve smyslu oprav a údržby mohou pouze osoby s el. kvalifikací.
- Při práci v podzemních objektech jsou zaměstnanci povinni důsledně používat OOPP a ochranných masťáků, tak aby minimalizovali styk pokožky a sliznic s odpadní vodou, kaly a usazeninami. Bezprostředně po práci, musí zaměstnanci vykonat hygienickou očistu osobní a očistu ochranného oděvu, do té doby nesmí kouřit, jíst a pohybovat se v prostorách kde se pohybují ostatní osoby. V případě výskytu hlodavců (potkani), musí být z prostoru vytěsnění zaplašením. Při jakémkoliv poranění hlodavcem, musí postižený vyhledat ošetření lékaře.
- Při pracích, kde hrozí nebezpečí úrazu, musí být přítomni minimálně 2 pracovníci.

Pilotáž

Rizika poranění mohou nastat v důsledku:

- zasažení vrtnou soupravou a nakladačem,
- pád do vrtů, zejména při osazování armokošů
- zasažení přepravovanými armokoši

Opatření stanovená na základě požadavků právních předpisů a vyhledaných rizik:

- Vzhledem k průměru pilot je zřejmé, že do zalití vrtu betonem je nutné zajištění proti pádu do vrtů, neboť pažení vrtů pilot nebo výplň vrtů armovacím košem nebude vždy tvořit ochranu proti pádu do vrtů. V případě, kdy roura pažení vrtu bude zasunuta do vrtu tak, že přesah roury nad okolní terén bude menší než 1,1 m, při veškerých činnostech v blízkosti vrtů jsou zaměstnanci povinni se v blízkosti vrtu jistit proti pádu do vrtu.

Ohrožený prostor kolem vrtné soupravy bude střežen pověřenou osobou proti vstupu nepovolaných osob.

Betonářské práce

Rizika poranění nebo poškození zdraví mohou nastat zejména v důsledku:

- zasažení přepravovanými dílci,
- pád z výšky, z lešení
- zasažení pruty při proarmování,
- zasažení hadicí čerpadla betonu,

Opatření stanovená na základě požadavků právních předpisů a vyhledaných rizik:

- Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem k řízení betonářských prací písemný záznam
- Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé.
- Při montáži bednění prováděné ve výšce nad 1,5 m budou pracovníci chráněni proti pádu dočasnou stavební konstrukcí (lešením).
- K čerpadlu betonu bude mít přístup pouze obsluha čerpadla, která bude postupovat podle návodu výrobce a místního provozního bezpečnostního předpisu zpracovaného dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb. zhotovitelem.
- Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný koš.
- Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné přístupové komunikace, například pracovní nebo přístupová lešení popřípadě podlahy tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uložené výztuži.
- Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány.
- Zhotovitel stanoví a zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla.

Odbedňování

- Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem.
- Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu. Žebřík lze při odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr.
- Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných fyzických osob.
- Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci.

Provoz jeřábu

Osazení betonových prefabrikátů a ocelových konstrukcí bude probíhat za pomoci jeřábu, byly prověřeny varianty použití železničního a silničního jeřábu.

Rizika poranění nebo poškození zdraví mohou nastat zejména v důsledku:

- zasažení přepravovanými dílci,
- zasažení autojeřábem při montáži,

Opatření stanovená na základě požadavků právních předpisů a vyhledaných rizik:

- Při práci s jeřáby bude postupováno dle systému bezpečné práce při práci s příslušným jeřábem.

Práce na mostech

- pád z výšky
- zasažení padajícími předměty
- provádění technologických postupů jednotlivých zhotovitelů. Jedná se o drobná poranění, která má v kompetenci zaměstnavatel osob provádějících konkrétní práce.

Opatření stanovená na základě požadavků právních předpisů a vyhledaných rizik:

- V rámci přípravy stavby budou zhotovitelem vypracovány a předloženy investorovi ke schválení technologické předpisy a postupy v souladu s TKP staveb státních drah.
- Při práci na mostě budou zastaveny práce a vyloučen provoz pod mostem.
- Při osazování / montáži zábradlí na mostě budou pracovníci na používat OOPP proti pádu.
- Kotevní body stanoví vedoucí montáže.

Zajištění prostoru pod místem práce ve výšce a v okolí

Prostory, nad kterými se pracuje a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen ohrožený prostor), je nutné vždy bezpečně zajistit.

Bezpečné zajištění ohrožených prostorů lze provést:

- vyloučením provozu
- konstrukcí ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo pod místem práce ve výšce, -
- ohrazením ohrožených prostorů dvoutýčovým zábradlím s dostatečnou stabilitou o výšce nejméně 1,1 m,
- dozorem ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení

Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně:

- 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m
- 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m
- 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m
- 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m

Šířka ohroženého prostoru je vytyčena od paty svislice, která prochází vnější hranou volného okraje pracoviště ve výšce.

Ruční manipulace s materiálem

Rizika poranění mohou nastat v důsledku:

- zasažení břemenem
- pád ze stohu materiálu
- sevření části těla

Opatření stanovená na základě požadavků právních předpisů a vyhledaných rizik:

- Manipulační plochy je nutné udržovat čisté, rovné.
- Je nutné odstranění překážek, o které by mohlo dojít k poranění nebo by mohly způsobit nebezpečí pádu.
- Je nutné dodržovat zákaz narušení stability stohů, např. vytahování předmětů a prvků zespodu nebo ze strany stohu.
- Nesmí se vystupovat a šplhat po navršeném materiálu.
- Před zahájením práce je nutná informovanost pracovníků o všech opatřeních, která mají být učiněna v oblasti bezpečné manipulace, zejména o hmotnosti břemene.
- Je nutné dodržovat správné pohyby při manipulaci, (např. zvedání neprovádět trhavými pohyby, manipulaci provádět pokud možno v poloze bez ohnutých zad).

- Manipulační plocha musí být odstraněna od vyčnívajících překážek (např. kabely a pohyblivé el. přívody, kotevní šrouby atd.)
- Pracovníci musí být proškoleni o správných způsobech a postupech ruční manipulace a nesmí být přetěžováni.
- Při navrhování manipulační jednotky určené pro ruční manipulaci se musí řešit současně i počet pracovníků s ohledem na tvar, hmotnost, rozměry (zejména délku). V případě, že manipulaci bude provádět více pracovníků určit vedoucího práce, který bude práci celé skupiny řídit a koordinovat.
- Je nutné zajišťovat přiměřený, popř. častější a dostatečný tělesný odpočinek a přestávky na zotavení v případě, že fyzická námaha je příliš častá nebo příliš dlouho trvající, zejména s přihlédnutím k zatížení páteře či nevhodných klimatických podmínek.
- Vyvarovat se skřípnutí, poranění nebo přiražení rukou k úložné ploše a podkladu.
- Hmotnost ručně přenášených břemen nesmí překročit při častém zvedání 30 kg, občasné 50 kg.

Požadavky na obsluhu strojů

Rizika poranění mohou nastat v důsledku:

- zasažení samojízdnými stroji
- zasažení zeminou
- pád z výšky z ložné plochy

Opatření stanovená na základě požadavků právních předpisů a vyhledaných rizik:

- Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek.
- Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, musí je obsluha stroje nastavit v pracovní poloze v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění.
- Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m.
- Na nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami.
- Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy.
- Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů, dohled a podle okolností též bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje dostatečným počtem způsobilých fyzických osob, které při této činnosti užívají jako osobní ochranný pracovní prostředek výstražný oděv s vysokou viditelností. Při označení překážky provozu na pozemních komunikacích seřídí ustanoveními zvláštních právních předpisů.
- Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně.

Demontáž (snesení) a následná montáž železničního svršku

Rizika poranění mohou nastat v důsledku:

- pád z výšky
- zasažení samojízdnými stroji
- zasažení zeminou, štěrkem
- zasažení padajícími předměty
- provádění technologických postupů jednotlivých zhotovitelů. Jedná se o drobná poranění, která má v kompetenci zaměstnavatel osob provádějících konkrétní práce.

Opatření stanovená na základě požadavků právních předpisů a vyhledaných rizik:

- V rámci přípravy stavby budou zhotovitelem vypracovány a předloženy investorovi ke schválení technologické předpisy a postupy v souladu s TKP staveb státních drah.
- Montáž bude provedena podle schválené z dokumentace zhotovitele, jak je předepsáno SM č. 11 GR SŽDC. Tato dokumentace musí být odsouhlasena projektantem.
- Rozměry a hmotnosti dílců nepřesahují přepravní limity a možnosti běžné techniky, která se k obdobným účelům používá.

Svařování a řezání plamenem

- Společné zásady bezpečnosti (vyhláška MV Č. 87/2000Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování)
- Před počátkem svářečských a řezacích prací se musí vyhodnotit, zda i v přilehlých prostorách nejde o práce se zvýšeným nebezpečím požáru.
- V případě zvýšeného nebezpečí se musí svařovat (řezat plamenem, pracovat s otevřeným ohněm, svařovací práce ve výškách) pouze na písemný příkaz a po provedení v něm nařízených bezpečnostních opatření.
- Před zahájením svářečských prací musí svářeč zkontrolovat, zda jsou v místě svařování odstraněny hořlavé látky, zamezeno požáru nebo výbuchu a zda je na pracovišti a v jeho okolí zabezpečena předepsaná ochrana osob.
- Po dobu práce, při jejím přerušení a po ukončení svařování nebo řezání v prostorách s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu musí být místo svařování a přilehlé prostory kontrolovány po nezbytně nutnou dobu a u nebezpečných prací po dobu nejméně 8 hodin po skončení práce.
- Láhve umístit tak, aby k nim byl volný přístup.
- Láhve musí být zajištěny proti převržení, pádu nebo skutálení stabilními nebo přenosnými stojany, řetězy, objímkami, kovovým pásem apod., každá tak, aby v případě potřeby bylo možno lahve rychle uvolnit.
- Budou-li lahve vystaveny sálavému teplu, musí být chráněny nehořlavou zástěnou, při ohřátí nad 50°C se musí chladit.
- Lahve v pojízdách dílnách se nemusí na pracovišti vykládat, pokud jsou splněny podmínky větracích otvorů v horní části vozidla a v podlaze a při odběru nesmí být prováděny ve vozidle žádné další práce.
- Hadice musí být chráněny před mechanickým poškozením a znečištěním mastnotami.
- Hadice a spoje musí být těsné a jejich délka minimálně 5 m.
- Při provádění prací několika soupravami současně musí být jednotlivé soupravy od sebe vzdáleny min. 3 m nebo musí být od sebe odděleny nehořlavou pevnou stěnou.
- Při déle trvajícím přerušení svařování nebo řezání musí být lahvové ventily uzavřeny, vypuštěn plyn z hadic a povoleny regulační šrouby redukčních ventilů.
- Po skončení práce nebo pracovní směny na přechodném pracovišti musí být lahve odvezeny na vyhrazené místo a zajištěny před manipulací nepovolanými osobami.

Natavovací hořáky, přístroje a agregáty na propan butan (izolace)

Rizika poranění mohou nastat v důsledku:

- výbuch
- popálení obsluhy
- únik PB, požár

Opatření stanovená na základě požadavků právních předpisů a vyhledaných rizik:

- Při užívání nastavovacích agregátů na PB zachovávat potřebnou opatrnost při zapalování i užívání, řídit se návodem pro používání a údržbu.
- Zajišťovat čistění, seřizování a servis natavovacích zařízení na PB; opravy provádět odborně, používat jen vhodného těsnícího materiálu.
- Při práci používat OOPP - vhodný pracovní oděv, pevnou uzavřenou obuv, kožené rukavice, OOPP k ochraně očí.
- Po každé výměně lahvi a hadice, a při podezření z úniku PB provádět kontrolu těsnosti.
- Při užívání nastavovacích agregátů na PB zachovávat potřebnou opatrnost při zapalování i užívání, řídit se návodem pro používání a údržbu.

Bezvýkopová technologie (protlak)

Rizika poranění mohou nastat v důsledku:

- nebezpečí úrazu přitlačením, naražením ve startovací jámě
- zavalení a zasypání při vstupu a práci ve výkopech - startovací/vstupní a cílové/konečné jámy
- pád pracovníka do výkopu startovací/cílové jámy

Opatření stanovená na základě požadavků právních předpisů a vyhledaných rizik:

- Dodržování min. rozměrů startovací a cílové jámy dle dokumentace a návodu výrobce (místech startovacích (vstupních), montážních, cílových a kontrolních rýh se navrhují otevřené výkopy)
- Při uvedení stroje do chodu se v blízkosti hydraulických částí zdržuje jen pracovník, který stroj řídí.
- Používání vhodného druhu a velikosti náradí.
- Při posunu protlačované tyče/roury nejsou ve vstupní (startovací) jámě vykonávány žádné jiné práce.
- Rozměry rýh musí umožňovat bezpečné provedení návazných bezvýkopových zemních prací a následně příslušných montážních prací (vtažení trubního vedení)
- Zajištění stěn výkopů proti při sesutí stěn od hloubky 1,30 m (resp. 1,50 m v nezastavěném území) pažením nebo svahováním dle projektu a skutečného stavu, fyzikálně mechanických vlastností zeminy a místních podmínek, podle potřeby zajistit stabilitu kolmé opěrné stěny.
- Před dalším vstupem kontrola stěn výkopu.
- Zřízení žebříků (popř. ramp, schodů) pro bezpečný sestup a výstup do výkopu startovací a cílové (konečné) jámy pro rychlé opuštění výkopu v případě vzniku nebezpečí. Žebřík bude přesahovat horní hranu jámy/pažení min. o 1,1 m
- Ohrazení výkopů startovací/cílové jámy pevným zábradlím. (Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné nebo více středních

Elektromechanické práce, práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení

Ochranná opatření:

- Elektrická zařízení smějí být obsluhována pouze pověřenými pracovníky.
- Přenosné kabely elektrického vedení musí být vedeny tak, aby nebyly vystaveny působení vlhkosti, plamene, nebo mechanickému poškození.
- Veškerá elektrická instalace bude pravidelně podrobována revizím.

- Při obsluze el. zařízení dbát příslušných návodů a instrukcí k jeho používání, dbát, aby elektrické zařízení nebylo nadměrně přetěžováno nebo jinak poškozováno.
- **Práce pod napětím může provádět pouze osoba znalá dle § 6,7,8 vyhlášky č.50/1978 Sb. ve znění pozdějších předpisů**
- Při práci je třeba věnovat prvořadou pozornost následujícím ČSN.
 - ČSN EN 61140 ed.2 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem
 - ČSN 33 2000-4-41 ed.2 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem
 - ČSN 33 2000-4-42 ed.2 - Ochrana před účinky tepla
 - ČSN EN 50110-1 ed.3 - Činnost na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky
 - NV 406/2004 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve výbušném prostředí
- V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dodržovat mj. následující podmínky:
 - dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
 - výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 m.
 - při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
 - je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864-1.
 - k zařízením veřejného osvětlení je nutné přistupovat, jako k zařízením pod napětím, i když veřejné osvětlení nesvítí (např. hrozba nevypínané žíly nebo nečekaného sepnutí).
- V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dodržovat mj. následující podmínky:
 - Ochranné pásmo vedení VVN a VN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „**POZOR, ochranné pásmo VN (VVN)**“ ze všech stran možného vjezdu do tohoto pásma. **Příklad značení:**



- Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1 ed.3)
- Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
- Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
- Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.

- Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
- Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká, s ČSN EN 50 110-1 ed 3 mj. o chování v případě zachycení rozvodů VN zejména nadzemních (bezpečné vystoupení z vozidla na kolech s pneumatikami či pásech s gumovými vložkami, krokové napětí)
- Pokud není možné dodržet výše uvedené podmínky, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhl. č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí, ...) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
- Nadzemní vedení nízkého napětí nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je však třeba dodržovat minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenosti dané v ČSN EN 50423-1.

Skladování hořlavých a provozních kapalin

Rizika poranění mohou nastat v důsledku:

- ekologické škody
- výbuch hořlavých par
- popálení

Opatření stanovená na základě požadavků právních předpisů a vyhledaných rizik:

- Hořlavé kapaliny na staveništi se smějí skladovat pouze v souladu s příslušnými normami - hořlavé kapaliny – prostory pro výrobu, skladování a manipulaci.
- Místo uložení hořlavých kapalin bude viditelně označeno odpovídajícím bezpečnostním značením a druhem obsahu skladovaných látek.
- Hořlavé kapaliny (chemikálie, barvy, oleje, ředidla) se budou ukládat jen na vyhrazených místech v původních přepravních obalech, nebo nádobách k tomu určených, které musí být uzavřeny.
- Nádob s hořlavými kapalinami musí být viditelně označeny druhem obsahu a třídou nebezpečnosti. Nádob musí být uzavřeny a musí být uloženy plnicím otvorem nahoru.
- Nádoby smí být plněny maximálně na 95% svého jmenovitého objemu.
- Je zakázáno používat obaly a láhve od nápojů (PET lahve) a potravin.
- Veškeré rozlité kapaliny a úkapy musí být ihned likvidovány.

Zpevněné plochy, sadové úpravy

Rizika poranění mohou nastat v důsledku:

- zasažení samojízdnými stroji
- zasažení nákladními vozidly při přepravě zeminy

Opatření stanovená na základě požadavků právních předpisů a vyhledaných rizik:

- V nebezpečném prostoru – min. 2 m od maximálního dosahu zemních strojů se nesmí nacházet žádné osoby. V případě, že některá osoba do tohoto prostoru vstoupí, strojník přeruší práci a osobu z nebezpečného prostoru vykáže.
- Řidiči nákladních vozů budou poučeni, že před couváním se přesvědčí o tom, že se v dráze vozidla nezdržují žádné osoby a upozorní zvukovým signálem počátek couvání.
- Opatření proti drobným poraněním jsou v kompetenci konkrétního zaměstnavatele, přičemž ochranu zaměstnanců zajistí podle konkrétních podmínek při práci a dle vlastních seznamů pro OOPP.

Dlaždičské práce

Při provádění dlažeb nehrozí pracovníkům žádné zvláštní rizika, kterým by bylo možné předcházet stanovováním bezpečnostních pravidel. Pracovníci musí dbát při používání náradí k formátování dlažby opatrnosti. Dále je nutné pracovníky vybavit náhleníky pro pohodlné provádění práce

Souběžná práce více zhotovitelů

Rizika poranění mohou nastat v důsledku:

- vzájemná neinformovanost o rizicích
- nevybavenost pracoviště lékárničkami

Opatření stanovená na základě požadavků právních předpisů a vyhledaných rizik:

- Povinnost vzájemné písemné informace o rizicích a přijatých opatřeních zhotovitelů.
- Seznámení vlastních pracovníků s informacemi o rizicích a přijatých opatřeních ostatních zhotovitelů na staveništi.
- Všechny zainteresované subjekty (investor, zhotovitelé / subdodavatelé, OSVČ apod.) musí být prokazatelně seznámeny s Plánem BOZP na staveništi, s riziky vyplývající z vlastních pracovních činností a dotčeného prostředí a prokazatelně proškoleni z BOZP a požární ochrany.
- Na dostupném a viditelném místě musí být uveden / vyvěšen : přehled základních bezpečnostních a požárních předpisů (požární a evakuační řád) a dále čísla tísňového volání včetně telefonů na důležité státní a místní orgány, stavbyvedoucí a osoby proškolené v poskytnutí první pomoci, popřípadě vnitřní telefonní seznam.
- Pracoviště (stavební buňky v místě ZS) musí být vybavena lékárničkami první pomoci podle rizik, traumatologickým plánem s přílohou první pomoci a přístroji PHP
- Při stavebních a montážních pracích je povinností určeného (zodpovědného) pracovníka hlavního zhotovitele seznámit odpovědné pracovníky subdodavatelů se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a potenciálními zdroji ohrožení na základě specifických podmínek konkrétního pracoviště na staveništi
- Další opatření – viz Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Závěr.

Plán a přijatá opatření byla zpracována na základě projektové dokumentace a informací od projektanta stavby. V případě změn projektové dokumentace, jejího doplnění, nebo technologického postupu je nutné plán aktualizovat.

17. Opatření při pracích za mimořádných podmínek a řešení mimořádných událostí

Postupy při porušení plynovodu, el. vedení, vodovodu:

1. Pracovník, který zpozoruje nežádoucí událost (porucha plynu, vodovodního potrubí, rozvodů el. energie apod.) je povinen neprodleně přivolat poruchovou službu buď z vlastního telefonu, nebo z telefonu řídicích pracovníků stavby.
2. Osoba oznamující poruchu do telefonu uvede:
kdo volá - svoje jméno a příjmení
kde k poruše došlo - adresu stavby
upřesní místo a rozsah poruchy
3. Při poruše el. energie nebo plynu se pracovníci i návštěvníci v klidu vzdálí do bezpečné vzdálenosti a vyčkají příjezdu poruchové služby.
4. Pracovníci jsou povinni zabezpečit okolí poruchy a upozornit na případné nebezpečí všechny dotčené osoby (pracovníky okolních pracovišť, kolemjdoucí apod.)
5. Po příjezdu poruchové služby se všichni řídí pokyny pracovníků poruchové služby.
6. Zaměstnanec, který ohlašuje událost sám prostřednictvím mobilního telefonu, je povinen vyrozumět o přivolání stavbyvedoucího který zajišťuje zabezpečení pracoviště do příjezdu záchranných složek.

Všechny mimořádné případy se budou řešit v součinnosti se stavbyvedoucím a vedením realizace stavby.

Pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob, nebo způsobit provozní nehodu, havárii technického zařízení, případně při příznaku takového nebezpečí, je povinen, pokud toto nebezpečí nemůže odvrátit sám, přerušit práci a oznámit to ihned odpovědnému pracovníkovi stavby (stavbyvedoucí) a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy. Obdobně postupuje každý pracovník při vzniku skoronehody nebo podezření, že je na pracovišti osoba pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných a návykových látek.

Stanovený signál upozorňující na bezprostřední ohrožení života (případně zastavení prací a opuštění pracoviště), zdraví nebo majetku na tomto staveništi nebo v jeho bezprostřední blízkosti je **3x dlouze zatroubit a to celkem 3x s prodlevou, případně jiným hlasitým akustickým signálem a voláním „POZOR!“ nebo „Opuštěte stavbu!“**.

Při vzniku jakékoli mimořádné události, bude neprodleně informován stavbyvedoucí případně pověřený vedoucí prací. Odpovědný vedoucí pracovník přítomný na místě, vyhodnotí a bez prodlení organizuje a realizuje nutná opatření (informuje další dotčené osoby, přivolá pomoc nebo policii) - v závislosti na situaci organizuje evakuaci, určuje trasy a místa včetně shromažďovacích prostor. Následně provede záznam ve stavebním deníku zhotovitele stavby.

Určení shromaždiště: V případě vzniku mimořádných událostí (požár, zřícení stěn, výbuch, atd.) se bezodkladně přesunou všechny osoby vyskytující se na staveništi na shromaždiště evakuovaných osob, které je stanoveno na chodníku před zařízením staveniště, kde se evakuované osoby budou zdržovat v blízkosti svých vedoucích pracovníků, kteří předají informace o stavu a počtu osob stavbyvedoucímu nebo jeho určenému zástupci

Postupy při porušení plynovodu, el. vedení, vodovodu:

1. Pracovník, který zpozoruje nežádoucí událost (porucha plynu, vodovodního potrubí, rozvodů el. energie apod.) je povinen neprodleně přivolat poruchovou službu buď z vlastního telefonu, nebo z telefonu řídicích pracovníků stavby.
2. Osoba oznamující poruchu do telefonu uvede:
kdo volá - svoje jméno a příjmení
kde k poruše došlo - adresu stavby
upřesní místo a rozsah poruchy
3. Při poruše el. energie nebo plynu se pracovníci i návštěvníci v klidu vzdálí do bezpečné vzdálenosti a vyčkají příjezdu poruchové služby.
4. Pracovníci jsou povinni zabezpečit okolí poruchy a upozornit na případné nebezpečí všechny dotčené osoby (pracovníky okolních pracovišť, kolemjdoucí apod.)
5. Po příjezdu poruchové služby se všichni řídí pokyny pracovníků poruchové služby.
6. Zaměstnanec, který ohlašuje událost sám prostřednictvím mobilního telefonu, je povinen vyrozumět o přivolání stavbyvedoucího který zajišťuje zabezpečení pracoviště do příjezdu záchranných složek.



HZS 150



ZZS 155



POLICIE ČR 158



IZS 112

Postupy při souběhu nebezpečných pracovních činností:

- Po dobu výstavby se nepředpokládá souběh nebezpečných pracovních činností

18. Údaje o bezpečnostních opatřeních, které se zavádějí

Hlavní zhotovitel stavby (v tomto plánu je za zhotovitele stavby považován zhotovitel stavby dle § 160 stavebního zákona) projedná s každým zhotovitelem a prokazatelně mu předá aktualizovaný a s dalšími zhotoviteli projednaný plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to před zahájením prací jimi vykonávanými.

Každý zhotovitel bude smluvně zavázán informovat zhotovitele stavby o všech okolnostech znemožňujících dodržení plánu. Zhotovitel stavby bude provádět kontroly dodržování plánu a před nástupem každého zhotovitele na pracoviště zkontroluje, zda je pracoviště vybaveno v souladu s plánem, aby mohla být činnost nastupujícího zhotovitele prováděna bezpečně.

Každý zhotovitel povede vlastní evidenci přítomnosti všech zaměstnanců a dalších fyzických osob, včetně vymezení jejich právního postavení (např. zaměstnanec, OSVČ) na části staveniště, která mu byla předána a tuto evidenci bude schopen poskytnout kdykoliv svému objednateli, stavbyvedoucímu a koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Přitom je nutné vzít v úvahu, že OSVČ, která nikoho nezaměstnává, nemá rozsah povinností stanovených zákonem v rozsahu zaměstnavatelů, nemá vlastní pracoviště, ale je na pracovišti zhotovitele – zaměstnavatele, na jehož pracovišti se pohybuje. Záznamy budou zhotoviteli a koordinátorem prováděny také do knihy BOZ, která bude vedena na staveništi po celou dobu provádění prací.

Všichni pracovníci na staveništi budou používat výstražné vesty, a to po celou dobu provádění prací na plochách, kde bude zároveň probíhat pohyb mechanizace.

Koordinátor ve fázi realizace stavby bude organizovat na staveništi společné kontrolní dny BOZP. Řádné kontrolní dny o bezpečnosti se budou pořádat nejméně jednou za kalendářní měsíc. Kontrolní dny BOZP budou zaměřené do budoucna a bude se na nich jednat o bezpečnostních opatřeních, která se v nastávajícím období budou muset realizovat, zejména ve společných prostorech stavby

Koordinátor se stará o to, aby základem všech jednání na kontrolních dnech BOZP bude Plán BOZP – budou zde projednávány jeho aktualizace atd..

Účast: Hlavní zhotovitel stavby a ostatní jeho na stavbě zúčastnění zhotovitelé či jejich odpovědní zástupci (zaměstnavatelé, a to včetně PFO).

Koordinace BOZP mimo kontrolní dny BOZP

Koordinace v době mezi kontrolními dny BOZP o bezpečnosti probíhá prostřednictvím koordinátora osobního kontaktu se stavebními zhotoviteli. Pokud koordinátor nebo stavebník v období mezi dvěma kontrolními dny BOZP zaznamená okolnosti, které jsou důležité pro společnou bezpečnost a je třeba je rychle řešit, kontaktuje koordinátor stavebního zhotovitele, jež je za dotyčné opatření zodpovědný, a tento stavební zhotovitel se musí postarat o nápravu těchto poměrů.

Za umístění hlavního vypínače elektrického zařízení tak, aby byl snadno přístupný, jeho označení a zabezpečení proti neoprávněné manipulaci a za provedení prokazatelného seznámení všech fyzických osob zdržujících se na staveništi s jeho umístěním a za provádění pravidelných prokazatelných kontrol prozatímního elektrického zařízení staveniště osobou s vyšší elektrotechnickou kvalifikací odpovídá hlavní zhotovitel; zápisy budou prováděny do Knihy BOZP stavby nebo jiným prokazatelným způsobem (do záznamové části Plánu BOZP stavby).

Za pořádek a úklid na staveništi, včetně staveništních komunikací, odvozu odpadu a kontrolu vymezení staveniště (oplocení staveniště a vstupů na staveniště, včetně označení bezpečnostními tabulkami a dopravními značkami a dále včetně řádného uzavření staveniště po skončení pracovní doby) odpovídá hlavní zhotovitel.

Za vypnutí, odpojení a zabezpečení el. zařízení proti neoprávněné manipulaci po skončení pracovní doby v rámci staveniště, včetně zařízení staveniště, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta odpovídá hlavní zhotovitel.

19. Plán – popis kontrol v průběhu výstavby

Kontroly BOZP a PO na stavbě budou prováděny průběžně pověřenými pracovníky hlavního zhotovitele stavby, prokazatelným způsobem nejméně 1x za kalendářní měsíc. Tyto záznamy budou na vyžádání předloženy koordinátorovi BOZP.

Dále bude prováděna nejméně 1x za 14 dnů kontrolní činnost koordinátorem BOZP stavby. Hlavní zhotovitel před započítím prací předloží koordinátorovi dokumentaci pro dopracování plánu BOZP stavby.

20. Seznam požadované základní dokumentace BOZP a PO – podklady pro dopracování Plánu BOZP:

- pro práce, které jsou předmětem uzavřeného smluvního vztahu předložit dokumentaci o vyhodnocení rizik a přijmutí opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno (§ 102 ZP).
- dokumentaci (záznamy) o informování svých zaměstnanců o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů – subdodavatelů (§ 101 ZP)
- záznamy o zajištění a určení potřebného počtu vyškolených a vybavených zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky a organizují evakuaci pracovníků (§ 102 odst. 6 ZP)
- dokumentaci (záznamy) o zabezpečení plnění povinnosti, aby zaměstnanci jiného zaměstnavatele – subdodavatele vykonávající práce na jeho pracovišti obdrželi před jejich zahájením vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a evakuace fyzických osob v případě mimořádných událostí (§ 103 odst. 1 písm g) ZP)
- dokumentaci o potřebné schopnosti – kvalifikaci a zdravotní způsobilosti zaměstnanců pro výkon jejich práce na pracovišti na stavebním projektu (včetně subdodavatelů), a to včetně provedení proškolení z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve smyslu § 349 ZP týkajících se prováděných prací na stavebním projektu a o provedení vstupního školení k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců na pracovišti - možno nahradit čestným prohlášením (*v případě zjištění nedostatku budou vyžadovány již konkrétní dokumenty*)
- dokumentaci pro vedení evidence úrazů (§ 105 ZP)
- čestné prohlášení o používání potřebných osobních ochranných pracovních prostředků a o dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v příloze č. 2 NV č. 591/2006 Sb.; *v případě zjištění konkrétního rozporu v rámci kontrolní činnosti se stanovenými zvláštními právními předpisy budou požadovány k předložení konkrétní doklady*
- technologický/é (pracovní) postup/y k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při vykonávání prací v rámci realizace stavebního projektu (včetně subdodavatelů); včetně záznamů o seznámení pracovníků - tyto budou po prohlídce koordinátorem BOZP začleněny do Plánu BOZP staveniště

Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky hlavního zhotovitele nebo u pracovníka nebo pracovníky jeho ostatních zhotovitelů k použití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti (staveništi), je povinen hlavní zhotovitel dotyčného pracovníka okamžitě odvolat ze stavby. Pracovníci hlavního zhotovitele nebo jeho ostatních zhotovitelů jsou povinni podrobit se na žádost stavebníka dechové zkoušce na přítomnost alkoholických nápojů či jiné návykové látky.

21. Údržba a opravy

Zásady bezpečného provozu jsou obsáhle zpracovány v provozních předpisech provozovatele, který je vázán povinnostmi dle Drážního zákona. Dále jsou zásady upraveny platnými právními předpisy.

Při provádění těchto prací bude dle rozsahu stavby omezen provoz na trati případně komunikaci. Na opravy většího rozsahu bude vždy vypracován samostatný Plán BOZP.

Zpracoval.....
Jiří Kaiserlich ZEKA/624/KOO/2017

Příloha 1:

Provozní řád stavby

Platí pro všechny osoby, které se zdržují na stavbě, včetně návštěvníků.

Nedodržení provozního řádu může mít za následek vykázání ze stavby.

Všeobecný provozní řád stavby

1. Všichni pracovníci na stavbě musí projít vstupním a periodickým školením BOZP.
2. Na stavbě musí být používány odpovídající osobní **ochranné pracovní prostředky**.
3. Každá nehoda nebo situace, která může k nehodě vést, musí být hlášena neprodleně odpovědnému řídicímu pracovníkovi generálního dodavatele.
4. Každá osoba, u níž bude zjištěno, že poškozuje prostředky nebo zařízení určená k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, bude ze stavby vykázána.
5. **Kouření** je zakázáno ve všech rizikových prostorech staveniště a buňkokoviště.
6. **Platí přísný zákaz vnášení zbraní, donášení či požívání alkoholických a jiných omamných látek, pořizování snímků či jiných audio/video záznamů bez povolení vedení stavby.**
7. **Návštěvy se musí hlásit** ve staveništní kanceláři generálního dodavatele a vstup na stavbu jim bude umožněn pouze na základě svolení GD. Po dobu pobytu na stavbě jsou návštěvníci povinni nosit odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky.
8. **Řidiči vozidel** musí nosit ochranné přilby a reflexní vesty pokaždé, když to vyžaduje situace.
9. Řidiči vozidel v prostoru staveniště couvají jen za pomoci dalšího kvalifikovaného pracovníka.
10. Dodržuje se bezpečnostní značení a vyhlášky, při pohybu v areálu stavby respektovat dopravní cesty, vchody a východy, nevstupovat na místa se zakázaným vstupem.
11. Všichni pracovníci stavby jsou povinni, v zájmu bezpečnosti své a bezpečnosti ostatních, dodržovat **technologické postupy** zpracované jejich zaměstnavatelem.
12. Přenosné hasící přístroje a požární řády chrání lidské životy. Nepoškozujte je.

Pravidla osobní bezpečnosti

1. Všichni pracovníci jsou povinni nosit **ochranné přilby a pracovní obuv**.
2. **Požívání alkoholu a drog je zakázáno.**
3. Nikdo nesmí obsluhovat žádné strojní zařízení nebo vybavení, pokud nebyl řádně proškolen a nemá k dispozici osvědčení o své kvalifikaci.
4. Každé strojní zařízení nebo vybavení, které je zjištěno jako vadné, musí být vyřazeno z provozu.
5. Přímou ze žebříků je možno provádět pouze krátkodobé práce a pouze tehdy, kdy není možno použít jinou alternativu přístupu. Žebříky musí být při používání vždy zajištěny proti posunutí a převrácení. Je zakázáno používat jiných žebříků než atestovaných
6. Používání improvizovaných lešení je zakázáno. Zvýšené pracovní podlahy bez zábradlí a zárážky u podlahy lze používat pouze do výšky 1500 mm. U větších výšek se používají řádně zkonstruovaná a zajištěná stabilní nebo pojízdná lešení s ochranným zábradlím a zárážkou u podlahy.
7. Potraviny je možno konzumovat pouze ve vyhrazených místech.
8. Veškerá připojení (mimo běžných zásuvkových) a úpravy na elektrických spotřebičích a elektro přípojkách může provádět pouze určená osoba s příslušnou kvalifikací
9. V prostoru staveniště se netoleruje žádné vyrušování zaměstnanců při práci, bránění či zdržování postupu stavebních prací, netolerují se žádné rvačky, kanadské žerty apod.

Ekologické minimum

1. Nenechávat volně položené nebezpečné a ostatní odpady, nemíchat nebezpečné odpady s ostatními odpady.
2. Umisťovat odpady do označených odpadových nádob
3. Snažit se minimalizovat množství vznikajících odpadů
4. Při práci s nebezpečnými chemickými látkami používat zachytých prostředků (např. zachytivé vany apod.)
5. Chemické látky nikdy nevylévat volně do kanalizace
6. Řídit se pokyny uvedenými na obalu nebezpečné chemické látky, popř. údaji z bezpečnostního listu.
7. Po použití chemických látek nenechávat tyto nádoby otevřené
8. Prázdné znečištěné obaly od nebezpečných chemických látek ukládat do nádob pro nebezpečný odpad, při úniku chemických látek ihned použít absorpčních prostředků (např. VAPEX, sorpční prostředky apod.)
9. Při práci s nebezpečnými chemickými látkami používat vždy předepsané OOPP

Příloha 2:


ZEKA plus, s.r.o.

ZEKA plus, s.r.o., Jasmínová 876, 763 21 Slavičín, držitel akreditace pro provádění zkoušek fyzických osob z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle ustanovení § 20 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí č. j.: 2013/33688 - 423/2 ze dne 18.10.2013

VYDÁVÁ

OSVĚDČENÍ

**o získání odborné způsobilosti k činnosti
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi**

Evidenční číslo: **ZEKA/624/KOO/2017**

Titul, jméno a příjmení: **Jiří KAISERLICH**

Datum a místo narození: **23.3.1970, Brno**

Držitel osvědčení úspěšně vykonal/a dne 9.6.2017 periodickou zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi před odbornou zkušební komisí jmenovanou držitelem akreditace ZEKA plus, s.r.o., Jasmínová 876, 763 21 Slavičín. Toto osvědčení je dokladem o úspěšném vykonání periodické zkoušky z této odborné způsobilosti podle ustanovení §10 odst. 2 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a podle ustanovení § 8 odst. 1 a odst. 2 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Osvědčení o úspěšném vykonání periodické zkoušky má podle ustanovení § 10 odst. 3 zákona platnost 5 let ode dne jejího vykonání.

Zkouška z odborné způsobilosti se skládá opakovaně každých 5 let.

Platnost tohoto osvědčení je do: 9.6.2022
Ve Slavičíně dne: 9.6.2017



předseda odborné zkušební komise



držitel akreditace, statutární orgán



OSVĚDČENÍ O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

| | |
|--|---|
| Evidenční číslo: | 1903 / 2020 - CPS |
| Titul, jméno, příjmení: | Jiří Kaiserlich |
| Datum narození: | 23. 3. 1970 |
| Vykonal dne: | 25. 11. 2020 |
| ZKOUŠKU | <input checked="" type="checkbox"/> odbornou (zkoušky odborné) <input type="checkbox"/> nastavbovou (zkoušky nastavbové) <input type="checkbox"/> praktické způsobilosti <input type="checkbox"/> zvláštní odborné způsobilosti |
| | Č : KMB - 10/1 |
| S výsledkem: | PROSPĚL |
| Platnost zkoušky/přezkoušení *): | 24. 11. 2025 |
| Za SŽDC ředitel:  Ing. Bohuslav Stečinský, MSc.  (titul, jméno, příjmení) podpis) Dílžďena 1003/7 110 00 Praha 1 IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 [176] | Předseda komise nebo zkoušející:  Ing. Radovan Jiskra  (titul, jméno, příjmení) podpis) Dílžďena 1003/7 110 00 Praha 1 IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 [176] |
| Poznámka: | ---- |

*) Za předpokladu splnění podmínek předpisu SŽDC Zam1

**) Titul, jméno, příjmení vypsát hůlkovým písmem

Příloha 3:**Seznámení odpovědných pracovníků dodavatelů stavebních prací s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci**

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, že jsem tomuto plánu BOZP porozuměl, a že se skutečnostmi uvedenými v plánu BOZP seznámím ostatní spolupracovníky a své podřízené, kteří působí na této stavbě.

| Poř. číslo | Název dodavatelské organizace | Příjmení a jméno seznámeného | Datum seznámení | Podpis seznámeného |
|------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | | | | |
| 14. | | | | |
| 15. | | | | |
| 16. | | | | |
| 17. | | | | |
| 18. | | | | |
| 19. | | | | |
| 20. | | | | |
