


PROPUSTKY V KM 75,295 A 75,707 - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ V ŽST MILOTICE N. OPAVOU												
Propustek v km 75,295												
období	září 2024				říjen 2024				listopad 2024			
Výluka - nickolejný provoz - 70 dní (21.9. - 29.11..2024)												
SP0 - Přípravné práce - 10 dní												
-Zajištění zázemí stavby	1	1										
-Předzásobení stavby materiálem	1	1										
-Vytyčení inženýrských sítí	1	1										
-provedení případných přeložek	1	1										
-provedení ochrany stávajících kabelů	1	1										
-osazení provizorního dopravního značení	1	1										
SP1 - práce během výluky - 70 dní												
-odstranění žel. Svršku		1										
-Demolice stávajících konstrukcí		1	1									
-Výkopové práce vč. urovnání základové spáry		1	1									
-bednění, armování a betonáž základů vč. podkladního betonu			1	1	1	1	1	1				
-návoz a osazení prefabrikovaných dílců						1	1					
-Provedení hydroizolace na prefabrikátech						1						
-Armování, bednění a betonáž vtokového objektu						1	1	1	1	1		
-Provedení hydroizolace na vtokovém objektu							1					
-Hutněné zásypy a obsypy konstrukce								1	1			
-Provedení odláždění na vtoku a výtoku								1				
-Položení kolejového lože + osazení žel. Svršku								1	1			
Celkem dní propustek v km 75,295												25 dní
Propustek v km 75,707												
SP1 - práce během výluky - 70 dní												
-odstranění žel. Svršku						1						
-Demolice stávajících konstrukcí						1	1					
-Výkopové práce vč. urovnání základové spáry						1	1					
-bednění, armování a betonáž základů vč. podkladního betonu						1	1	1	1	1	1	1
-návoz a osazení prefabrikovaných dílců									1	1		
-Provedení hydroizolace na prefabrikátech									1			
-Armování, bednění a betonáž vtokového objektu									1	1	1	1
-Provedení hydroizolace na vtokovém objektu										1		
-Hutněné zásypy a obsypy konstrukce										1	1	
-Provedení odláždění na vtoku a výtoku											1	
-Položení kolejového lože + osazení žel. Svršku											1	1
Celkem dní propustek v km 75,707												23 dní
Celkem dní pro oba propustky												48 dní

Zrušení zařízení staveniště v Miloticích n.  
Opavou + Prostor pro následující stavby,  
které budou prováděny v rámci výluky.  
Celkem 24 dní



PROPUSTKY V KM 76,522 A 77,317 - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ U MOSTU V KM 77,596												
Propustek v km 76,522												
období	září 2024				říjen 2024				listopad 2024			
Výluka - nickolejný provoz - 70 dní (21.9. - 29.11..2024)												
SP0 - Přípravné práce - 10 dní												
-Zajištění zázemí stavby	1	1										
-Předzásobení stavby materiálem	1	1										
-Vytyčení inženýrských sítí	1	1										
-provedení případných přeložek	1	1										
-provedení ochrany stávajících kabelů	1	1										
-osazení provizorního dopravního značení	1	1										
SP1 - práce během výluky - 70 dní												
-odstranění žel. Svršku		1										
-Demolice stávajících konstrukcí		1	1									
-Výkopové práce vč. urovnání základové spáry		1	1									
-bednění, armování a betonáž základů vč. podkladního betonu			1	1	1	1	1	1				
-návoz a osazení prefabrikovaných dílců						1	1					
-Provedení hydroizolace na prefabrikátech						1						
-Armování, bednění a betonáž vtokového objektu						1	1	1	1	1		
-Provedení hydroizolace na vtokovém objektu								1				
-Hutné zasypy a obsypy konstrukce									1	1		
-Provedení odláždění na vtoku a výtoku									1			
-Položení kolejového lože + osazení žel. Svršku									1	1		
Celkem dní propustek v km 76,522												25 dní
Propustek v km 77,317												
SP1 - práce během výluky - 70 dní												
-odstranění žel. Svršku								1				
-Demolice stávajících konstrukcí								1	1			
-Výkopové práce vč. urovnání základové spáry								1	1			
-úprava dna propustku,bednění a betonáž prostoru mezi opěrami									1	1	1	
-Hutné zasypy a obsypy konstrukce + terénní úpravy okolí											1	1
-Položení kolejového lože + osazení žel. Svršku											1	1
Celkem dní propustek v km 75,707												10 dní
Celkem dní pro oba propustky												35 dní

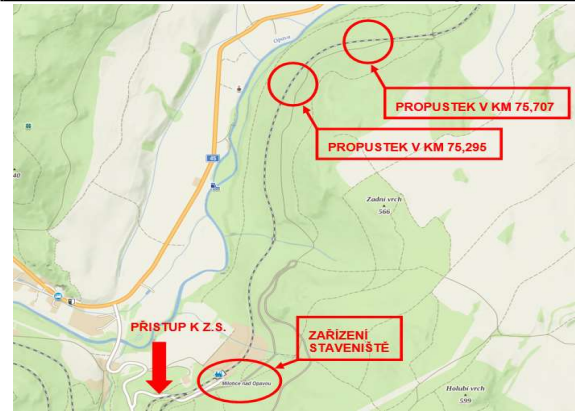
