

Podpis: _____ Datum: _____




 **AFRY**

Prostor pro další informace

Rekonstrukce výpravní budovy v žst Klatovy

ID	Text1	Název úkolu	Doba trvání																													
1		Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Klatovy	587 dny																													
2	Fáze 0	Zařízení staveniště a přeložky sítí	20 dny																													
3		Provizorní WC a pokladny pro cestující	1 týden																													
4		Zařízení staveniště	3 týdny																													
5	SO 74-31-01	ŽST Klatovy, Venkovní dešťová, splašková kanalizace; retence; podchod	4 týdny																													
6	SO 74-31-02	ŽST Klatovy, nová přípojka vodovodu	3 týdny																													
7	Fáze 1	ŽST Klatovy, rekonstrukce výpravní budovy	282 dny																													
8		Vyklizení prostor pro Fázi 1	0 dny																													
9	SO 74-71-01	ŽST Klatovy, rekonstrukce výpravní budovy	248 dny																													
10		SKR - Stavebně konstrukční řešení	46 týdnů																													
11		100 - ZTI - Zdravotně technické intalace	9 týdnů																													
12		200 - PLYN - Domovní rozvod plynu	8 týdnů																													
13		300 - VYT - Vytápění	8 dny																													
14		400 - VZT + CHL - Vzduchotechnika, chlazení	9 týdnů																													
15		500 - ESI - Silnoproudá zařízení - hromosvod	7 týdnů																													
16		600 - SLB - Slaboproudá zařízení	6 týdnů																													
17		700 - MaR - Měření a regulace	4 týdny																													
18		800 - Gastroprovoz	4 týdny																													
19		Kolaudace a přejímka	4 týdny																													
20		Uvedení do provozu	0 týdnů																													
21	Fáze 1a	2. ostr. Nástupiště	75 dny																													
22	SO 74-12-01	ŽST Klatovy, nástupiště	6 týdnů																													
23	SO 74-20-01	ŽST Klatovy, vestavba výtahů	8 týdnů																													
24	SO 74-74-01	ŽST Klatovy, rekonstrukce zastřešení 2.nástupiště, řešení ostrovních nástupišť v rámci vestavby výtahů	6 týdnů																													
25	SO 74-77-01	ŽST Klatovy, orientační systém	2 týdnů																													
26	SO 74-86-02	ŽST Klatovy, osvětlení nástupišť	4 týdny																													
27	PS 74-02-21	ŽST Klatovy, rozhlasové zařízení	4 týdny																													
28	PS 74-02-71	ŽST Klatovy, informační systém	4 týdny																													
29																																
30	PS 74-04-11	ŽST Klatovy, výtahy na nástupiště	4 týdny																													
31		Kolaudace a přejímka	4 týdny																													
32		Uvedení do provozu	0 týdnů																													
33		Omezení provozu na koleji č. 1 a 3	14 týdnů																													
34	Fáze 1b	3. ostr. Nástupiště	75 dny																													
35	SO 74-12-01	ŽST Klatovy, nástupiště	8 týdnů																													
	SO 74-20-01	ŽST Klatovy, vestavba výtahů	6 týdnů																													
36	SO 74-74-01	ŽST Klatovy, rekonstrukce zastřešení 3.nástupiště, řešení ostrovních nástupišť v																														


Rekonstrukce výpravní budovy v žst KLATOVY

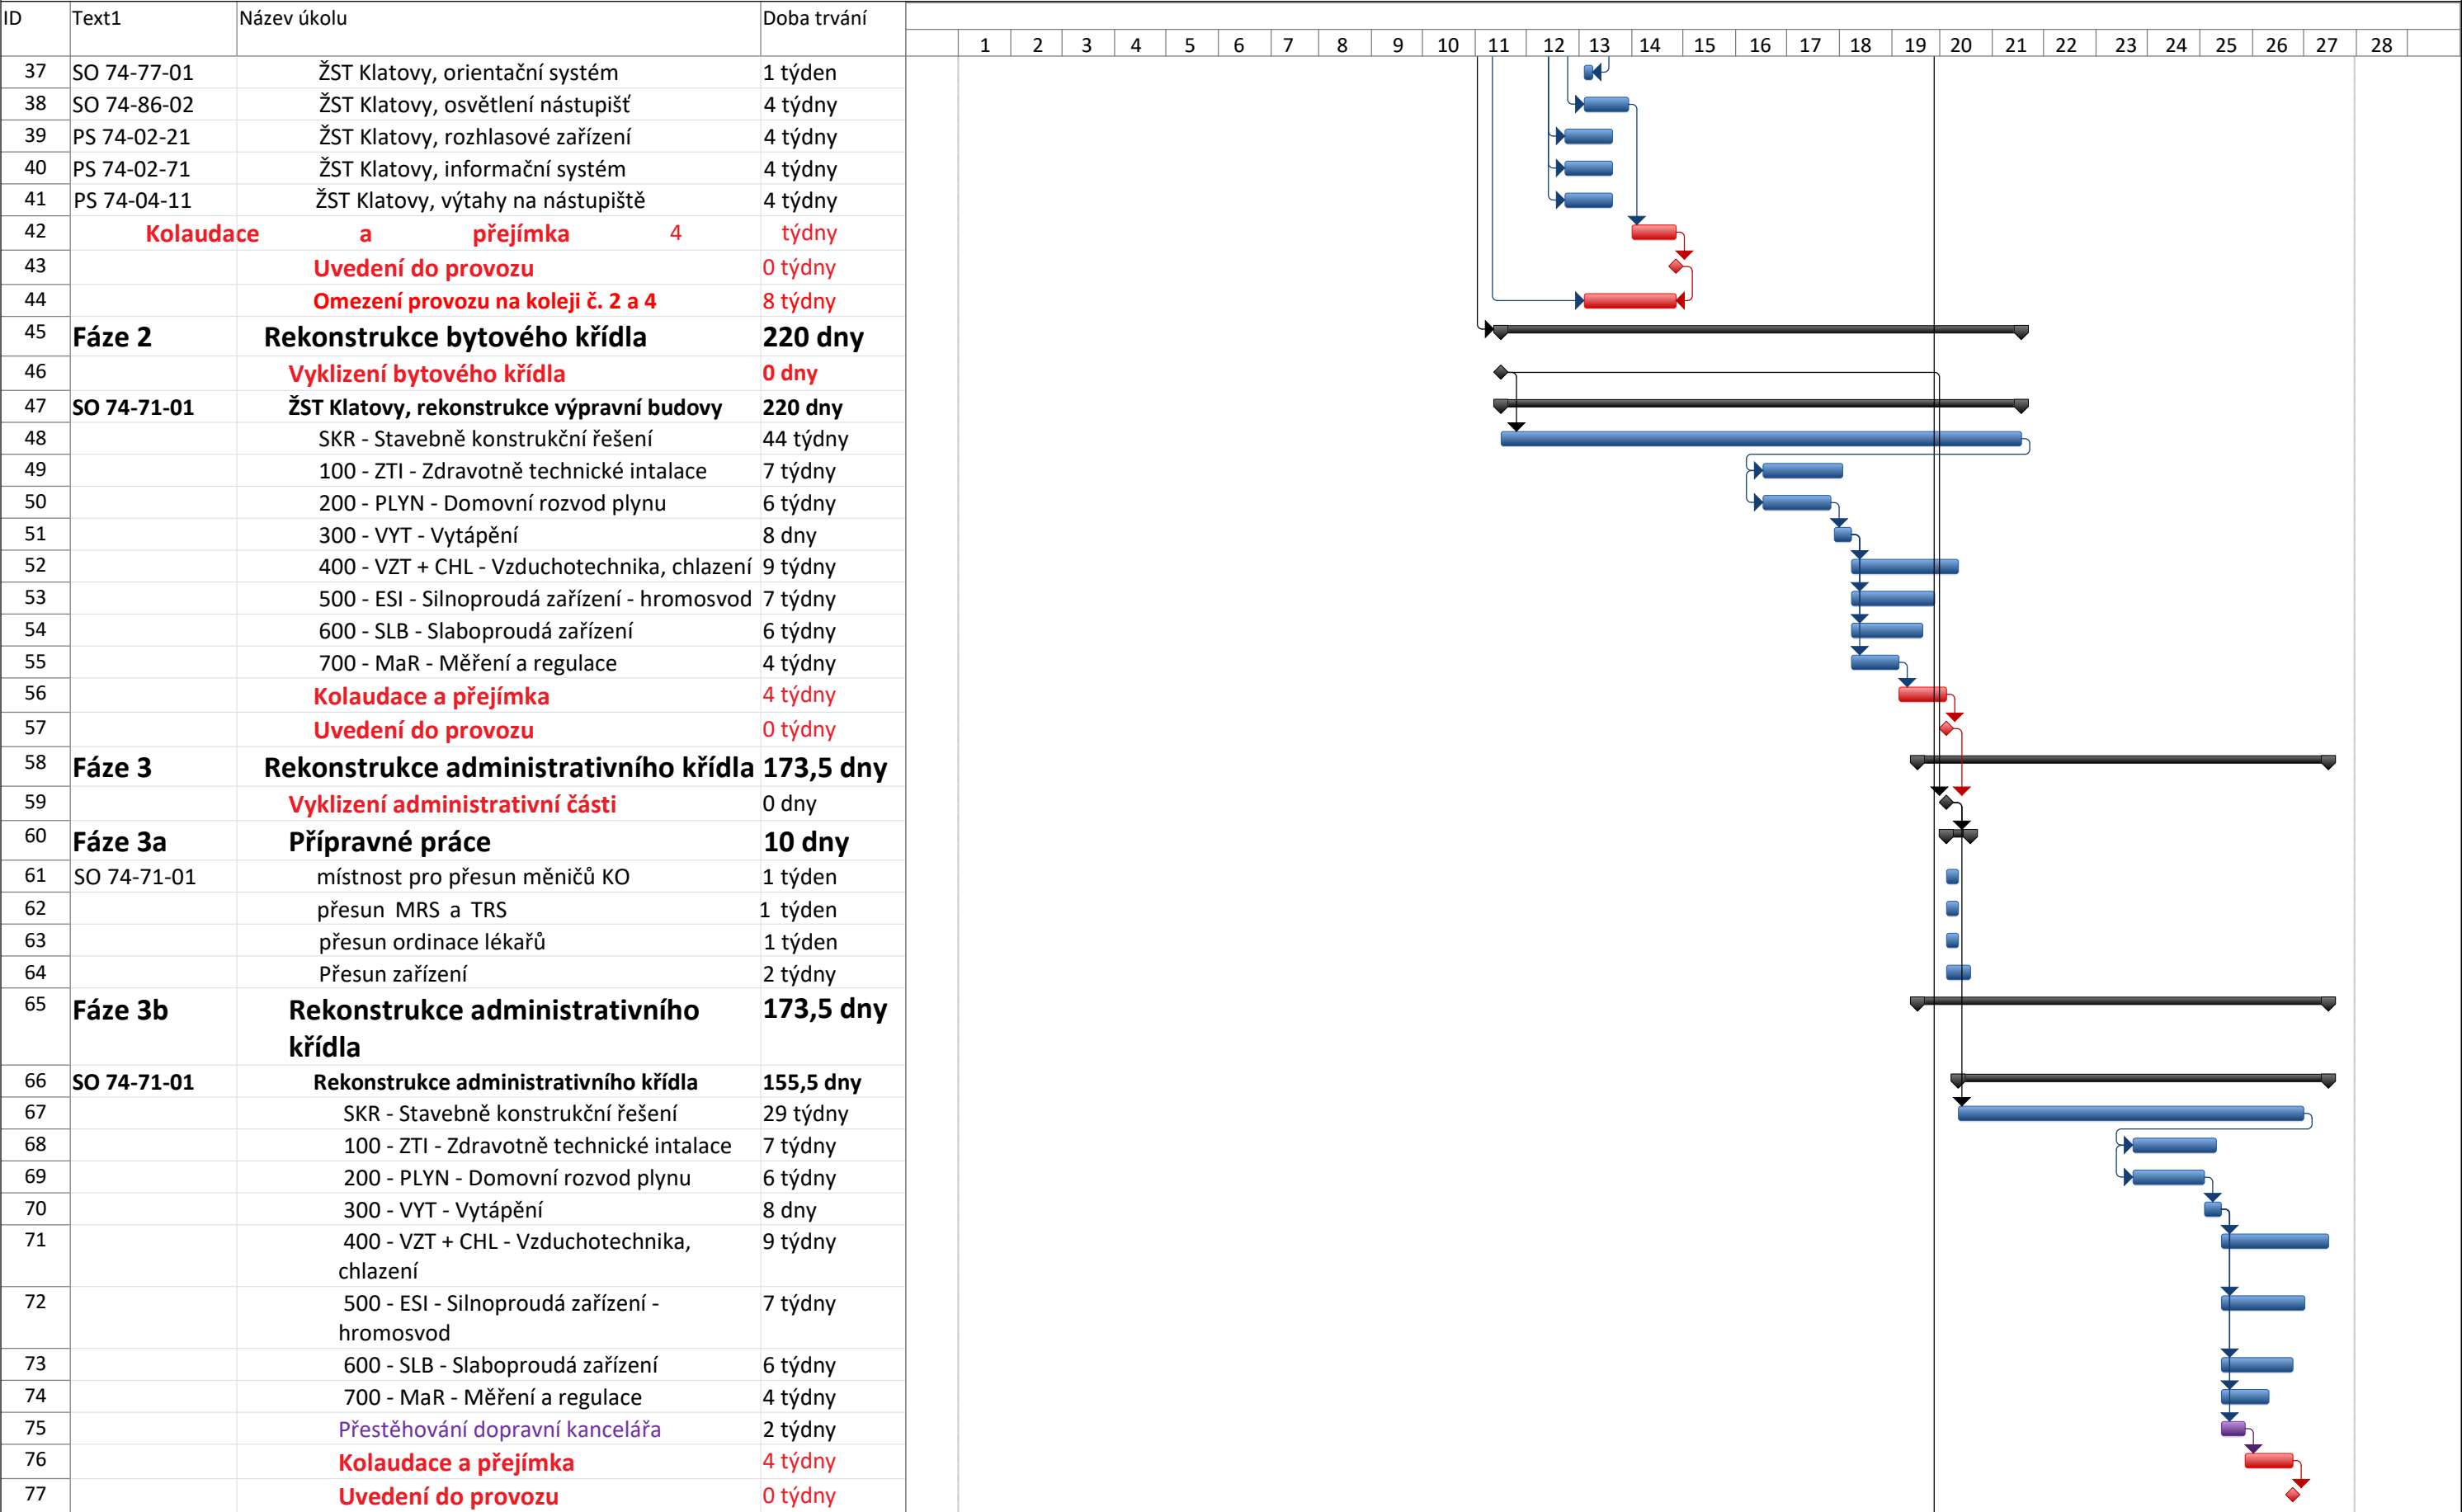

Rekonstrukce výpravní budovy v žst KLATOVY

ID	Text1	Název úkolu	Doba trvání																													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
78	Fáze 3b	Rekonstrukce 1. nástupiště směr Plzeň	102,5 dny																													
79	SO 74-12-01	ŽST Klatovy, nástupiště	14 týdny																													
80	SO 74-74-01	ŽST Klatovy, rekonstrukce zastřešení 1.nástupiště, řešení ostrovních nástupišť v rámci vestavby výtahů	9 týdny																													
81	SO 74-77-01	ŽST Klatovy, orientační systém	2 týdny																													
82	SO 74-86-02	ŽST Klatovy, osvětlení nástupišť	5 týdny																													
83	PS 74-02-21	ŽST Klatovy, rozhlasové zařízení	5 týdny																													
84	PS 74-02-71	ŽST Klatovy, informační systém	4 týdny																													
85	PS 74-02-81	ŽST Klatovy, přemístění STA, TRS a MRS	5 týdny																													
86		Kolaudace a převímka	4 týdny																													
87		Uvedení do provozu	0 týdny																													
88		Omezení provozu na koleji č. 5 směr Plzeň	20 týdny																													
89	Fáze 4	Rekonstrukce 1. nástupiště směr Železná Ruda	60 dny																													
90		Rekonstrukce nástupiště při severní fasádě VB	60 dny																													
91	SO 74-12-01	ŽST Klatovy, nástupiště	7 týdny																													
92	SO 74-74-01	ŽST Klatovy, rekonstrukce zastřešení 1.nástupiště, řešení ostrovních nástupišť v rámci vestavby výtahů	5 týdny																													
93	SO 74-77-01	ŽST Klatovy, orientační systém	1 týden																													
94	SO 74-86-02	ŽST Klatovy, osvětlení nástupišť	2 týdny																													
95	PS 74-02-21	ŽST Klatovy, rozhlasové zařízení	2 týdny																													
96	PS 74-02-71	ŽST Klatovy, informační systém	2 týdny																													
97	PS 74-02-81	ŽST Klatovy, přemístění STA, TRS a MRS	2 týdny																													
98		Kolaudace a převímka	4 týdny																													
99		Uvedení do provozu	0 týdny																													
100		Omezení provozu na koleji č. 5 směr Plzeň	8 týdny																													
101	Fáze 5	Odstranění stávajících a položení nových sítí v manipulačním dvoře	20 dny																													
102	SO 74-12-01	ŽST Klatovy, nástupiště	4 týdny																													
103	SO 74-31-02	ŽST Klatovy, nová přípojka vodovodu	3 týdny																													
104	Fáze 6	Finální povrchy	60 dny																													
105	SO 74-86-01	ŽST Klatovy, rozvody NN, VO - cykloďum, manipulační dvůr (vjezdová závora, dobíjení elektromobilů)	4 týdny																													
106	SO 74-96-01	ŽST Klatovy, náhradní výsadba	4 týdny																													
107	SO 74-50-01	ŽST Klatovy, manipulační dvůr vč. příjezdové komunikace, přednádraží	6 týdny																													
108	SO 74-59-01	ŽST Klatovy, dopravně inženýrská opatření	2 týdny																													
109	SO 74-79-01	ŽST Klatovy - mobiliář	2 týdny																													
110	Fáze Cykloc	Cykloďum	70 dny																													

Rekonstrukce výpravní budovy v žst KLATOVY

ID	Text1	Název úkolu	Doba trvání																												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
111	SO 74-73-01	ŽST Klatovy, cykloďům	40 dny																												
112		SKR - Stavebně konstrukční řešení	8 týdny																												
113		500 - ESI - Silnoproudá zařízení	4 týdny																												
114		600 - SLB - Slaboproudá zařízení	2 týdny																												
115	SO 74-86-01	ŽST Klatovy, rozvody NN, VO - cykloďům, manip	4 týdny																												
116	SO 74-96-01	ŽST Klatovy, náhradní výsadba	4 týdny																												
117	SO 74-50-01	ŽST Klatovy, manipulační dvůr vč. příjezdové komunikace, přednádraží	4 týdny																												
118	SO 74-59-01	ŽST Klatovy, dopravně inženýrská opatření	2 týdny																												
119	SO 74-79-01	ŽST Klatovy - mobiliář	2 týdny																												
120		Kolaudace a přejímka	4 týdny																												
121		Uvedení do provozu	0 týdny																												
