



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:






Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
P003	31.03.2025	DSP + PDPS čistopis	Ing. Emil Špaček
P002	30.11.2024	DSP + PDPS k připomínkám	Ing. Emil Špaček
P001	15.05.2024	Návrh technického řešení	Ing. Emil Špaček

Stavebník/Investor:	<b>Správa železnic, státní organizace</b>	 <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel díla:	<b>SAGASTA s.r.o.</b>	 <b>SAGASTA</b>
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka	
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz	
Zhotovitel části/objektu:	<b>SAGASTA s.r.o.</b>	 <b>SAGASTA</b>
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka	
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz	
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Emil Špaček	Specialista: -

Název stavby/akce:	<b>Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo)- Sázava u Žďáru (mimo)</b>		Označení investora: S 561352001
			Zakázka: 123162
Název části:	Souhrnná technická zpráva		Označení části: <b>B.8</b>
Název objektu/dílní části:	<b>Zásady organizace výstavby</b>		Označení objektu/komplexu:
Název přílohy:	Harmonogram výstavby		Číslo přílohy (typ/pořadí): <b>5. 001</b>
Název dílní části přílohy:			
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:	Stupeň dokumentace:
Ing. Emil Špaček	Ing. Adam Rusý	- A4	<b>DSP/PDPS</b>
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Smluvní datum zpracování:
Vysočina	viz textová část	viz textová část	<b>03/2025</b>

S-kód:

Stupeň dokumentace: Část:

Objekt:


Podobjekt:

Příloha:

Revize:

5 5 6 1 3 5 2 0 0 1 - P D P S - B B X X X - X X X X X X X X X - X X - 1 - 0 0 0 P 0 0 3

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA, s.r.o.

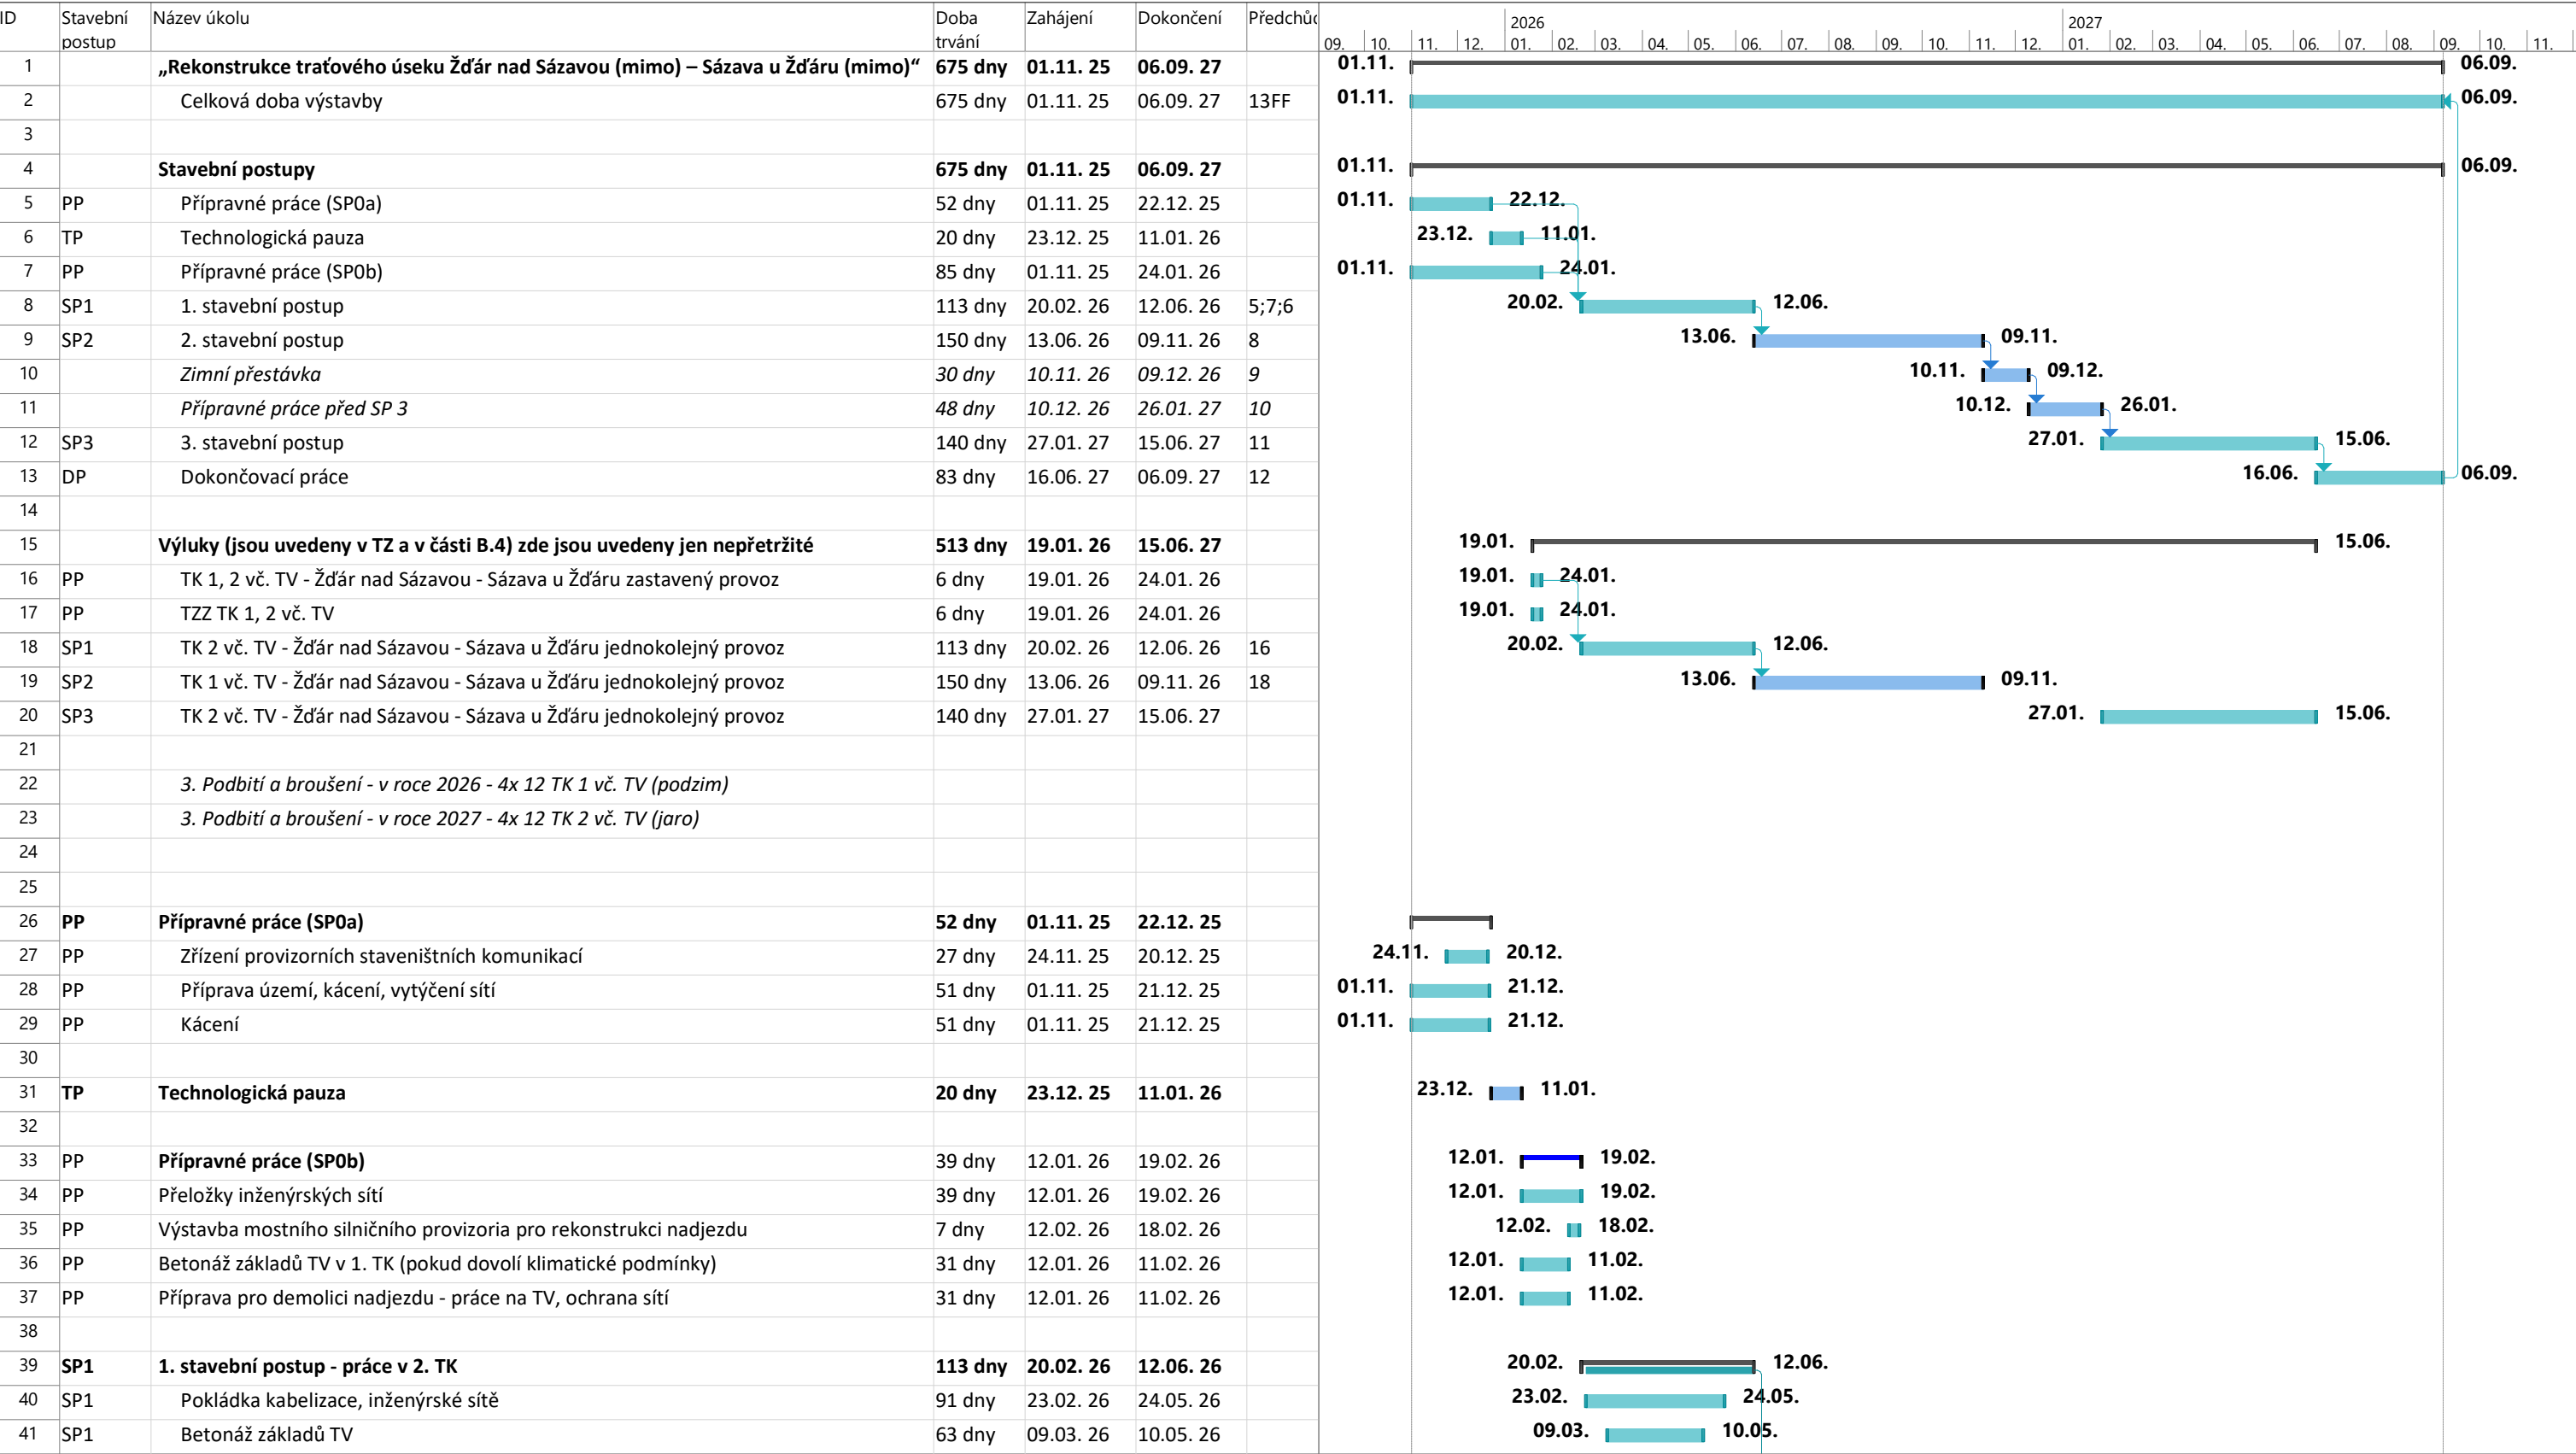

Projekt: B.8.5.1

Vypracoval: Ing. Adam Rusý

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu

ID	Stavební postup	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůzce	2026												2027											
42	SP1	Snesení kolejového roštu a odtěžení štěrkového lože strojní čističkou (v úseku přeložky	8 dny	23.02. 26	02.03. 26																									
43	SP1	Práce na železničním spodku	83 dny	03.03. 26	24.05. 26	42																								
44	SP1	Montáž železniční svršku a TV v místě přeložky	19 dny	25.05. 26	12.06. 26	43																								
45	SP1	Rekonstrukce propustku pod mostem v km 90,437 (uzavření komunikace pod mostem	110 dny	23.02. 26	12.06. 26																									
46	SP1	Rekonstrukce mostu v ev. km 89,699	90 dny	28.02. 26	28.05. 26																									
47	SP1	Rekonstrukce nadjezdu v ev. Km 88,363	110 dny	23.02. 26	12.06. 26																									
48	SP1	Sanace skalních svahů (část)	82 dny	04.03. 26	24.05. 26																									
49																														
50	SP2	2. stavební postup - práce v 1. TK vč. TV	150 dny	13.06. 26	09.11. 26	39																								
51	SP2	Pokládka kabelizace, inženýrské sítě	80 dny	13.06. 26	31.08. 26																									
52	SP2	Snesení kolejového roštu a odtěžení štěrkového lože strojní čističkou, demontáž TV	14 dny	23.06. 26	06.07. 26																									
53	SP2	Práce na železničním spodku	95 dny	07.07. 26	09.10. 26	52																								
54	SP2	Rekonstrukce mostů, propustků, zdí	105 dny	07.07. 26	19.10. 26																									
55	SP2	Sanace skalních svahů	95 dny	07.07. 26	09.10. 26																									
56	SP2	Demontáž a montáž nástupiště zast. Hamry nad Sázavou	8 dny	07.07. 26	14.07. 26																									
57	SP2	Montáž nástupiště zast. Hamry nad Sázavou	23 dny	05.10. 26	27.10. 26																									
58	SP2	Zřízení železničního svršku	28 dny	30.09. 26	27.10. 26	53																								
59	SP2	Montáž TV	20 dny	08.10. 26	27.10. 26																									
60	SP2	Aktivace nového TZZ v kol. č. 1	15 dny	26.10. 26	09.11. 26																									
61																														
62		Přípravné práce před SP 3	43 dny	10.11. 26	22.12. 26																									
63		Příprava území	43 dny	10.11. 26	22.12. 26																									
64		Přeložky inženýrských sítí	15 dny	10.11. 26	24.11. 26																									
65		Zimní přestávka	35 dny	23.12. 26	26.01. 27																									
66																														
67	SP3	3. stavební postup - práce v 2. TK vč. TV	140 dny	27.01. 27	15.06. 27																									
68	SP3	Pokládka kabelizace, inženýrské sítě	50 dny	27.01. 27	17.03. 27																									
69	SP3	Snesení kolejového roštu a odtěžení štěrkového lože strojní čističkou, demontáž TV	12 dny	27.01. 27	07.02. 27																									
70	SP3	Práce na železničním spodku	91 dny	08.02. 27	09.05. 27	69																								
71	SP3	Rekonstrukce mostů, propustků, zdí	98 dny	03.02. 27	11.05. 27																									
72	SP3	Sanace skalních svahů	90 dny	08.02. 27	08.05. 27																									
73	SP3	Demontáž a montáž nástupiště zast. Hamry nad Sázavou	8 dny	27.01. 27	03.02. 27																									
74	SP3	Montáž nástupiště zast. Hamry nad Sázavou	23 dny	08.05. 27	30.05. 27																									
75	SP3	Zřízení železničního svršku	36 dny	28.04. 27	02.06. 27																									
76	SP3	Montáž TV	30 dny	14.05. 27	12.06. 27																									
77	SP3	Aktivace nového TZZ v kol. č. 2	15 dny	01.06. 27	15.06. 27																									
78																														
79	DP	Dokončovací práce	83 dny	16.06. 27	06.09. 27																									
80	DP	Náhradní výsadba	83 dny	16.06. 27	06.09. 27																									
81	DP	Odklizení zařízení staveniště	30 dny	07.07. 27	05.08. 27																									
82	DP	Rekultivace území	30 dny	08.08. 27	06.09. 27																									

Projekt: B.8.5.1

Vypracoval: Ing. Adam Rusý

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu
