



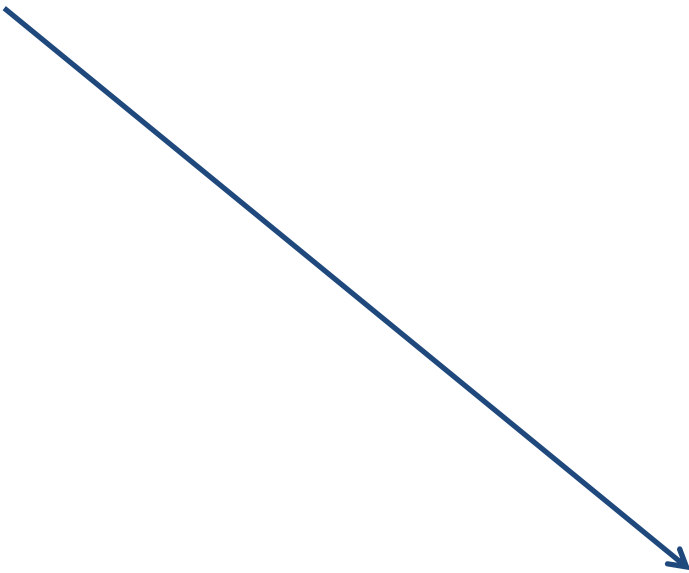

ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM STAVBY								
práce	specifikace	dny	týdny		týdny	dny		
předání převzetí staveniště	-	1	1		1	1		
mobilizace kapacit	zařízení staveniště	2				2		
vymezení stavby	piktogramy, bezpečnostní páska apod.	3				3		
odstranění vegetace	vysekání náletové zeleně (křoviny, tráva), ruční dočištění zařízení pařezů	4				4		
		5				5		
		6				6		
		7				7		
		8				2	2	8
		9						9
		10						10
		11						11
zajištění stavby	ochranný plot, zábrany, nylonové sítě apod.	12				12		
kácení stromů	odstranění 2 ks vzrostlých buků průměru do 1 m (postupné seřezávání) štěpkování větví a keřů	13				13		
		14				14		
čištění svahů odvoz materiálu	návoz materiálu a nářadí očištění líce skalních svahů odstranění nestabilních částí skalního podkladu odvoz, přemístění a uložení odtěženého materiálu vyčištění odvodňovacích příkopů srovnání terénu na pozemku investora z natěženého materiálu	15	3		3	15		
		16				16		
		17				17		
		18				18		
		19				19		
		20				20		
		21				21		
		22				4	4	22
		23						23
		24						24
		25						25
		26						26
		27						27
		28						28
vrtání (ocelové sítě) vrtání (dynamické bariéry)	vrtání otvorů vzduchovými kladivý pro instalaci kotevních svorníků ocelových sítí vrtání otvorů pro svorníky s kutým okem (pro vedení obvodových lan) vrtání kotevních svorníků dynamických bariér vrtání otvorů pro kotevní body dynamických bariér (záchytné a boční kotevní body)	29	5		5	29		
		30				30		
		31				31		
		32				32		
		33				33		
		34				34		
		35				35		
		36	6		6	36		
		37				37		
		38				38		
		39				39		
		40				40		
		41				41		
		42				42		
		43	7		7	43		
		44				44		
		45				45		
		46				46		
		47				47		
		48				48		
		49				49		
		50	8		8	50		
		51				51		
		52				52		
		53				53		
		54				54		
		55				55		
		56				56		
návoz materiálu	návoz materiálu ocelové sítě, svorníky, cement, ocelová lana, sloupky, ocelové základové desky a lana dynamických bariér	57	9		9	57		
	58	58						
provedení zálivky cementovou suspenzí	fixace svorníků a kotevních bodů ocelových sítí a dynamických bariér	59				59		
		60				60		
montáž technických opatření	montáž ochranných celoplošně kotvených ocelových sítí montáž dynamickícýh bariér - sloupky - lana - sítě	61			10	61		
		62				62		
		63				63		
		64				64		
		65				65		
		66				66		
		67				67		
		68				68		
		69				69		
		70	11		11	70		
		71				71		
		72				72		
		73				73		
		74				74		
		75				75		
		76				76		
		77	12		12	77		
		78				78		
		79				79		
		80				80		
		81				81		
		82				82		
		83				83		
84	84							
uvedení do původního stavu	odstranění nedostatků a vad, úklid stavby, odvoz strojů a materiálu, zrušení zařízení staveniště, úklid	85	13		13	85		
		86				86		
		87				87		
		88				88		
		89				89		
90	90							
předání staveniště	-	91				91		
