




ČISTOPIS 03/2019



Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel: 	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
--	--


Zhotovitel: Účastníci Společnosti "SP+SEU+PRX_Berounka-Karlštejn_PD"	  
---	--

Správce:  SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	Vedoucí týmu: ING. PAVEL KUBÁT	Asistent vedoucího týmu: ING. LUKÁŠ PÁNIK Specialista profese: ING. PETR VRÁBEL
---	--	--


Zpracovatel části: 	KOMOVIA s.r.o. Sídlo: Olšanská 1a, 130 00 Praha 3 Kancelář: Bělehradská 3, 434 01 Most tel.: +420 605 229 066 e-mail: marvan@komovia.cz
--	---





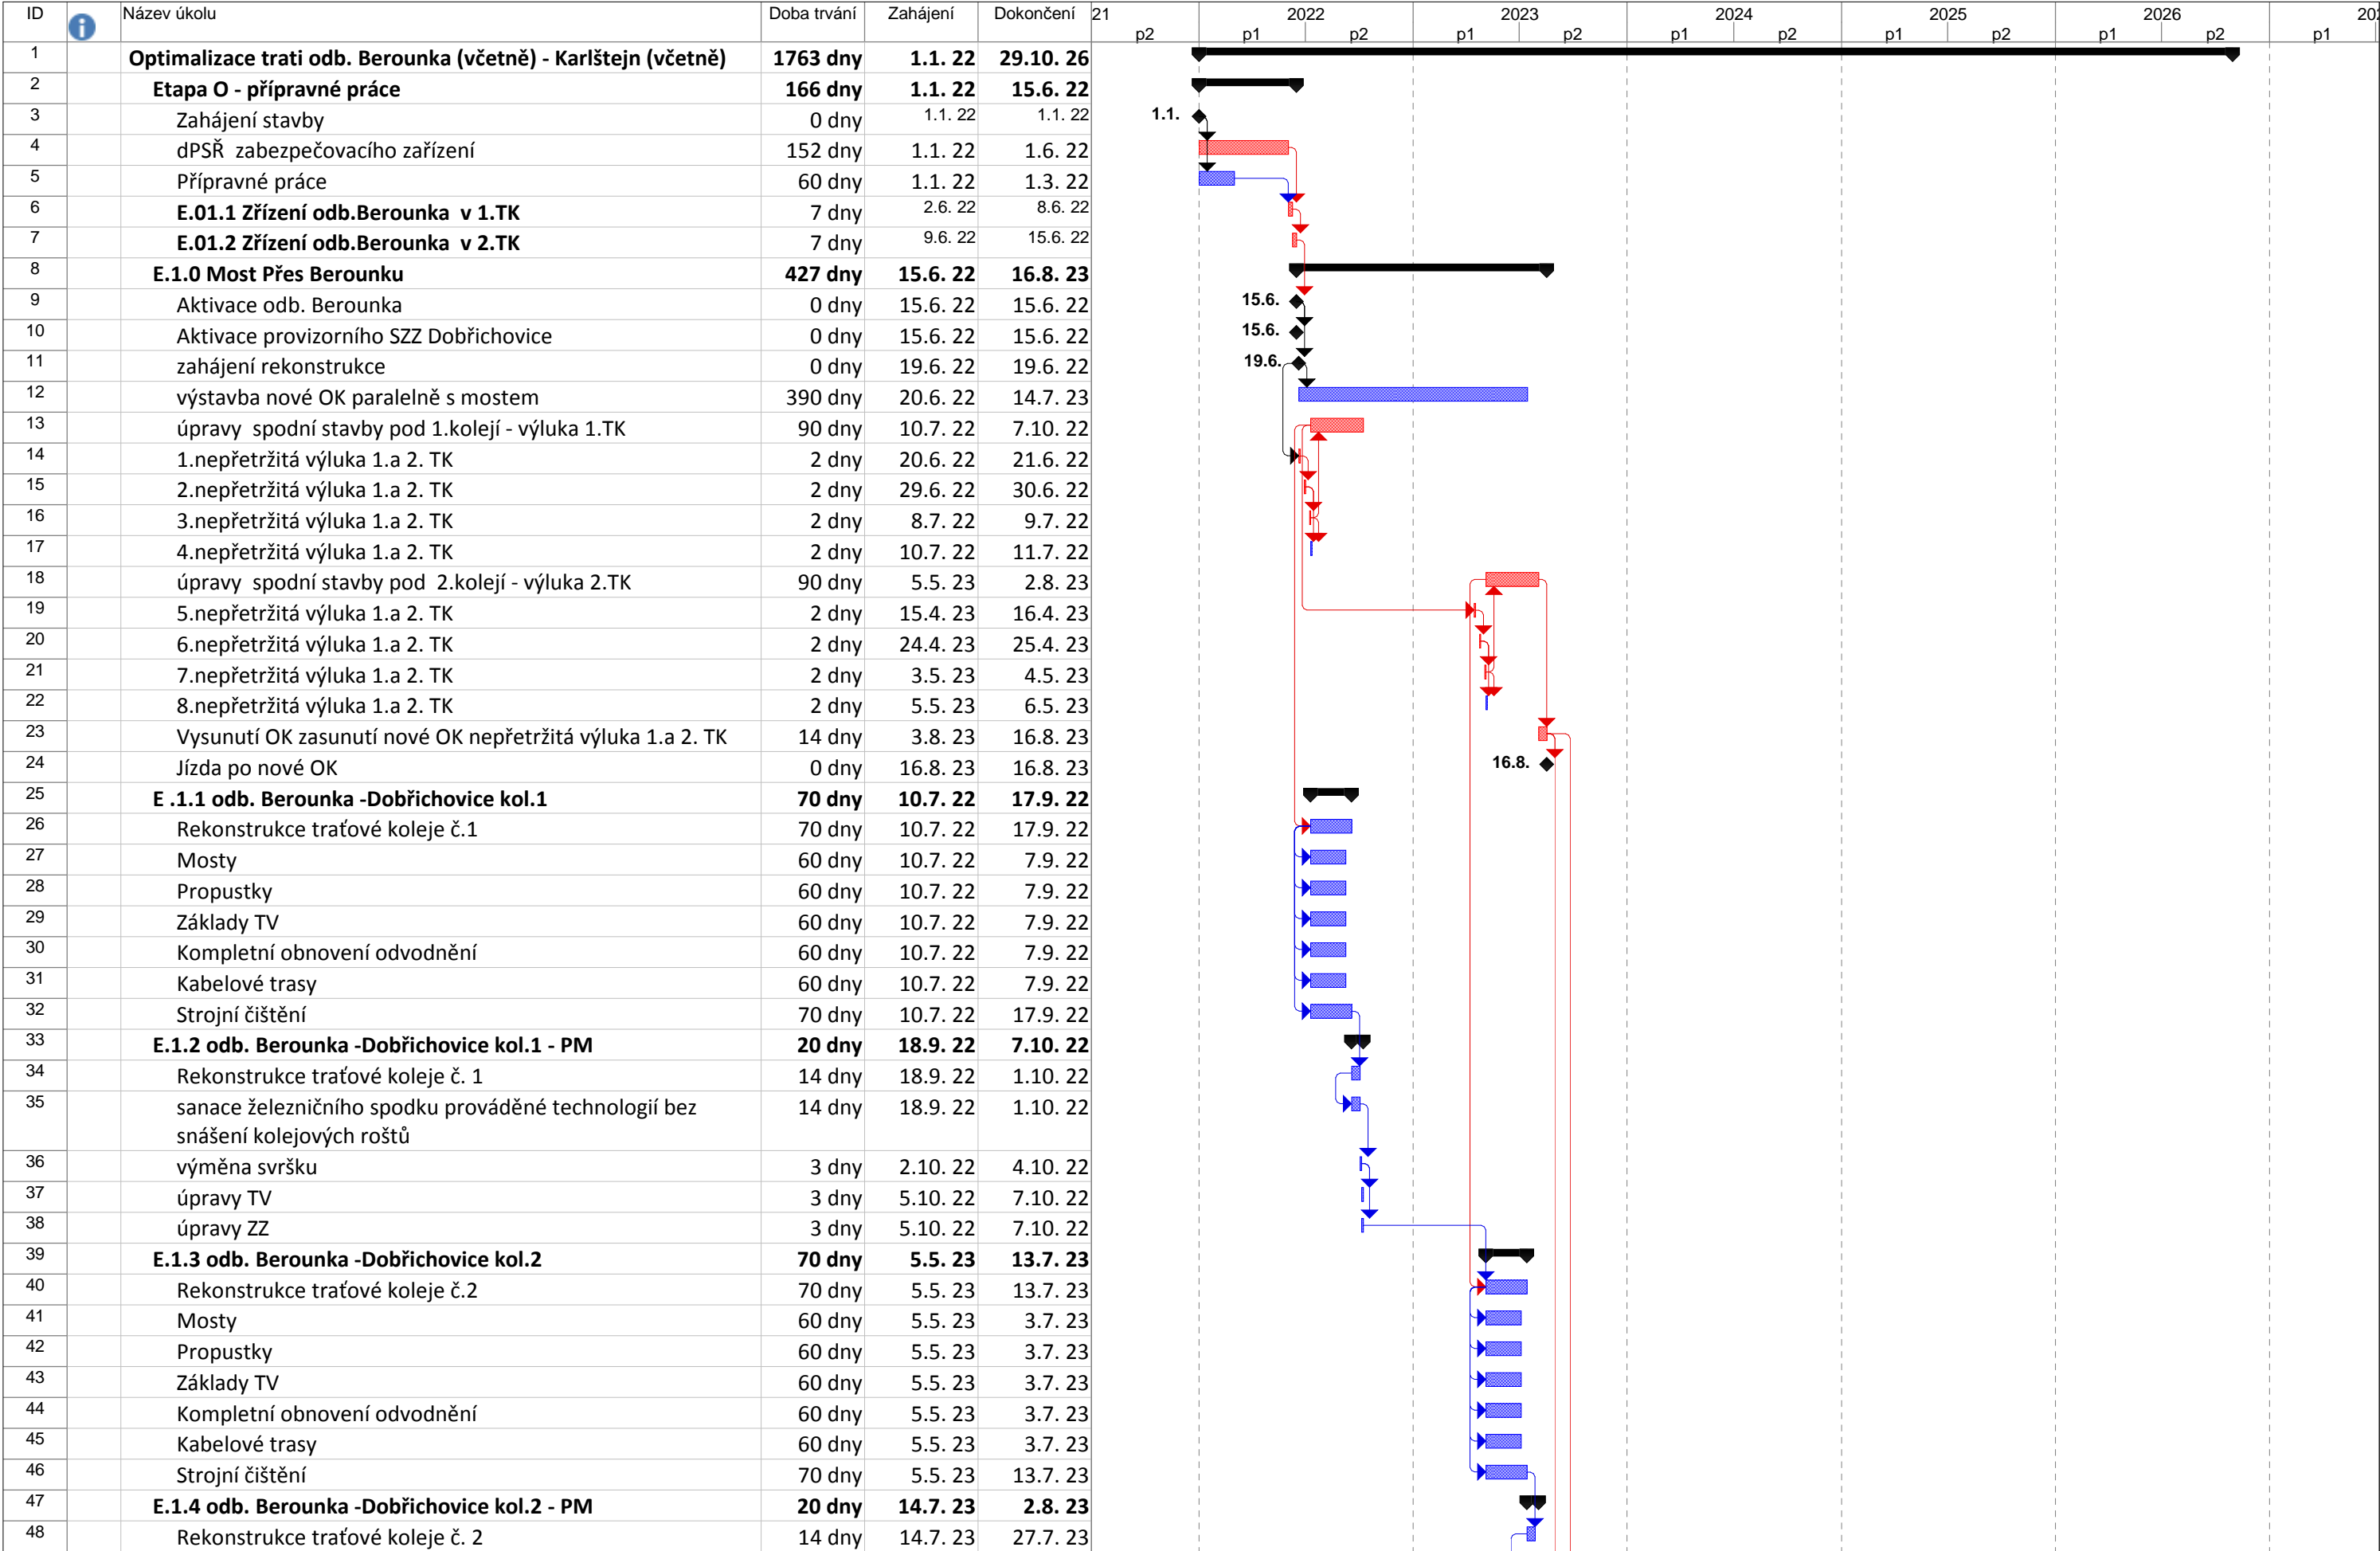



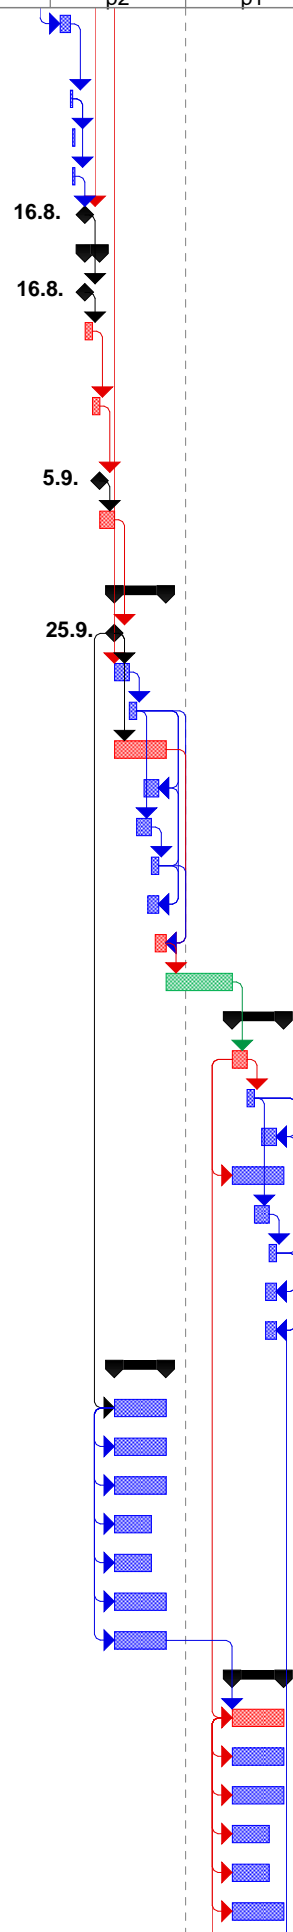





































Vedoucí střediska: ING. VÁCLAV MARVAN	Odpovědný projektant SO, IO, PS:  ING. PETR LAPÁČEK	Vypracoval:  ING. PETR LAPÁČEK	Kontroloval: ING. VÁCLAV MARVAN
---	---	---	---

Název akce: OPTIMALIZACE TRATI ODB. BEROUNKA (VČETNĚ) - KARLŠTEJN (VČETNĚ)	Číslo smlouvy: 17-316.230
	Projektový stupeň: DUR
Část: ORGANIZACE VÝSTAVBY	Datum: 4/2019
	Číslo části: B.12
Název přílohy: HARMONOGRAM VÝSTAVBY	Měřítko: -
	Počet formátů: - Číslo přílohy: 2




ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	21	2022		2023		2024		2025		2026		20
						p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	
49	sanace železničního spodku prováděné technologií bez snášení kolejových roštů	14 dny	14.7. 23	27.7. 23												
50	výměna svršku	3 dny	28.7. 23	30.7. 23												
51	definitivní TV	3 dny	31.7. 23	2.8. 23												
52	definitivní AB	3 dny	31.7. 23	2.8. 23												
53	Aktivace napájení 22 kV v TNS Karlštejn	0 dny	16.8. 23	16.8. 23												
54	E.2.ŽST. Zadní Třebáň	20 dny	16.8. 23	5.9. 23												
55	Aktivace provizorního SZZ	0 dny	16.8. 23	16.8. 23												
56	E.2.1 rekonstrukce kolejí č. 1 a 3 v nezbytném rozsahu vč. vložení výhybek do 1.T.K	10 dny	17.8. 23	26.8. 23												
57	E.2.2 rekonstrukce kolejí č.2 v nezbytném rozsahu vč. vložení výhybek do 2.T.K	10 dny	27.8. 23	5.9. 23												
58	Zprovoznění nových traťových spolek	0 dny	5.9. 23	5.9. 23												
59	E.3.0 Přípravná etapa ŽST. Karlštejn - vložení mostních provizorií	20 dny	6.9. 23	25.9. 23												
60	E.3.1 Žst.Karlštejn, lichá skupina	70 dny	25.9. 23	4.12. 23												
61	Aktivace provizorního SZZ	0 dny	25.9. 23	25.9. 23												
62	železniční spodek - pražské zhlaví + staniční koleje	20 dny	26.9. 23	15.10. 23												
63	železniční svršek- pražské zhlaví + staniční koleje	10 dny	16.10. 23	25.10. 23												
64	Podchod	70 dny	26.9. 23	4.12. 23												
65	nástupiště	20 dny	5.11. 23	24.11. 23												
66	železniční spodek - berounské zhlaví + staniční koleje	20 dny	26.10. 23	14.11. 23												
67	železniční svršek- berounské zhlaví + staniční koleje	10 dny	15.11. 23	24.11. 23												
68	úprava SZZ	15 dny	10.11. 23	24.11. 23												
69	rekonstrukce TV	15 dny	20.11. 23	4.12. 23												
70	Technologická přestávka	90 dny	5.12. 23	3.3. 24												
71	E.3.2 Žst.Karlštejn, sudá skupina	70 dny	4.3. 24	12.5. 24												
72	železniční spodek - pražské zhlaví + staniční koleje	20 dny	4.3. 24	23.3. 24												
73	železniční svršek- pražské zhlaví + staniční koleje	10 dny	24.3. 24	2.4. 24												
74	nástupiště	20 dny	13.4. 24	2.5. 24												
75	Podchod	70 dny	4.3. 24	12.5. 24												
76	železniční spodek - berounské zhlaví + staniční koleje	20 dny	3.4. 24	22.4. 24												
77	železniční svršek- berounské zhlaví + staniční koleje	10 dny	23.4. 24	2.5. 24												
78	úprava SZZ-definitvní	15 dny	18.4. 24	2.5. 24												
79	definitivní TV	15 dny	18.4. 24	2.5. 24												
80	E.4.1 Zadní Třebáň-Karlštejn kol.1	70 dny	26.9. 23	4.12. 23												
81	Rekonstrukce traťové koleje č.1	70 dny	26.9. 23	4.12. 23												
82	Mosty	70 dny	26.9. 23	4.12. 23												
83	Propustky	70 dny	26.9. 23	4.12. 23												
84	Základy TV	50 dny	26.9. 23	14.11. 23												
85	Kompletní obnovení odvodnění	50 dny	26.9. 23	14.11. 23												
86	Kabelové trasy	70 dny	26.9. 23	4.12. 23												
87	Strojní čištění	70 dny	26.9. 23	4.12. 23												
88	E.4.2 Zadní Třebáň-Karlštejn kol.2	70 dny	4.3. 24	12.5. 24												
89	Rekonstrukce traťové koleje č.2	70 dny	4.3. 24	12.5. 24												
90	Mosty	70 dny	4.3. 24	12.5. 24												
91	Propustky	70 dny	4.3. 24	12.5. 24												
92	Základy TV	50 dny	4.3. 24	22.4. 24												
93	Kompletní obnovení odvodnění	50 dny	4.3. 24	22.4. 24												
94	Kabelové trasy	70 dny	4.3. 24	12.5. 24												



ID		Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	21	2022		2023		2024		2025		2026		20
						p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1
95		Strojní čištění	70 dny	4.3. 24	12.5. 24												
96		E.4.3 Zadní Třebáň-Karlštejn kol.1-PM	20 dny	13.5. 24	1.6. 24												
97		Rekonstrukce traťové koleje č. 1	14 dny	13.5. 24	26.5. 24												
98		sanace železničního spodku prováděné technologií bez snášení kolejových roštů	14 dny	13.5. 24	26.5. 24												
99		výměna svršku	3 dny	27.5. 24	29.5. 24												
100		úpravy TV	3 dny	30.5. 24	1.6. 24												
101		úpravy ZZ	3 dny	30.5. 24	1.6. 24												
102		E.4.4 Zadní Třebáň-Karlštejn kol.2-PM	20 dny	2.6. 24	21.6. 24												
103		Rekonstrukce traťové koleje č. 2	14 dny	2.6. 24	15.6. 24												
104		sanace železničního spodku prováděné technologií bez snášení kolejových roštů	14 dny	2.6. 24	15.6. 24												
105		výměna svršku	3 dny	16.6. 24	18.6. 24												
106		definitivní TV	3 dny	19.6. 24	21.6. 24												
107		definitivní AB	3 dny	19.6. 24	21.6. 24												
108		E.5.1 Řevnice-Zadní Třebáň 2.TK	90 dny	22.6. 24	19.9. 24												
109		Rekonstrukce traťové koleje č.2	90 dny	22.6. 24	19.9. 24												
110		Mosty, podchod	90 dny	22.6. 24	19.9. 24												
111		Propustky	90 dny	22.6. 24	19.9. 24												
112		Základy TV	70 dny	22.6. 24	30.8. 24												
113		Kompletní obnovení odvodnění	70 dny	22.6. 24	30.8. 24												
114		Kabelové trasy	70 dny	22.6. 24	30.8. 24												
115		Strojní čištění	90 dny	22.6. 24	19.9. 24												
116		E.5.2 Řevnice-Zadní Třebáň 1. TK	90 dny	20.9. 24	18.12. 24												
117		Rekonstrukce traťové koleje č.1	90 dny	20.9. 24	18.12. 24												
118		Mosty, podchod	90 dny	20.9. 24	18.12. 24												
119		Propustky	90 dny	20.9. 24	18.12. 24												
120		Základy TV	70 dny	20.9. 24	28.11. 24												
121		Kompletní obnovení odvodnění	70 dny	20.9. 24	28.11. 24												
122		Kabelové trasy	70 dny	20.9. 24	28.11. 24												
123		Strojní čištění	90 dny	20.9. 24	18.12. 24												
124		Technologická přestávka	80 dny	19.12. 24	8.3. 25												
125		E.5.3 Řevnice -Zadní Třebáň -kol.2-PM	20 dny	9.3. 25	28.3. 25												
126		Rekonstrukce traťové koleje č. 2	14 dny	9.3. 25	22.3. 25												
127		sanace železničního spodku prováděné technologií bez snášení kolejových roštů	14 dny	9.3. 25	22.3. 25												
128		výměna svršku	3 dny	23.3. 25	25.3. 25												
129		úpravy TV	3 dny	26.3. 25	28.3. 25												
130		úpravy ZZ	3 dny	26.3. 25	28.3. 25												
131		E.5.4 Řevnice -Zadní Třebáň -kol.1-PM	20 dny	29.3. 25	17.4. 25												
132		Rekonstrukce traťové koleje č. 1	14 dny	29.3. 25	11.4. 25												
133		sanace železničního spodku prováděné technologií bez snášení kolejových roštů	14 dny	29.3. 25	11.4. 25												
134		výměna svršku	3 dny	12.4. 25	14.4. 25												
135		definitivní TV	3 dny	15.4. 25	17.4. 25												
136		E.6.0 Přípravná etapa ŽST. Řevnice - vložení mostních provizorií	10 dny	22.6. 24	1.7. 24												
137		E.6.1 Žst.Řevnice, sudé koleje	70 dny	1.7. 24	9.9. 24												
138		Aktivace provizorního SZZ	0 dny	1.7. 24	1.7. 24												
139		železniční spodek - pražské zhlaví + staniční koleje	20 dny	2.7. 24	21.7. 24												

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	21	2022		2023		2024		2025		2026		20
						p2		p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1
140	železniční svršek- pražské zhlaví + staniční koleje	15 dny	22.7. 24	5.8. 24												
141	Podchod	70 dny	2.7. 24	9.9. 24												
142	nástupiště	20 dny	21.8. 24	9.9. 24												
143	železniční spodek - berounské zhlaví + staniční koleje	20 dny	6.8. 24	25.8. 24												
144	železniční svršek- berounské zhlaví + staniční koleje	15 dny	26.8. 24	9.9. 24												
145	úprava SZZ	15 dny	26.8. 24	9.9. 24												
146	rekonstrukce TV	15 dny	26.8. 24	9.9. 24												
147	E.6.2 Žst.Řevnice, liché koleje	70 dny	20.9. 24	28.11. 24												
148	železniční spodek - pražské zhlaví + staniční koleje	20 dny	20.9. 24	9.10. 24												
149	železniční svršek- pražské zhlaví + staniční koleje	15 dny	10.10. 24	24.10. 24												
150	Podchod	70 dny	20.9. 24	28.11. 24												
151	nástupiště	20 dny	9.11. 24	28.11. 24												
152	železniční spodek - berounské zhlaví + staniční koleje	20 dny	25.10. 24	13.11. 24												
153	železniční svršek- berounské zhlaví + staniční koleje	15 dny	14.11. 24	28.11. 24												
154	úprava SZZ-definitivní	15 dny	14.11. 24	28.11. 24												
155	definitivní TV	15 dny	14.11. 24	28.11. 24												
156	E.7.1 Dobřichovice -Řevnice - kol.1	70 dny	18.4. 25	26.6. 25												
157	Rekonstrukce traťové koleje č.1	70 dny	18.4. 25	26.6. 25												
158	Mosty	60 dny	18.4. 25	16.6. 25												
159	Propustky	60 dny	18.4. 25	16.6. 25												
160	Základy TV	50 dny	18.4. 25	6.6. 25												
161	Kompletní obnovení odvodnění	50 dny	18.4. 25	6.6. 25												
162	Kabelové trasy	50 dny	18.4. 25	6.6. 25												
163	Strojní čištění	70 dny	18.4. 25	26.6. 25												
164	E.7.2 Dobřichovice -Řevnice - kol.2	70 dny	27.6. 25	4.9. 25												
165	Rekonstrukce traťové koleje č.2	70 dny	27.6. 25	4.9. 25												
166	Mosty	60 dny	27.6. 25	25.8. 25												
167	Propustky	60 dny	27.6. 25	25.8. 25												
168	Základy TV	50 dny	27.6. 25	15.8. 25												
169	Kompletní obnovení odvodnění	50 dny	27.6. 25	15.8. 25												
170	Kabelové trasy	50 dny	27.6. 25	15.8. 25												
171	Strojní čištění	70 dny	27.6. 25	4.9. 25												
172	E.7.3 Dobřichovice -Řevnice - kol.1 -PM	20 dny	5.9. 25	24.9. 25												
173	Rekonstrukce traťové koleje č. 1	14 dny	5.9. 25	18.9. 25												
174	sanace železničního spodku prováděné technologií bez snášení kolejových roštů	14 dny	5.9. 25	18.9. 25												
175	výměna svršku	3 dny	19.9. 25	21.9. 25												
176	úpravy TV	3 dny	22.9. 25	24.9. 25												
177	úpravy ZZ	3 dny	22.9. 25	24.9. 25												
178	E.7.4 Dobřichovice -Řevnice - kol.2 -PM	20 dny	25.9. 25	14.10. 25												
179	Rekonstrukce traťové koleje č. 2	14 dny	25.9. 25	8.10. 25												
180	sanace železničního spodku prováděné technologií bez snášení kolejových roštů	14 dny	25.9. 25	8.10. 25												
181	výměna svršku	3 dny	9.10. 25	11.10. 25												
182	definitivní TV	3 dny	12.10. 25	14.10. 25												
183	definitivní AB	3 dny	12.10. 25	14.10. 25												
184	E.8.0 Technologická přestávka+ vložení mostních provizorií v žst Dobřichovice	140 dny	15.10. 25	3.3. 26												
185	E.8.1 Žst.Dobřichovice, sudé koleje	90 dny	3.3. 26	1.6. 26												
186	Úpravy provizorního SZZ	0 dny	3.3. 26	3.3. 26												

ID		Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	21	2022		2023		2024		2025		2026		20
						p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1
187		železniční spodek - pražské zhlaví + staniční koleje	40 dny	4.3. 26	12.4. 26												
188		železniční svršek- pražské zhlaví + staniční koleje	15 dny	13.4. 26	27.4. 26												
189		Podchod	90 dny	4.3. 26	1.6. 26												
190		nástupiště	20 dny	13.5. 26	1.6. 26												
191		železniční spodek - berounské zhlaví + staniční koleje	20 dny	28.4. 26	17.5. 26												
192		železniční svršek- berounské zhlaví + staniční koleje	15 dny	18.5. 26	1.6. 26												
193		úprava SZZ	15 dny	18.5. 26	1.6. 26												
194		rekonstrukce TV	15 dny	18.5. 26	1.6. 26												
195		E.8.2 Žst.Dobřichovice, liché koleje	90 dny	2.6. 26	30.8. 26												
196		železniční spodek - pražské zhlaví + staniční koleje	40 dny	2.6. 26	11.7. 26												
197		železniční svršek- pražské zhlaví + staniční koleje	15 dny	12.7. 26	26.7. 26												
198		Podchod	90 dny	2.6. 26	30.8. 26												
199		nástupiště	20 dny	11.8. 26	30.8. 26												
200		železniční spodek - berounské zhlaví + staniční koleje	20 dny	27.7. 26	15.8. 26												
201		železniční svršek- berounské zhlaví + staniční koleje	15 dny	16.8. 26	30.8. 26												
202		úprava SZZ-definitvní	15 dny	16.8. 26	30.8. 26												
203		definitvní TV	15 dny	16.8. 26	30.8. 26												
204		Dokončovací práce	60 dny	31.8. 26	29.10. 26												
205		Ukončení stavby	0 dny	29.10. 26	29.10. 26												

