




E.05.08

PO PŘIPOMÍNKÁCH 05/2020





Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Investor: 	Správa železnic, státní organizace Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc	Objednatel: 	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz
--	---	---	---

Zhotovitel: Účastníci Společnosti "SP+SEU_Pardubice - Stéblová_DSP"	
	

Správce: 	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	Vedoucí týmu: ING. PAVEL KUBÁT	Asistent vedoucího týmu: ING. MONIKA POSPÍCHALOVÁ Specialista profese: -
--	---	--	---

Zpracovatel části: 	SUDOP EU a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 305 e-mail: info@sudopeu.cz
--	---

Vedoucí střediska: ING. MIROSLAV VÁŇA 	Odpovědný projektant SO, IO, PS: ING. IVAN GRISA 	Vypracoval: ING. IVAN GRISA 	Kontroloval: ING. JAROSLAV DYTRYCH 
---	--	--	--

Název akce: MODERNIZACE TRATI HRADEC KRÁLOVÉ - PARDUBICE - CHRUDIM, 3. STAVBA, ZDVOUKOLEJNĚNÍ PARDUBICE-ROSICE NAD LABEM - STÉBLOVÁ	Číslo smlouvy: 19-041.250	
	Projektový stupeň: DSP + PDPS	
Část: ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY	Datum: 06/2020	
	Číslo části: E.05.08	
Název přílohy: Harmonogram stavby	Měřítko: -	Počet formátů: -
	Číslo přílohy: 3	

Rádkový harmonogram výstavby













Modernizace trati Pardubice - Stéblová


Délka stavby (dnů), bez následné úpravy kolejí:
967

Legenda:

- █ výtluk
- █ uzavírka/omezení PK

Stavební úsek	Etapy	Popis činnosti	dobu trvání (mínimally)		més.	týdny	dry
		Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)	od	do			
		zahájení soutěže na dodavatele		7. říjen 2020			
		výběr dodavatele		5. únor 2021			
		uzavření smlouvy a předání staveniště dodavateli		7. březen 2021			
		DPSR (dopracování projektu souhrnného řešení) SZZ Pardubice-Rosice n. L.: mobilní staniční zabezpečovací zařízení (MSZZ)	10. březen 2021	13. červen 2021	3,0	13,6	95
		DPSR (dopracování projektu souhrnného řešení) SZZ Pardubice-Rosice n. L.: definitivní zabezpečovací zařízení (SZZ)	10. březen 2021	13. červen 2021	3,2	13,6	95
		instalace a zkoušení MSZZ Pardubice-Rosice n. L.	14. červen 2021	25. říjen 2021	1,0	19,0	133
		aktivace MSZZ Pardubice-Rosice n. L.	26. říjen 2021	16. listopad 2021	3,0	3,0	21
		zaprnutí MSZZ Pardubice-Rosice n. L.		16. listopad 2021			
		instalace a zkoušení SZZ Pardubice-Rosice n. L.	14. červen 2021	24. červen 2023	1,0	105,7	740
		aktivace SZZ Pardubice-Rosice n. L.: stěblovké zhlaví	25. červen 2023	7. červenec 2023	1,0	1,7	12
		aktivace SZZ Pardubice-Rosice n. L.: pardubické zhlaví	5. listopad 2023	9. prosinec 2023	1,0	5,0	35
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice n. L.		10. březen 2021			
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice n. L.		6. prosinec 2023			
		konec dokončovacíh prací v úseku Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice n. L.		16. prosinec 2023			
		zahájení stavby - přípravné práce v žst. Pardubice-Rosice n. L.		10. březen 2021			
		ukončení hlavních stavebních prací v žst. Pardubice-Rosice n. L.		6. prosinec 2023			
		konec dokončovacíh prací v žst. Pardubice-Rosice n. L.		7. červen 2024			
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Pardubice-Rosice n. L. - Stěblová		10. březen 2021			
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Pardubice-Rosice n. L. - Stěblová		17. říjen 2023			
		konec dokončovacíh prací v úseku Pardubice-Rosice n. L. - Stěblová		4. červen 2024			
		zahájení přípravných a stavebních prací v žst. Stěblová		10. březen 2021			
		ukončení hlavních stavebních prací v žst. Stěblová		4. červenec 2023			
		konec dokončovacíh prací v žst. Stěblová		4. červen 2024			
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Medlešice - Pardubice-Rosice n. L.		31. květen 2021			
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Medlešice - Pardubice-Rosice n. L.		6. prosinec 2023			
		konec dokončovacíh prací v úseku Medlešice - Pardubice-Rosice n. L.		16. prosinec 2023			

	zabezpečovací a sdělovací zařízení		hlavní mřížky přípravy a výstavby
	kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž)		měsíce zimního období
	mostní objekty (podchody vč.zastřešení)		délka dílčího stavebního postupu
	objekty elektro		přípravné a dokončovací práce
	pozemní objekty,nástupišť,zastřešení,demolice		zkušební provoz
	potrubní sítě		omezení silničního provozu

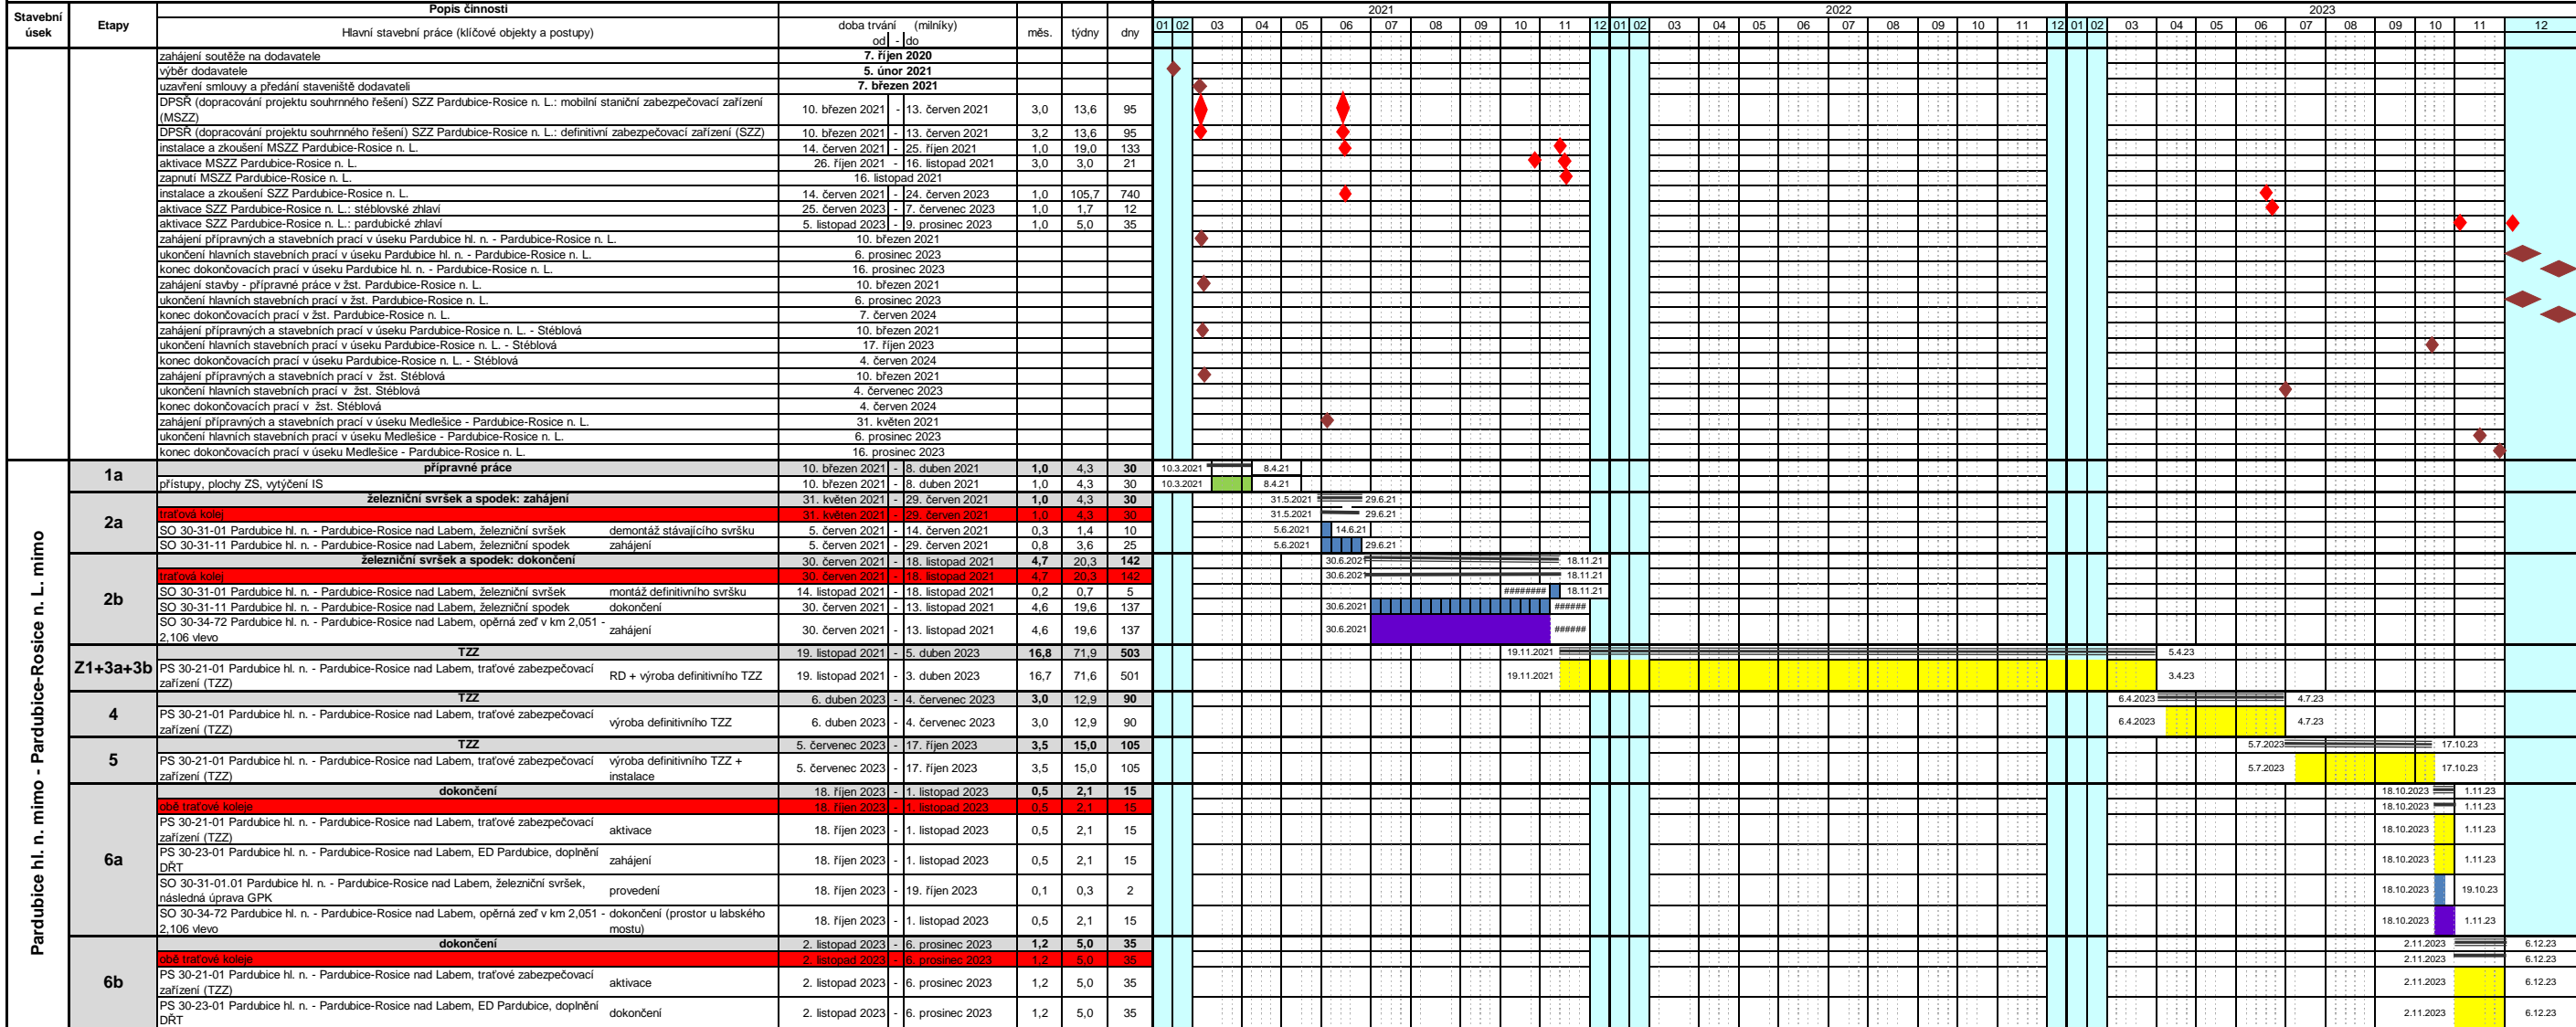













Řádkový harmonogram výstavby

Modernizace trati Pardubice - Stéblová

Legenda:

 výlučka
 uzavírka/omezení PK

	zabezpečovací a sdělovací zařízení		hlavní mílníky přípravy a výstavby
	kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž)		měsíce zimního období
	mostní objekty (podchody vč.zastřešení)		délka dílčího stavebního postupu
	objekty elektro		přípravné a dokončovací práce
	pozemní objekty,nástupišť,zastřešení,demolice		zkusební provoz
	potrubní sítě		omezení silničního provozu

Stavební úsek	Etapy	Popis činnosti						2021												2022												2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)						doba trvání (minuty)	měs.	týdny	dry	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		zahájení soutěže na dodavatele							7. říjen 2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

Řádkový harmonogram výstavby


Modernizace trati Pardubice - Stéblová

Délka stavby (dny), bez následné úpravy kolejí:
967

Legenda:

výluka

uzavírka/omezení PK

 zabezpečovací a sdělovací zařízení

kolejové úpravy (demonťáž,žel.spodek,montáž)

	mostní objekty (podchody vč.zastřešení)
--	---

obiekty elektro

[illegible]

	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					

♦♦ hlavní milníky přípravy a výstavby

měsíce zimního období

===== délka dílčího stavebního postupu

něípravné a dokončovací práce

	10	20	30	40
--	----	----	----	----

	65	70	75	80
1990	1.0	1.0	1.0	1.0
2000	1.0	1.0	1.0	1.0
2010	1.0	1.0	1.0	1.0
2020	1.0	1.0	1.0	1.0
2030	1.0	1.0	1.0	1.0
2040	1.0	1.0	1.0	1.0
2050	1.0	1.0	1.0	1.0
2060	1.0	1.0	1.0	1.0
2070	1.0	1.0	1.0	1.0
2080	1.0	1.0	1.0	1.0
2090	1.0	1.0	1.0	1.0
2100	1.0	1.0	1.0	1.0

[illegible]

Rádkový harmonogram výstavby

Modernizace trati Pardubice - Stěblová

Délka stavby (dny), bez následné úpravy kolejí:
967

Legenda:

- výluka
- uzavírka/omezení PK

Stavební úsek	Etapy	Popis činnosti		dobu trvání (minut)		més.	týdny	dny	
		Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)		od	do				
2a	zahájení soutěže na dodavatele			7. říjen 2020					
	výběr dodavatele			5. únor 2021					
	uzavření smlouvy a předání staveniště dodavateli			7. březen 2021					
	DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) SZS Pardubice-Rosice n. L.: mobilní staniční zabezpečovací zařízení (MSZZ)			10. březen 2021	13. červen 2021	3,0	13,6	95	
	DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) SZS Pardubice-Rosice n. L.: definitivní zabezpečovací zařízení (SZS)			10. březen 2021	13. červen 2021	3,2	13,6	95	
	instalace a zkoušení MSZZ Pardubice-Rosice n. L.			14. červen 2021	25. říjen 2021	1,0	19,0	133	
	aktivace MSZZ Pardubice-Rosice n. L.			26. říjen 2021	16. listopad 2021	3,0	3,0	21	
	zapnutí MSZZ Pardubice-Rosice n. L.			16. listopad 2021					
	instalace a zkoušení SZS Pardubice-Rosice n. L.			14. červen 2021	24. červen 2023	1,0	105,7	740	
	aktivace SZS Pardubice-Rosice n. L.: stěbového zhlaví			25. červen 2023	7. červenec 2023	1,0	1,7	12	
	aktivace SZS Pardubice-Rosice n. L.: pardubického zhlaví			5. listopad 2023	9. prosinec 2023	1,0	5,0	35	
	zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice n. L.			10. březen 2021					
	ukončení hlavních stavebních prací v úseku Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice n. L.			6. prosinec 2023					
	konec dokončovacích prací v úseku Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice n. L.			16. prosinec 2023					
	zahájení stavby - přípravné práce v žst. Pardubice-Rosice n. L.			10. březen 2021					
	ukončení hlavních stavebních prací v žst. Pardubice-Rosice n. L.			6. prosinec 2023					
	konec dokončovacích prací v žst. Pardubice-Rosice n. L.			7. červen 2024					
	zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Pardubice-Rosice n. L. - Stěbová			10. březen 2021					
	ukončení hlavních stavebních prací v úseku Pardubice-Rosice n. L. - Stěbová			17. říjen 2023					
	konec dokončovacích prací v úseku Pardubice-Rosice n. L. - Stěbová			4. červen 2024					
	SO 31-32-02 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, nástupiště č. 1	dočasné nástupiště u koleje 1n: zřízení, definitivní nástupiště: zahájení		31. květen 2021	29. červen 2021	1,0	4,3	30	
	SO 31-32-02.1 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, nástupiště č. 1, demolice nástupišť	všechna stávající + dočasná u kolejí 5st, 9st		31. květen 2021	9. červen 2021	0,3	1,4	10	
	SO 31-32-03 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, nové ostrovní nástupiště č. 2	definitivní nástupiště: zahájení (hrana u koleje 1n do km cca 2,860, hrana u koleje 3n celá)		31. květen 2021	29. červen 2021	1,0	4,3	30	
	SO 31-34-01 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most ev. km 2,184 přes řeku Labe	stavba dočasného mostu: zahájení		31. květen 2021	29. červen 2021	1,0	4,3	30	
	SO 31-34-02 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most v km 2,769 - podchod pro cestující	třeba pod koleji 1n, 2n + výstup na ostrovní nástupiště: zahájení		31. květen 2021	29. červen 2021	1,0	4,3	30	
	SO 31-34-21 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, železniční propustek ev. km 1,960 přes vodoteč	prostor mimo dočasnou kolej: zahájení		31. květen 2021	29. červen 2021	1,0	4,3	30	
	SO 31-35-03 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, úprava sdělovacího vedení T-Mobile v km 2,410	provedení		9. červen 2021	18. červen 2021	0,3	1,4	10	
	SO 31-36-02 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, odvodnění podchodu v km 2,769	pokračování		31. květen 2021	29. červen 2021	1,0	4,3	30	
	SO 31-36-04 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, odvodnění zastřešení nástupišť	zahájení		31. květen 2021	29. červen 2021	1,0	4,3	30	
	SO 31-39-01 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, kabelovod	pokračování: část pod koleji 3n, 1n, 2n		31. květen 2021	14. červen 2021	0,5	2,1	15	
	SO 31-51-03 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, úprava oplotení	pokračování		31. květen 2021	29. červen 2021	1,0	4,3	30	
	SO 31-61-01 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, trakční vedení	snesení TV stávajícího pardubického zhlaví		31. květen 2021	9. červen 2021	0,3	1,4	10	
	SO 31-61-01 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, trakční vedení	demolice stávajících podpěr na levém břehu Labe a labském mostě + podpěr 1st - 13st, 13Ast, 14st, 15st - 22st, 27st, 29st, 31st, 33st		5. červen 2021	14. červen 2021	0,3	1,4	10	
	SO 31-64-01 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, elektrický ohřev výhybek	demontáž na výhybkách 1XAsi, 1XBst, 1st, 4st, 5st, 7st, 8st, 9st, 10st, 11st		31. květen 2021	9. červen 2021	0,3	1,4	10	
	SO 31-66-01 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, venkovní rozvody nn a osvětlení	demontáž na rušené části pardubického zhlaví, demontáž na rušených nástupištech		31. květen 2021	9. červen 2021	0,3	1,4	10	
	SO 31-66-02 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, dálkové ovládání úsekových odpojovačů	demontáž na rušené části pardubického zhlaví		5. červen 2021	14. červen 2021	0,3	1,4	10	
	SO 31-67-01 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, ukojení vodivých konstrukcí	podle kolejí		25. červen 2021	29. červen 2021	0,2	0,7	5	
	stavba podchodu a nástupišť: pokračování, rekonstrukce pardubického zhlaví: pokračování				30. červen 2021	18. listopad 2021	1,0	20,3	142
	SK 1st = SK 2n (pardubické zhlaví - dočasné nástupiště mimo)				30. červen 2				

[illegible]

Rádkový harmonogram výstavby

Modernizace trati Pardubice - Stěblová


Délka stavby (dnů), bez následné úpravy kolejí:
967

Legenda:



- výluka
- uzavírka/omezení PK


Modernizace trati Pardubice - Stěblová

Délka stavby (dry), bez následné úpravy kolejí:
967



Legenda:

	vyluka
	uzavírka/omezení PK

	zabezpečovací a sdělovací zařízení		hlavní mlíčníky přípravy a výstavby
	kolejové úpravy (demontáž, žel. spodek, montáž)		měsíce zimního období
	mostní objekty (podchody vč. zastřešení)		délka dílčího stavebního postupu
	objekty elektro		přípravné a dokončovací práce
	pozemní objekty, nástupiště, zastřešení, demolice		zkušební provoz
	potrubní sítě		omezení silničního provozu

[illegible]

Rádkový harmonogram výstavby

Modernizace trati Pardubice - Stěblová













Délka stavby (dny), bez následné úpravy kolejí:
967


Legenda:

- výluka
- uzavírka/omezení PK

Stavební úsek	Etapy	Popis činnosti	dobu trvání (mínimally)		més.	týdny	dny	
		Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)	od	do				
1a	zahájení soutěže na dodavatele		7. říjen 2020					
	výběr dodavatele		5. únor 2021					
	uzavření smlouvy a předání staveniště dodavateli		7. březen 2021					
	DPSR (dopracování projektu souhrnného řešení) SZZ Pardubice-Rosice n. L.: mobilní stanoviční zabezpečovací zařízení (MSZZ)		10. březen 2021	13. červen 2021	3,0	13,6	95	
	DPSR (dopracování projektu souhrnného řešení) SZZ Pardubice-Rosice n. L.: definitivní zabezpečovací zařízení (SZZ)		10. březen 2021	13. červen 2021	3,2	13,6	95	
	instalace a zkoušení MSZZ Pardubice-Rosice n. L.		14. červen 2021	25. říjen 2021	1,0	19,0	133	
	aktivace MSZZ Pardubice-Rosice n. L.		26. říjen 2021	16. listopad 2021	3,0	3,0	21	
	zapnutí MSZZ Pardubice-Rosice n. L.		16. listopad 2021					
	instalace a zkoušení SZZ Pardubice-Rosice n. L.		14. červen 2021	24. červen 2023	1,0	105,7	740	
	aktivace SZZ Pardubice-Rosice n. L.: stěbovské zhlaví		25. červen 2023	7. červenec 2023	1,0	1,7	12	
	aktivace SZZ Pardubice-Rosice n. L.: pardubické zhlaví		5. listopad 2023	9. prosinec 2023	1,0	5,0	35	
	zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice n. L.		10. březen 2021					
	ukončení hlavních stavebních prací v úseku Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice n. L.		6. prosinec 2023					
	konec dokončovacích prací v úseku Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice n. L.		16. prosinec 2023					
	zahájení stavby - přípravné práce v žst. Pardubice-Rosice n. L.		10. březen 2021					
	ukončení hlavních stavebních prací v žst. Pardubice-Rosice n. L.		6. prosinec 2023					
	konec dokončovacích prací v žst. Pardubice-Rosice n. L.		7. červen 2024					
	zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Pardubice-Rosice n. L. - Stěbová		10. březen 2021					
	ukončení hlavních stavebních prací v úseku Pardubice-Rosice n. L. - Stěbová		17. říjen 2023					
	konec dokončovacích prací v úseku Pardubice-Rosice n. L. - Stěbová		4. červen 2024					
	SO 31-51-03 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, úpravy oplocení	pokračování	3. květen 2022	12. květen 2022	0,3	1,4	10	
	SO 31-60-02 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, drobná architektura na nástupišti č. 2	dokončení	3. květen 2022	12. květen 2022	0,3	1,4	10	
	SO 31-67-01 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, ukojení vodivých konstrukcí	podle kolejí	3. květen 2022	12. květen 2022	0,3	1,4	10	
	3b	PS 31-21-01 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, stanoviční zabezpečovací zařízení (SZZ)	výroba definitivního SZZ	13. květen 2022	5. duben 2023	1,0	46,9	328
		PS 31-22 -01 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, místní kabelizace	pokračování	13. květen 2022	5. duben 2023	10,9	46,9	328
SO 31-31-11 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, železniční spodek		kolej 1n v prostoru budoucích výhybek 26n, 29n	13. květen 2022	5. duben 2023	10,9	46,9	328	
SO 31-34-01 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most ev. km 2,184 přes řeku Labe		stavba definitivního mostu: pokračování	13. květen 2022	5. duben 2023	10,9	46,9	328	
SO 31-61-01 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, trakční vedení		základy podpěr 62n, 64n, 66n, 68n, 72n, 73n, 75n, 77n - 89n, 91n, 93n, 95n, 97n, 99n, 101n, 103n, 105n, 107n, 109, 110n, 112n, 114n	10. říjen 2022	6. prosinec 2022	1,9	8,3	58	
SO 31-61-01 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, trakční vedení		podpěry 62n, 64n, 66n, 68n, 72n, 73n, 75n, 77n - 89n, 91n, 93n, 95n, 97n, 99n, 101n, 103n, 105n, 107n, 109, 110n, 112n, 114n	4. únor 2023	2. duben 2023	1,9	8,3	58	
SO 31-51-03 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, úpravy oplocení		pokračování	13. květen 2022	5. duben 2023	10,9	46,9	328	
SO 31-67-01 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, ukojení vodivých konstrukcí		podle kolejí	13. květen 2022	5. duben 2023	10,9	46,9	328	
3c		rekonstrukce stěbovského zhlaví: zahájení		6. duben 2023	20. duben 2023	1,0	2,1	15
		SK 2n (km 3.250 - stěbovské zhlaví), SK 3n (ostrovní nástupiště mimo - stěbovské zhlaví), SK 5n - 13n (pardubické zhlaví mimo - stěbovské zhlaví včetně), Stěbová: SK 1n, 2n kusem směr Stěbová		6. duben 2023	20. duben 2023	0,5	2,1	15
	SK 1n (km 3.300 - výhybka 29st včetně), vlečky V4436 - V4437		11. duben 2023	14. duben 2023	0,1	0,6	4	
	PS 31-21-01 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, stanoviční zabezpečovací zařízení (SZZ)	instalace a zkoušení definitivního SZZ	6. duben 2023	20. duben 2023	0,5	2,1	15	
	PS 31-22 -01 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, místní kabelizace	pokračování	6. duben 2023	20. duben 2023	0,5	2,1	15	
	SO 31-31-01 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek	demontáž stěbovského zhlaví (výhybky 19st, 21st, 22st, 24st, 25st, 27st, 30st)	8. duben 2023	14. duben 2023	0,2	1,0	7	
	SO 31-31-01 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek	náhrada výhybky 29st kolejovým polem	15. duben 2023	20. duben 2023	0,2	0,9	6	
	SO 31-31-11 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, železniční spodek	stěbovské zhlaví mimo konflikt s původním napojením semtřískových vleček	6. duben 2023	20. duben 2023	0,5	2,1	15	
	SO 31-33-01 Žst. Pardubice							

uzavírka/omezení PK

	zabezpečovací a sdělovací zařízení		hlavní mílníky přípravy a výstavby
	kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž)		měsíce zimního období
	mostní objekty (podchody vč.zastřešení)		délka dílčího stavebního postupu
	objekty elektro		přípravné a dokončovací práce
	pozemní objekty,nástupišť,zastřešení,demolice		zkušební provoz
	potrubní sítě		omezení silničního provozu

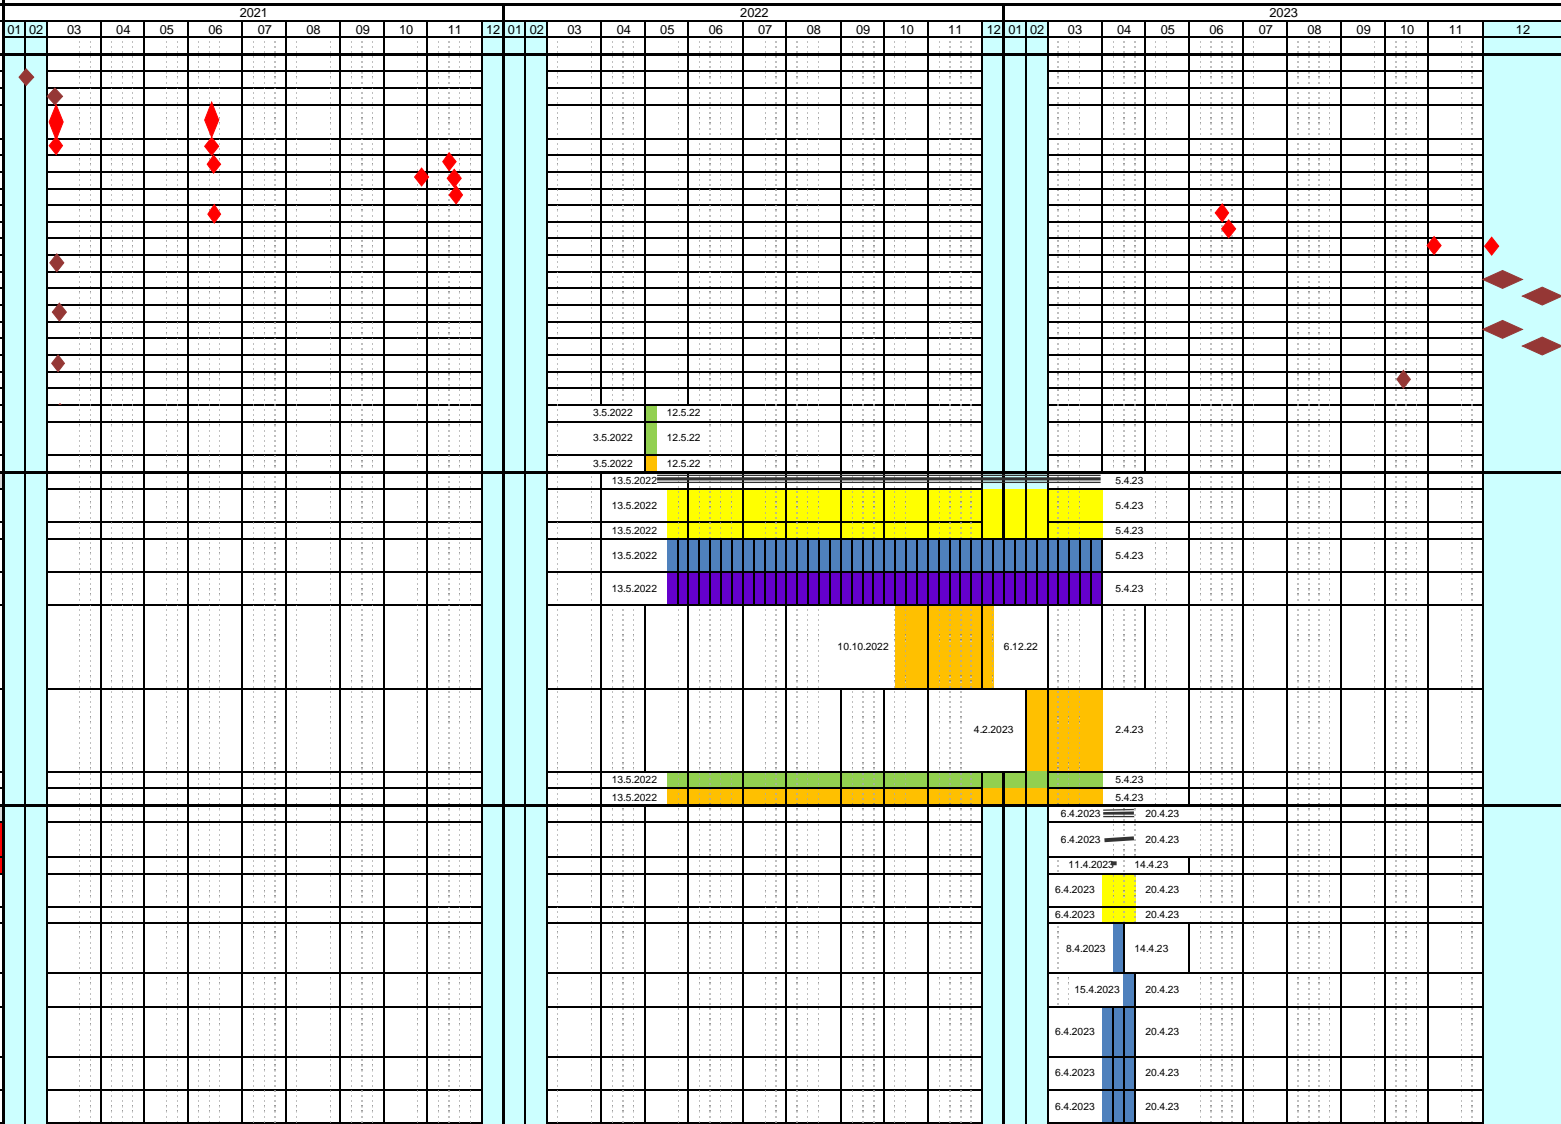

Rádkový harmonogram výstavby

Modernizace trati Pardubice - Stěblová


Délka stavby (dry), bez následné úpravy kolejí:
967

Legenda:

- výluka
- uzavírka/omezení PK


Modernizace trati Pardubice - Stěblová	
Délka stavby (dry), bez následné úpravy kolejí:	967

Legenda:



výfuka

uzavírka/omezení PK

	zabezpečovací a sdělovací zařízení		hlavní mlílníky přípravy a výstavby
	kolejové úpravy (demontáž, žel. spodek, montáž)		měsíce zimního období
	mostní objekty (podchody vč. zastřešení)		délka dílčího stavebního postupu
	objekty elektro		přípravné a dokončovací práce
	pozemní objekty, nástupiště, zastřešení, demolice		zkušební provoz
	potrubní sítě		omezení silničního provozu

[illegible]













Řádkový harmonogram výstavby

Legenda:

Modernizace trati Pardubice - Stéblová
Délka stavby (dny), bez následné úpravy kolejí:
967

 výluka

 uzavírka/omezení PK

	zabezpečovací a sdělovací zařízení		hlavní mílníky přípravy a výstavby
	kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž)		měsíce zimního období
	mostní objekty (podchody vč.zastřešení)		délka dílčího stavebního postupu
	objekty elektro		přípravné a dokončovací práce
	pozemní objekty,nástupišť,zastřešení,demolice		zkusební provoz
	potrubní sítě		omezení silničního provozu

[illegible]

Rádkový harmonogram výstavby

Modernizace trati Pardubice - Stéblová

Délka stavby (dry), bez následné úpravy kolejí:
967

Legenda:

- výluka
- uzavírka/omezení PK

Stavební úsek	Etapy	Popis činnosti		dobu trvání (mínimally)		měs.	týdny	dny	
		Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)		od	do				
5	zahájení soutěže na dodavatele			7. říjen 2020					
	výběr dodavatele			5. únor 2021					
	uzavření smlouvy a předání staveniště dodavateli			7. březen 2021					
	DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) SZS Pardubice-Rosice n. L.: mobilní staniční zabezpečovací zařízení (MSZZ)			10. březen 2021	13. červen 2021	3,0	13,6	95	
	DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) SZS Pardubice-Rosice n. L.: definitivní zabezpečovací zařízení (SZS)			10. březen 2021	13. červen 2021	3,2	13,6	95	
	Instalace a zkoušení MSZZ Pardubice-Rosice n. L.			14. červen 2021	25. říjen 2021	1,0	19,0	133	
	aktivace MSZZ Pardubice-Rosice n. L.			26. říjen 2021	16. listopad 2021	3,0	3,0	21	
	zapnutí MSZZ Pardubice-Rosice n. L.			16. listopad 2021					
	Instalace a zkoušení SZS Pardubice-Rosice n. L.			14. červen 2021	24. červen 2023	1,0	105,7	740	
	aktivace SZS Pardubice-Rosice n. L.: stěblovské zhlaví			25. červen 2023	7. červenec 2023	1,0	1,7	12	
	aktivace SZS Pardubice-Rosice n. L.: pardubické zhlaví			5. listopad 2023	9. prosinec 2023	1,0	5,0	35	
	zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice n. L.			10. březen 2021					
	ukončení hlavních stavebních prací v úseku Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice n. L.			6. prosinec 2023					
	konec dokončovacíh prací v úseku Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice n. L.			16. prosinec 2023					
	zahájení stavby - přípravné práce v žst. Pardubice-Rosice n. L.			10. březen 2021					
	ukončení hlavních stavebních prací v žst. Pardubice-Rosice n. L.			6. prosinec 2023					
	konec dokončovacíh prací v žst. Pardubice-Rosice n. L.			7. červen 2024					
	zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Pardubice-Rosice n. L. - Stěblová			10. březen 2021					
	ukončení hlavních stavebních prací v úseku Pardubice-Rosice n. L. - Stěblová			17. říjen 2023					
	konec dokončovacíh prací v úseku Pardubice-Rosice n. L. - Stěblová			4. červen 2024					
	SO 31-66-02 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, dálkové ovládání úsekových odpojovačů		montáž v prostoru koleji od 13n	15. červen 2023	4. červenec 2023	0,7	2,9	20	
	SO 31-67-01 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, ukojení vodivých konstrukcí		podle kolejí	15. červen 2023	4. červenec 2023	0,7	2,9	20	
	6a	rekonstrukce pardubického zhlaví: pokračování			5. červenec 2023	17. říjen 2023	1,0	15,0	105
		dočasné koleje přes labky most (roz. čtyři hodiny)			17. říjen 2023	17. říjen 2023	0,0	0,1	1
		PS 31-22 -01 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, místní kabelizace		pokračování	5. červenec 2023	17. říjen 2023	3,5	15,0	105
SO 31-31-01 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek			montáž definitivního pardubického zhlaví (výhybky 2, 3, 4, 5, 6, 7, koleje 5a, 7a): zahájení	23. září 2023	17. říjen 2023	0,8	3,6	25	
SO 31-31-11 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, železniční spodek			definitivní pardubické zhlaví: zahájení	5. červenec 2023	17. říjen 2023	3,5	15,0	105	
SO 31-34-01 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most ev. km 2,184 přes řeku Labe			stavba definitivního mostu: dokončení	5. červenec 2023	17. říjen 2023	3,5	15,0	105	
SO 31-34-03 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most ev. km 3,677 přes Brozanský potok			demolice původního mostu	5. červenec 2023	3. srpen 2023	1,0	4,3	30	
SO 31-61-01 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, trakční vedení			základ podpěr 17A, 19, 20, 21, 22	8. září 2023	12. září 2023	0,2	0,7	5	
SO 31-61-01 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, trakční vedení			podpěry 17A, 19, 20, 21, 22	12. říjen 2023	16. říjen 2023	0,2	0,7	5	
SO 31-61-01 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, trakční vedení			brány 25-26, 27-28	17. říjen 2023	17. říjen 2023	0,0	0,1	1	
SO 31-66-04 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most ev. km 2,184 přes řeku Labe, osvětlení konstrukce			provedení	3. říjen 2023	17. říjen 2023	0,5	2,1	15	
SO 31-67-01 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, ukojení vodivých konstrukcí			podle kolejí	3. říjen 2023	17. říjen 2023	0,5	2,1	15	
rekonstrukce pardubického zhlaví: pokračování			18. říjen 2023	1. listopad 2023	1,0	2,1	15		
Pardubicko-medvědí zhlaví po výhybku 11 včetně			18. říjen 2023	1. listopad 2023	0,5	2,1	15		
PU-Rosice napěťové výluky celé stanice (91 hodiny v noci)			31. říjen 2023	31. říjen 2023	0,0	0,1	1		
Vlaková V4459			18. říjen 2023	1. listopad 2023	0,5	2,1	15		
6a	PS 31-22 -01 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, místní kabelizace		pokračování	18. říjen 2023	1. listopad 2023	0,5	2,1	15	
	SO 31-31-01 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek		demontáž dočasného pardubického zhlaví (výhybky 1XB, 1XP, 4XP, 5XP, 7XP)	18. říjen 2023	22. říjen 2023	0,2	0,7	5	
	SO 31-31-01 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek		montáž definitivního pardubického zhlaví (výhybky 2, 3, 4, 5, 6, 7, koleje 5a, 7a): pokračování	18. říjen 2023	1. listopad 2023				

[illegible]

Rádkový harmonogram výstavby

Modernizace trati Pardubice - Stěblová

Délka stavby (dny), bez následné úpravy kolejí:
967

Legenda:

- výluka
- uzavírka/omezení PK

- zabezpečovací a sdělovací zařízení
- kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž)
- mostní objekty (podchody vč.zastřešení)
- objekty elektro
- pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice
- potrubní sítě
- hlavní milníky přípravy a výstavby
- měsíce zimního období
- délka dílčího stavebního postupu
- přípravné a dokončovací práce
- zkušební provoz
- omezení silničního provozu

Stavební úsek	Etapy	Popis činnosti	2021												2022												2023																			
			doba trvání od - do	měs.	týdny	dny	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
		zahájení soutěže na dodavatele	7. říjen 2020																																											
		výběr dodavatele	5. únor 2021																																											
		uzavření smlouvy a předání staveniště dodavateli	7. březen 2021																																											
		DPSR (dopracování projektu souhrnného řešení) SZZ Pardubice-Rosice n. L.: mobilní staniční zabezpečovací zařízení (MSZZ)	10. březen 2021 - 13. červen 2021	3,0	13,6	95																																								
		DPSR (dopracování projektu souhrnného řešení) SZZ Pardubice-Rosice n. L.: definitivní zabezpečovací zařízení (SZZ)	10. březen 2021 - 13. červen 2021	3,2	13,6	95																																								
		instalace a zkoušení MSZZ Pardubice-Rosice n. L.	14. červen 2021 - 25. říjen 2021	1,0	19,0	133																																								
		aktivace MSZZ Pardubice-Rosice n. L.	26. říjen 2021 - 16. listopad 2021	3,0	3,0	21																																								
		zapnutí MSZZ Pardubice-Rosice n. L.	16. listopad 2021																																											
		instalace a zkoušení SZZ Pardubice-Rosice n. L.	14. červen 2021 - 24. červen 2023	1,0	105,7	740																																								
		aktivace SZZ Pardubice-Rosice n. L.: stěblovské zhlaví	25. červen 2023 - 7. červenec 2023	1,0	1,7	12																																								
		aktivace SZZ Pardubice-Rosice n. L.: pardubické zhlaví	5. listopad 2023 - 9. prosinec 2023	1,0	5,0	35																																								
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice n. L.	10. březen 2021																																											
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice n. L.	6. prosinec 2023																																											
		konec dokončovacích prací v úseku Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice n. L.	16. prosinec 2023																																											
		zahájení stavby - přípravné práce v žst. Pardubice-Rosice n. L.	10. březen 2021																																											
		ukončení hlavních stavebních prací v žst. Pardubice-Rosice n. L.	6. prosinec 2023																																											
		konec dokončovacích prací v žst. Pardubice-Rosice n. L.	7. červen 2024																																											
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Pardubice-Rosice n. L. - Stěblová	10. březen 2021																																											
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Pardubice-Rosice n. L. - Stěblová	17. říjen 2023																																											
		konec dokončovacích prací v úseku Pardubice-Rosice n. L. - Stěblová	4. červen 2024																																											
				SO 31-61-01 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, trakční vedení	podpěry 11 - 18	18. říjen 2023 - 1. listopad 2023	0,5	2,1	15																																					
				SO 31-64-01 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, elektrický ohřev výhybek	demontáž na dočasném pardubickém zhlaví (výhybky 1XB, 1XP, 4XP, 5XP, 7XP)	18. říjen 2023 - 22. říjen 2023	0,2	0,7	5																																					
				SO 31-66-01 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, venkovní rozvody nn a osvětlení	demontáž na dočasném pardubickém zhlaví	18. říjen 2023 - 22. říjen 2023	0,2	0,7	5																																					
				SO 31-66-02 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, dálkové ovládání úsekových odpojovačů	demontáž na dočasném pardubickém zhlaví	18. říjen 2023 - 22. říjen 2023	0,2	0,7	5																																					
				SO 31-67-01 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, ukolejnění vodivých konstrukcí	podle kolejí	28. říjen 2023 - 1. listopad 2023	0,2	0,7	5																																					
6b		rekonstrukce pardubického zhlaví: pokračování		2. listopad 2023 - 6. prosinec 2023	1,0	5,0	35																																							
		Pardubicko-medvědiecké zhlaví po výhybku 11 včetně		2. listopad 2023 - 6. prosinec 2023	1,2	5,0	35																																							
		PU-Rosice: napěťové výluky celé stanice (8 hodin v noci)		27. listopad 2023 - 4. prosinec 2023	0,3	1,1	8																																							
		PS 31-21-01 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)	aktivace definitivního SZZ: pardubické zhlaví	2. listopad 2023 - 6. prosinec 2023	1,2	5,0	35																																							
		PS 31-22-01 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, místní kabelizace	dokončení	2. listopad 2023 - 6. prosinec 2023	1,2	5,0	35																																							
		PS 31-22-04 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, kamerový systém		22. listopad 2023 - 6. prosinec 2023	0,5	2,1	15																																							
		PS 31-22-05 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, EZS	montáž definitivního zařízení:	22. listopad 2023 - 6. prosinec 2023	0,5	2,1	15																																							
		PS 31-22-08 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, sdělovací zařízení	pardubické zhlaví	22. listopad 2023 - 6. prosinec 2023	0,5	2,1	15																																							
		PS 31-23-01 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, DŘT		22. listopad 2023 - 6. prosinec 2023	0,5	2,1	15																																							
		SO 31-31-01 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek	montáž definitivního pardubického zhlaví (výhybky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8): dokončení	2. listopad 2023 - 6. prosinec 2023	1,2	5,0	35																																							
		SO 31-34-01 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most ev. km 2,184 přes řeku Labe	demolice dočasného mostu: dokončení	2. listopad 2023 - 6. prosinec 2023	1,2	5,0	35																																							
		SO 31-34-21 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, železniční propustek ev. km 1,960 přes vodoteč	prostor po sнесенé dočasné kolejí: dokončení	2. listopad 2023 - 21. listopad 2023	0,7	2,9	20																																							
		SO 31-34-31 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, silniční most přes trať v žkm 2,494 na ulici Generála Svobody, zábrany proti dotyku	provedení	2. listopad 2023 - 11. listopad 2023	0,3	1,4	10																																							
		SO 31-61-01 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, trakční vedení	nové TV pardubického zhlaví	12. listopad 2023 - 6. prosinec 2023	0,8	3,6	25																																							
		SO 31-64-01 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, elektrický ohřev výhybek	montáž na pardubickém zhlaví (výhybky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)	22. listopad 2023 - 6. prosinec 2023	0,5	2,1	15																																							
		SO 31-66-01 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, venkovní rozvody nn a osvětlení	montáž na pardubickém zhlaví	2. listopad 2023 - 6. prosinec 2023	1,2	5,0	35																																							
		SO 31-66-02 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, dálkové ovládání úsekových odpojovačů	montáž na pardubickém zhlaví	2. listopad 2023 - 6. prosinec 2023	1,2	5,0	35																																							
		SO 31-67-01 Žst. Pardubice-Rosice nad Labem, ukolejnění vodivých konstrukcí	podle kolejí	2. listopad 2023 - 6. prosinec 2023	1,2	5,0	35																																							
		NÚK		následná úprava koleje GPK		3. červen 2024 - 7. červen 2024	0,2	0,7	5																																					
				SK 2 + 4 (noční čtyřhodinová výuka)		3. červen 2024 - 3. červen 2024	0,0	0,1	1																																					
				SK 1 + 3 (noční čtyřhodinová výuka)		5. červen 2024 - 5. červen 2024	0,0	0,1	1																																					
				SK 5 - 9		7. červen 2024 - 7. červen 2024	0,0	0,1	1																																					

Rádkový harmonogram výstavby

Modernizace trati Pardubice - Stěblová

Délka stavby (dnů), bez následné úpravy kolejí:
967

Legenda:

- výluka
- uzavírka/omezení PK

Stavební úsek	Etapy	Popis činnosti	dobu trvání (mínimally)		měs.	týdny	dny	
		Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)	od	do				
1a		zahájení soutěže na dodavatele		7. říjen 2020				
		výběr dodavatele		5. únor 2021				
		uzavření smlouvy a předání staveniště dodavateli		7. březen 2021				
		DPSR (dopracování projektu souhrnného řešení) SZZ Pardubice-Rosice n. L.: mobilní staniční zabezpečovací zařízení (MSZZ)	10. březen 2021	- 13. červen 2021	3,0	13,6	95	
		DPSR (dopracování projektu souhrnného řešení) SZZ Pardubice-Rosice n. L.: definitivní zabezpečovací zařízení (SZZ)	10. březen 2021	- 13. červen 2021	3,2	13,6	95	
		instalace a zkoušení MSZZ Pardubice-Rosice n. L.	14. červen 2021	- 25. říjen 2021	1,0	19,0	133	
		aktivace MSZZ Pardubice-Rosice n. L.	26. říjen 2021	- 16. listopad 2021	3,0	3,0	21	
		zapnutí MSZZ Pardubice-Rosice n. L.	16. listopad 2021					
		instalace a zkoušení SZZ Pardubice-Rosice n. L.	14. červen 2021	- 24. červen 2023	1,0	105,7	740	
		aktivace SZZ Pardubice-Rosice n. L.: stěbloviské zhlaví	25. červen 2023	- 7. červenec 2023	1,0	1,7	12	
		aktivace SZZ Pardubice-Rosice n. L.: pardubické zhlaví	5. listopad 2023	- 9. prosinec 2023	1,0	5,0	35	
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice n. L.	10. březen 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice n. L.	6. prosinec 2023					
		konec dokončovacíh prací v úseku Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice n. L.	16. prosinec 2023					
		zahájení stavby - přípravné práce v zst. Pardubice-Rosice n. L.	10. březen 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v zst. Pardubice-Rosice n. L.	6. prosinec 2023					
		konec dokončovacíh prací v zst. Pardubice-Rosice n. L.	7. červen 2024					
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Pardubice-Rosice n. L. - Stěblová	10. březen 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Pardubice-Rosice n. L. - Stěblová	17. říjen 2023					
		konec dokončovacíh prací v úseku Pardubice-Rosice n. L. - Stěblová	4. červen 2024					
		přípravné práce	10. březen 2021	- 8. duben 2021	1,0	4,3	30	
		stabilizaci traťové koleje	4. duben 2021	- 3. duben 2021	0,1	0,3	2	
		přístupy, kácení, plochy ZS, vyčištění IS	10. březen 2021	- 8. duben 2021	1,0	4,3	30	
		PS 32-22-01 Pardubice-Rosice nad Labem – Stěblová, DOK a TK	úpravy dle potřeb stavby TK	10. březen 2021	- 8. duben 2021	1,0	4,3	30
		SO 32-31-11 Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, železniční spodek	nové úseky TK 1, 2 mimo konflikt se stávající TK	10. březen 2021	- 8. duben 2021	1,0	4,3	30
		SO 32-34-41 Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, silniční propustek přes přítok Hředivského potoka	provedení	10. březen 2021	- 8. duben 2021	1,0	4,3	30
		SO 32-35-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, úprava sdělovacího vedení CETIN v km 4,541	provedení	10. březen 2021	- 8. duben 2021	1,0	4,3	30
		SO 32-35-04 Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, úprava sdělovacího vedení CETIN v km 8,305	provedení	10. březen 2021	- 8. duben 2021	1,0	4,3	30
		SO 32-81-81 Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, přelozka stávajícího koryta vpravo železniční trati v žkm 6,1 - 7,0	provedení	10. březen 2021	- 8. duben 2021	1,0	4,3	30
		SO 32-36-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, přelozka jednotné kanalizace 2 x DN 600 VaK Pardubice v žkm 4,645	provedení	10. březen 2021	- 8. duben 2021	1,0	4,3	30
		SO 32-36-03 Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, ochrana kanalizačního výtlaku PE d.110 VaK Pardubice v žkm 6,942	provedení	10. březen 2021	- 8. duben 2021	1,0	4,3	30
		SO 32-36-04 Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, přelozka kanalizačního výtlaku	provedení	10. březen 2021	- 8. duben 2021	1,0	4,3	30
		SO 32-51-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, úpravy oplocení	zahájení	10. březen 2021	- 8. duben 2021	1,0	4,3	30
		SO 32-51-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, základy RD u přejezdu v km 8,295	provedení	10. březen 2021	- 8. duben 2021	1,0	4,3	30
		SO 32-51-03 Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, zastávka Stěblová obec, základy TTS	provedení	10. březen 2021	- 8. duben 2021	1,0	4,3	30
1b+1c		stavba úseků obou TK mimo kolisi se stávající trati	9. duben 2021	- 30. květen 2021	1,0	7,4	52	
		PS 32-22-01 Pardubice-Rosice nad Labem – Stěblová, DOK a TK	úpravy dle potřeb stavby TK	9. duben 2021	- 30. květen 2021	1,7	7,4	52
		SO 32-31-11 Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, železniční spodek	nové úseky TK 1, 2 mimo konflikt se stávající TK	9. duben 2021	- 30. květen 2021	1,7	7,4	52
		SO 32-36-11 Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, přelozka vodovodu LT DN 400 VaK Pardubice v žkm 4,530	provedení	9. duben 2021	- 30. květen 2021	1,7	7,4	52
		SO 32-36-12 Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, přelozka vodovodu PE d.315 VaK Pardubice v žkm 5,295	provedení	9. duben 2021	- 30. květen 2021	1,7	7,4	52
		SO 32-36-13 Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, přelozka vodovodu OC DN 500 VaK Pardubice v žkm 5,458	provedení	9. duben 2021	- 30. květen 2021	1,7	7,4	52
		SO 32-36-14 Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, přelozka vodovodu PE d.90 VaK Pardubice v žkm 8,308	provedení	9. duben 2021	- 30. květen 2021			

[illegible]

Rádkový harmonogram výstavby

Modernizace trati Pardubice - Stěblová

Délka stavby (dnů), bez následné úpravy kolejí:
967

Legenda:

- výluka
- uzavírka/omezení PK

Stavební úsek	Etapy	Popis činnosti		dobu trvání (mínimally)		měs.	týdny	dny
		Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)		od	do			
3b		zahájení soutěže na dodavatele		7. říjen 2020				
	výběr dodavatele		5. únor 2021					
	uzavření smlouvy a předání staveniště dodavateli		7. březen 2021					
	DPSR (dopracování projektu souhrnného řešení) SZZ Pardubice-Rosice n. L.: mobilní staniční zabezpečovací zařízení (MSZZ)		10. březen 2021	13. červen 2021	3,0	13,6	95	
	DPSR (dopracování projektu souhrnného řešení) SZZ Pardubice-Rosice n. L.: definitivní zabezpečovací zařízení (SZZ)		10. březen 2021	13. červen 2021	3,2	13,6	95	
	instalace a zkoušení MSZZ Pardubice-Rosice n. L.		14. červen 2021	25. říjen 2021	1,0	19,0	133	
	aktivace MSZZ Pardubice-Rosice n. L.		26. říjen 2021	16. listopad 2021	3,0	3,0	21	
	zapnutí MSZZ Pardubice-Rosice n. L.		16. listopad 2021					
	instalace a zkoušení SZZ Pardubice-Rosice n. L.		14. červen 2021	24. červen 2023	1,0	105,7	740	
	aktivace SZZ Pardubice-Rosice n. L.: stěbovské zhlaví		25. červen 2023	7. červenec 2023	1,0	1,7	12	
	aktivace SZZ Pardubice-Rosice n. L.: pardubické zhlaví		5. listopad 2023	9. prosinec 2023	1,0	5,0	35	
	zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice n. L.		10. březen 2021					
	ukončení hlavních stavebních prací v úseku Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice n. L.		6. prosinec 2023					
	konec dokončovacíh prací v úseku Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice n. L.		16. prosinec 2023					
	zahájení stavby - přípravné práce v žst. Pardubice-Rosice n. L.		10. březen 2021					
	ukončení hlavních stavebních prací v žst. Pardubice-Rosice n. L.		6. prosinec 2023					
	konec dokončovacíh prací v žst. Pardubice-Rosice n. L.		7. červen 2024					
	zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Pardubice-Rosice n. L. - Stěbová		10. březen 2021					
	ukončení hlavních stavebních prací v úseku Pardubice-Rosice n. L. - Stěbová		17. říjen 2023					
	konec dokončovacíh prací v úseku Pardubice-Rosice n. L. - Stěbová		4. červen 2024					
	SO 32-52-03 Pardubice-Rosice nad Labem - Stěbová, zastávka Stěbová obec, přístřešky na nástupištích		u koleje 2	14. březen 2022	12. květen 2022	2,0	8,6	60
	SO 32-54-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stěbová, zastávka Pardubice-Semtín, orientační systém		u koleje 2	14. březen 2022	12. květen 2022	2,0	8,6	60
	SO 32-54-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stěbová, zastávka Stěbová obec, orientační systém		u koleje 2	14. březen 2022	12. květen 2022	2,0	8,6	60
	SO 32-66-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stěbová, zastávka Pardubice-Semtín, venkovní osvětlení a rozvody nn		u koleje 2	14. březen 2022	12. květen 2022	2,0	8,6	60
	SO 32-66-05 Pardubice-Rosice nad Labem - Stěbová, zastávka Stěbová obec, venkovní osvětlení a rozvody nn		u koleje 2	14. březen 2022	12. květen 2022	2,0	8,6	60
	stavba úseků obou TK mimo kolisi se stávající trati			13. květen 2022	5. duben 2023	1,0	46,9	328
	PS 32-21-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stěbová, traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)		RD, výroba definitivního TZZ	13. květen 2022	5. duben 2023	10,9	46,9	328
	PS 32-22-01 Pardubice-Rosice nad Labem – Stěbová, DOK a TK		úpravy dle potřeb stavby TK nové úseky TK 1, 2 mimo konflikt se stávající TK	13. květen 2022	5. duben 2023	10,9	46,9	328
	SO 32-31-11 Pardubice-Rosice nad Labem - Stěbová, železniční spodek		u koleje 2: dokončení	13. květen 2022	21. červenec 2022	2,3	10,0	70
	SO 32-32-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stěbová, zastávka Pardubice-Semtín, vnější nástupiště		u koleje 2: dokončení	13. květen 2022	21. červenec 2022	2,3	10,0	70
SO 32-32-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stěbová, zastávka Stěbová obec, nová vnější nástupiště			5. březen 2023	5. duben 2023	1,1	4,6	32	
SO 32-34-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stěbová, železniční most v km 4,560 přes horkovod		stavba pod oběma kolejem: zahájení (příprava bez vlivu na provozovanou kolej)	5. březen 2023	5. duben 2023	1,1	4,6	32	
SO 32-34-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stěbová, železniční most v km 4,800 – podchod pro cestující a pěší			5. březen 2023	5. duben 2023	1,1	4,6	32	
SO 32-34-03 Pardubice-Rosice nad Labem - Stěbová, železniční most ev. km 6,215 přes vodoteč			5. březen 2023	5. duben 2023	1,1	4,6	32	
SO 32-34-04 Pardubice-Rosice nad Labem - Stěbová, železniční most ev. km 8,176 přes Velkou strouhu			13. květen 2022	21. červenec 2022	2,3	10,0	70	
SO 32-38-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stěbová, zastávka Pardubice-Semtín, přístupové komunikace na nástupiště, část SŽDC		u koleje 2: dokončení	13. květen 2022	21. červenec 2022	2,3	10,0	70	
SO 32-38-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stěbová, zastávka Pardubice-Semtín, přístupové komunikace na nástupiště, část Statutární město Pardubice		u koleje 2: dokončení	13. květen 2022	21. červenec 2022	2,3	10,0	70	
SO 32-51-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stěbová, úpravy oplacení		pokračování	13. květen 2022	5. duben 2023	10,9	46,9	328	
SO 32-52-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stěbová, zastávka Pardubice-Semtín, zastřešení výstupů z podchodu		u koleje 2: dokončení	13. květen 2022	21. červenec 2022	2,3	10,0	70	
SO 32-61-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stěbová, trakční vedení		základy podpěr 2N, 4N, 6N, 8N, 10N - 12N, 14N, 16N, 18N, 20N, 22N, 25N, 27N, 29N, 30N, 31N - 33N, 41N,						

[illegible]

Řádkový harmonogram výstavby

Modernizace trati Pardubice - Stéblová

Délka stavby (dny), bez následné úpravy kolejí:
967

Legenda:

vyluka

uzavírka/omezení PK

zabezpečovací a sdělovací zařízení

	kolejové úpravy (demontáž, žel. spodek, montáž)
--	---

 mostní objekty (podchody vč.zastřešení)

 objekty elektro

pozemní objekty, nástupiště, zastřešení, demolice

potrubní sítě

♦♦ hlavní milníky přípravy a výstavby

měsíce zimního období

===== délka dílčího stavebního postupu

— přípravné a dokončovací práce

 zkušební provo.

omezení silničního provozu

[illegible]

Rádkový harmonogram výstavby

Modernizace trati Pardubice - Stěblová


Délka stavby (dny), bez následné úpravy kolejí:
967

Legenda:

- výluka
- uzavírka/omezení PK







Modernizace trati Pardubice - Stěblová	
Délka stavby (dry), bez následné úpravy kolejí:	967






Legenda:





výfuka


uzavírka/omezení PK

	zabezpečovací a sdělovací zařízení
	kolejové úpravy (demontáž, žel. spodek, montáž)
	mostní objekty (podchody vč. zastřešení)
	objekty elektro
	pozemní objekty, nástupiště, zastřešení, demolice
	potrubní sítě







	kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž)
	mostní objekty (podchody vč.zastřešení)
	objekty elektro
	pozemní objekty,nástupišťe,zastřešení,demolice
	potrubní sítě






- mostní objekty (podchody vč. zastřešení)
- objekty elektro
- pozemní objekty, nástupiště, zastřešení, demolic
- potrubní sítě




	objekty elektro
	pozemní objekty, nástupiště, zastřešení, demolice
	potrubní sítě



 pozemní objekty, nástupiště, zastřešení, demolicce
 potrubní sítě


 potrubní síť


-  hlavní milníky přípravy a výstavby
-  měsíce zimního období
-  délka dílčího stavebního postupu
-  přípravné a dokončovací práce
-  zkušební provoz
-  omezení silničního provozu

-  měsíce zimního období
-  délka dílčího stavebního postupu
-  přípravné a dokončovací práce
-  zkušební provoz
-  omezení silničního provozu

 délka dílčího stavebního postupu
 přípravné a dokončovací práce
 zkušební provoz
 omezení silničního provozu

 přípravné a dokončovací práce
 zkušební provoz
 omezení silničního provozu

 zkušební provoz

 omezení silničního provozu

omezení silničního provozu

[illegible]

Rádkový harmonogram výstavby

Legenda:

Modernizace trati Pardubice - Stéblová

Délka stavby (dny), bez následné úpravy kolejí:
967

- výluka
- uzavírka/omezení PK

- zabezpečovací a sdělovací zařízení
- kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž)
- mostní objekty (podchody vč.zastřešení)
- objekty elektro
- pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice
- potrubní sítě
- hlavní milníky přípravy a výstavby
- měsíce zimního období
- délka dílčího stavebního postupu
- přípravné a dokončovací práce
- zkušební provoz
- omezení silničního provozu

Stavební úsek	Etapy	Popis činnosti	Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)	doba trvání (miniky)		měs.	týdny	dny	2021												2022												2023															
				od	do				01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
4d		zahájení soutěže na dodavatele		7. říjen 2020																																												
		výběr dodavatele		5. únor 2021																																												
		uzavření smlouvy a předání staveniště dodavateli		7. březen 2021																																												
		DPSR (dopracování projektu souhrnného řešení) SZZ Pardubice-Rosice n. L.: mobilní staniční zabezpečovací zařízení (MSZZ)		10. březen 2021	- 13. červen 2021	3,0	13,6	95																																								
		DPSR (dopracování projektu souhrnného řešení) SZZ Pardubice-Rosice n. L.: definitivní zabezpečovací zařízení (SZZ)		10. březen 2021	- 13. červen 2021	3,2	13,6	95																																								
		instalace a zkoušení MSZZ Pardubice-Rosice n. L.		14. červen 2021	- 25. říjen 2021	1,0	19,0	133																																								
		aktivace MSZZ Pardubice-Rosice n. L.		26. říjen 2021	- 16. listopad 2021	3,0	3,0	21																																								
		zapnutí MSZZ Pardubice-Rosice n. L.		16. listopad 2021																																												
		instalace a zkoušení SZZ Pardubice-Rosice n. L.		14. červen 2021	- 24. červen 2023	1,0	105,7	740																																								
		aktivace SZZ Pardubice-Rosice n. L.: stéblovské zhlaví		25. červen 2023	- 7. červenec 2023	1,0	1,7	12																																								
		aktivace SZZ Pardubice-Rosice n. L.: pardubické zhlaví		5. listopad 2023	- 9. prosinec 2023	1,0	5,0	35																																								
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice n. L.		10. březen 2021																																												
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice n. L.		6. prosinec 2023																																												
		konec dokončovacích prací v úseku Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice n. L.		16. prosinec 2023																																												
		zahájení stavby - přípravné práce v žst. Pardubice-Rosice n. L.		10. březen 2021																																												
		ukončení hlavních stavebních prací v žst. Pardubice-Rosice n. L.		6. prosinec 2023																																												
		konec dokončovacích prací v žst. Pardubice-Rosice n. L.		7. červen 2024																																												
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Pardubice-Rosice n. L. - Stéblová		10. březen 2021																																												
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Pardubice-Rosice n. L. - Stéblová		17. říjen 2023																																												
		konec dokončovacích prací v úseku Pardubice-Rosice n. L. - Stéblová		4. červen 2024																																												
		SO 32-34-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, železniční most v km 4,560 přes horkovod	stavba pod oběma kolejemi: dokončení	15. květen 2023	- 13. červen 2023	1,0	4,3	30																																								
		SO 32-34-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, železniční most v km 4,800 - podchod pro cestující a pěší	stavba pod oběma kolejemi: dokončení	15. květen 2023	- 13. červen 2023	1,0	4,3	30																																								
		SO 32-34-03 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, železniční most ev. km 6,215 přes vodoteč	stavba pod oběma kolejemi: dokončení	15. květen 2023	- 3. červenec 2023	1,7	7,1	50																																								
		SO 32-34-04 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, železniční most ev. km 8,176 přes Velkou struhu	stavba pod oběma kolejemi: dokončení	15. květen 2023	- 13. červen 2023	1,0	4,3	30																																								
		SO 32-34-21 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, železniční propustek ev. km 4,578 přes občasnou vodoteč	stavba pod oběma kolejemi: dokončení	15. květen 2023	- 13. červen 2023	1,0	4,3	30																																								
		SO 32-34-22 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, železniční propustek ev. km 5,375 přes vodoteč	stavba pod oběma kolejemi: dokončení	15. květen 2023	- 13. červen 2023	1,0	4,3	30																																								
		SO 32-34-23 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, železniční propustek ev. km 7,254 přes vodoteč	stavba pod oběma kolejemi: dokončení	15. květen 2023	- 13. červen 2023	1,0	4,3	30																																								
		SO 32-34-24 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, železniční propustek ev. km 7,857 přes vodoteč	stavba pod oběma kolejemi: dokončení	15. květen 2023	- 13. červen 2023	1,0	4,3	30																																								
		SO 32-34-25 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, železniční propustek ev. km 8,505 přes vodoteč	stavba pod oběma kolejemi: dokončení	15. květen 2023	- 13. červen 2023	1,0	4,3	30																																								
		SO 32-36-31 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, přeložka horkovodu 2 x DN 350 EOP v žkm 4,555	provedení	14. červen 2023	- 4. červenec 2023	0,7	3,0	21																																								
		SO 32-38-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Pardubice-Semtin, přístupové komunikace na nástupiště, část SŽDC	u koleje 1: pokračování	15. květen 2023	- 4. červenec 2023	1,7	7,3	51																																								
		SO 32-38-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Pardubice-Semtin, přístupové komunikace na nástupiště, část Statutární město Pardubice	u koleje 1: pokračování	15. květen 2023	- 4. červenec 2023	1,7	7,3	51																																								
		SO 32-40-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, PHS v km 4,811 - 5,258 vlevo	dokončení	15. květen 2023	- 4. červenec 2023	1,7	7,3	51																																								
		SO 32-40-03 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, PHS v km 7,042 - 7,082 vlevo	dokončení	15. květen 2023	- 4. červenec 2023	1,7	7,3	51																																								
		SO 32-51-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, úpravy oplocení	dokončení	15. květen 2023	- 4. červenec 2023	1,7	7,3	51																																								
		SO 32-52-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Pardubice-Semtin, přístřešky na nástupišťích	u koleje 1: pokračování	15. květen 2023	- 4. červenec 2023	1,7	7,3	51																																								
		SO 32-52-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Pardubice-Semtin, zastřešení výstupů z podchodu	u koleje 1: pokračování	15. květen 2023	- 4. červenec 2023	1,7	7,3	51																																								
		SO 32-55-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Pardubice-Semtin, demolice technologického domku	provedení	14. červen 2023	- 4. červenec 2023	0,7	3,0	21																																								
		SO 32-61-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, trakční vedení	montáž sudých podpěr (dokončení) + TV nové TK 2 + základy zbylých lichých podpěr (zahájení)	14. červen 2023	- 4. červenec 2023	0,7	3,0	21																																								
		SO 32-61-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, TM Stéblová, úprava připojení napájecího vedení	provedení	14. červen 2023	- 4. červenec 2023	0,7	3,0	21																																								
		SO 32-66-03 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, železniční most v km 4,800 - podchod pro pěší - elektroinstalace	provedení	14. červen 2023	- 4. červenec 2023	0,7	3,0	21																																								
SO 32-66-07 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, TM Stéblová, úprava dálkového ovládání úsekových odpojovačů	provedení	14. červen 2023	- 4. červenec 2023	0,7	3,0	21								</																																		

Rádkový harmonogram výstavby

Modernizace trati Pardubice - Stéblová

Délka stavby (dny), bez následné úpravy kolejí:
967

Legenda:

- výtluka
- uzavírka/omezení PK

Stavební úsek	Etapy	Popis činnosti		dobu trvání (mínulky)		més.	týdny	dry	
		Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)		od - do					
		zahájení soutěže na dodavatele			7. říjen 2020				
	výběr dodavatele				5. únor 2021				
	uzavření smlouvy a předání staveniště dodavateli (MSZZ)				7. březen 2021				
	DPSR (dopracování projektu souhrnného řešení) SZZ Pardubice-Rosice n. L.: mobilní staniční zabezpečovací zařízení			10. března 2021	13. červen 2021	3,0	13,6	95	
	DPSR (dopracování projektu souhrnného řešení) SZZ Pardubice-Rosice n. L.: definitivní zabezpečovací zařízení (SZZ)			10. března 2021	13. červen 2021	3,2	13,6	95	
	instalace a zkoušení MSZZ Pardubice-Rosice n. L.			14. červen 2021	25. říjen 2021	1,0	19,0	133	
	aktivace MSZZ Pardubice-Rosice n. L.			26. říjen 2021	16. listopad 2021	3,0	3,0	21	
	zapnutí MSZZ Pardubice-Rosice n. L.			16. listopad 2021					
	instalace a zkoušení SZZ Pardubice-Rosice n. L.			14. červen 2021	24. červen 2023	1,0	105,7	740	
	aktivace SZZ Pardubice-Rosice n. L.: stěbovské zhlaví			25. červen 2023	7. červenec 2023	1,0	1,7	13	
	aktivace SZZ Pardubice-Rosice n. L.: pardubické zhlaví			5. listopad 2023	9. prosinec 2023	1,0	5,0	35	
	zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice n. L.			10. března 2021					
	ukončení hlavních stavebních prací v úseku Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice n. L.			6. prosinec 2023					
	konec dokončovacíh prací v úseku Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice n. L.			16. prosinec 2023					
	zahájení stavby - přípravné práce v žst. Pardubice-Rosice n. L.			10. března 2021					
	ukončení hlavních stavebních prací v žst. Pardubice-Rosice n. L.			6. prosinec 2023					
	konec dokončovacíh prací v žst. Pardubice-Rosice n. L.			7. červen 2024					
	zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Pardubice-Rosice n. L. - Stěbová			10. března 2021					
	ukončení hlavních stavebních prací v úseku Pardubice-Rosice n. L. - Stěbová			17. říjen 2023					
	konec dokončovacíh prací v úseku Pardubice-Rosice n. L. - Stěbová			4. červen 2024					
	SO 32-66-08 Pardubice-Rosice nad Labem - Stěbová, TM Stěbová, úprava návěští pro elektrický provoz	provedení		14. červen 2023	4. červenec 2023	0,7	3,0	21	
	SO 32-66-09 Pardubice-Rosice nad Labem - Stěbová, magistralní rozvod 22kV SŽDC dokončení			15. květen 2023	16. červen 2023	1,1	4,7	33	
	SO 32-67-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stěbová, ukojení vodních konstrukcí	provedení		14. červen 2023	4. červenec 2023	0,7	3,0	21	
	nová traťová kolej 1				5. červenec 2023	17. říjen 2023	3,5	15,0	105
	PS 32-22-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stěbová, zastávka Pardubice-Semtin, rozhlasové zařízení	montáž: nástupiště u koleje 1		28. září 2023	17. říjen 2023	0,7	2,9	20	
	PS 32-22-04 Pardubice-Rosice nad Labem - Stěbová, zastávka Stěbová obec, rozhlasové zařízení	montáž: nástupiště u koleje 1		28. září 2023	17. říjen 2023	0,7	2,9	20	
	PS 32-22-03 Pardubice-Rosice nad Labem - Stěbová, zastávka Pardubice-Semtin, informační systém pro cestující	montáž: nástupiště u koleje 1		28. září 2023	17. říjen 2023	0,7	2,9	20	
	PS 32-22-05 Pardubice-Rosice nad Labem - Stěbová, zastávka Stěbová obec, informační systém pro cestující	montáž: nástupiště u koleje 1		28. září 2023	17. říjen 2023	0,7	2,9	20	
	SO 32-31-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stěbová, železniční svršek	TK 1		28. září 2023	17. říjen 2023	0,7	2,9	20	
	SO 32-31-11 Pardubice-Rosice nad Labem - Stěbová, železniční spodek	TK 1 dokončení		5. červenec 2023	27. září 2023	2,8	12,1	85	
SO 32-32-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stěbová, zastávka Pardubice-Semtin, vnější nástupiště	u koleje 1: dokončení		5. červenec 2023	24. červenec 2023	0,7	2,9	20		
SO 32-32-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stěbová, zastávka Stěbová obec, nová vnější nástupiště	u koleje 1: dokončení		5. červenec 2023	24. červenec 2023	0,7	2,9	20		
SO 32-34-31 Pardubice-Rosice nad Labem - Stěbová, silniční most přes trať v žkm 4,608 na silnici I/36, zábrany proti dotyku	provedení		28. září 2023	17. říjen 2023	0,7	2,9	20		
SO 32-34-32 Pardubice-Rosice nad Labem - Stěbová, silniční most přes trať v žkm 7,005 na silnici III/0375, zábrany proti dotyku	provedení		28. září 2023	17. říjen 2023	0,7	2,9	20		
SO 32-38-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stěbová, zastávka Pardubice-Semtin, přístupové komunikace na nástupiště, část SŽDC	u koleje 1: dokončení		5. červenec 2023	24. červenec 2023	0,7	2,9	20		
SO 32-38-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stěbová, zastávka Pardubice-Semtin, přístupové komunikace na nástupiště, část Statutární město Pardubice	u koleje 1: dokončení		5. červenec 2023	24. červenec 2023	0,7	2,9	20		
SO 32-52-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stěbová, zastávka Pardubice-Semtin, přístřešky na nástupištech	u koleje 1: dokončení		5. červenec 2023	24. červenec 2023	0,7	2,9	20		
SO 32-52-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stěbová, zastávka Pardubice-Semtin, zastřešení výstupů z podchodu	u koleje 1: dokončení		5. červenec 2023	24. červenec 2023	0,7	2,9	20		
SO 32-52-03 Pardubice-Rosice nad Labem - Stěbová, zastávka Stěbová obec, přístřešky na nástupištech	u koleje 1		5. červenec 2023	24. červenec 2023	0,7	2,9	20		
SO 32-54-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stěbová, zastávka Pardubice									

uzavírka/omezení PK

[illegible]

Rádkový harmonogram výstavby

Legenda:

Modernizace trati Pardubice - Stéblová

Délka stavby (dny), bez následné úpravy kolejí:
967

výluka
uzavírka/omezení PK

zabezpečovací a sdělovací zařízení
kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž)
mostní objekty (podchody vč.zastřešení)
objekty elektro
pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice
potrubní síť
hlavní milníky přípravy a výstavby
měsíce zimního období
délka dílčího stavebního postupu
přípravné a dokončovací práce
zkušební provoz
omezení silničního provozu

Stavební úsek	Etapy	Popis činnosti Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)	doba trvání od - do (minútky)	més.	týdny	dny	2021												2022												2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Stéblová		zahájení soutěže na dodavatele	7. říjen 2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
