




Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Orientační schéma:

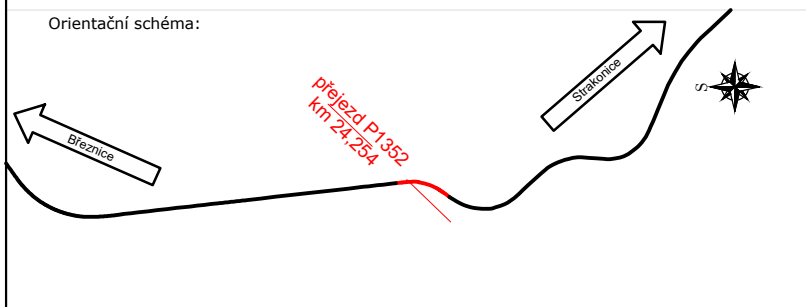




Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	30.04.2022	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Stanislav Rýznar

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	

<p>Zhotovitel stavby:</p> <p>Adresa:</p> <p>Kontakt:</p>	<p>SAGASTA s.r.o.</p> <p>Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka</p> <p>T: +420 261 344 100</p> <p>E: info@sagasta.cz</p> <div data-bbox="1005 1120 1404 1178">  </div>		
<p>Zhotovitel objektu:</p> <p>Adresa:</p> <p>Kontakt:</p>	<p>SAGASTA s.r.o.</p> <p>Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka</p> <p>T: +420 261 344 100</p> <p>E: info@sagasta.cz</p> <div data-bbox="1005 1178 1404 1234">  </div>		
<p>Hlavní projektant (HIP):</p> <p>Ing. Stanislav Rýznar</p>	<p>Specialista:</p> <p>Bc. Peter Čapek</p>	<p>Odpovědný projektant:</p> <p>Bc. Peter Čapek</p>	<p>Zpracovatel:</p> <p>Bc. Peter Čapek</p>

Název stavby/akce:	Výstavba PZS (P1352) v km 24,254 trati Březnice - Strakonice			Označení (S-kód): S 632000131
				Označení zhotovitele: 120081
Název části:	Zásady organizace výstavby			Označení části: B.8
Název objektu:	Zásady organizace výstavby			Označení objektu/komplexu:
Název přílohy:	Harmonogram stavby			Číslo přílohy: 2 102
Název dílčí části přílohy:				Paré:
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:		
Jihočeský	Blatná, Sedlice	043108		
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:	
DUSP	06/2021	3 × A4	1:500	

S-kód:										Stupeň dokumentace:					Část:					Objekt:					Podobjekt:					Příloha:					Revize:								
5	6	3	2	0	0	0	1	3	1	-	D	U	S	P	-	B	8	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	-	2	-	1	0	2	-	0	0	0

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA, s.r.o.

Výstavba PZS v km 24,254 (P1352) trati Březnice - Strakonice



Harmonogram výstavby

ID	Číslo PS/SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Půlrok 2, 2022												Půlrok 1, 2023					Půlrok 2, 2023						
						Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P					
1		Výstavba PZS v km 24,254 (P1352) trati Březnice - Strakonice																											
2																													
3		Celkem stavba	447 dny?	01.08. 22	21.10. 23																								
4		Přípravné práce	31 dny	01.08. 22	31.08. 22	1.08.																							
5		Stavební postup 1	84 dny	01.09. 22	23.11. 22	01.09.																							
6		Stavební postup 2a	128 dny?	26.05. 23	30.09. 23																								
7		Stavební postup 2b	18 dny	01.10. 23	18.10. 23																								
8		Dokončovací práce	3 dny	19.10. 23	21.10. 23																								
9																													
10																													
11		Stavební postupy	447 dny?	01.08. 22	21.10. 23																								
12		Přípravné práce	31 dny	01.08. 22	31.08. 22																								
13		Vytýčení sítí	1 den	01.08. 22	01.08. 22	1.08.																							
14		Kácení dřevin pro náhradní pozemní komunikaci za rušený přejezd	30 dny	02.08. 22	31.08. 22	2.08.																							
15		Výkopové práce pro pokládku kabelizace včetně protlaků.	30 dny	02.08. 22	31.08. 22																								
16		Příprava zařízení staveniště	8 dny	02.08. 22	09.08. 22	2.08.																							
17																													
18		Stavební postup 1	84 dny	01.09. 22	23.11. 22																								
19		Úprava zemní pláně pro výstavbu části náhradní pozemní komunikace (k rybníku)	20 dny	01.09. 22	20.09. 22	01.09.																							
20		Odtěžení části zemní pláně	7 dny	21.09. 22	27.09. 22	21.09.																							
21		Zřizování konstrukčních vrstev části pozemní komunikace včetně hutnění	15 dny	28.09. 22	12.10. 22	28.09.																							
22		Pokládka mechanického kameniva pro část nahrazující pozemní komunikace (k rybníku) a hutnění	15 dny	13.10. 22	27.10. 22	13.10.																							

Výstavba PZS v km 24,254 (P1352) trati Březnice - Strakonice

Harmonogram výstavby

ID	Číslo PS/SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Přehled termínů a stavu																		
						Č	Půlrok 2, 2022						Půlrok 1, 2023					Půlrok 2, 2023						
						Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P
23		Pokládka asfaltového betonu na napojovací část pozemní komunikace (k rybníku) včetně dorovnání v místě styku dvou rozdílných materiálů	5 dny	28.10. 22	01.11. 22																			
24		Vyklízení částí nahrazující komunikace a uvedení do provozu.	1 den	02.11. 22	02.11. 22																			
25		Výkopové práce pro základy výstražníků, reléového domku a přípojkové skříně.	4 dny	03.11. 22	06.11. 22																			
26		Pokládka kabelizace zabezpečovacího zařízení a silnoproudého zařízení.	10 dny	07.11. 22	16.11. 22																			
27		Terénní úpravy, zneplatnění výstražníků	2 dny	17.11. 22	18.11. 22																			
28		Vyklízení zařízení staveniště včetně úpravy povrchů	5 dny	19.11. 22	23.11. 22																			
29																								
30		Stavební postup 2a	128 dny	26.05. 23	30.09. 23																			
31		Budování zařízení staveniště	2 dny	26.05. 23	27.05. 23																			
32		Úprava zemní pláně pro výstavbu zbylé části náhradní pozemní komunikace za zrušený přejezd	20 dny	28.05. 23	16.06. 23																			
33		Snesení asfaltového povrchu dotčené pozemní komunikace v místech napojení na silnici III. třídy	7 dny	28.05. 23	03.06. 23																			
34		Odtěžení části zemní pláně pro výstavbu propustků	7 dny	17.06. 23	23.06. 23																			
35		Výstavba podkladního betonu a železobetonové desky včetně zrání betonu	4 dny	24.06. 23	27.06. 23																			
36		Pokládka železobetonové trouby včetně asfaltového nátěru	2 dny	28.06. 23	29.06. 23																			
37		Zřizování konstrukčních vrstev pozemní komunikace včetně hutnění	40 dny	30.06. 23	08.08. 23																			

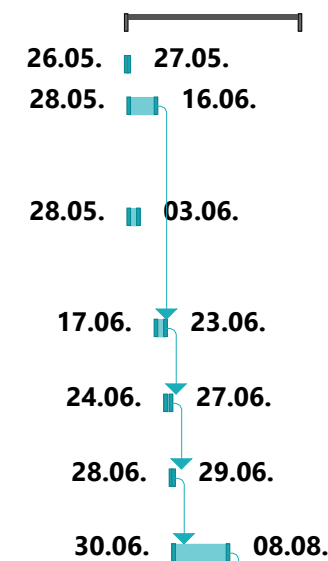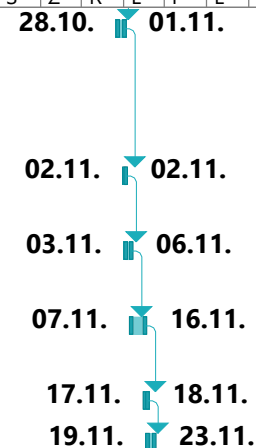

Výstavba PZS v km 24,254 (P1352) trati Březnice - Strakonice

Harmonogram výstavby

ID	Číslo PS/SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Č	Půlrok 2, 2022						Půlrok 1, 2023					Půlrok 2, 2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
38		Pokládka mechanického kameniva pro nahrazující pozemní komunikaci za rušený přejezd a hutnění	40 dny	09.08. 23	17.09. 23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Výstavba PZS v km 24,254 (P1352) trati Březnice - Strakonice

Harmonogram výstavby

ID	Číslo PS/SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení																			
						Č	Půlrok 2, 2022						Půlrok 1, 2023					Půlrok 2, 2023						
						Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P
52		Provedení bednění na vtoku, armování a betonáže dříku čela římsy, hydroizolační nátěry	1 den	10.10. 23	10.10. 23																			
53		Budování železničního spodku včetně odvodnění podél řešeného úseku a zásypu budovaných propustků včetně hutnění	2 dny	10.10. 23	11.10. 23															10.10.				11.10.
54		Pokládka železničního svršku a kolejového roštu	3 dny	11.10. 23	13.10. 23															11.10.				13.10.
55		Výškové a směrové vyrovnaní celého řešeného úseku	1 den	14.10. 23	14.10. 23															14.10.				14.10.
56		Instalace opěrných zídek přejezdové konstrukce do betonu	2 dny	15.10. 23	16.10. 23															15.10.				16.10.
57		Instalace přejezdové konstrukce	1 den	17.10. 23	17.10. 23															17.10.				17.10.
58		Výkopové práce pro základy výstražníků	2 dny	04.10. 23	05.10. 23															04.10.				05.10.
59		Instalace výstražníků a břevna přejezdového zabezpečovacího zařízení včetně zapojení	2 dny	06.10. 23	07.10. 23															06.10.				07.10.
60		Instalace nového softwaru SZZ vŽST Blatná v době dopravního klidu osobní dopravy (23:30 – 4:00 hod.).	1 den	06.10. 23	06.10. 23															06.10.				06.10.
61		Instalace počítačích bodů a přejezdníků včetně zapojení	1 den	15.10. 23	15.10. 23															15.10.				15.10.
62		Zkoušení PZS a uvedení do provozu	3 dny	16.10. 23	18.10. 23															16.10.				18.10.
63																								
64		Dokončovací práce	3 dny	19.10. 23	21.10. 23																			
65		Snesení přejezdové konstrukce rušeného přejezdu P1353 a odstranění dočasného napojení na nahrazující komunikaci	3 dny	19.10. 23	21.10. 23															19.10.				21.10.
66		Vyklízení zařízení staveniště včetně úpravy povrchů	3 dny	19.10. 23	21.10. 23															19.10.				21.10.
67		Povrchové úpravy po výkopových pracích.	3 dny	19.10. 23	21.10. 23															19.10.				21.10.
68		Budování značení na dotčených pozemních komunikacích.	3 dny	19.10. 23	21.10. 23															19.10.				21.10.
