

Středisko - závod

Stavební deník

stavby Generální oprava mostu v km 26.049 trati
Strážná - Horní lida

Základní list - adresář

pro objekt (označ. podle invest. plánu)

úsek

obec *Korní Wale*

Kraj

Levomoňovský

Okres

Vrátna

Místo

Zúčastněné strany:

Jména, adresy, telef. odpov. zástupců:

Přímý investor

Vrchní investor (HS)

Ústřední investor

Hlavní investor

Technický (stavební) dozor investora

Stálý

Občasný

Generální dodavatel

Mosťní obvod Buelke

Hlavní stavbyvedoucí

Stavbyvedoucí

Generální projektant

Odpovědný projektant

Autorský dozor

ing. Michael Kd

Změny a doplňky

Počasí: Zataženo +1°C
 Pracovní doba: 6.00 - 16.30 hod.
 Počet zam: 1 + 6 zaměstnanci
 Druh práce: Výroba konsol pro OK - příkopy pro pře-
 přemístění a uložení materiálů

1.3.1984

Počasí: Zataženo +2°C
 Pracovní doba: 6.00 - 12.00 hod.
 Počet zam: 6 zaměstnanci
 Druh práce: Výroba konsol pro OK a čistič pro centrické
 uložení mostnic

2.3.1984

Počasí: Zataženo 0°C
 Prac. doba: 8.00 - 14.30 hod.
 Počet zam: 1 + 2 zaměstnanci
 Druh práce: Výroba konsol pro OK

5.3.1984

Počasí: Zataženo +2°C
 Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod.
 Počet zam: 1 + 4 zaměstnanci
 Druh práce: Výroba konsol pro OK - výroba dílců pro centrické
 uložení mostnic
 Hoblování kbelů a soustružení podložek z trubky
 Ø 159/5 vyrobeno v lok. dílně V. Benčíkovi

6.3.1984

Počasí: Zataženo +1°C
 Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod.
 Počet zam: 1 + 5 zaměstnanci
 Druh práce: Výroba dílců pro centrické uložení mostnic

11.3.1984

Počasí: Polojasno +1°C
 Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod.
 Počet zam: 1 + 5 zaměstnanci
 Druh práce: Výroba dílců pro centrické uložení mostnic -
 polévání materiálů pro kbelky podložek
 mostnic

8.3.1984

Přesli: Polojasno - 1°C

9.3.1984

Prac. doba: 6.00 - 12.00 hod.

Počet zam: 1+6 rolníků

Druh práce: Výroba dílen pro centrické uložení mostnic -
výroba korbelů pro podlahové nosníky

Přesli: Zatočeno 0°C

12.3.1984

Prac. doba: 8.00 - 14.30 hod.

Počet zam: 1+6 rolníků

Druh práce: Výroba dílen pro centrické uložení mostnic -
výroba korbelů pro podlahové nosníky

Přesli: Zatočeno +2°C

13.3.1984

Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod.

Počet zam: 1+5 rolníků

Druh práce: Výroba dílen pro centrické uložení mostnic -
výroba korbelů pro podlahové nosníky

Přesli: Zatočeno +1°C

14.3.1984

Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod.

Počet zam: 1+5 rolníků

Druh práce: Výroba dílen pro centrické uložení mostnic -

Na 20.3.1983 provedena kontrola hotových prací. Proto
byly přečísleny a porovnány na km 17,152 Brno -
V. Přibor.

V době od 11/3.84 do 24/3.84 provedla četa z Mělníka
v Brnělně tyto práce: Naladění a složení provizoria Faltus, demontáž
a montáž této provizoria, opravování proužků, resitování provizoria,
montáž proužků a napájení nosníků IP 700 na rošty.

Přesli: Zatočeno +4°C

4.4.84

Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod.

Počet zam: 3 rolníků

Druh práce: Ukládání a přeprava větví pro uložení provizoria
na opěry

Počasí: Polojasno + 8°C

Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod

Počet zam: 1 + 2 směrníků

Druh práce: Nalození, odvoz, složení klinků na vyrovnání opěr
na motorový vozík. Složení z vozíku na mostě a
vyrovnání uložné plochy proložení provizoria

10. 4. 1984

Počasí: Polojasno + 9°C

Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod

Počet zam: 1 + 2 směrníků

Druh práce: Nalození řízev a jeho vyjítím na regoně v
Broděm

11. 4. 1984

Počasí: Jasno + 16°C

Prac. doba: 8.00 - 14.30 hod

Počet zam: 1 + 6 směrníků

Druh práce: Uložba ocobýd roků pod posadnice

16. 4. 1984

Počasí: Jasno + 13°C

Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod

Počet zam: 1 + 6 směrníků

Druh práce: Uložba ocobýd roků dokončení a bžb
Uložba plety pod provizorium a bžb vyjítím

17. 4. 1984

Počasí: Jasno + 12°C

Prac. doba: 6.00 - 16.30

Počet zam: 1 + 6 směrníků

Druh práce: Přikládání práce - nakládání materiálu na
motorový vozík.

18. 4. 1984

Počasí: Jasno + 12°C

Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod.

Počet zam: 1 + 6 směrníků

Druh práce: Složení materiálu z motorového vozíku a úprava
opěr a rozložení spádů roků

19. 4. 1984

Počasí: Jasně + 11°C

20.4.1984

Prac. doba: 6.00 - 12.00 hod

Počet zam: 1+6 řemeslníků

Druh práce: Zřízení větrného letem pro odpočet kontrol

Na ložném provizoria a roštu

Jedná z LD V. Dvůrčiči + Převoz

Počasí: Zataženo + 8°C

21.4.1984

Prac. doba: 8.00 - 14.30 hod

Počet zam: 1+5 řemeslníků

Druh práce: Příprava výlukové práce - výroba roštrů, podlah

Počasí: Polojasně + 12°C

25.4.1984

Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod

Počet zam: 1+5 řemeslníků

Druh práce: Výluke podlah GND - demontáž podlah,
roštrů a kontrol. Zhotovení kotveních roštrů

Počasí: Jasně + 14°C

26.4.1984

Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod 2 koleje přečty EDK 700

Počet zam: 1+5 řemeslníků MO-Buna + LD-Ostrava

Druh práce: Výlukové práce - vyjmutí OK z kol. č. 2 a ložném
provizoria Faltní

Počasí: Zataženo + 3°C přehledy

29.4.1984

Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod

Počet zam: 1+5 řemeslníků

Druh práce: Dokončování práce na provizoria a odvoz materiálů
a materiálů

Ověření stability provizoria na mostě, os. vod. koleji

4150 mm, sednutí 5 mm, převisnutí na mostě

cca 30 mm. - pro jednoduchou provozu na mostě

Počasí: Zataženo + 2°C přehledy

Ing. Machal

Prac. doba: 6.00 - 12.00 hod

28.4.1984

Počet zam: 1+5 řemeslníků

Druh práce: Uložení materiálů a šrotu ve V. Dvůrčiči

28.4.1984

Převážně nepříjemná vyjmutí kostra 23.5.84
 Pod mostníkem pan vyšetřování
 plachty železní klauzury - až do 12m,
 měřící pan měřičem plachty.
 Součástí je s přírodním vyjmutím
 části přímé kování páru Předpo-
 kladem je, že bude k dispozici
 pásmo st. 12m pro celou
 délku mostku. Pak je možno ještě
 části pásmo pásmových nepo-
 řádek. Přitom nutno dbát, aby
 celková klauzura pásmo byla do-
 držena a doplněna délky. Pak
 pásmo nebude k dispozici bude
 upraveno provedena podle projektu
 s tím, že měla být podrobně
 vyšetřena se přehledem.

M. J. J. J.

Počesí: Zetřeno dle + 1100

24.5.1984

Proč. práce: 6⁰⁰ - 16³⁰ hod.

Počesí: 1 + 5 dle měřičů

Druh práce: Srovnání konstrukce z rogovu ruční a
 provádění demontáže polohových plachty
 střechu polohy

M. J. J. J.

24.5.1984.

Na základě vč. lepsi práci dle dle
 měřiče k očištění práce 4 vzhledu z kování
 pásmo za vzhledu z vzhledu kování
 v práci, se vzhledu kování (obě) vzhledu
 bude kování (tj. bude se prováděna kování
 11343 a 18.) dle vzhledu práce k očištění vzhledu
 vzhledu. Míst s. k. na, c. dle vzhledu u vzhledu
 kování vzhledu s. k. k. k. k. k.

- 1, kování pásmo - jeden vzhled
- 2, vzhled vzhled 3x3 cm - kování
- 3, bude provedena kování vzhledu vzhledu

24 25 26

U prilogu, te ovaj projekt, te
 ovaj novi putnici ul. u ovom isom-
 aru, kao polovna zrel-
 ti. prilikom list prilozi te pošto

800 500. kel

Podaci: Poljesno + 1406

Proc. date: 6⁰⁰ - 12⁰⁰ hrd

Родет ми: 1+4 кинески

Drugi prijed: Oprema OK - dodatni materijal

25.5.1984

Podaci: laboratorij + 130C

prec. cloba: 8.⁰⁰ - 14.³⁰ hod.

Point com: 1 + 426 m

Drak pŕaŕa: Oprava Olŕ - montáŕ kontrol - vyŕobnĕ poŕbĕhŕ
nosnĕkŕ

28.5.1984

Počasi i labava + 15°C

Proc. class: 6:00 - 11:30 hrs.

Point van 1+5 dimensionen

Druh práce: Oprava OK - montáž podlahových desek,
výroba chodníkové podlahy. *ll*

29.5.1984

Počasí: letárená + 14°C

Proc. date: 6.00-16.30

Роль нем: 1+5 человек

Drugi priča: Oprova OK - možda i chodim i na godišnjicu

30.5.1984

Počasí: hejčane +16°C

Prei. clbe: 6^h - 16:30 hcl.

Рост см: 1 + 5 сантиметров

Druh práce: Oprava OK - výměna posuvu na kolový
rolník OK

31.5.1984

Denní záznamy stavby:

List č.



7

Datum

Počasí: Polojasno + 22°C

Prac. doba: 6.00 - 11.00 hod.

Počet zam.: 1 + 4 rolníků

Druh práce: Demontáž podlah - podlahový nosník a
kontrola.

M-12

1.6.1984

Počasí: Polojasno + 28°C

Prac. doba: 8.00 - 14.30 hod.

Počet zam.: 1 + 4 rolníků

Druh práce: Montáž kontrol na vnější straně OK a
výroba podlahový nosník

M-12

4.6.1984

Počasí: letákové + 26°C

Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod.

Počet zam.: 4 rolníků

Druh práce: Montáž podlahový nosník a výroba
chodníkové podlahy

M-1

5.6.1984

Počasí: letákové + 22°C

Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod.

Počet zam.: 5 rolníků

Druh práce: Výroba chodníkové podlahy

M-12

6.6.1984

Počasí: Polojasno + 18°C

Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod.

Počet zam.: 5 rolníků

Druh práce: Montáž chodníkové podlahy a jejich revize
OK před opravou

M-12

7.6.1984

Počasí: Polojasno + 16°C

Prac. doba: 6.00 - 12.00 hod.

Počet zam.: 1 + 4 rolníků

Druh práce: Odpočetní práce pro stavbu mostičky a
jejich kontrolu.

M-12

8.6.1984

Počasí: Polojasno + 18°C

Prac. doba: 8.00 - 14.30 hod.

Počet zam.: 1 + 4 rolníků

Druh práce: Demontáž kotelů v chladicím okruhu
kotelový chlazení

M-12

11.6.1984

Počasí: letní + 13°C

14. 6. 1984

Prac. doba: 6⁰⁰ - 16⁰⁰ hod

Počet žen: 1 + 6 ženinů

Prac. práce: výška ucelených dřev a říjící ucelených
rebrůvých horní posuvce pro uvození list

M. J.

Počasí: letní + 15°C

15. 6. 1984

Prac. doba: 6⁰⁰ - 12⁰⁰ hod

Počet žen: 1 + 5 ženinů

Prac. práce: horní kbelce ucelených na ok - rebrůvých
horní posuvce pro uvození list

M. J.

Počasí: letní + 15°C

16. 6. 1984

Prac. doba: 8⁰⁰ - 14⁰⁰ hod

Počet žen: 1 + 4 ženinů

Prac. práce: Oprava ok - výška a ucelených rebrůvých

M. J.

21. 6. 1984

Prac. práce: práce pro na práci
materiálu se dřevem na rebrůvých dřevěch
uhořelých dřevěch a dřevěch dřevěch
u. p. dřev.

J. Štěl

Prac. práce a prohlášení horní posuvce na
magnetu a ucelených horní posuvce pro uvození list

22. 6. 84

Počasí: letní + 16°C

Prac. doba: 6⁰⁰ - 12⁰⁰ hod

Počet žen: 1 + 5 ženinů

Prac. práce: výška posuvce - ucelených posuvce pod
listy ucelených ucelených posuvce.
Dělníci podlah a kotel.

M. J.



Počasí: Zataženo, +18°C přehánky

2. 4. 1984

Prac. doba: 8⁰⁰ - 14³⁰ hod

Počet zam: 1+5 směrníků

Druh práce: Navazování list centrického ukladání
mostnic, výrobka list

M. J.

Počasí: Polejano +17°C

3. 4. 1984

Prac. doba: 6⁰⁰ - 16³⁰ hod.

Počet zam: 1+3 směrníků

Druh práce: Demontáž roštrů, podlah, podlahových
normálních konzol.

M. J.

Počasí: Zataženo +16°C

5. 4. 1984

Prac. doba: 6⁰⁰ - 16³⁰ hod

Počet zam: 4 směrníků

Druh práce: Navazování a výroba list pro centrické
ukládání mostnic, výměna
porozích uhlíků 2x 1,7m

M. J.

Počasí: Polejano +19°C

6. 7. 1984

Prac. doba: 6⁰⁰ - 12⁰⁰

Počet zam: 5 směrníků

Druh práce: Kvalitní vyčištění a jednodušší vyčištění vyti
Příprava veličností pro podlahy odstav

M. J.

Počasí: Jasně +24°C

9. 4. 1984

Prac. doba: 8⁰⁰ - 14³⁰ hod

Počet zam: 1+4 směrníků

Druh práce: Dokončení demontáže konzol a ujetí svíček

M. J.

Počasí: Jasně +28°C

10. 4. 1984

Prac. doba: 6⁰⁰ - 16³⁰ hod

Počet zam: 1+3 směrníků

Druh práce: Čištění a svíčkovaní podlah a podlahových
normálních

M. J.

Počasí: Jasně +32°C

11. 4. 1984

Prac. doba: 6⁰⁰ - 16³⁰ hod.

Počet zam: 1+4 směrníků

Druh práce: Podlahy odstav OK o 25m v důsledku
tryskání a metalizace

M. J.

Denní záznamy stavby:

List č.

* 10

Datum

Počasí: Jasná + 34°C

12. 4. 1984

Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod.

Počet zam: 1 + 3 náteřníci

Druh práce: Dokončení podlahového posuvu OK pro
tryskačím a metalizací. Polotíní
144, seřadí 3x1m.

Počasí: Polojasno + 23°C

16. 4. 1984

Prac. doba: 8.00 - 14.30 hod.

Počet zam: 3 náteřníci

Druh práce: Příprava materiálů a nářadí pro
tryskačím a metalizací OK
Zdrůtkelní OK pro tryskačím.

Počasí: Polojasno + 21°C

17. 4. 1984

Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod.

Počet zam: 3 náteřníci

Druh práce: Snížení písku pro tryskačím

Počasí: Zataženo + 12°C

18. 4. 1984

Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod.

Počet zam: 3 náteřníci

Druh práce: Tryskačím a metalizací OK

Počasí: Zataženo + 20°C

19. 4. 1984

Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod.

Počet zam: 3 náteřníci

Druh práce: Tryskačím a metalizací OK

Počasí: Zataženo + 16°C

20. 4. 1984

Prac. doba: 6.00 - 12.00 hod.

Počet zam: 3 náteřníci

Druh práce: Tryskačím a metalizací OK

Počasí: Jasná + 25°C

23. 4. 1984

Prac. doba: 8.00 - 14.30 hod.

Počet zam: 3 náteřníci

Druh práce: Tryskačím a metalizací OK

Denní záznamy stavby:

List č.

* 11

Datum

Počasí: Polojasno +21°C

24.4.1984

Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod.

Počet zam: 3 natěrači

Druh práce: Tryskání a metalizace Ok. Snížení písku

M. J.

Počasí: Polojasno +23°C

25.4.1984

Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod.

Počet zam: 3 natěrači

Druh práce: Tryskání a metalizace Ok. Snížení písku

M. J.

Počasí: Jasně +28°C

26.4.1984

Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod.

Počet zam: 2 natěrači + 20. natěrači

Druh práce: Tryskání a metalizace Ok - snížení písku

M. J.

Počasí: Zetavěno +17°C

27.4.1984

Prac. doba: 6.00 - 12.00 hod.

Počet zam: 2 natěrači

Druh práce: Snížení písku, tryskání a metalizování

M. J.

Počasí: Polojasno +22°C

30.4.1984

Prac. doba: 8.00 - 14.30 hod.

Počet zam: 3 natěrači

Druh práce: Tryskání Ok, metalizace a snížení písku

M. J.

Počasí: Polojasno +21°C

31.4.1984

Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod.

Počet zam: 3 natěrači

Druh práce: Tryskání a metalizace Ok, snížení písku

M. J.

Denní záznamy stavby:

List č.

* 12

Datum

Počasí: Jasně + 35°C

1.8.1984

Prac. doba: 6.00 - 16.30

Počet ram: 3 natěrači

Druh práce: Třídění a metalizace OK

K. J.

Počasí: Zataženo + 19°C

2.8.1984

Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod.

Počet ram: 3 natěrači

Druh práce: Třídění a metalizace OK

K. J.

Dnešního dne byla provedena kontrolní prohlídka
při provádění povrchových úprav konstrukce mostu
po km 26,049 Str. H. Lideč - Táblov
Travníků metalizace je v souladu s předpřiz
a nebylo zjištěno odchyl

na TD Val. Menšík:

Byl odebrán 1st v. 9-11

J. Chalupa
M. Mura

Počasí: Jasně + 28°C

3.8.1984

Prac. doba: 6.00 - 12.00 hod

Počet ram: 3 natěrači

Druh práce: Třídění a metalizace OK

K. J.

Počasí: Polojasně + 22°C

6.8.1984

Prac. doba: 8.00 - 14.30 hod.

Počet ram: 3 natěrači

Druh práce: Třídění, metalizace a sušení písku

K. J.

Počasí: Zataženo + 23°C přehánky

4.8.1984

Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod.

Počet ram: 3 natěrači

Druh práce: Třídění, metalizace OK a sušení písku

K. J.

Počasí: Zataženo + 21°C přehánky

8.8.1984

Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod.

Počet ram: 3 natěrači

Druh práce: Sušení písku

K. J.

Počasí: Položeno + 26°C

Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod.

Počet zam: 3 materiáři

Druh práce: Třídění, metalizace OK a sušení písku

9.8.1984

Počasí: Položeno + 25°C

Prac. doba: 6.00 - 12.00 hod.

Počet zam: 3 materiáři

Druh práce: Třídění, metalizace OK a sušení písku

10.8.1984

Dne 10.8.1984 byla provedena kontrola zpracování OK a provedena porovnávací úprava. Kontrolou zjištěno, že zpracování je provedeno v souladu s projektem. Provedené změny byly ověřovány se zastupcem St. 13/2 SSO s ing. Tiskem. Provedení třídění a metalizace jim bylo sdruženo. Podle provedení ~~je~~ permitte krytí náletu na střešní plochu dle M. nově a zavěšením.

Počasí: Zataženo + 22°C

Prac. doba: 8.00 - 14.30 hod.

Počet zam: 3 materiáři

Druh práce: Třídění, metalizace OK a sušení písku

13.8.1984

Počasí: Položeno 27°C

Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod.

Počet zam: 3 materiáři

Druh práce: Třídění, metalizace OK - sušení písku

14.8.1984

Počasí: Položeno + 23°C

Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod.

Počet zam: 3 materiáři

Druh práce: Třídění, metalizace OK - sušení písku

15.8.1984

Denní záznamy stavby:

List č.

* 14

Datum

Počasí: Jasně + 24°C

16. 8. 84

Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod.

Počet žen: 3 nastěraci

Druh práce: Tykání a metalizace OK - svícní pítka

K. J.

Počasí: Jasně + 23°C

17. 8. 84

Prac. doba: 6.00 - 12.00 hod.

Počet žen: 3 nastěraci

Druh práce: Tykání a metalizace OK

K. J.

Počasí: Jasně + 24°C

20. 8. 84

Prac. doba: 8.00 - 14.30

Počet žen: 3 nastěraci

Druh práce: Větrání podlahových ploch svícní

K. J.

Počasí: Jasně + 26°C

21. 8. 84

Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod.

Počet žen: 3 nastěraci

Druh práce: Větrání podlahových ploch a kontrol

K. J.

Dnešního dne převzal nástupce TD G. ČERNÝ

Stručný stav: členka č. 1 a 3 + 12, 13

Zodpovědné byly převzaty 1. a 2. svícní

nastěrací kontrol a dodání nových prvků - (bez

přípominek); 17.000 provázek 1. kříže nastěrací

G. ČERNÝ

Počasí: 25°C - Jasně

22. 8. 1984

Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod.

Počet žen: 3 nastěraci

Druh práce: Tykání a metalizace OK

K. J.

Počasí: jasně + 26°C

23. 8. 1984

Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod.

Počet žen: 3 nastěraci

Druh práce: Tykání a metalizace OK

K. J.

Počasí: Jasně + 26°C

24. 8. 1984

Prac. doba: 6.00 - 12.00 hod.

Počet žen: 2 nastěraci

Druh práce: Tykání a metalizace OK

K. J.

Počasí: Polojasno + 16°C

24.8.1984

Prac. doba: 8.00 - 14.30 hod.

Počet lidí: 3 natěraci

Druh práce: Třískotín, metalizace OK - sušením písku

Počasí: Jasně + 22°C

28.8.1984

Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod.

Počet lidí: 3 natěraci

Druh práce: Sušením písku, třískotín a metalizace OK

Počasí: Jasně + 24°C

29.8.1984

Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod.

Počet lidí: 3 natěraci

Druh práce: Sušením písku, třískotín a metalizace OK

Počasí: Jasně + 24°C

30.8.1984

Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod.

Počet lidí: 3 natěraci

Druh práce: Sušením písku, třískotín a metalizace OK

Počasí: Jasně + 23°C

31.8.1984

Prac. doba: 6.00 - 12.00 hod.

Počet lidí: 3 natěraci

Druh práce: Sušením písku, třískotín a metalizace OK

Počasí: 22°C

3.9.1984

Prac. doba: 8.00 - 14.30 hod.

Počet lidí: 3 natěraci

Druh práce: Sušením písku, třískotín a metalizace OK

Počasí: 22°C

4.9.1984

Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod.

Počet lidí: 3 natěraci

Druh práce: Sušením písku, třískotín a metalizace OK

Denní záznamy stavby:

List č.

* 16

Datum

Počasí: 22°C

5.9.1984

Pracovní doba: 6⁰⁰ - 16³⁰ hod.

Počet žen: 3 nastěraci

Druh práce: Suvňový písek - fyzikální a metalografie OK

Helena Lel

Počasí: zatlačeno 16°C

6.9.1984

Prac. doba: 6⁰⁰ - 16³⁰ hod.

Počet žen: 3 nastěraci

Druh práce: Suvňový písek, fyzikální a metalografie OK

Helena Lel

Počasí: Oblačno - srážky 15°C

11.9.1984

Prac. doba: 6⁰⁰ - 12⁰⁰ hod.

Počet žen: 3 nastěraci

Druh práce: Suvňový písek, fyzikální a metalografie OK

Helena Lel

Počasí: zatlačeno 16°C

10.9.1984

Prac. doba: 6⁰⁰ - 14³⁰ hod.

Počet žen: 3 nastěraci

Druh práce: Suvňový písek, fyzikální a metalografie OK

Helena Lel

Počasí: zatlačeno 17°C

11.9.1984

Prac. doba: 6⁰⁰ - 16³⁰ hod.

Počet žen: 3 nastěraci

Druh práce: Dokončení fyzikální a metalografie OK

Helena Lel

Počasí: Polojasno + 17°C

11.9.1984

Prac. doba: 6⁰⁰ - 16³⁰ hod.

Počet žen: 3 nastěraci

Druh práce: Některá OK

Helena Lel

Denní záznamy stavby:

List č.

* 17

Datum

Počasí: jasno + 21°C

13.9.1984

Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod

Počet zam: 3 zatevaci

Prul práce: Nakl. OK

Četela Lul

Počasí: jasno + 20°C

14.9.1984

Prac. doba: 6.00 - 11.00 hod

Počet zam: 3 zatevaci

Prul práce: Nakl. OK

Četela Lul

20.9.84

Druhá část provedena zamerením a vytyčením koleje (osy) na mostě v hale Val. Mezíně. Vše -
 řeky $F = 90 \text{ mm}$, $R = 400 \text{ mm}$, $p = 128 \text{ mm}$. Uvedené
 vytyčení osy bude sloužit pro vytyčení a montáž
 podkladů. Získáním TD Val. Mezíně nebyly
 zjištěny nedostatky

ze 120

kg mubal

za TD

g. Chalupa

Počasí: Zataženo +13°C

Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod

Počet zam: 1 + 3 zaměření

Druh práce: Montáž mostnic a cizích ušlechť

25.9.1984

Prováděna kontrola prací přednostky

přesky zprávy

V. Ch., st. 13

M. Chalupa

M. Chalupa

Počasí: Zataženo +10°C

Prac. doba: 6.00 - 16.10 hod

Počet zam: 1 + 4 zaměření

Druh práce: Zřízení rovnání - zřízení OK a podoty
 práce OK do log. Spuštění OK

26.9.1984

Počasí: Zataženo +12°C

Prac. doba: 6.00 - 16.10 hod

Počet zam: 1 + 3 zaměření

Druh práce: Uložka zajišťovacího ušlechť

27.9.1984

Počasí: Polojasno +14°C

Prac. doba: 6.00 - 12.00 hod

Počet zam: 1 + 3 zaměření

Druh práce: Nakládání OK na vagon a vnější odbran
 práce chodby OK pro ušlechť

28.9.1984

Denní záznamy stavby:

List č.

* 19

Datum

Počasí: Polojasno + 21°C

1.10.1984

Prac. doba: 8.00 - 14.30 hod.

Počet zam: 1 + 5 sešmátnutí

Druh práce: Montáž kotel na Ole a montáž
podlahových rovin.

K. H.

Počasí: Zataženo + 17°C přehánky

2.10.1984

Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod.

Počet zam: 1 + 5 sešmátnutí

Druh práce: Mýdlování kotel - montáž chodíkové podlahy

K. H.

Počasí: Polojasno + 13°C

3.10.1984

Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod.

Počet zam: 1 + 6 sešmátnutí

Druh práce: Úprava a montáž stěhů podlahy - dokončení
montáž chodíkové podlahy

K. H.

Počasí: Zataženo + 12°C

4.10.1984

Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod.

Počet zam: 1 + 6 sešmátnutí

Druh práce: Úprava a montáž hlavní podlahy

K. H.

Počasí: Polojasno + 14°C

5.10.1984

Prac. doba: 6.00 - 12.00 hod.

Počet zam: 1 + 4 sešmátnutí

Druh práce: Montáž rovin na Ole

K. H.

Počasí: Zataženo + 11°C

6.10.1984

Prac. doba: 8.00 - 14.30 hod.

Počet zam: 1 + 5 sešmátnutí

Druh práce: Zřízení rovin pro kotlovou přístavbu

K. H.

Počasí: Zataženo + 10°C

7.10.1984

Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod.

Počet zam: 1 + 6 sešmátnutí

Druh práce: Demontáž rovin, chodíkové podlahy, podl.
na stěhů a kotel.

K. H.

Provedení kotelové přístavby pro
před myšlenou

9/8/85

Počasí: Polojasno + 16°C

10.10.1984

- Prac. doba: 6.⁰⁰ - 16.¹⁰ hod.

Počet zam: 1 + 6 zaměstnanci

Druh práce: Vylučka vložení OK do kolejí i. 1 a
y jiných OK v důsledkem opravy

K. V.

Počasí: Polojasno + 14°C

11.10.1984

Prac. doba: 6.⁰⁰ - 16.²⁰ hod.

Počet zam: 1 + 5 zaměstnanci

Druh práce: Dokončování práce po výhledu, vyřazení a
směrové úpravy OK, úpravy Lofitok

K. V.

Počasí: Zataženo + 12°C

12.10.1984

Prac. doba: 6.⁰⁰ - 12.⁰⁰ hod.

Počet zam: 1 + 5 zaměstnanci

Druh práce: Odvoz materiálů a nářadí motorovým vozem
do nákladního a jeho uložení, vyřízení OK na vozovně

K. V.

Počasí: Zataženo + 12°C

1.11.1984

Prac. doba: 6.⁰⁰ - 16.³⁰ hod.

Počet zam: 1 + 6 zaměstnanci

Druh práce: Skládání OK ~~putně~~ v hale V. Narváje
nakládání materiálů v Brně

K. V.

Počasí: Polojasno + 11°C

2.11.1984

Prac. doba: 6.⁰⁰ - 12.⁰⁰ hod.

Počet zam: 1 + 3 zaměstnanci

Druh práce: Demontáž střešní podlahy a klavírní podlahy

K. V.

Počasí: jasno + 9°C

5.11.1984

Prac. doba: 8.⁰⁰ - 14.³⁰ hod.

Počet zam: 1 + 6 zaměstnanci autojeřáb + 148

Druh práce: Skládání materiálů z vozovny a nakládání
materiálu

K. V.

Denní záznamy stavby:

List č.

* 21

Datum

Počasí: Polojasno + 14°C

7.11.1984

Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod

Počet zam: 1 + 3 volněvolní

Druh práce: Demontáž ke mostu

[Signature]

Počasí: jasno + 16°C

8.11.1984

Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod

Počet zam: 1 + 4 volněvolní

Druh práce: Nakládání odvoz a složení mostu u T.D.

[Signature]

Počasí: Polojasno + 11°C

9.11.1984

Prac. doba: 6.00 - 14.30 hod

Počet zam: 1 + 4 volněvolní

Druh práce: Vyroba kotel, pálení pásnice na horní most
hlavní nosník

[Signature]

Počasí: zatlačeno + 1°C


10.11.1984

Prac. doba: 8.00 - 14.30 hod

Počet zam: 1 + 4 volněvolní

Druh práce: Vyroba kotel - vyrobění vložek pro světlou

Schéma vyrobění vložek na ok 1 a 2

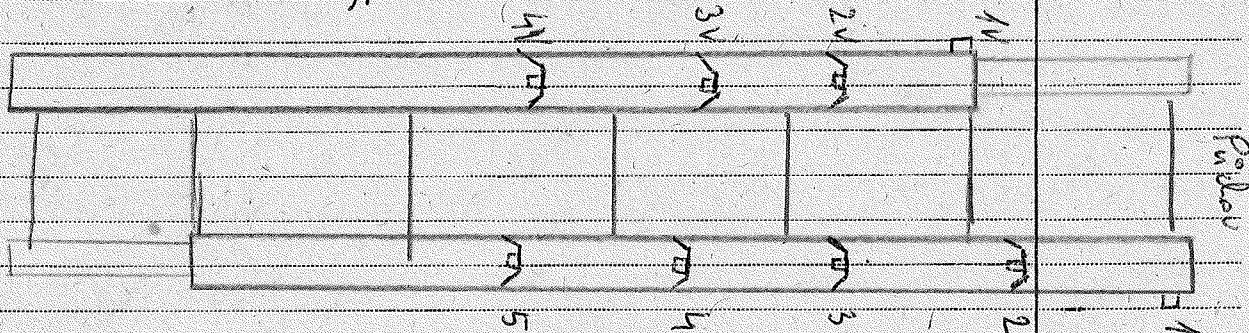

1 V rozšířené pásnice

1 rozšířené pásnice

(nepočítá pásnice společně)

2 V pásnice 2

2 pásnice 2

3 V - " - 3

3 - " - 3

4 V - " - 4

4 - " - 4

5 - " - 5

[Signature]

Denní záznamy stavby:

List č.

* 22

Datum

Počasí: Zataženo + 2°C

20.11.1984

Pracovní doba: 6.00 - 16.30 hod

Počet zam: 1 + 10 směrníků

Druh práce: Lehká revize mostní konstrukce před
opravou. Výroba podlahových nosníků,
výroba uorků pro svařitelství.

Počasí: zataženo + 4°C

21.11.1984

Pracovní doba: 6.00 - 16.30 hod

Počet zam: 1 + 6 směrníků

Druh práce: Výroba podlahových nosníků, výroba chodníků
podlahy - montáž kotel

Práce do 11.11.1984

Počasí: Polojasno + 8°C

22.11.1984

Pracovní doba: 6.00 - 16.30 hod

Počet zam: 1 + 3 směrníků

Druh práce: Výroba podlahových nosníků

Počasí: Zataženo + 10°C

23.11.1984

Pracovní doba: 6.00 - 12.00 hod

Počet zam: 1 + 4 směrníků

Druh práce: Montáž podlahových nosníků

Počasí: Zataženo + 8°C

26.11.1984

Prac. doba: 8.00 - 14.30 hod

Počet zam: 1 + 5 směrníků

Druh práce: Dokončení montáže podlahových nosníků - výroba
chodníků podlahy výšší na kotelnu

Počasí: Zataženo + 9°C

24.11.1984

Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod

Počet zam: 1 + 5 směrníků

Druh práce: Výroba chodníků podlahy - montáž podlahy

Počasí: Zataženo + 7°C

28.11.1984

Prac. doba: 6⁰⁰ - 16³⁰ hod.

Počet zam: 1 + 5 odměnek

Druh prací: Výroba chodníkové podlahy uvnitř mezi oky

Počasí: Jasně + 11°C

29.11.1984

Prac. doba: 6⁰⁰ - 16³⁰ hod.Počet zam: 1 + 4 odměnek + 1 odměnek BH na mostě při
míření

Druh prací: Montáž podlahy

Počasí: Položeno + 9°C

30.11.1984

Prac. doba: 6⁰⁰ - 12⁰⁰ hod.

Počet zam: 1 + 3 odměnek

Druh prací: Výroba a montáž rohoží

Počasí: Jasně + 7°C

3.12.1984

Prac. doba: 8⁰⁰ - 14³⁰ hod.

Počet zam: 1 + 5 odměnek

Druh prací: Výroba mostnic (opravených)
výroba a montáž sedel centrického
upravení mostnic

Počasí: Jasně + 5°C

4.12.1984

Prac. doba: 6⁰⁰ - 16³⁰ hod.

Počet zam: 1 + 4 odměnek

Druh prací: Výroba mostnic (opravených)

Počasí: Položeno + 2°C

5.12.1984

Prac. doba: 6⁰⁰ - 16³⁰ hod.

Počet zam: 1 + 2 odměnek

Druh prací: Výroba sedel centrického alumin.
výroba a montáž listů

Počasí: Zataženo + 3°C

6.12.1984

Prac. doba: 6⁰⁰ - 16³³ hod.

Počet zam: 1 + 6 odměnek

Druh prací: Výroba sedel centrického alumin.
mostnic - výroba
a montáž listů. Brzdění pod listy před přivazováním

Počasí: Zataženo +1°C
 Prac. doba: 6.00 - 12.00 hod.
 Počet zam: 6 volněvolných
 Druh práce: Melba odvoz a složení mostu

4.12.1984

Počasí: Zataženo +3°C
 Prac. doba: 7.00 - 14.30 hod.
 Počet zam: 1 + 6 volněvolných
 Druh práce: Výroba ucel centrického uložení mostu

10.12.1984

Počasí: Zataženo +4°C
 Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod.
 Počet zam: 1 + 6 volněvolných
 Druh práce: Výroba ucel centrického uložení mostu -
 kladka na mostě při měření

11.12.1984

Počasí: Polojasno 10°C
 Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod.
 Počet zam: 1 + 5 volněvolných
 Druh práce: Dokončení výroby ucel centrického uložení

12.12.1984

Počasí: Zataženo -2°C
 Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod.
 Počet zam: 1 + 6 volněvolných
 Druh práce: Montáž ucel svrchní - montáž a přivážení
 lit

13.12.1984

Počasí: Zataženo -4°C
 Prac. doba: 7.00 - 14.30 hod.
 Počet zam: 1 + 6 volněvolných
 Druh práce: Výroba a montáž lit centrického uložení mostu -
 opracování mostu

14.12.1984

Počasí: Polojasno +3°C
 Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod.
 Počet zam: 1 + 6 volněvolných
 Druh práce: Dokončení montáže lit centrického uložení
 mostu - montáž mostu

18.12.1984

Počasí: Zataženo +3°C

19.12.1984

Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod.

Počet lidí: 1 + 6 volantinů

Druh práce: Dokončení montáže mostků - výroba mostků z dřevěného dřeva

Všechny práce v B a D

Prac. doba:

Počasí: Zataženo +2°C

20.12.1984

Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod.

Počet lidí: 1 + 6 volantinů

Druh práce: Výroba a montáž mostků z dřevěného dřeva - výroba a montáž rozřezaných uhlíků

Počasí: Zataženo +1°C

21.12.1984

Prac. doba: 6.00 - 12.30 hod.

Počet lidí: 1 + 4 volantinů

Druh práce: Výroba a montáž rozřezaných uhlíků

Počasí: Položeno +3°C

22.12.1984

Prac. doba: 6.00 - 12.00 hod.

Počet lidí: 1 + 4 volantinů

Druh práce: Výroba hlavové podlahy se zasklením

Počasí: Zataženo -3°C

24.12.1984

Prac. doba: 8.00 - 14.30 hod.

Počet lidí: 1 + 2 volantinů

Druh práce: Výroba hlavové podlahy se zasklením

Počasí: Zataženo -5°C

28.12.1984

Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod.

Počet lidí: 1 + 2 volantinů

Druh práce: Výroba hlavové podlahy se zasklením

Denní záznamy stavby:

List č.

* 26

Datum

Počasí: Zataženo -4°C

29. 12. 1985

Prac. doba: 6.00 - 12.00 hod.

Počet km: 1 + 1200 m

Druh práce: Montáž dřevěných podlah pod jehly

[Signature]

Dne 9. 1. 1985 byla provedena přejímka zednických prací u oplocení a. Poradení projektorem ing. Zdeňkem Zvěrnou. Po konstrukci dřevěných a střešních prvků odpovídá schválené projektové dokumentaci.

[Signature]

Byla provedena publikace dílenských a pracovních konstrukcí pro Rev. č. 2. Na pracovních podlahách jsou nové prvky: palivnice. Ostatní práce jsou dle schváleného projektu, přičemž odpovídá vzhledu ulicím, mostům, korytům a podlahám pro na střešních. První stavební práce pro přenos dřevěných st. korytů přerazují až po metu - korytů konstrukce při definování nových mostů. Při korytách ulicích mostů v sedlech a na listech byla spíše vnitřní vlna a mosty č. 14, 15 a 26 na vnější straně a na mostech č. 17 a 25 na vnitřní straně. Po demontáži vlnitiny a korytů bylo upraveno vlnité namísto plochy na sedle. Jinak je provedení bez problémů. U stavebních nádrží byla práce byla provedena chemická práce, hodiny pro zhoršení. Nové práce na podlahách nejsou dotčené a jsou ani korytům, mostům přerazují a doplnění.

[Signature]

Denní záznamy stavby:

List č.

* 27

Datum

Počasí: Zataženo +10°C

25.2.85

Prac. doba: 8.00 - 14.30 hod.

Počet zam: 1+5 vlnemínků

Druh práce: Demontáž vlnemínků - podlah. podl. vlnemínků
kontrol, rejstřík vlnemínků

Počasí: Položeno +3°C

16.2.1985

Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod.

Počet zam: 1+6 vlnemínků

Druh práce: Demontáž mostku - malování OK na vlnu
a odstraňování ok betonu k rekonstrukci

Počasí: Zataženo +8°C

15.4.1985

Prac. doba: 8.00 - 17.30 hod.

Počet zam: 1+5 vlnemínků

Druh práce: Montáž mostku - výška svahového vlnemínku

Počasí: Zataženo +10°C

16.4.1985

Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod.

Počet zam: 1+4 vlnemínků

Druh práce: Výška svahového a porostového vlnemínku

Počasí: Zataženo +4°C

14.4.1985

Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod.

Počet zam: 1+4 vlnemínků

Druh práce: Výška svahového vlnemínku a malování
dřev 80% síla.

Počasí: Jasně +12°C

18.4.1985

Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod.

Počet zam: 1+5 vlnemínků

Druh práce: Výška svahového vlnemínku a malování
dřev 80% síla

19.4.85

Počasí: jasno + 14°C

Pracovní doba: 6⁰⁰ - 12⁰⁰ hod.

Počet zam: 5 ročníků

Druh práce: Zaplétání OI na vozové - ukladání
podlah, konzol, podle rozříd. normy

M. J.

Počasí: jasno + 20°C

Prac. doba: 8⁰⁰ - 14³⁰ hod.

Počet zam: 1 + 5 ročníků

Druh práce: Montáž konzol na OI -
zřízení křivky pro montáž

M. J.

22.4.85

Počasí: jasno + 22°C

Prac. doba: 6⁰⁰ - 16³⁰ hod.

Počet zam: 1 + 5 ročníků

Druh práce: Montáž konzol - užitkové - montáž podle rozříd.
normy

M. J.

23.4.85

Počasí: Zataženo + 6°C

Prac. doba: 6⁰⁰ - 16³⁰ hod.

Počet zam: 1 + 5 ročníků

Druh práce: Montáž podlah a ukladání na OI

M. J.

24.4.85

Počasí: Zataženo + 8°C

Prac. doba: 6⁰⁰ - 16³⁰ hod.

Počet zam: 1 + 5 ročníků

Druh práce: Dokončení montáže podlah

M. J.

25.4.85

Počasí: Zataženo +

Prac. doba: 6⁰⁰ - 12⁰⁰ hod.

Počet zam: 1 + 5 ročníků

Druh práce: Odvoz materiálů a ukladání potřebných
pro vyhlášení práce na most a jejich uložení

M. J.

26.4.85

Počasí: Zataženo + 6°C suchoví přeházy

29.4.85

Prac. doba: 8.00 - 16.30

Počet zam.: 1 + 5 se měním

Druh práce: Vylučka - vložení opravovní mostní konstrukce
v koleji č. 2

Počasí: Zataženo + 2°C suchoví přeházy.

30.4.1985

Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod.

Počet zam.: 1 + 5 se měním

Druh práce: Dokončení vyluček práce - od smičové
úpravy OI, rovnání kolejí / rovnání

Počasí: Polojasno + 6°C

4.5.1985

Prac. doba: 8.00 - 14.30 hod.

Počet zam.: 1 + 5 se měním

Druh práce: Zdvíhání a spuštění OI v důkladnou úpravu
poddvořných kolejí před rekonstrukcí,
přelom kolejí pod koleji cel šířky

Počasí: Polojasno + 16°C

5.5.1985

Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod.

Počet zam.: 1 + 5 se měním

Druh práce: Odvoz materiálů - řízev z Horní křiž. do
V. Mníšického vozíku od T.D.
Nabíjení složení

Počasí: Polojasno + 20°C

6.5.1985

Prac. doba: 6.00 - 16.30 hod.

Počet zam.: 1 + 5 se měním

Druh práce: Dokončení vyluček v široké svačce a povypnutí
odhrobování a vložení řízev
z podkolejí

12.5.1985

DNEŠ PRÁCE ZAST. TD ING. CHALUPA

STAVBU STAVEBNÍHO PRÁCE Č. 15 ~ 28

J. Chalupa
