



ŽST, CHEB stavební postup

Rekonstrukce části nástupiště 2. Stavba výtahu na nástupišti 2. Uzavřeno nástupiště 2. Rekonstrukce podchodu pod kolejemi 3, 1

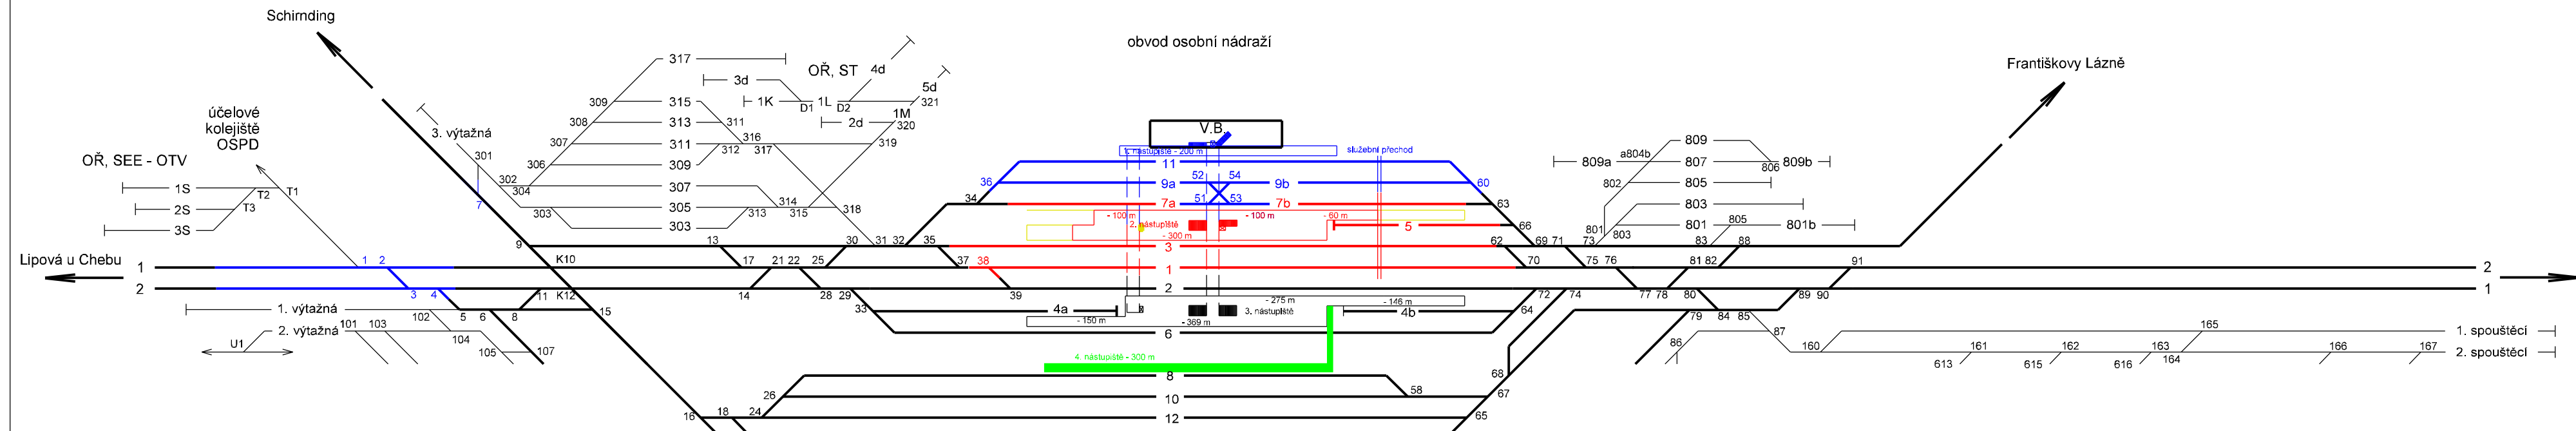


ŽST. CHEB stavební postup

Zahájení rekonstrukce nástupiště 3. Dokončení služebního přechodu

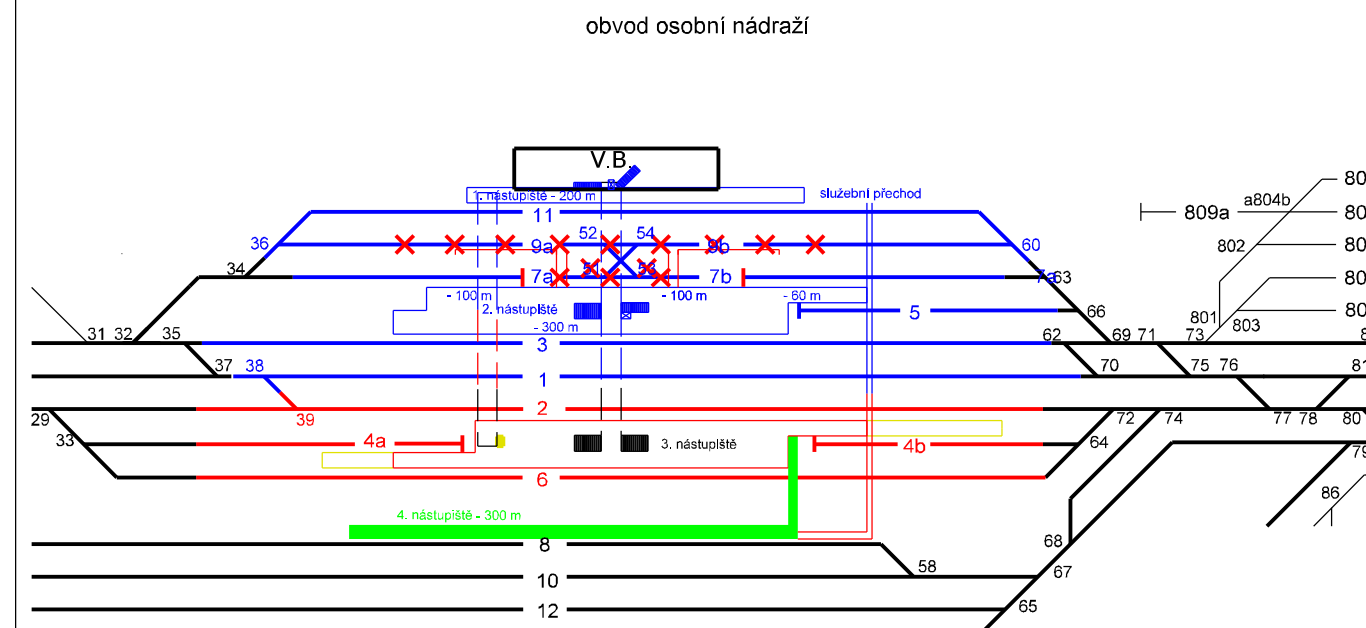


ŽST. CHEB stavební postup

Dokončení rekonstrukce nástupiště 3. Stavba eskalátorů a výtahu na nástupišti 3

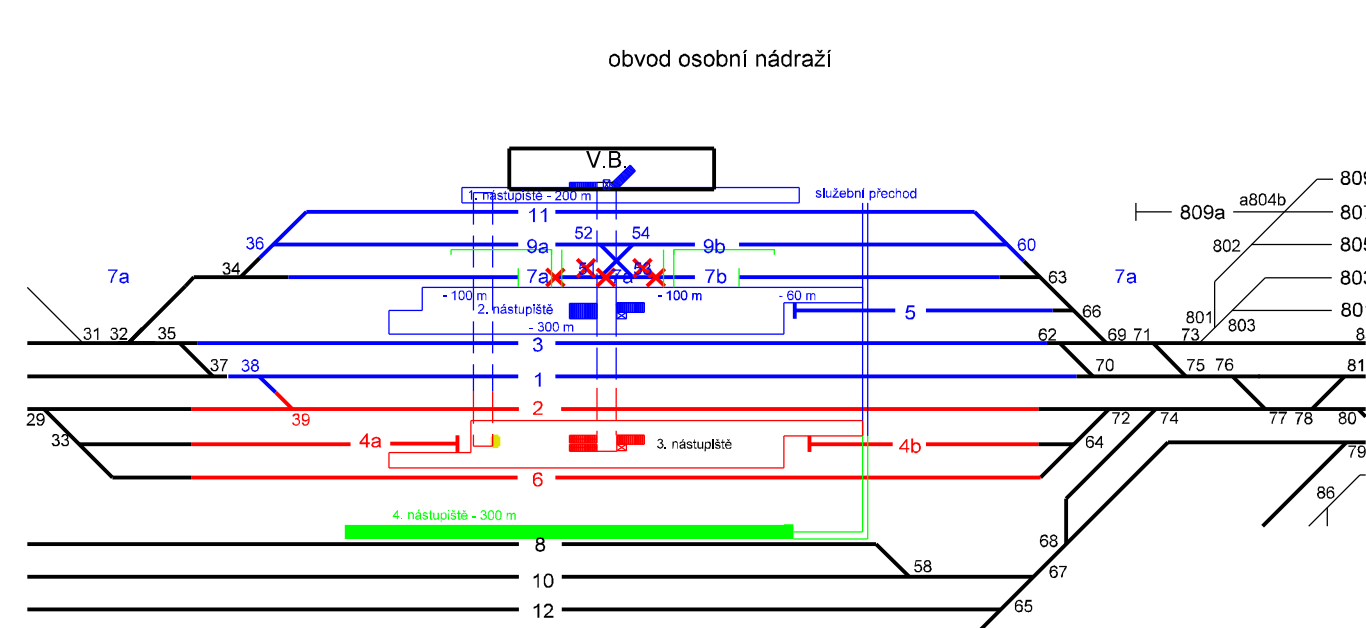


ŽST. CHEB stavební postup

Dokončení rekonstrukce nástupiště 2. Stavba eskalátorů na nástupišti 2

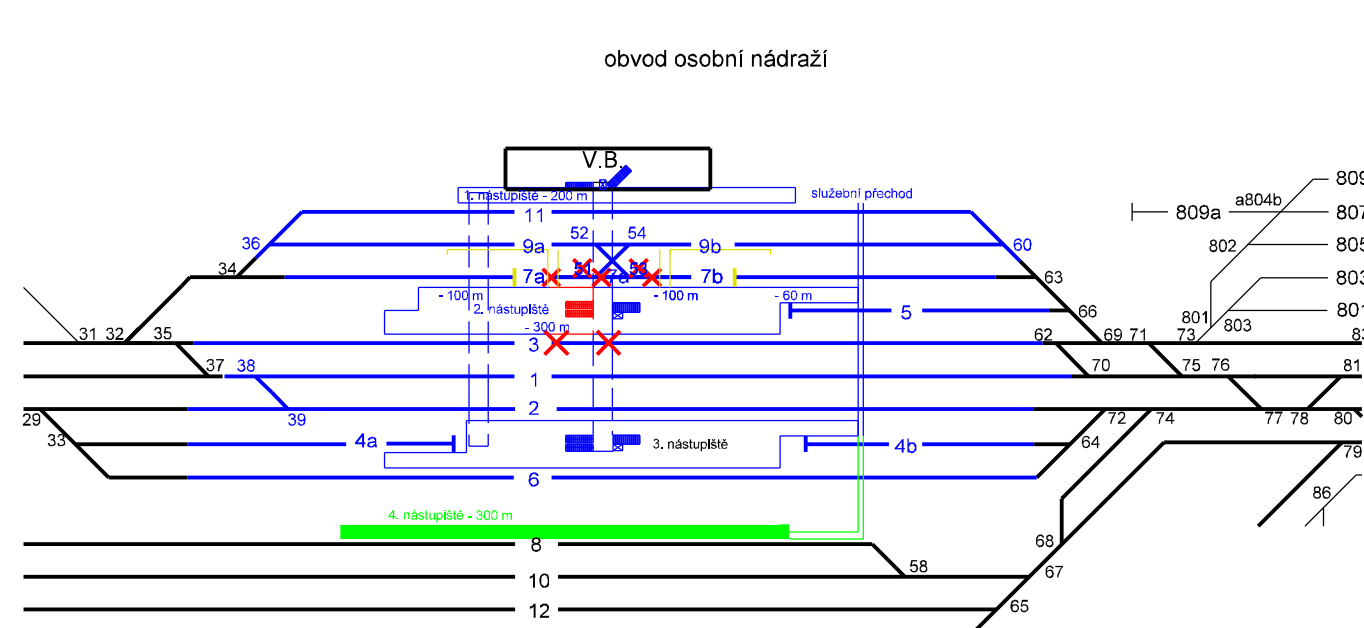


ŽST. CHEB stavební postup

Dokončení rekonstrukce nástupiště 1. Stavba eskalátorů do haly výpravní budovy
!!Příchod na obě ostrovní nástupiště jen přes služební přechod!!

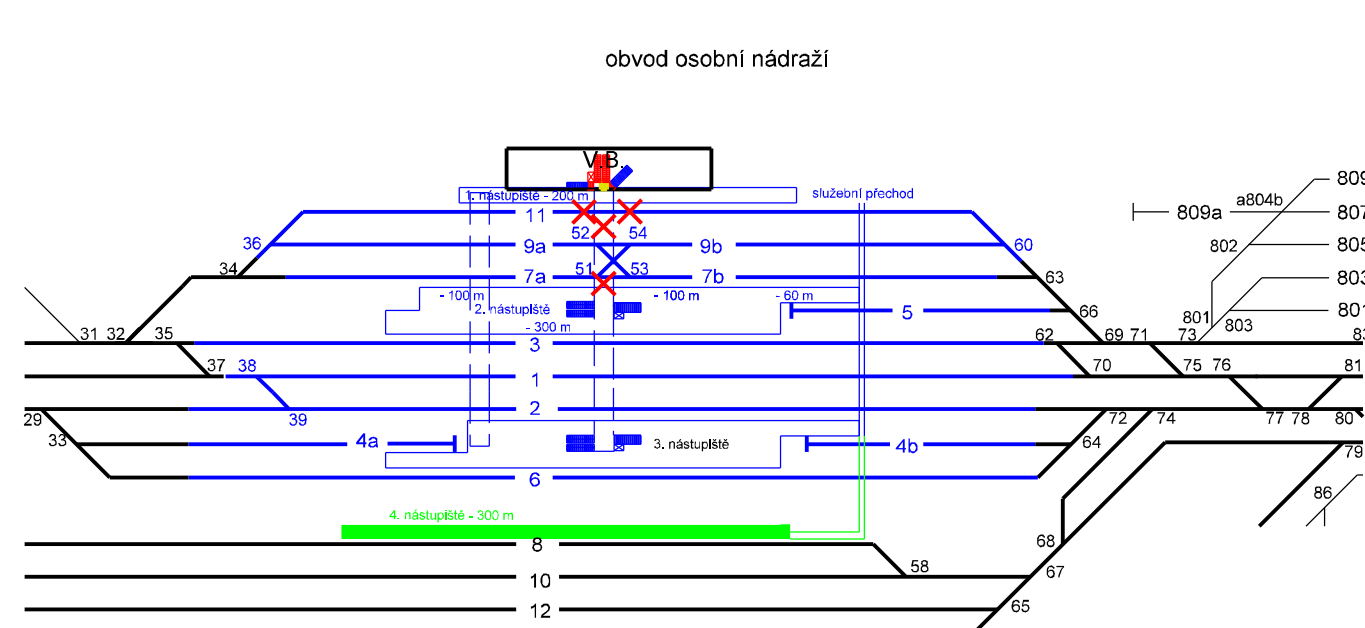





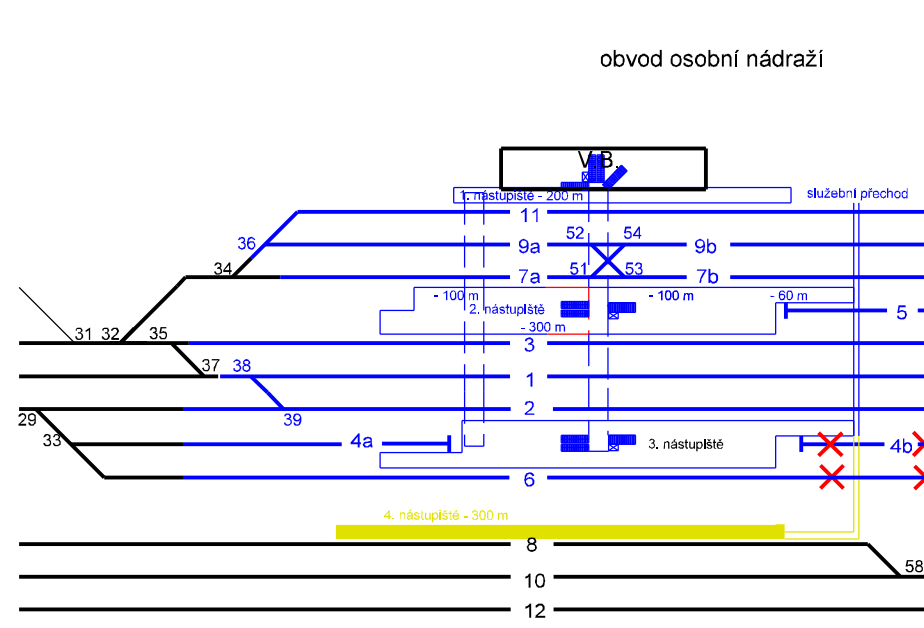





ŽST. CHEB stavební postup

Demontáž dočasné části přechodu
a dočasného nástupiště 4.



Legenda:

- | | |
|---|--------------------------------|
|  | Dopravní kolej stávající |
|  | Manipulační kolej stávající |
|  | Vlečka stávající |
|  | Dopravní kolej v rekonstrukci |
|  | Nástupiště dočasné uzavřené |
|  | Nástupiště v rekonstrukci |
|  | Podchod v rekonstrukci |
|  | Dopravní kolej v cílovém stavu |
|  | Nástupiště v cílovém stavu |
|  | Podchod v cílovém stavu |
