


Rekonstrukce žst. Olomouc

ID	Číslo PS, SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2013				2014				2015				2016			
						II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.
1		Harmonogram prací																			
2		Předání staveniště	5 dny	24.9. 13	28.9. 13																
3		PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ		24.9. 13																	
4		REALIZACE STAVBY	1073 dny	24.9. 13	31.8. 16																
5		DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ			31.8. 16																
6		Předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby		30.11. 16																30.11.	
7		Předání dokumentace skutečného provedení stavby v trvalém provedení a digitální formě		30.11. 16																30.11.	
8		Zahájení zkušebního provozu		15.5. 16																	
9		TECHNOLOGICKÉ ZIMNÍ PŘESTÁVKY	820 dny	16.12. 13	14.3. 16																
10		r. 2013/2014	87 dny	16.12. 13	12.3. 14																
11		r. 2014/2015	23 dny	13.12. 14	4.1. 15																
12		r. 2015/2016	101 dny	5.12. 15	14.3. 16																
13		STAVEBNÍ POSTUPY	1073 dny	24.9. 13	31.8. 16																
14		SP 0 - Přípravné práce	170 dny	24.9. 13	12.3. 14																
15		SP Trafostanice	755 dny	24.9. 13	18.10. 15																
16		SP Kabelovod	798 dny	24.9. 13	30.11. 15																
17		SP Přístavba ústředního stavědla	189 dny	24.9. 13	31.3. 14																
18		Vypnutí zab.zař. Bělidla - Zhlaví Olomouc Bělidla	7 dny	7.10. 13	13.10. 13																
19		SP 1 - Nové nástupiště č.5 (vč. zimní technolog. přestávky)	185 dny	7.10. 13	9.4. 14																
20		Vypnutí zab.zař. osobní nádaží - Grygovské zhlaví	21 dny	25.11. 13	15.12. 13																
21		Vypnutí zab.zař. osobní nádaží - Zhlaví u Bystřičky	21 dny	20.2. 14	12.3. 14																
22		SP 2 - Nástupiště č.4, TS1 v provozu	85 dny	9.4. 14	2.7. 14																
23		SP 7 - Koleje č.201, část 101, 103	42 dny	13.3. 14	23.4. 14																
24		SP 10 - Filiálka, zhlaví, lichá skupina	45 dny	13.3. 14	26.4. 14																
25		SP 8 - Koleje č. 202, 102, 104	51 dny	28.4. 14	17.6. 14																
26		SP 11 - Filiálka, zhlaví, sudá skupina	45 dny	28.4. 14	11.6. 14																
27		SP 13 - Pavlovický podjezd, DKV	51 dny	28.4. 14	17.6. 14																
28		SP 3 - Nástupiště č.3	85 dny	2.7. 14	24.9. 14																
29		Vypnutí zab.zař. Přednádraží - Zhlaví u Pavlovického podjezdu	21 dny	18.6. 14	8.7. 14																
30		SP 14 - Pavlovický podjezd, sudá skupina	64 dny	8.7. 14	9.9. 14																
31		Vypnutí zab.zař. Přednádraží - Zhlaví u filiálky a Černovír	21 dny	1.8. 14	21.8. 14																
32		SP 4 - Nástupiště č.2	80 dny	24.9. 14	12.12. 14																
33		SP 15 - Pavlovický podjezd, lichá skupina	71 dny	9.9. 14	18.11. 14																
34		SP 16 - Pavlovický podjezd, sudá skupina	21 dny	18.11. 14	8.12. 14																
35		SP 5 - Nástupiště č.1 (vč. zimní technolog. přestávky)	196 dny	24.10. 14	7.5. 15																
36		SP 16a - Definitivní úpravy TV na přednádraží	47 dny	9.12. 14	24.1. 15																
37		SP 6 - Nástupiště č.5 stávající (nové nástupiště č. 1A)	116 dny	12.1. 15	7.5. 15																
38		SP 17 - Grygovské zhl, výtažné koleje	53 dny	16.3. 15	7.5. 15																
39		SP 18 - Grygovské zhlaví sudá skupina	27 dny	7.5. 15	2.6. 15																
40		SP 19 - Grygovské zhlaví sudá skupina dokončení	22 dny	2.6. 15	23.6. 15																
41		Vypnutí zab.zař. - Grygovské zhlaví	22 dny	23.6. 15	14.7. 15																
42		SP 20 - Grygovské zhlaví lichá skupina	15 dny	15.7. 15	29.7. 15																
43		SP 21 - Grygovské zhlaví lichá skupina, dokončení	15 dny	29.7. 15	12.8. 15																
44		SP 22 - Zhlaví u Bystřičky, rozšíření mostu	38 dny	12.8. 15	18.9. 15																
45		SP 9 - Černovířský nadjezd (vč. zimní technolog. přestávky)	243 dny	1.9. 15	30.4. 16																
46		SP 23 - Zhlaví u Bystřičky, napojení TK od Bohumína	36 dny	18.9. 15	23.10. 15																
47		SP 24 - Zhlaví u Bystřičky	11 dny	23.10. 15	2.11. 15																
48		SP 25 - Zhlaví u Bystřičky, v kolejích č.2, 4	33 dny	2.11. 15	4.12. 15																
49		Vypnutí zab.zař. - Zhlaví u Bystřičky+Bělidla	22 dny	22.2. 16	14.3. 16																
50		SP 26 - Zhlaví u Bystřičky, v kol. č.51, 53	29 dny	14.3. 16	11.4. 16																
51		SP 12 - Štěpánovské zhlaví, lichá skupina	8 dny	11.4. 16	18.4. 16																
52		SP 12a - Štěpánovské zhlaví, sudá skupina	8 dny	18.4. 16	25.4. 16																
53		Vypnutí zab.zař. Přednádraží - Zhlaví u Pavlovického podjezdu	33 dny	2.5. 16	3.6. 16																
54		Vypnutí zab.zař. Přednádraží - Zhlaví u filiálky a Černovír	25 dny	3.6. 16	27.6. 16																
55		Dokončovací práce	120 dny	4.5. 16	31.8. 16																

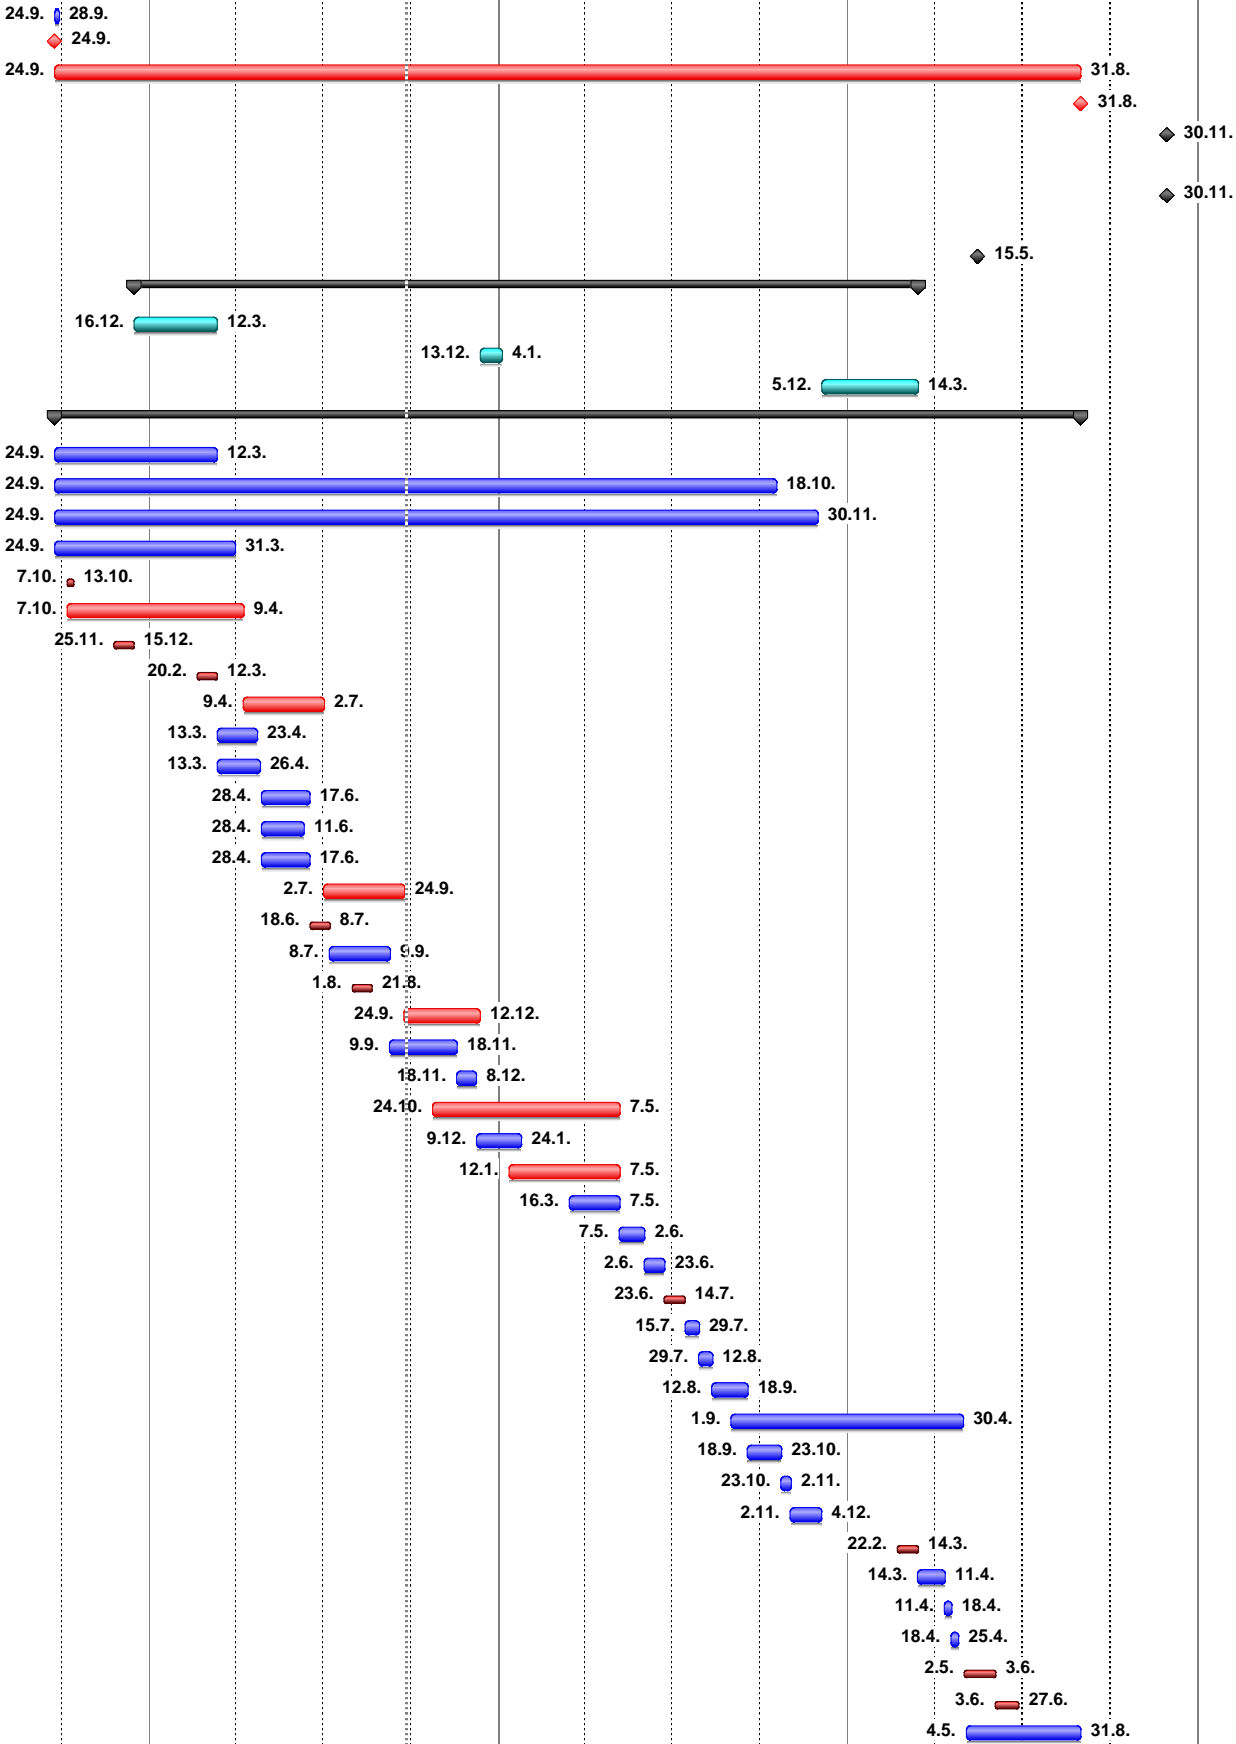

Rekonstrukce žst. Olomouc

ID	Číslo PS, SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2013				2014				2015				2016			
						II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.
56		VÝLUKY KOLEJÍ	1008 dny	24.9. 13	27.6. 16																
57		Rok 2013	198 dny	24.9. 13	9.4. 14																
58		SP 0	170 dny	24.9. 13	12.3. 14																
59		krátkodobé denní výluky pro: přípravné práce (TV, přeložky); demontáž TV kol.č.111 až 129, 203-213 a na vlečce Farmak	170 dny	24.9. 13	12.3. 14																
60		Nepřetržitá výluka koleje č.117 - 127	3 dny	1.10. 13	3.10. 13																
61		Nepřetržitá výluka koleje č.129	1 den	1.10. 13	1.10. 13																
62		Nepřetržitá výluka koleje mezi výhybkami č.255 a 239	1 den	8.10. 13	8.10. 13																
63		Nepřetržitá výluka části koleje č.53 mezi výh.č. 103-74	42 dny	9.10. 13	19.11. 13																
64		Nepřetržitá výluka koleje č.18, 20	1 den	20.11. 13	20.11. 13																
65		Nepřetržitá výluka koleje č.22, 24, 26	2 dny	22.11. 13	23.11. 13																
66		Nepřetržitá výluka koleje č.28, 32 a kolej mezi výhybkou č.48 a točnou	2 dny	25.11. 13	26.11. 13																
67		Nepřetržitá výluka koleje č.3	7 dny	27.11. 13	3.12. 13																
68		Nepřetržitá výluka koleje č.5	7 dny	4.12. 13	10.12. 13																
69		Nepřetržitá výluka koleje č.6	7 dny	11.12. 13	17.12. 13																
70		SP 1	185 dny	7.10. 13	9.4. 14																
71		Nepřetržitá výluka kol.č.12,16	185 dny	7.10. 13	9.4. 14																
72		Vypnutí zab.zař. osobní nádaží - Grygovské zhlaví	21 dny	25.11. 13	15.12. 13																
73		Rok 2014	442 dny	20.2. 14	7.5. 15																
74		Vypnutí zab.zař. osobní nádaží - Zhlaví u Bystřičky	21 dny	20.2. 14	12.3. 14																
75		SP 7	42 dny	13.3. 14	23.4. 14																
76		Nepřetržitá výluka kol.č. 201	17 dny	13.3. 14	29.3. 14																
77		Nepřetržitá výluka kol.č. 101, 103	42 dny	13.3. 14	23.4. 14																
78		Nepřetržitá výluka kol.č. 105, 107	28 dny	13.3. 14	9.4. 14																
79		Nepřetržitá výluka kol.č. 109, 113	4 dny	13.3. 14	16.3. 14																
80		SP 10	45 dny	13.3. 14	26.4. 14																
81		Nepřetržitá výluka kol.č.201,101,103,103b,105,107,109-129 ve zhl. u filiálky	45 dny	13.3. 14	26.4. 14																
82		Nepřetržitá výluka vlečky Farmak	21 dny	13.3. 14	2.4. 14																
83		SP 2	85 dny	9.4. 14	2.7. 14																
84		Nepřetržitá výluka kol.č.8,10	85 dny	9.4. 14	2.7. 14																
85		SP 8	51 dny	28.4. 14	17.6. 14																
86		Nepřetržitá výluka kol.č.202	17 dny	28.4. 14	14.5. 14																
87		Nepřetržitá výluka kol.č.102,104	51 dny	28.4. 14	17.6. 14																
88		Nepřetržitá výluka kol.č.106	9 dny	1.5. 14	9.5. 14																
89		Nepřetržitá výluka kol.č.108	3 dny	7.5. 14	9.5. 14																
90		Nepřetržitá výluka kol.č.104b	1 den	9.5. 14	9.5. 14																
91		Nepřetržitá výluka kol.č.54b,15t,16t,16k,17k v areálu DKV	10 dny	1.5. 14	10.5. 14																
92		SP 11	45 dny	28.4. 14	11.6. 14																
93		Nepřetržitá výluka kol.č.102, 202	7 dny	28.4. 14	4.5. 14																
94		Nepřetržitá výluka kol.č.102-122, 104b, 104a	16 dny	5.5. 14	20.5. 14																
95		Nepřetržitá výluka kol.č.102-110	22 dny	21.5. 14	11.6. 14																
96		Nepřetržitá výluka kol.č.148, 150	14 dny	5.5. 14	18.5. 14																
97		SP 13	51 dny	28.4. 14	17.6. 14																
98		Nepřetržitá výluka kol.č.1t,7t	51 dny	28.4. 14	17.6. 14																
99		SP 3	85 dny	2.7. 14	24.9. 14																
100		Nepřetržitá výluka kol.č.4,6	85 dny	2.7. 14	24.9. 14																
101		Vypnutí zab.zař. Přednádraží - Zhlaví u Pavlovického podjezdu	21 dny	18.6. 14	8.7. 14																
102		SP 14 - Pavlovický podjezd, sudá skupina	64 dny	8.7. 14	9.9. 14																
103		Nepřetržitá výluka kol.č.1t,54a,52a	64 dny	8.7. 14	9.9. 14																
104		Nepřetržitá výluka kol. č.54, 56, 58	4 dny	10.7. 14	13.7. 14																
105		Vypnutí zab.zař. Přednádraží - Zhlaví u filiálky a Černovír	21 dny	1.8. 14	21.8. 14																
106		SP 4	85 dny	24.9. 14	17.12. 14																
107		Nepřetržitá výluka kol.č.1,2	85 dny	24.9. 14	17.12. 14																
108		SP 15	71 dny	9.9. 14	18.11. 14																
109		Nepřetržitá výluka kol.č.101-109, 51-65	71 dny	9.9. 14	18.11. 14																
110		SP 16	21 dny	18.11. 14	8.12. 14																
111		Nepřetržitá výluka kol.č.102-120	10 dny	18.11. 14	27.11. 14																
112		Nepřetržitá výluka kol.č.52-58, 52a, 54a	21 dny	18.11. 14	8.12. 14																
113		SP 5	196 dny	24.10. 14	7.5. 15																
114		Nepřetržitá výluka kol.č.3	196 dny	24.10. 14	7.5. 15																
115		SP 16a	47 dny	9.12. 14	24.1. 15																
116		Krátkodobé výluky kolejí na přednádraží	47 dny	9.12. 14	24.1. 15																
117		Rok 2015	475 dny	12.1. 15	30.4. 16																
118		SP 6	116 dny	12.1. 15	7.5. 15																
119		Nepřetržitá výluka kol.č.5,7,7a	116 dny	12.1. 15	7.5. 15																
120		SP 17	53 dny	16.3. 15	7.5. 15																
121		Nepřetržitá výluka kol.č.16,18,12 na grygovském zhlaví	53 dny	16.3. 15	7.5. 15																
122		Nepřetržitá výluka kol.č.18a	8 dny	19.3. 15	26.3. 15																
123		SP 18	27 dny	7.5. 15	2.6. 15																
124		Nepřetržitá výluka vlečky ADM Olomouc	1 den	7.5. 15	7.5. 15																
125		Nepřetržitá výluka vlečky ADM Olomouc	2 dny	20.5. 15	21.5. 15																
126		Nepřetržitá výluka kol.č.12a; TK č.2 Grygov-Olomouc	27 dny	7.5. 15	2.6. 15																
127		Nepřetržitá výluka kol.č.18a, kol.č. 10-20 grygovského zhlaví	15 dny	7.5. 15	21.5. 15																

Rekonstrukce žst. Olomouc

ID	Číslo PS, SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2013				2014				2015				2016			
						II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.
128		SP 19		22 dny	2.6. 15																
129		Nepřetržitá výluka kol.č.4,6,8 na grygovském zhlaví	7 dny	2.6. 15	8.6. 15																
130		Nepřetržitá výluka kol.č.2 na grygovském zhlaví	22 dny	2.6. 15	23.6. 15																
131		Vypnutí zab.zař. - Grygovské zhlaví	22 dny	23.6. 15	14.7. 15																
132		SP 20	15 dny	15.7. 15	29.7. 15																
133		Nepřetržitá výluka TK č.1 Grygov-Olomouc	8 dny	15.7. 15	22.7. 15																
134		Nepřetržitá výluka kol.č.1 na grygovském zhlaví	12 dny	15.7. 15	26.7. 15																
135		Nepřetržitá výluka kol.č.5a	2 dny	15.7. 15	16.7. 15																
136		Nepřetržitá výluka kol.č.6c, kol. mezi výh. 106-88	15 dny	15.7. 15	29.7. 15																
137		SP 21	15 dny	29.7. 15	12.8. 15																
138		Nepřetržitá výluka TK Olomouc - Blatec	1 den	29.7. 15	29.7. 15																
139		Nepřetržitá výluka kol.č.3,3b,5, 6c; kol. mezi výh. č. 106-88	15 dny	29.7. 15	12.8. 15																
140		SP 22	38 dny	12.8. 15	18.9. 15																
141		Nepřetržitá výluka kol.č.12 až 32 na zhlaví od Bystřičky	38 dny	12.8. 15	18.9. 15																
142		Nepřetržitá výluka kol. směr Olomouc-Bělidla	8 dny	11.9. 15	18.9. 15																
143		SP 9 - Černovířský nadjezd (vč. zimní technolog. přestávky)	243 dny	1.9. 15	30.4. 16																
144		Krátkodobé výluky kolejí č.201, 202	243 dny	1.9. 15	30.4. 16																
145		Nepřetržitá výluka kol.č.202	8 dny	21.11. 15	28.11. 15																
146		Nepřetržitá výluka kol.č.201 a TK Štěpánov-Olomouc	8 dny	29.11. 15	6.12. 15																
147		SP 23	36 dny	18.9. 15	23.10. 15																
148		Nepřetržitá výluka TK směr Bohuňovice a koleje mezi výh.č.110 a 92	3 dny	18.9. 15	20.9. 15																
149		Nepřetržitá výluka koleje mezi výh.č.115 a 91	2 dny	21.9. 15	22.9. 15																
150		Nepřetržitá výluka kol.č.6,8,10 na zhlaví od Bystřičky	14 dny	10.10. 15	23.10. 15																
151		Nepřetržitá výluka TK směr Bohuňovice	9 dny	15.10. 15	23.10. 15																
152		Nepřetržitá výluka kol.č. 56,58,11,3t	6 dny	18.10. 15	23.10. 15																
153		SP 24	11 dny	23.10. 15	2.11. 15																
154		Nepřetržitá výluka kol.č.4,6	11 dny	23.10. 15	2.11. 15																
155		SP 25	33 dny	2.11. 15	4.12. 15																
156		Nepřetržitá výluka kol.č.2,4,52,54	33 dny	2.11. 15	4.12. 15																
157		Krátkodobé výluky kolejí č.58, 1t	33 dny	2.11. 15	4.12. 15																
158		Rok 2016	127 dny	22.2. 16	27.6. 16																
159		Vypnutí zab.zař. - Zhlaví u Bystřičky+Bělidla	21 dny	22.2. 16	13.3. 16																
160		SP 26	29 dny	14.3. 16	11.4. 16																
161		Nepřetržitá výluka kol.č.1,3,51,53	29 dny	14.3. 16	11.4. 16																
162		Nepřetržitá výluka vlečky pošty	3 dny	14.3. 16	16.3. 16																
163		SP 12	8 dny	11.4. 16	18.4. 16																
164		Nepřetržitá výluka TK č.1 Štěpánov-Olomouc a kol.č.201	8 dny	11.4. 16	18.4. 16																
165		SP 12a	8 dny	18.4. 16	25.4. 16																
166		Nepřetržitá výluka TK č.2 Štěpánov-Olomouc a kol.č.202	8 dny	18.4. 16	25.4. 16																
167		Vypnutí zab.zař. Přednádraží - Zhlaví u Pavlovického podjezdu	33 dny	2.5. 16	3.6. 16																
168		Vypnutí zab.zař. Přednádraží - Zhlaví u filiálky a Černovír	25 dny	3.6. 16	27.6. 16																
169		POSTUPNÉ PŘEDÁVÁNÍ A UVÁDĚNÍ KOLEJÍ DO PROVOZU	747 dny	9.4. 14	25.4. 16																
170		SP 1 - Nové nástupiště č.5; kol.č. 12, 16 žst. Olomouc	0 dny	9.4. 14	9.4. 14																
171		SP 7 - Koleje č. 201, 101, 103	0 dny	23.4. 14	23.4. 14																
172		SP 10 - Filiálka, zhlaví, lichá skupina	0 dny	26.4. 14	26.4. 14																
173		SP 11 - Filiálka, zhlaví, sudá skupina, kolej č. 204b	0 dny	11.6. 14	11.6. 14																
174		SP 2 - Nástupiště č.4, kol.č. 8, 10 žst. Olomouc	0 dny	2.7. 14	2.7. 14																
175		SP 8 - Koleje č. 202, 102, 104, 104b	0 dny	17.6. 14	17.6. 14																
176		SP 3 - Nástupiště č.3, kol.č. 4, 6 žst. Olomouc	0 dny	24.9. 14	24.9. 14																
177		SP 14 - Pavlovický podjezd, část sudé skupiny, kol. č. 52a, 54a	0 dny	9.9. 14	9.9. 14																
178		SP 4 - Nástupiště č.2, kol.č. 1, 2 žst. Olomouc	0 dny	12.12. 14	12.12. 14																
179		SP 15 - Pavlovický podjezd, lichá skupina	0 dny	18.11. 14	18.11. 14																
180		SP 16 - Pavlovický podjezd, zbytek sudé skupiny	0 dny	8.12. 14	8.12. 14																
181		SP 5 - Nástupiště č.1, kol.č. 3 žst. Olomouc	0 dny	7.5. 15	7.5. 15																
182		SP 6 - Nástupiště č.1A, koleje č. 5, 7a	0 dny	7.5. 15	7.5. 15																
183		SP 18 - Grygovské zhlaví část sudé skupiny, výtažné koleje, TK č. 2 Olomouc-Grygov	0 dny	2.6. 15	2.6. 15																
184		SP 19 - Grygovské zhlaví, zbytek sudé skupiny	0 dny	23.6. 15	23.6. 15																
185		SP 20 - Grygovské zhlaví část liché skupiny, TK č. 1 Olomouc-Grygov	0 dny	29.7. 15	29.7. 15																
186		SP 21 - Grygovské zhlaví, zbytek liché skupiny, kol. č. 3b žst. Olomouc	0 dny	12.8. 15	12.8. 15																
187		SP 22 - Zhlaví u Bystřičky, část sudé skupiny, TK Olomouc - Olomouc Bělidla	0 dny	18.9. 15	18.9. 15																
188		SP 23 - Zhlaví u Bystřičky, část sudé skupiny, kol. č. 56, TK Olomouc - Bohuňovice	0 dny	23.10. 15	23.10. 15																
189		SP 24 - Zhlaví u Bystřičky, část sudé skupiny	0 dny	2.11. 15	2.11. 15																
190		SP 25 - Zhlaví u Bystřičky, zhlaví v kolejích č.2, 4, 4a, kolej č. 102	0 dny	4.12. 15	4.12. 15																
191		SP 26 - Zhlaví u Bystřičky, zhlaví v kol. č.51, 53, kolej č. 101, koleje Pošty Olomouc	0 dny	11.4. 16	11.4. 16																
192		SP 12 - TK č. 1 Olomouc - Štěpánov	0 dny	18.4. 16	18.4. 16																
193		SP 12a - TK č. 2 Olomouc - Štěpánov	0 dny	25.4. 16	25.4. 16																

Rekonstrukce žst. Olomouc

ID	Číslo PS, SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2013	2014	2015	2016								
						II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.
200		Železniční most v km 86,486 (přes Bystřičku), úplná uzavírka na 2x 14 dní	60 dny	7.10. 13	5.12. 13		7.10.	5.12.									
201		Železniční most v km 86,486 (přes Bystřičku), úplná uzavírka	32 dny	12.8. 15	12.9. 15						12.8.	12.9.					
202		Železniční most v km 86,486 (přes Bystřičku), úplná uzavírka	26 dny	2.11. 15	27.11. 15						2.11.	27.11.					
203		Železniční most v km 86,486 (přes Bystřičku), úplná uzavírka	28 dny	14.3. 16	10.4. 16								14.3.	10.4.			
204		Ochranné štíty na hodolanském nadjezdu - postupné zužování chdníků pro pěší	91 dny	16.3. 15	14.6. 15					16.3.	14.6.						
205		PLÁN KONTROL A ZKOUŠEK			24.9. 13	♦ 24.9.											
206		DOPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE			24.9. 13	♦ 24.9.											
207		HARMONOGRAM PRACÍ	1073 dny	24.9. 13	31.8. 16												
208		D TECHNOLOGICKÁ ČÁST	1073 dny	24.9. 13	31.8. 16												
209		D.1. Zabezpečovací zařízení	1073 dny	24.9. 13	31.8. 16												
210		D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení	1041 dny	24.9. 13	30.7. 16												
211	PS 18-28-01	Žst. Olomouc, staniční zabezpečovací zařízení	1041 dny	24.9. 13	30.7. 16												
212	PS 18-28-01.1	Žst. Olomouc, definitivní staniční zabezpečovací zařízení	1041 dny	24.9. 13	30.7. 16	24.9.										30.7.	
213	PS 18-28-01.2	Žst. Olomouc, provizorní staniční zabezpečovací zařízení	133 dny	4.1. 16	15.5. 16												
214	PS 18-28-01.2.1	Žst. Olomouc, provizorní stanoviště	133 dny	4.1. 16	15.5. 16										4.1.	15.5.	
215	PS 18-28-01.2.2	Žst. Olomouc, pomocné stavědlo pod Hodolanským nadjezdem	84 dny	22.2. 16	15.5. 16										22.2.	15.5.	
216	PS 18-28-01.3	Žst. Olomouc, klimatizace ústředního stavědla	89 dny	17.2. 16	15.5. 16										17.2.	15.5.	
217		D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení	396 dny	27.3. 15	25.4. 16												
218	PS 18-28-02	t.ú. Olomouc-Štěpánov, úprava traťového zabezpečovacího zařízení	165 dny	13.11. 15	25.4. 16												
219	PS 18-28-03	Žst. Olomouc, úvazka TZZ směr Grygov	125 dny	27.3. 15	29.7. 15												
220	PS 18-28-04	Žst. Olomouc, úvazka TZZ směr Nová Ulice a Blatec	133 dny	2.4. 15	12.8. 15												
221	PS 18-28-05	Žst. Olomouc, úvazka TZZ směr Velká Bystřice	134 dny	8.5. 15	18.9. 15												
222	PS 18-28-06	Žst. Olomouc, úvazka TZZ směr Bohuňovice	135 dny	11.6. 15	23.10. 15												
223		D.1.5 Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení	334 dny	3.10. 15	31.8. 16												
224	PS 18-28-07	Žst. Olomouc, ERTMS / ETCS	334 dny	3.10. 15	31.8. 16												
225	PS 18-28-07.1	Žst. Olomouc, ERTMS / ETCS	334 dny	3.10. 15	31.8. 16										3.10.	31.8.	
226	PS 18-28-07.2	Žst. Olomouc, DOZ	334 dny	3.10. 15	31.8. 16										3.10.	31.8.	
227		D.2 Sdělovací zařízení	1011 dny	24.9. 13	30.6. 16												
228		D.2.1 Místní kabelizace	829 dny	24.9. 13	31.12. 15												
229	PS 18-14-01	Žst. Olomouc, úpravy traťových kabelů	280 dny	27.3. 15	31.12. 15												
230	PS 18-14-02	Žst. Olomouc, úpravy diagnostických optických kabelů	164 dny	2.7. 14	12.12. 14												
231	PS 18-14-03	Žst. Olomouc, místní optické kabely	418 dny	24.9. 13	15.11. 14												
232	PS 18-14-04	Žst. Olomouc, místní kabelizace	803 dny	24.9. 13	5.12. 15	24.9.										5.12.	
233		D.2.2 Rozhlasové zařízení	924 dny	20.10. 13	30.4. 16												
234	PS 18-14-05	Žst. Olomouc, rozhlas pro cestující	924 dny	20.10. 13	30.4. 16	20.10.										30.4.	
235		D.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení	151 dny	1.2. 16	30.6. 16												
236	PS 18-14-09	Žst. Olomouc, sdělovací zařízení	151 dny	1.2. 16	30.6. 16												
237	PS 18-14-09.1	Žst. Olomouc, sdělovací zařízení	151 dny	1.2. 16	30.6. 16												
238	PS 18-14-09.2	Žst. Olomouc, sdělovací zařízení - DOZ	151 dny	1.2. 16	30.6. 16												
239	PS 18-14-10	Žst. Olomouc, úprava spojovacího uzlu	151 dny	1.2. 16	30.6. 16												
240		D.2.4 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace	778 dny	1.10. 13	17.11. 15												
241	PS 18-14-07	Žst. Olomouc, EPS	681 dny	6.1. 14	17.11. 15												
242	PS 18-14-08	Žst. Olomouc, EZS	778 dny	1.10. 13	17.11. 15	1.10.											
243		D.2.7 Informační systém pro cestující	523 dny	1.12. 13	7.5. 15												
244	PS 18-14-06	Žst. Olomouc, informační zařízení	523 dny	1.12. 13	7.5. 15	1.12.											
245	PS 18-14-11	Žst. Olomouc, kamerový systém	523 dny	1.12. 13	7.5. 15	1.12.											
246		D.2.8 Traťové radiové spojení	121 dny	1.2. 16	31.5. 16												
247	PS 18-14-12	Žst. Olomouc, úprava sítí TRS	121 dny	1.2. 16	31.5. 16												
248	PS 18-14-13	Žst. Olomouc, úprava sítí MRS	121 dny	1.2. 16	31.5. 16												
249	PS 18-14-14	Žst. Olomouc hl., GSM-R	121 dny	1.2. 16	31.5. 16												
250		D.3 Silnoproudá technologie	961 dny	14.1. 14	31.8. 16												
251		D.3.1 Dispečerská řídicí technika a dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty	879 dny	6.4. 14	31.8. 16												
252		D.3.1.1 Dispečerská řídicí technika	879 dny	6.4. 14	31.8. 16												
253	PS 18-05-01	Žst.Olomouc,trafostanice ČD TS1 22/0,4kV a STS 6kV 313A - zařízení DŘT	222 dny	5.5. 14	12.12. 14												
254	PS 18-05-02	Žst.Olomouc,trafostanice ČD TS2 22/0,4kV a STS6kV 314A - zařízení DŘT	204 dny	6.4. 14	26.10. 14	6.4.											
255	PS 18-05-03	Žst.Olomouc,trafostanice ČD TS3 22/0,4kV a STS6kV 314B - zařízení DŘT	122 dny	18.11. 14	19.3. 15												
256	PS 18-05-04	Žst.Olomouc ÚS,trafostanice ČD TS4 22/0,4kV a STS6kV 314 - zařízení DŘT	122 dny	6.3. 15	5.7. 15												
257	PS 18-05-05	Žst.Olomouc,trafostanice ČD TS5 22/0,4kV a STS6kV 315 - zařízení DŘT	204 dny	6.4. 14	26.10. 14	6.4.											
258	PS 18-05-06	Žst.Olomouc,trafostanice ČD TS6 22/0,4kV a STS6kV 313 - zařízení DŘT	204 dny	6.4. 14	26.10. 14	6.4.											
259	PS 18-05-07	Žst.Olomouc,trafostanice ČD TS7 22/0,4kV - zařízení DŘT	122 dny	19.9. 15	18.1. 16												
260	PS 18-05-08	Žst.Olomouc, ústřední stavědlo - místní řídicí systém	122 dny	1.3. 16	30.6. 16												
261	PS 18-05-09	Žst.Olomouc přednádraží, demontáž DŘT	61 dny	2.7. 16	31.8. 16												
262	PS 50-05-01	Doplnění DŘT a řídicího systému na ED Přerov	153 dny	1.3. 16	31.7. 16												
263		D.3.1.2 Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty	122 dny	1.3. 16	30.6. 16												
264	PS 18-05-15	Žst.Olomouc, dálková diagnostika technologických systémů ŽDC	122 dny	1.3. 16	30.6. 16												
265	PS 18-05-15.1	Žst.Olomouc, dálková diagnostika technologických systémů ŽDC	122 dny	1.3. 16	30.6. 16												
266	PS 18-05-15.2	Žst.Olomouc, dálková diagnostika technologických systémů ŽDC - kabelizace	122 dny	1.3. 16	30.6. 16												
267	PS 18-05-15.3	CDP Přerov - doplnění systému pro žst. Olomouc	122 dny	1.3. 16	30.6. 16												

Rekonstrukce žst. Olomouc

ID	Číslo PS, SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2013				2014				2015				2016				I.
						II.	III.	IV.		I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	
268		D.3.5 Technologie transformačních stanic VN/NN (energetika)	643 dny	14.1. 14	18.10. 15																	
269	PS 18-13-01	Žst. Olomouc, rekonstrukce trafostanice ČD TS 22/0,4 kV, TS 1	294 dny	22.2. 14	12.12. 14					22.2.			12.12.									
270	PS 18-13-02	Žst. Olomouc, rekonstrukce trafostanice ČD TS 22/0,4 kV, TS2	286 dny	14.1. 14	26.10. 14					14.1.			26.10.									
271	PS 18-13-03	Žst. Olomouc, rekonstrukce trafostanice ČD TS 22/0,4 kV, TS 3	204 dny	28.8. 14	19.3. 15						28.8.		19.3.									
272	PS 18-13-04	Žst. Olomouc, nová trafostanice ČD TS 22/0,4 kV, TS4	125 dny	1.12. 14	4.4. 15							1.12.	4.4.									
273	PS 18-13-05	Žst. Olomouc, rekonstrukce trafostanice ČD TS 22/0,4 kV, TS5	286 dny	14.1. 14	26.10. 14					14.1.			26.10.									
274	PS 18-13-06	Žst. Olomouc, nová trafostanice ČD TS 22/0,4 kV, TS6	286 dny	14.1. 14	26.10. 14					14.1.			26.10.									
275	PS 18-13-07	Žst. Olomouc, rekonstrukce trafostanice ČD TS 22/0,4 kV, TS7	125 dny	16.6. 15	18.10. 15									16.6.		18.10.						
276	PS 18-08-01	Žst. Olomouc, rekonstrukce trafostanice ČD STS 6/0,4 kV, STS 313	286 dny	14.1. 14	26.10. 14					14.1.			26.10.									
277	PS 18-08-02	Žst. Olomouc, rekonstrukce trafostanice ČD STS 6/0,4 kV, STS 313A	299 dny	22.2. 14	17.12. 14					22.2.			17.12.									
278	PS 18-08-03	Žst. Olomouc, rekonstrukce trafostanice ČD STS 6/0,4 kV, STS 314	125 dny	1.12. 14	4.4. 15							1.12.	4.4.									
279	PS 18-08-04	Žst. Olomouc, rekonstrukce trafostanice ČD STS 6/0,4 kV, STS 314A	286 dny	14.1. 14	26.10. 14					14.1.			26.10.									
280	PS 18-08-05	Žst. Olomouc, rekonstrukce trafostanice ČD STS 6/0,4 kV, STS 314B	212 dny	20.8. 14	19.3. 15						20.8.		19.3.									
281	PS 18-08-06	Žst. Olomouc, rekonstrukce trafostanice ČD STS 6/0,4 kV, STS 315	286 dny	14.1. 14	26.10. 14					14.1.			26.10.									
282	PS 18-09-01	Žst. Olomouc, rozvodna EPZ	566 dny	1.4. 14	18.10. 15					1.4.			18.10.									
283	PS 18-07-01	Žst. Olomouc, úpravy rozvodny nn, VB	122 dny	22.2. 14	23.6. 14					22.2.		23.6.										
284	PS 18-07-03	Žst. Olomouc, demontáž dieselagregátu trafostanice TS2	14 dny	18.12. 14	31.12. 14								18.12.	31.12.								
285	PS 18-07-04	Žst. Olomouc, demontáž dieselagregátu trafostanice TS3	14 dny	18.12. 14	31.12. 14								18.12.	31.12.								
286	PS 18-07-05	Žst. Olomouc, demontáž technologického zařízení 6 kV	360 dny	24.4. 14	18.4. 15					24.4.			18.4.									
287		D.4 Ostatní technologická zařízení	801 dny	1.2. 14	11.4. 16																	
288		D.4.1 Osobní výtahy	461 dny	1.2. 14	7.5. 15																	
289	PS 18-29-01	Žst.Olomouc, technologie výtahů	461 dny	1.2. 14	7.5. 15					1.2.			7.5.									
290		D.4.2 Provozní technologie různé	742 dny	1.4. 14	11.4. 16																	
291	PS 18-27-01	Žst.Olomouc, nákladní nádraží - odvodnění železniční trati - čerpací stanice 1	244 dny	1.4. 14	30.11. 14					1.4.			30.11.									
292	PS 18-27-02	Žst.Olomouc, vnitřní nádraží - odvodnění železniční trati - čerpací stanice 2	66 dny	6.2. 16	11.4. 16												6.2.		11.4.			
293	PS 18-27-03	Žst.Olomouc, osobní nádraží - odvodnění železniční trati - čerpací stanice 3	70 dny	11.6. 15	19.8. 15																	
294	PS 18-27-04	Žst.Olomouc, osobní nádraží - odvodnění železniční trati - čerpací stanice 4	60 dny	1.3. 15	30.4. 15									1.3.		30.4.						
295		E STAVEBNÍ ČÁST	1042 dny	24.9. 13	31.7. 16																	
296		E.1 INŽENYRSKÉ OBJEKTY	1042 dny	24.9. 13	31.7. 16																	
297		E.1.1 Kolejový svršek a spodek	965 dny	24.9. 13	15.5. 16																	
298	SO 18-16-01	Žst.Olomouc, kolejový spodek	768 dny	16.3. 14	21.4. 16																	
299	SO 18-16-01.1	Žst.Olomouc - obvod přednádraží, kolejový spodek	768 dny	16.3. 14	21.4. 16																	
300		SP 7	26 dny	16.3. 14	10.4. 14																	
301		zřízení odvodnění	14 dny	16.3. 14	29.3. 14					16.3.		29.3.										
302		těžení zeminy, úprava zemní pláně	21 dny	17.3. 14	6.4. 14					17.3.		6.4.										
303		zřízení podkladních vrstev	23 dny	19.3. 14	10.4. 14					19.3.		10.4.										
304		SP 10	27 dny	16.3. 14	11.4. 14																	
305		zřízení odvodnění	14 dny	16.3. 14	29.3. 14					16.3.		29.3.										
306		těžení zeminy, úprava zemní pláně	18 dny	19.3. 14	5.4. 14					19.3.		5.4.										
307		zřízení podkladních vrstev	7 dny	5.4. 14	11.4. 14					5.4.		11.4.										
308		SP 8	37 dny	1.5. 14	6.6. 14																	
309		zřízení odvodnění	18 dny	1.5. 14	18.5. 14					1.5.		18.5.										
310		těžení zeminy, úprava zemní pláně	24 dny	3.5. 14	26.5. 14					3.5.		26.5.										
311		zřízení podkladních vrstev	7 dny	31.5. 14	6.6. 14					31.5.		6.6.										
312		SP 11	40 dny	29.4. 14	7.6. 14																	
313		zřízení odvodnění	26 dny	29.4. 14	24.5. 14					29.4.		24.5.										
314		těžení zeminy, úprava zemní pláně	36 dny	29.4. 14	3.6. 14					29.4.		3.6.										
315		zřízení podkladních vrstev	36 dny	3.5. 14	7.6. 14					3.5.		7.6.										
316		SP 14	52 dny	11.7. 14	31.8. 14																	
317		zřízení odvodnění	48 dny	11.7. 14	27.8. 14					11.7.		27.8.										
318		těžení zeminy, úprava zemní pláně	41 dny	18.7. 14	27.8. 14					18.7.		27.8.										
319		zřízení podkladních vrstev	4 dny	28.8. 14	31.8. 14					28.8.		31.8.										
320		SP 15	47 dny	13.9. 14	29.10. 14																	
321		zřízení odvodnění	35 dny	13.9. 14	17.10. 14					13.9.		17.10.										
322		těžení zeminy, úprava zemní pláně	38 dny	18.9. 14	25.10. 14					18.9.		25.10.										
323		zřízení podkladních vrstev	10 dny	20.10. 14	29.10. 14					20.10.		29.10.										
324		SP 16	13 dny	20.11. 14	2.12. 14																	
325		zřízení odvodnění	8 dny	20.11. 14	27.11. 14					20.11.		27.11.										
326		těžení zeminy, úprava zemní pláně	10 dny	22.11. 14	1.12. 14					22.11.		1.12.										
327		zřízení podkladních vrstev	4 dny	29.11. 14	2.12. 14					29.11.		2.12.										
328		SP 12	4 dny	11.4. 16	14.4. 16																	
329		zřízení odvodnění	2 dny	11.4. 16	12.4. 16																	
330		těžení zeminy, úprava zemní pláně	2 dny	12.4. 16	13.4. 16																	
331		zřízení podkladních vrstev	1 den	14.4. 16	14.4. 16																	
332		SP 12a	4 dny	18.4. 16	21.4. 16																	
333		zřízení odvodnění	2 dny	18.4. 16	19.4. 16																	
334		těžení zeminy, úprava zemní pláně	2 dny	19.4. 16	20.4. 16																	
335		zřízení podkladních vrstev	1 den	21.4. 16	21.4. 16																	
336	SO 18-16-01.2	Žst.Olomouc - obvod osobní nádraží, kolejový spodek	720 dny	12.4. 14	31.3. 16																	
337		SP 2 - kol.č. 8, 10	71 dny	12.4. 14	21.6. 14																	
338		zřízení odvodnění	42 dny	12.4. 14	23.5. 14					12.4.		23.5.										
339		těžení zeminy, úprava zemní pláně	51 dny	22.4. 14	11.6. 14					22.4.		11.6.										
340		zřízení podkladních vrstev	10 dny	12.6. 14	21.6. 14					12.6.		21.6.										

Rekonstrukce žst. Olomouc

ID	Číslo PS, SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2013				2014				2015				2016			
						II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.
341		SP 3	72 dny	5.7. 14	14.9. 14																
342		zřízení odvodnění	42 dny	5.7. 14	15.8. 14							5.7.	15.8.								
343		těžení zeminy, úprava zemní pláň	48 dny	15.7. 14	31.8. 14							15.7.	31.8.								
344		zřízení podkladních vrstev	10 dny	5.9. 14	14.9. 14							5.9.	14.9.								
345		SP 4	72 dny	27.9. 14	7.12. 14																
346		zřízení odvodnění	42 dny	27.9. 14	7.11. 14							27.9.	7.11.								
347		těžení zeminy, úprava zemní pláň	48 dny	6.10. 14	22.11. 14							6.10.	22.11.								
348		zřízení podkladních vrstev	10 dny	28.11. 14	7.12. 14							28.11.	7.12.								
349		SP 15	47 dny	13.9. 14	29.10. 14																
350		zřízení odvodnění	35 dny	13.9. 14	17.10. 14							13.9.	17.10.								
351		těžení zeminy, úprava zemní pláň	38 dny	18.9. 14	25.10. 14							18.9.	25.10.								
352		zřízení podkladních vrstev	10 dny	20.10. 14	29.10. 14							20.10.	29.10.								
353		SP 16	13 dny	20.11. 14	2.12. 14																
354		zřízení odvodnění	8 dny	20.11. 14	27.11. 14							20.11.	27.11.								
355		těžení zeminy, úprava zemní pláň	10 dny	22.11. 14	1.12. 14							22.11.	1.12.								
356		zřízení podkladních vrstev	4 dny	29.11. 14	2.12. 14							29.11.	2.12.								
357		SP 5	182 dny	27.10. 14	26.4. 15																
358		zřízení odvodnění	19 dny	27.10. 14	14.11. 14							27.10.	14.11.								
359		těžení zeminy, úprava zemní pláň	28 dny	27.3. 15	23.4. 15																
360		zřízení podkladních vrstev	6 dny	21.4. 15	26.4. 15																
361		SP 17	36 dny	19.3. 15	23.4. 15																
362		zřízení odvodnění	21 dny	19.3. 15	8.4. 15																
363		těžení zeminy, úprava zemní pláň	23 dny	26.3. 15	17.4. 15																
364		zřízení podkladních vrstev	7 dny	17.4. 15	23.4. 15																
365		SP 18	61 dny	24.3. 15	23.5. 15																
366		zřízení odvodnění	47 dny	24.3. 15	9.5. 15																
367		těžení zeminy, úprava zemní pláň	42 dny	31.3. 15	11.5. 15																
368		zřízení podkladních vrstev	5 dny	19.5. 15	23.5. 15																
369		SP 19	15 dny	3.6. 15	17.6. 15																
370		zřízení odvodnění	10 dny	3.6. 15	12.6. 15																
371		těžení zeminy, úprava zemní pláň	12 dny	4.6. 15	15.6. 15																
372		zřízení podkladních vrstev	4 dny	14.6. 15	17.6. 15																
373		SP 20	4 dny	15.7. 15	18.7. 15																
374		zřízení odvodnění	2 dny	15.7. 15	16.7. 15																
375		těžení zeminy, úprava zemní pláň	3 dny	16.7. 15	18.7. 15																
376		zřízení podkladních vrstev	2 dny	17.7. 15	18.7. 15																
377		SP 21	11 dny	29.7. 15	8.8. 15																
378		zřízení odvodnění	5 dny	29.7. 15	2.8. 15																
379		těžení zeminy, úprava zemní pláň	7 dny	30.7. 15	5.8. 15																
380		zřízení podkladních vrstev	3 dny	6.8. 15	8.8. 15																
381		SP 22	26 dny	16.8. 15	10.9. 15																
382		zřízení odvodnění	14 dny	16.8. 15	29.8. 15																
383		těžení zeminy, úprava zemní pláň	16 dny	18.8. 15	2.9. 15																
384		zřízení podkladních vrstev	4 dny	7.9. 15	10.9. 15																
385		SP 23	10 dny	12.10. 15	21.10. 15																
386		zřízení odvodnění	8 dny	12.10. 15	19.10. 15																
387		těžení zeminy, úprava zemní pláň	9 dny	12.10. 15	20.10. 15																
388		zřízení podkladních vrstev	4 dny	18.10. 15	21.10. 15																
389		SP 24	7 dny	23.10. 15	29.10. 15																
390		zřízení odvodnění	2 dny	23.10. 15	24.10. 15																
391		těžení zeminy, úprava zemní pláň	3 dny	24.10. 15	26.10. 15																
392		zřízení podkladních vrstev	2 dny	28.10. 15	29.10. 15																
393		SP 25	20 dny	4.11. 15	23.11. 15																
394		zřízení odvodnění	12 dny	4.11. 15	15.11. 15																
395		těžení zeminy, úprava zemní pláň	15 dny	5.11. 15	19.11. 15																
396		zřízení podkladních vrstev	5 dny	19.11. 15	23.11. 15																
397		SP 26	17 dny	15.3. 16	31.3. 16																
398		zřízení odvodnění	10 dny	15.3. 16	24.3. 16																
399		těžení zeminy, úprava zemní pláň	13 dny	16.3. 16	28.3. 16																
400		zřízení podkladních vrstev	4 dny	28.3. 16	31.3. 16																
401	SO 18-17-01	Žst.Olomouc, kolejový svršek	958 dny	1.10. 13	15.5. 16																
402	SO 18-17-01.1	Žst.Olomouc - obvod přednádraží, kolejový svršek	937 dny	1.10. 13	24.4. 16																
403		SP 0 - přípravné práce	14 dny	1.10. 13	14.10. 13																
404		snesení kol.č. 111, 111b, 115, 53a, 53b, 203, 205, část kol.č. 104b, 207; snesení výhybek č. 232, 243, 245, 249, 252; zřízení zarážedel v kol.č. 117, 119, 121, 123, 205	14 dny	1.10. 13	14.10. 13																
405		SP 7 - kol.č. 101, 103, 201	37 dny	15.3. 14	20.4. 14																
406		snesení kol.č. 101, 103, 201	7 dny	15.3. 14	21.3. 14																
407		předštěrkování kol.č.201	2 dny	21.3. 14	22.3. 14																
408		zřízení žel. svršku kol.č. 201	5 dny	23.3. 14	27.3. 14																
409		předštěrkování kol.č.101, 103	6 dny	7.4. 14	12.4. 14																
410		zřízení žel. svršku kol.č. 101, 103	11 dny	10.4. 14	20.4. 14																

Rekonstrukce žst. Olomouc


ID	Číslo PS, SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2013				2014				2015				2016				I.
						II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.		
411		SP 10 - Zhlaví Filiálka, lichá skupina	41 dny	15.3. 14	24.4. 14																	
412		snesení kol.č. 103b; snesení výh.č. 337, 320, 318, 315, 314, 310, 308, 327, 338, 342ab, 344ab, 346	7 dny	15.3. 14	21.3. 14				15.3.	21.3.												
413		předšterkování kol.č.203b, kol. po snesených výh.č. 308, 310, výh.č. 246X, 247X, 252X, 255X, 285X	5 dny	9.4. 14	13.4. 14				9.4.	13.4.												
414		předšterkování výh.č. 344	1 den	29.3. 14	29.3. 14				29.3.	29.3.												
415		zřízení žel. svršku kol.č. kol.č.203b; kol. po snesených výh.č. 308, 310; výh.č. 246X, 247X, 252X, 255X, 285X	13 dny	12.4. 14	24.4. 14				12.4.	24.4.												
416		zřízení žel. svršku výh.č. 344	3 dny	30.3. 14	1.4. 14				30.3.	1.4.												
417		SP 8 - kol.č. 102, 104, 202	47 dny	30.4. 14	15.6. 14				30.4.	4.5.												
418		snesení kol.č. 102, 104, 202, 54b, 16kt; snesení části kol. 15t, 16t, 106; snesení výh.č. 236, 225, 621, 623	5 dny	30.4. 14	4.5. 14				30.4.	4.5.												
419		předšterkování kol.č.102, 104, 202, 104b; části kol 106, 17k, 17t; výh.č. 226X, 203X, 621X	32 dny	8.5. 14	8.6. 14				8.5.	8.6.												
420		zřízení žel. svršku kol.č. 102, 104, 202, 104b; části kol 106, 17k, 17t; výh.č. 226X, 203X, 621X	38 dny	9.5. 14	15.6. 14				9.5.	15.6.												
421		SP 9 - Černovířský nadjezd	16 dny	21.11. 15	6.12. 15																	
422		snesení části kol č. 202	5 dny	21.11. 15	25.11. 15												21.11.	25.11.				
423		zpětné vložení části kol č. 202	3 dny	26.11. 15	28.11. 15												26.11.	28.11.				
424		snesení části kol č. 201	5 dny	29.11. 15	3.12. 15												29.11.	3.12.				
425		zpětné vložení části kol č. 201	3 dny	4.12. 15	6.12. 15												4.12.	6.12.				
426		SP 11 - Zhlaví Filiálka, sudá skupina	44 dny	28.4. 14	10.6. 14																	
427		snesení výh.č. 326, 336, 340,341	1 den	28.4. 14	28.4. 14				28.4.	28.4.												
428		snesení části kol.č. 104b; výh.č. 324ab, 328, 335, 339	2 dny	5.5. 14	6.5. 14				5.5.	6.5.												
429		předšterkování výh.č. 282X, 281X, 262X	1 den	1.5. 14	1.5. 14				1.5.	1.5.												
430		předšterkování části kol.č. 104bvýh.č. 259X, 260X, 267X	1 den	15.5. 14	15.5. 14				15.5.	15.5.												
431		předšterkování části kol.č. 102; výh.č. 256X	1 den	8.6. 14	8.6. 14				8.6.	8.6.												
432		zřízení žel. svršku výh.č. 282X, 281X, 262X	4 dny	1.5. 14	4.5. 14				1.5.	4.5.												
433		zřízení žel. svršku části kol.č.104b; výh.č. 259X, 260X, 267X, 325	4 dny	16.5. 14	19.5. 14				16.5.	19.5.												
434		zřízení žel. svršku části kol.č. 102; výh.č. 256X	2 dny	9.6. 14	10.6. 14				9.6.	10.6.												
435		SP 13 - Pavlovický podjezd	51 dny	28.4. 14	17.6. 14																	
436		dočasné snesení části kol.č. 7t v oblasti podjezdu	1 den	28.4. 14	28.4. 14				28.4.	28.4.												
437		pokládka dočasně snesené části kol.č. 7t v oblasti podjezdu	2 dny	16.6. 14	17.6. 14				16.6.	17.6.												
438		SP 14	61 dny	9.7. 14	7.9. 14																	
439		snesení části kol.č. 1t, 54a, 52a, 54, 56; výh.č. 620	2 dny	9.7. 14	10.7. 14				9.7.	10.7.												
440		osazení provizorních zarážedel do kol.č. 54, 56	2 dny	11.7. 14	12.7. 14				11.7.	12.7.												
441		předšterkování kol.č.54a, 52a; výh.č. 620X	2 dny	1.9. 14	2.9. 14												1.9.	2.9.				
442		zřízení žel. svršku kol.č.54a, 52a; výh.č. 620X	6 dny	2.9. 14	7.9. 14												2.9.	7.9.				
443		SP 15 - Pavlovický podjezd, lichá skupina	67 dny	11.9. 14	16.11. 14																	
444		snesení kol.č. 53b, 53a; části kol.č. 51-65; výh.č. 203, 208, 210, 212, 211, 213,214, 215, 221, 222, 223, 224, 226, 228, 230, 235, 232, 238, 239, 240, 255, osazení zarážedel do kol.č. 125, 127	10 dny	11.9. 14	20.9. 14																	
445		předšterkování části kol.č. 101-109; výh.č. 218X, 211X, 214X, 209X, 206X, 205X, 201X, 128X, 126X, 129X, 130X	10 dny	22.10. 14	31.10. 14												22.10.	31.10.				
446		zřízení žel. svršku částí kol.č. 101-109; výh.č. 218X, 211X, 214X, 209X, 206X, 205X, 201X, 128X, 126X, 129X, 130X	21 dny	27.10. 14	16.11. 14												27.10.	16.11.				
447		SP 16	8 dny	19.11. 14	26.11. 14																	
448		snesení výh.č. 227, 229	2 dny	19.11. 14	20.11. 14																	
449		předšterkování výh.č. 202X, 204X, 207X, 208X	2 dny	22.11. 14	23.11. 14												19.11.	20.11.				
450		zřízení žel. svršku výh.č. výh.č. 202X, 204X, 207X, 208X	4 dny	23.11. 14	26.11. 14												22.11.	23.11.				
451		SP 12 - kol.č.201 a kol.č.1 TÚ Štěpánov-Olomouc	7 dny	11.4. 16	17.4. 16												23.11.	26.11.				
452		snesení částí kol.č. 207, částí kol.č. 1 TÚ Olomouc - Štěpánov; kol.č. 203b; výh.č. 355, 357, 358, 359ab, 360, 361, 362; osazení zarážedel do kol.č. 209, 211	2 dny	11.4. 16	12.4. 16																	
453		předšterkování části kol.č. 1 TÚ Olomouc - Štěpánov	1 den	15.4. 16	15.4. 16																	
454		zřízení žel. svršku části kol.č. 1 TÚ Olomouc - Štěpánov	3 dny	15.4. 16	17.4. 16																	
455		SP 12a - kol.č.202 a kol.č.2 TÚ Štěpánov-Olomouc	7 dny	18.4. 16	24.4. 16																	
456		snesení částí kol.č. 2 TÚ Olomouc - Štěpánov; výh.č. 356, 363	1 den	18.4. 16	18.4. 16																	
457		předšterkování části kol.č. 2 TÚ Olomouc - Štěpánov	1 den	22.4. 16	22.4. 16																	
458		zřízení žel. svršku částí kol.č. 2 TÚ Olomouc - Štěpánov	3 dny	22.4. 16	24.4. 16																	
459	SO 18-17-01.2	Žst.Olomouc - obvod osobní nádraží, kolejový svršek	922 dny	1.10. 13	9.4. 16																	
460		SP 0 - přípravné práce	78 dny	1.10. 13	17.12. 13																	
461		snesení kol.č. 1a, 6a, 14, 18b, část kol.č. 18a	14 dny	1.10. 13	14.10. 13				1.10.	14.10.												
462		směrová úprava koleje č. 3 a nástupištní hrany nást. č. 1	7 dny	27.11. 13	3.12. 13				27.11.	3.12.												
463		směrová úprava koleje č. 6 a nástupištní hrany nást. č. 3	7 dny	4.12. 13	10.12. 13				4.12.	10.12.												
464		směrová úprava koleje č. 5 a nástupištní hrany nást. č. 5	7 dny	11.12. 13	17.12. 13				11.12.	17.12.												
465		SP 1 - kol.č. 12, 16	183 dny																			

Rekonstrukce žst. Olomouc

ID	Číslo PS, SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2013			2014				2015				2016				I.
						II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	
474		předštěrkování kol.č.4, 6	3 dny	14.9. 14	16.9. 14						14.9.	16.9.									
475		zřízení žel. svršku kol.č. 4, 6	7 dny	16.9. 14	22.9. 14						16.9.	22.9.									
476		SP 4 - kol.č. 1, 2	82 dny	25.9. 14	15.12. 14																
477		snesení kol.č. 1, 2	4 dny	25.9. 14	28.9. 14						25.9.	28.9.									
478		předštěrkování kol.č.1, 2	3 dny	7.12. 14	9.12. 14							7.12.	9.12.								
479		zřízení žel. svršku kol.č. 1, 2	7 dny	9.12. 14	15.12. 14							9.12.	15.12.								
480		SP 15 - Pavlovický podjezd, lichá skupina	67 dny	11.9. 14	16.11. 14																
481		snesení kol.č. 53b, 53a; částí kol.č. 51-65	10 dny	11.9. 14	20.9. 14						11.9.	20.9.									
482		předštěrkování částí kol.č. 51-65; výh.č. 127X, 217X, 124X, 118X	10 dny	22.10. 14	31.10. 14						22.10.	31.10.									
483		zřízení žel. svršku částí kol.č. 51-65; výh.č. 127X, 217X, 124X, 118X	21 dny	27.10. 14	16.11. 14						27.10.	16.11.									
484		SP 16	18 dny	19.11. 14	6.12. 14																
485		snesení výh.č. 204, 205, 209	2 dny	19.11. 14	20.11. 14						19.11.	20.11.									
486		předštěrkování částí kol.č. 52a, 54a, 56, 68; výh.č. 116X, 120X, 121X, 123X	3 dny	1.12. 14	3.12. 14							1.12.	3.12.								
487		zřízení žel. svršku částí kol.č. 52a, 54a, 56, 68; výh.č. 116X, 120X, 121X, 123X	5 dny	2.12. 14	6.12. 14							2.12.	6.12.								
488		SP 5 - kol.č. 3	193 dny	25.10. 14	5.5. 15																
489		snesení kol.č. 3	3 dny	25.10. 14	27.10. 14						25.10.	27.10.									
490		předštěrkování kol.č.3	2 dny	27.4. 15	28.4. 15								27.4.	28.4.							
491		zřízení žel. svršku kol.č. 3	7 dny	29.4. 15	5.5. 15								29.4.	5.5.							
492		SP 17 - Grygovské zhlaví, výtažné koleje	49 dny	17.3. 15	4.5. 15																
493		snesení kol.č. 12, 16, 18; výh.č. 32; osazení provizor. zarážedel do kol.č. 12, 16, 18	5 dny	17.3. 15	21.3. 15								17.3.	21.3.							
494		snesení kol.č. 18a; výh.č. 12	1 den	19.3. 15	19.3. 15								19.3.	19.3.							
495		předštěrkování částí kol.č. 18a; výh.č. 3X, 12X	1 den	22.3. 15	22.3. 15								22.3.	22.3.							
496		předštěrkování částí kol.č. 12, 16, 18; výh.č. 45X, 39X, 38X, 36X, 32X	4 dny	22.4. 15	25.4. 15								22.4.	25.4.							
497		zřízení žel. svršku ččástí kol.č. 18a; výh.č. 3X, 12X	4 dny	23.3. 15	26.3. 15								23.3.	26.3.							
498		zřízení žel. svršku částí kol.č. 12, 16, 18; výh.č. 45X, 39X, 38X, 36X, 32X	11 dny	24.4. 15	4.5. 15								24.4.	4.5.							
499		SP 18 - Grygovské zhlaví, sudá skupina	27 dny	7.5. 15	2.6. 15																
500		snesení částí kol.č. 2 TK Olomouc-Grygov vč. výh. Č. 9; části vlečky ADM; provizorní propojení kol.č. 2 do vlečky ADM	1 den	7.5. 15	7.5. 15								7.5.	7.5.							
501		snesení výh.č. 21, 29, 30, 33, 36ab, 39 vč. mezilehlých kolejí	4 dny	8.5. 15	11.5. 15								8.5.	11.5.							
502		snesení částí kol.č. 2 TK Olomouc-Grygov vč. prov. propojení do vlečky ADM; propojení výh.č. 3X do vlečky ADM	2 dny	20.5. 15	21.5. 15								20.5.	21.5.							
503		předštěrkování částí kol.č. 2, 10, 12a, 18, 20; výh.č. 5X, 7X, 9X, 17X, 24X, 26X, 27X, 28X, 29X	5 dny	21.5. 15	25.5. 15								21.5.	25.5.							
504		zřízení žel. svršku částí kol.č. 2, 10, 12a, 18, 20; výh.č. 5X, 7X, 9X, 17X, 24X, 26X, 27X, 28X, 29X	11 dny	23.5. 15	2.6. 15								23.5.	2.6.							
505		SP 19 - Grygovské zhlaví, sudá skupina, dokončení	21 dny	2.6. 15	22.6. 15																
506		snesení částí kol.č. 2, 4, 6, 8; výh.č. 44, 43, 41, 38, 35, 23, 25, 31	3 dny	2.6. 15	4.6. 15								2.6.	4.6.							
507		předštěrkování částí kol.č. 4, 6, 8; výh.č. 35	1 den	4.6. 15	4.6. 15								4.6.	4.6.							
508		předštěrkování částí kol.č. 2; výh.č. 20X, 22X, 25X	2 dny	17.6. 15	18.6. 15								17.6.	18.6.							
509		zřízení žel. svršku částí kol.č. 4, 6, 8; výh.č. 35	3 dny	5.6. 15	7.6. 15								5.6.	7.6.							
510		zřízení žel. svršku částí kol.č. 2; výh.č. 20X, 22X, 25X	5 dny	18.6. 15	22.6. 15								18.6.	22.6.							
511		SP 20 - Grygovské zhlaví, lichá skupina	7 dny	15.7. 15	21.7. 15																
512		snesení částí kol.č. 1 TK Olomouc-Grygov, 5a; výh.č. 13, 16, 17, 20, 26, 37	3 dny	15.7. 15	17.7. 15								15.7.	17.7.							
513		předštěrkování částí kol.č. 1 TK Olomouc-Grygov; kol.č. 5a, 3a; výh.č. 15X, 30X, 31X	3 dny	17.7. 15	19.7. 15								17.7.	19.7.							
514		zřízení žel. svršku částí kol.č. 1 TK Olomouc-Grygov; kol.č. 5a, 3a; výh.č. 15X, 30X, 31X	4 dny	18.7. 15	21.7. 15								18.7.	21.7.							
515		SP 21 - Grygovské zhlaví, lichá skupina, dokončení	14 dny	29.7. 15	11.8. 15																
516		snesení výh.č. 6; náhrada výh. č. 6 kol. polem	1 den	29.7. 15	29.7. 15								29.7.	29.7.							
517		snesení kol.č. 3b; výh.č. 18, 34, 49, 45 vč. kusé koleje	2 dny	29.7. 15	30.7. 15								29.7.	30.7.							
518		předštěrkování kol.č. 3b, částí kol.č. 5; výh.č. 16X, 19X, 37X, 42X	3 dny	7.8. 15	9.8. 15								7.8.	9.8.							
519		zřízení žel. svršku kol.č. 3b, částí kol.č. 5; výh.č. 16X, 19X, 37X, 42X	4 dny	8.8. 15	11.8. 15								8.8.	11.8.							
520		SP 22 - Zhlaví u Bystřičky	31 dny	15.8. 15	14.9. 15																
521		snesení částí kol.č. 12, 16, 18, 20; výh.č. 72, 78, 79, 88, 87, 85, 82, 81	4 dny	15.8. 15	18.8. 15								15.8.	18.8.							
522		snesení části TK směr Olomouc-Bělidla; výh.č. 106	2 dny	11.9. 15	12.9. 15								11.9.	12.9.							
523		předštěrkování částí TK Olomouc-Olomouc,Bělidla; části kol.č. 12, 16, 18, 20, 22; výh.č. 52X, 54X, 64X, 67X, 72X, 73X	3 dny	5.9. 15	7.9. 15								5.9.	7.9.							
524		předštěrkování částí TK směr Olomouc-Bělidla; výh.č. 101X, 106X	3 dny	9.9. 15	11.9. 15								9.9.	11.9.							
525		zřízení žel. svršku části TK Olomouc-Olomouc,Bělidla; části kol.č. 12, 16, 18, 20, 22; výh.č. 52X, 54X, 64X, 67X, 72X, 73X, 101X, 106X	8 dny	7.9. 15	14.9. 15								7.9.	14.9.							
526		zřízení žel. svršku částí TK směr Olomouc-Bělidla; výh.č. 101X, 106X	4 dny	11.9. 15	14.9. 15								11.9.	14.9.							
527		SP 23 - Zhlaví u Bystřičky	36 dny	18.9. 15	23.10. 15																
528		snesení výh.č. 108ab, 109	1 den	18.9. 15	18.9. 15								18.9.	18.9.							
529		snesení výh.č. 105	1 den	21.9. 15	21.9. 15								21.9.	21.9.							
530		snesení částí kol.č. 8, 10; výh.č. 67	1 den	11.10. 15	11.10. 15								11.10.	11.10.							
531		snesení části TK Olomouc-Bohuňovice, části kol.č. 104b; výh.č. 112	2 dny	15.10. 15	16.10. 15								15.10.	16.10.							
532		snesení částí kol.č. 1t, 58, 56; výh.č. 113, 116	1 den	18.10. 15	18.10. 15								18.10.	18.10.							
533		předštěrkování provizorních výh.č. X1, X3	1 den	18.9. 15	18.9. 15								18.9.	18.9.							
534		předštěrkování provizorní výh.č. X2	1 den	21.9. 15	21.9. 15								21.9.	21.9.							
535		předštěrkování částí kol.č. 8, 10; výh.č. 69X, 58X	2 dny	19.10. 15	20.10. 15								19.10.	20.10.							
536		předštěrkování částí TK Olomouc-Bohuňovice, části kol.č. 104b; výh.č. 108X, 109X, 108X, 111X, 114X	2 dny	18.10. 15	19.10. 15								18.10.	19.10.							
537		předštěrkování částí kol.č. 1t, 58, 56; výh.č. 113X	1 den	22.10. 15	22.10. 15								22.10.	22.10.							

Rekonstrukce žst. Olomouc

ID	Číslo PS, SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2013			2014				2015				2016				I.
						II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	
538		zřízení žel. svršku provizorních výh.č. X1, X3, provizorní napojení výh.č. X3 na TK Olomouc-Bohuňovice	2 dny	19.9. 15	20.9. 15											19.9. ↓ 20.9.					
539		zřízení žel. svršku provizorní výh.č. X2	1 den	22.9. 15	22.9. 15											22.9. ↓ 22.9.					
540		zřízení žel. svršku části kol.č. 8, 10; výh.č. 69X, 58X	3 dny	20.10. 15	22.10. 15											20.10. ↓ 22.10.					
541		zřízení žel. svršku části TK Olomouc-Bohuňovice, části kol.č. 104b; výh.č. 108X, 109X, 108X, 111X, 114X	4 dny	19.10. 15	22.10. 15											19.10. ↓ 22.10.					
542		zřízení žel. svršku části kol.č. 1t, 58, 56; výh.č. 113X	2 dny	22.10. 15	23.10. 15											22.10. ↓ 23.10.					
543		SP 24 - Zhlaví u Bystřičky	10 dny	23.10. 15	1.11. 15											↓					
544		snesení části kol.č. 6; výh.č. 71, 76	1 den	23.10. 15	23.10. 15											23.10. ↓ 23.10.					
545		předštěrkování části kol.č. 6; výh.č. 59X	2 dny	29.10. 15	30.10. 15											29.10. ↓ 30.10.					
546		zřízení žel. svršku části kol.č. 6; výh.č. 59X	3 dny	30.10. 15	1.11. 15											30.10. ↓ 1.11.					
547		SP 25 - Zhlaví u Bystřičky, v kolejích č. 2, 4	30 dny	3.11. 15	2.12. 15											↓					
548		snesení části kol.č. 4, 52, 54; výh.č. 83, 90, 92, 101, 108, 109,110, 105, 91, 84, 114 a X1, X2, X3	5 dny	3.11. 15	7.11. 15											3.11. ↓ 7.11.					
549		předštěrkování části kol.č. 4a, 102; výh.č. 68X, 70X, 71X, 74X, 102X, 103X, 107X, 112X	4 dny	21.11. 15	24.11. 15											21.11. ↓ 24.11.					
550		zřízení žel. svršku části kol.č. 4a, 102; výh.č. 68X, 70X, 71X, 74X, 102X, 103X, 107X, 112X	10 dny	23.11. 15	2.12. 15											23.11. ↓ 2.12.					
551		SP 26 - Zhlaví u Bystřičky, v kolejích č. 51, 53	27 dny	14.3. 16	9.4. 16																
552		snesení kol.č. 51, části kol.č. 1; výh.č. 62, 70, 74, 86, 89, 103, 117	4 dny	14.3. 16	17.3. 16																
553		předštěrkování výh.č. 47X	1 den	15.3. 16	15.3. 16																
554		předštěrkování kol.č. 101; výh.č. 53X, 55X, 63X, 115X	4 dny	29.3. 16	1.4. 16																
555		zřízení žel. svršku výh.č. 47X; SVÚ výhybek č.64, 69, 77	2 dny	15.3. 16	16.3. 16																
556		zřízení žel. svršku kol.č. 101; výh.č. 53X, 55X, 63X, 115X; SVÚ koleje č. 53, výhybek č.104, 107	10 dny	31.3. 16	9.4. 16																
557		SP 6 - kol.č. 5, 7, 7a	4 dny	2.5. 15	5.5. 15																
558		směrová i výšková úprava kolejí č.5, 7, 7a	4 dny	2.5. 15	5.5. 15											2.5. ↓ 5.5.					
559	SO 18-17-01.3	Žst.Olomouc, úpravy železničních přejezdů	70 dny	7.3. 16	15.5. 16																
560	SO 18-17-02	Žst.Olomouc, výstroj trati	945 dny	24.9. 13	25.4. 16																
561	SO 18-17-02.1	Výstroj trati	755 dny	2.4. 14	25.4. 16																
562	SO 18-17-02.2	Informační billboardy	68 dny	24.9. 13	30.11. 13																
563		E.1.2 Nástupišť	952 dny	7.10. 13	15.5. 16																
564	SO 18-16-02	Žst. Olomouc, nástupišť	578 dny	7.10. 13	7.5. 15																
565		Žst. Olomouc, nástupišť č. 5	185 dny	7.10. 13	9.4. 14																
566		Žst. Olomouc, nástupišť č. 4	85 dny	9.4. 14	2.7. 14																
567		Žst. Olomouc, nástupišť č. 3	85 dny	2.7. 14	24.9. 14																
568		Žst. Olomouc, nástupišť č. 2	80 dny	24.9. 14	12.12. 14																
569		Žst. Olomouc, nástupišť č. 1A	116 dny	12.1. 15	7.5. 15																
570		Žst. Olomouc, nástupišť č. 1	196 dny	24.10. 14	7.5. 15																
571	SO 18-17-03	Žst. Olomouc, informační systém - piktogramy	435 dny	27.2. 14	7.5. 15																
572		Žst. Olomouc, informační systém - piktogramy, nástupišť č. 5	42 dny	27.2. 14	9.4. 14																
573		Žst. Olomouc, informační systém - piktogramy, nástupišť č. 4	42 dny	22.5. 14	2.7. 14																
574		Žst. Olomouc, informační systém - piktogramy, nástupišť č. 3	42 dny	14.8. 14	24.9. 14																
575		Žst. Olomouc, informační systém - piktogramy, nástupišť č. 2	42 dny	1.11. 14	12.12. 14																
576		Žst. Olomouc, informační systém - piktogramy, nástupišť č. 1	42 dny	27.3. 15	7.5. 15																
577		Žst. Olomouc, informační systém - piktogramy, nástupišť č. 1A	42 dny	27.3. 15	7.5. 15																
578	SO 18-16-03	Žst. Olomouc, zpevněné plochy	63 dny	14.3. 16	15.5. 16																
579		E.1.4 Mosty, propustky a zdi	943 dny	1.10. 13	30.4. 16																
580	SO 18-19-01	Žst.Olomouc, silniční nadjezd v km 83,484 (Černovír)	243 dny	1.9. 15	30.4. 16																
581	SO 18-19-02	Žst.Olomouc, chránička vodovodu v novém km 83,680	75 dny	13.3. 14	26.5. 14																
582	SO 18-19-03	Žst.Olomouc, železniční propustek v km 84,575	75 dny	13.3. 14	26.5. 14																
583	SO 18-19-04	Žst.Olomouc, zrušení zbytku mostního objektu v km 84,860	559 dny	17.3. 14	26.9. 15																
584	SO 18-19-04.1	Žst.Olomouc, zrušení zbytku mostního objektu v km 84,015	7 dny	2.5. 14	8.5. 14																
585	SO 18-19-04.2	Žst.Olomouc, zrušení zbytku mostního objektu v km 84,300	53 dny	17.3. 14	8.5. 14																
586		pod kol.č. 201	7 dny	17.3. 14	23.3. 14																
587		pod kol.č. 202	7 dny	2.5. 14	8.5. 14																
588	SO 18-19-04.3	Žst.Olomouc, zrušení zbytku mostního objektu v km 84,860	56 dny	17.3. 14	11.5. 14																
589		pod kol.č. 101	10 dny	17.3. 14	26.3. 14																
590		pod kol.č. 102, 104	10 dny	2.5. 14	11.5. 14																
591	SO 18-19-04.4	Žst.Olomouc, zrušení zbytku mostního objektu v km 205,256	75 dny	8.5. 15	21.7. 15																
592		pod kol.č. 1, 12a	5 dny	8.5. 15	12.5. 15																
593		pod kol.č. 1a	5 dny	17.7. 15	21.7. 15																
594	SO 18-19-04.5	Žst.Olomouc, zrušení zbytku mostního objektu v km 86,783	450 dny	4.7. 14	26.9. 15																
595		pod kol.č. 2, 4	7 dny	4.7. 14	10.7. 14																
596		pod kol.č. 1, 3	7 dny	26.9. 14	2.10. 14																
597		pod kol.č. 5	7 dny	26.10. 14	1.11. 14																
598		pod kol.č. 10, 12, 14, 16	10 dny	14.8. 15	23.8. 15																
599		pod kol.č. 6, 8	7 dny	20.9. 15	26.9. 15																
600	SO 18-19-05	Žst.Olomouc, zrušení zbytku mostního objektu v km 85,090																			

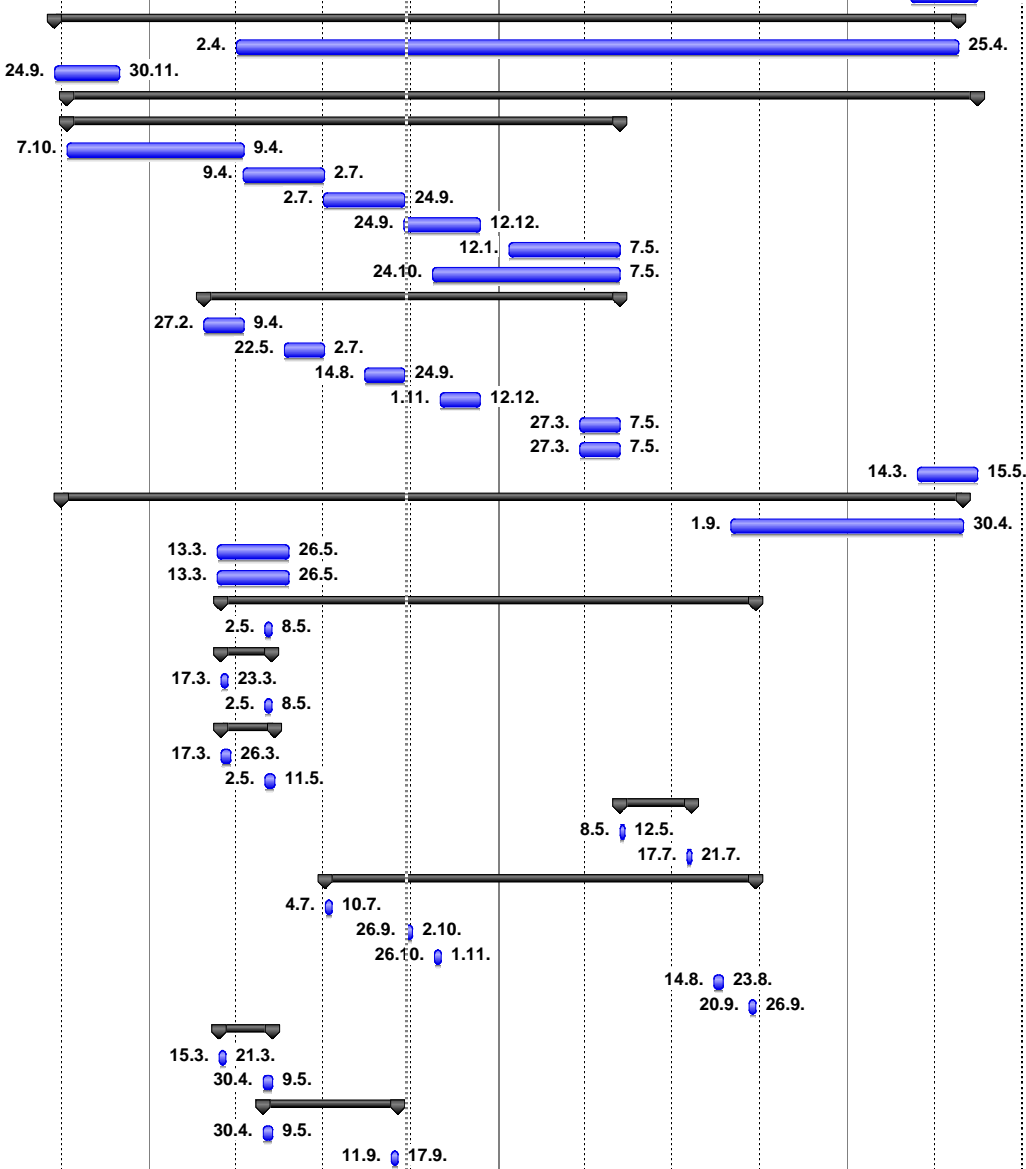

Rekonstrukce žst. Olomouc

ID	Číslo PS, SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2013				2014				2015				2016				
						II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	
606	SO 18-19-07	Žst.Olomouc, železniční most v km 85,761 (Pavlovický podjezd)	429 dny	28.4. 14	30.6. 15				28.4.						30.6.							
607	SO 18-19-08	Žst.Olomouc, kabelový most v km 85,761	77 dny	1.8. 14	16.10. 14					1.8.		16.10.										
608	SO 18-19-09	Žst.Olomouc, železniční most v km 86,486 (přes Bystřičku)	938 dny	1.10. 13	25.4. 16																	
609		přípravné práce, výstavba nové římsy vpravo trati	50 dny	1.10. 13	19.11. 13	1.10.		19.11.														
610		hlavní stavební práce - rozšíření spodní stavby; nová NK v koleji č. 10; rekonstrukce NK v kol.č. 1, 2, 4, 103a, 103b	271 dny	16.7. 15	11.4. 16										16.7.							
611		dokončovací práce	30 dny	27.3. 16	25.4. 16													27.3.		25.4.		
612	SO 18-19-10	Žst.Olomouc, kabelový most v km 86,486	147 dny	17.11. 15	11.4. 16												17.11.			11.4.		
613	SO 18-19-11	Žst.Olomouc, železniční most v km 86,840 (starý podchod)	578 dny	7.10. 13	7.5. 15																	
614		podchod pod kol.č. 10, výstup na nástupiště č. 5	185 dny	7.10. 13	9.4. 14	7.10.			9.4.													
615		podchod pod kol.č. 6, 8, výstup na nástupiště č. 4	85 dny	9.4. 14	2.7. 14				9.4.		2.7.											
616		podchod pod kol.č. 2, 4, výstup na nástupiště č. 3	85 dny	2.7. 14	24.9. 14					2.7.		24.9.										
617		podchod pod kol.č. 1, 3, výstup na nástupiště č. 2	80 dny	24.9. 14	12.12. 14						24.9.		12.12.									
618		podchod pod kol.č. 5, výstup na nástupiště č. 1	196 dny	24.10. 14	7.5. 15						24.10.			7.5.								
619	SO 18-19-12	Žst.Olomouc, železniční most v ev. km 205,741 (nový podchod)	564 dny	7.10. 13	23.4. 15																	
620		podchod pod kol.č. 10, výstup na nástupiště č. 5	185 dny	7.10. 13	9.4. 14	7.10.			9.4.													
621		úprava podchodu v oblasti nástupiště č. 4	45 dny	19.5. 14	2.7. 14				19.5.		2.7.											
622		úprava podchodu v oblasti nástupiště č. 3	45 dny	11.8. 14	24.9. 14					11.8.		24.9.										
623		úprava podchodu v oblasti nástupiště č. 2	45 dny	29.10. 14	12.12. 14						29.10.		12.12.									
624		úprava podchodu v oblasti nástupiště č. 1	45 dny	10.3. 15	23.4. 15								10.3.		23.4.							
625	SO 18-19-13	Žst.Olomouc, zrušení návěštní lávky v km 83,637	7 dny	18.4. 16	24.4. 16													18.4.		24.4.		
626	SO 18-19-14	Žst.Olomouc, zrušení kolektoru v km 83,661 (ochrana vodovodu)	85 dny	13.3. 14	5.6. 14				13.3.		5.6.											
627	SO 18-19-15	Žst. Olomouc, ochranné štíty v km 87,393 na tramvajovém nadjezdu	88 dny	26.3. 15	21.6. 15								26.3.		21.6.							
628	SO 18-19-16	Žst. Olomouc, ochranné štíty v km 87,430 na silničním nadjezdu	88 dny	26.3. 15	21.6. 15								26.3.		21.6.							
629		E.1.5 Ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě a hydrotechnické objekty)	61 dny	14.10. 13	13.12. 13																	
630	SO 18-27-15	Žst. Olomouc, úprava parovodu	61 dny	14.10. 13	13.12. 13	14.10.		13.12.														
631		E.1.6 Potrubní vedení	981 dny	24.10. 13	30.6. 16																	
632	SO 18-22-01	Žst. Olomouc, přeložky plynovodů	42 dny	10.6. 15	21.7. 15									10.6.		21.7.						
633	SO 18-27-01	Žst. Olomouc, nákladní nádraží - odvodnění železniční trati - sběrače	403 dny	24.10. 13	30.11. 14	24.10.																
634	SO 18-27-02	Žst. Olomouc, nákladní nádraží - odvodnění železniční trati - čerpací stanice 1	403 dny	24.10. 13	30.11. 14	24.10.																
635	SO 18-27-03	Žst.Olomouc, vnitřní nádraží - odvodnění železniční trati - sběrače	106 dny	7.12. 15	21.3. 16																	
636	SO 18-27-04	Žst.Olomouc, vnitřní nádraží - odvodnění železniční trati - čerpací stanice 2	123 dny	2.10. 15	1.2. 16																	
637	SO 18-27-05	Žst. Olomouc, osobní nádraží - odvodnění železniční trati - sběrače	620 dny	11.11. 13	23.7. 15	11.11.																
638	SO 18-27-06	Žst. Olomouc, osobní nádraží - odvodnění železniční trati - čerpací stanice 3	92 dny	1.3. 15	31.5. 15									1.3.		31.5.						
639	SO 18-27-07	Žst. Olomouc, osobní nádraží - odvodnění železniční trati - čerpací stanice 4	92 dny	1.3. 15	31.5. 15									1.3.		31.5.						
640	SO 18-27-08	Žst.Olomouc , osobní nádraží - odvedení vod ze střech nástupišť	555 dny	27.10. 13	4.5. 15	27.10.									4.5.							
641	SO 18-27-10	Žst.Olomouc, železniční most v km 86,486 (přes Bystřici) - zajištění kanalizace	81 dny	17.11. 15	5.2. 16																	
642	SO 18-27-11	Žst. Olomouc, stávající inženýrské sítě	181 dny	3.4. 14	30.9. 14				3.4.		30.9.											
643	SO 18-27-12	Žst.Olomouc, nákladní nádraží - ochrana vodovodu - km 85,100	94 dny	13.3. 14	14.6. 14				13.3.		14.6.											
644	SO 18-27-13	Žst.Olomouc, nákladní nádraží - přeložení vodovodu	836 dny	18.3. 14	30.6. 16																	
645	SO 18-27-13.1	Žst.Olomouc, nákladní nádraží - přeložení vodovodu DN 500 mm - km 83,661	75 dny	17.4. 16	30.6. 16																	
646	SO 18-27-13.2	Žst.Olomouc, nákladní nádraží - ochrana a přeložení vodovodu DN 500 mm - km 84,408	167 dny	18.3. 14	31.8. 14				18.3.		31.8.											
647	SO 18-27-14	Žst. Olomouc, osobní nádraží - přeložení vodovodu nástupiště 1 až 5	521 dny	27.10. 13	31.3. 15	27.10.								31.3.								
648		E.1.8 Pozemní komunikace	1042 dny	24.9. 13	31.7. 16																	
649	SO 18-18-01	Žst. Olomouc, úprava komunikace, silniční nadjezd v km 83,484 (Černovír)	202 dny	12.10. 15	30.4. 16																	
650	SO 18-18-02	Žst. Olomouc, úprava komunikace, železniční most v km 85,761 (Pavlovický podjezd)	73 dny	20.3. 15	31.5. 15								20.3.		31.5.							
651	SO 18-18-03	Žst. Olomouc, úprava komunikace, železniční most v km 86,486 (přes Bystřičku)	35 dny	8.3. 16	11.4. 16																	
652	SO 18-18-04	Žst. Olomouc, úprava cyklistické stezky, železniční most v km 86,486 (přes Bystřičku)	21 dny	21.6. 16	11.7. 16																	
653	SO 18-00-01	Žst. Olomouc, dopravní opatření	1022 dny	24.9. 13	11.7. 16																	
654	SO 18-00-01.1	Žst. Olomouc, dopravní opatření	1015 dny	1.10. 13	11.7. 16																	
655		silniční nadjezd v km 83,484 (Černovír)	243 dny	1.9. 15	30.4. 16																	
656		železniční most v km 85,761 (Pavlovický podjezd)	60 dny	28.4. 14	26.6. 14					28.4.		26.6.										
657		železniční most v km 85,761 (Pavlovický podjezd)	70 dny	9.9. 14	17.11. 14						9.9.		17.11.									
658		železniční most v km 86,486 (přes Bystřičku)	50 dny	1.10. 13	19.11. 13	1.10.		19.11.														
659		železniční most v km 86,486 (přes Bystřičku)	271 dny	16.7. 15	11.4. 16																	
660																						

Rekonstrukce žst. Olomouc

ID	Číslo PS, SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2013	2014				2015				2016				
						II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.
674		E.1.10 Protihlukové objekty	140 dny	27.2. 16	15.7. 16														
675	SO 18-15-14	Žst. Olomouc, PHS	140 dny	27.2. 16	15.7. 16														
676	SO 18-15-14.1	Žst. Olomouc, PHS - ulice Rejskova	82 dny	25.4. 16	15.7. 16														
677	SO 18-15-14.2	Žst. Olomouc, PHS v km 86,432 - 86,542 vpravo	60 dny	1.4. 16	30.5. 16														
678	SO 18-15-14.3	Žst. Olomouc, PHS v km 86,328 - 86,542 vlevo	45 dny	27.2. 16	11.4. 16														
679		E.2 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A TECHNICKÉ VYBAVENÍ POZEMNÍCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ	1042 dny	24.9. 13	31.7. 16														
680		E.2.1 Pozemní objekty budov (provozní, technologické, skladové	1042 dny	24.9. 13	31.7. 16														
681	SO 18-15-01	Žst. Olomouc, stavební úpravy VB	433 dny	1.3. 14	7.5. 15				1.3.				7.5.						
682	SO 18-15-02	Žst. Olomouc, rekonstrukce rychlozboží	21 dny	25.2. 15	17.3. 15							25.2.	17.3.						
683	SO 18-15-05	Žst. Olomouc, přístavba ústředního stavědla	1042 dny	24.9. 13	31.7. 16														
684	SO 18-15-05.1	Žst. Olomouc, přístavba ústředního stavědla	342 dny	24.9. 13	31.8. 14	24.9.													
685	SO 18-15-05.2	Žst. Olomouc, stavební úpravy ústředního stavědla	153 dny	1.3. 16	31.7. 16												1.3.		31.7.
686	SO 18-15-05.3	Žst. Olomouc, stavební úpravy ústředního stavědla - zpevněné plochy	153 dny	1.4. 14	31.8. 14				1.4.										
687	SO 18-15-06	Žst. Olomouc, rekonstrukce stavědla č.4 km 85,720	40 dny	22.8. 14	30.9. 14														
688	SO 18-15-09	Žst. Olomouc, oplocení	50 dny	3.6. 15	22.7. 15									3.6.		22.7.			
689	SO 18-15-10	Žst. Olomouc, stavební úpravy trafostanic T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7	630 dny	24.9. 13	15.6. 15														
690	SO 18-15-10.1	Žst. Olomouc, stavební úpravy trafostanice T1	322 dny	29.10. 13	15.9. 14	29.10.													
691	SO 18-15-10.2	Žst. Olomouc, stavební úpravy trafostanice T2	402 dny	24.9. 13	30.10. 14														
692	SO 18-15-10.2.1	Žst. Olomouc, rekonstrukce stávající trafostanice T2 na technologický objekt	402 dny	24.9. 13	30.10. 14	24.9.													
693	SO 18-15-10.2.2	Žst. Olomouc, novostavba trafostanice T2	112 dny	24.9. 13	13.1. 14	24.9.													
694	SO 18-15-10.3	Žst. Olomouc, stavební úpravy trafostanice T3	349 dny	17.3. 14	28.2. 15				17.3.										
695	SO 18-15-10.4	Žst. Olomouc, stavební úpravy trafostanice T4	181 dny	3.7. 14	30.12. 14														
696	SO 18-15-10.5	Žst. Olomouc, stavební úpravy trafostanice T5	112 dny	24.9. 13	13.1. 14	24.9.													
697	SO 18-15-10.6	Žst. Olomouc, stavební úpravy trafostanice T6	112 dny	24.9. 13	13.1. 14	24.9.													
698	SO 18-15-10.7	Žst. Olomouc, stavební úpravy trafostanice T7	151 dny	16.1. 15	15.6. 15														
699	SO 18-15-11	Žst. Olomouc, rozvodny pro EPZ	518 dny	1.3. 14	31.7. 15				1.3.										
700	SO 18-15-12	Žst. Olomouc, reléové domky	126 dny	1.4. 15	5.8. 15														
701	SO 18-15-12.1	Žst. Olomouc, reléový domek v km 0,580 trati Olomouc - Krnov	90 dny	1.4. 15	30.6. 15									1.4.		30.6.			
702	SO 18-15-12.2	Žst. Olomouc, reléový domek v km 1,651 trati Olomouc - Krnov	90 dny	1.4. 15	30.6. 15									1.4.		30.6.			
703	SO 18-15-12.3	Žst. Olomouc, reléový domek v km 102,539 trati Olomouc-Šumperk	90 dny	7.5. 15	5.8. 15									7.5.		5.8.			
704	SO 18-15-12.4	Žst. Olomouc, reléový domek v km 102,828 trati Olomouc-Šumperk	90 dny	7.5. 15	5.8. 15									7.5.		5.8.			
705		E.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupišťích	563 dny	22.10. 13	7.5. 15														
706	SO 18-15-03	Žst. Olomouc, zastřešení 1.nástupišťe	61 dny	8.3. 15	7.5. 15								8.3.		7.5.				
707	SO 18-15-04	Žst. Olomouc, zastřešení ostrovních nástupišť	563 dny	22.10. 13	7.5. 15														
708		Žst. Olomouc, nástupišťe č. 5	170 dny	22.10. 13	9.4. 14	22.10.													
709		Žst. Olomouc, nástupišťe č. 4	65 dny	29.4. 14	2.7. 14				29.4.										
710		Žst. Olomouc, nástupišťe č. 3	65 dny	22.7. 14	24.9. 14														
711		Žst. Olomouc, nástupišťe č. 2	65 dny	9.10. 14	12.12. 14														
712		Žst. Olomouc, nástupišťe č. 1A	65 dny	4.3. 15	7.5. 15														
713		E.2.3 Individuální protihluková opatření	391 dny	7.7. 15	31.7. 16														
714	SO 18-15-13	Žst. Olomouc, IPO	391 dny	7.7. 15	31.7. 16														
715		IPO - výměna oken během stavby	60 dny	7.7. 15	5.9. 15														
716		IPO - výměna oken dle výsledků měření po dokončení stavby	77 dny	16.5. 16	31.7. 16														
717		E.2.5 Demolice	1042 dny	24.9. 13	31.7. 16														
718	SO 18-15-07	Žst. Olomouc, demolice	652,5 dny	24.9. 13	31.7. 16	24.9.													
719		E.3 TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ	965 dny	24.9. 13	15.5. 16														
720		E.3.1 Trakční vedení	965 dny	24.9. 13	15.5. 16														
721	SO 18-01-01	Žst.Olomouc, trakční vedení	965 dny	24.9. 13	15.5. 16														
722	SO 18-01-01.1	Olomouc - Štěpánov, trakční vedení	945 dny	24.9. 13	25.4. 16														
723		výstavba podpěr TV	229 dny	24.9. 13	10.5. 14	24.9.													
724		zřízení TV	97 dny	13.3. 14	17.6. 14				13.3.										
725		zřízení TV	14 dny	12.4. 16	25.4. 16														
726	SO 18-01-01.2	Žst.Olomouc, obvod přednádraží, trakční vedení	488 dny	24.9. 13	24.1. 15														
727		výstavba podpěr TV	362 dny	24.9. 13	20.9. 14	24.9.													
728		zřízení TV	297 dny	3.4. 14	24.1. 15				3.4.										
729	SO 18-01-01.3	Žst.Olomouc, obvod osobní nádraží, trakční vedení	965 dny	24.9. 13	15.5. 16														
730		výstavba podpěr TV	776 dny	24.9. 13	8.11. 15	24.9.													
731		zřízení TV	623 dny	24.3. 14	15.5. 16														
732	SO 18-01-01.4	Žst. Olomouc, obcházecí vedení	42 dny	24.9. 13	4.11. 13	24.9.													
733	SO 18-01-03	Žst.Olomouc, provizorní zavěšení ZOK na nové trakční podpěry	642 dny	24.10. 13	27.7. 15														
734	SO 18-01-03.1	Žst.Olomouc, převěšení ZOK - ČD Telematika	642 dny	24.10. 13	27.7. 15	24.10.													
735	SO 18-01-03.2	Žst.Olomouc, převěšení ZOK - SŽDC	211 dny	24.10. 13	11.5. 15	24.10.													
736		E.3.4 Ohřev výměn	769 dny	2.4. 14	9.5. 16														
737	SO 18-06-07	Žst. Olomouc, EOv	769 dny	2.4. 14	9.5. 16														
738		E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení	792 dny	1.3. 14	30.4. 16														
739	SO 18-06-02	Žst. Olomouc, EPZ a kabelové rozvody	792 dny	1.3. 14	30.4. 16														
740		E.3.6 Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů	950 dny	24.9. 13	30.4. 16														
741	SO 18-06-01	Žst. Olomouc, venkovní osvětlení	920 dny	24.10. 13	30.4. 16	24.10.													
742	SO 18-06-03	Žst. Olomouc, DOÚO	645 dny	1.3. 14	5.12. 15				1.3.										
743	SO 18-06-04	Žst. Olomouc, kabelové rozvody nn	645 dny	1.3. 14	5.12. 15				1.3.										
744	SO 18-06-05	Žst. Olomouc, silnoproudé rozvody a osvětlení nástupišť a podchodů	792 dny	1.3. 14	30.4. 16				1.3.										
745	SO 18-06-06	Žst. Olomouc, přeložky kabelů nn	433 dny	24.9. 13	30.11. 14	24.9.													

Rekonstrukce žst. Olomouc

ID	Číslo PS, SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2013				2014				2015				2016			
						II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.
746	SO 18-04-01	Žst. Olomouc, kabelové rozvody vn 6 kV	677 dny	24.10. 13	31.8. 15		24.10.									31.8.					
747	SO 18-04-02	Žst. Olomouc, přeložky kabelů vn 6 kV	707 dny	24.9. 13	31.8. 15		24.9.									31.8.					
748	SO 18-12-01	Žst. Olomouc, kabelové rozvody vn 22 kV	677 dny	24.10. 13	31.8. 15		24.10.									31.8.					
749	SO 18-12-02	Žst. Olomouc, přeložky kabelů vn 22 kV	707 dny	24.9. 13	31.8. 15		24.9.									31.8.					
750	SO 18-06-15	Žst. Olomouc, úprava rozvodu nn pro ukolejnění	247 dny	26.7. 14	29.3. 15																
751		Úprava svodů na budově pošty	46 dny	26.7. 14	10.9. 14																
752		Úprava stávající sítě VO na nadjezdu	48 dny	10.2. 15	29.3. 15																
753		E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí	795 dny	13.3. 14	15.5. 16																
754	SO 18-01-02	Žst. Olomouc, ukolejnění	795 dny	13.3. 14	15.5. 16																
755	SO 18-01-02.1	Olomouc - Štěpánov, ukolejnění	108 dny	13.3. 14	24.4. 16																
756	SO 18-01-02.2	Žst.Olomouc, obvod přednádraží, ukolejnění	297 dny	3.4. 14	24.1. 15		13.3.														24.4.
757	SO 18-01-02.3	Žst.Olomouc, obvod osobní nádraží, ukolejnění	623 dny	24.3. 14	15.5. 16		3.4.														15.5.
758		E.3.8 Vnější uzemnění	571 dny	27.3. 14	18.10. 15		24.3.														
759	SO 18-06-08	Žst. Olomouc, společné uzemnění trafostanic TS1 a STS 313A	232 dny	25.4. 14	12.12. 14																
760	SO 18-06-09	Žst. Olomouc, společné uzemnění trafostanic TS2 a STS 314A	214 dny	27.3. 14	26.10. 14		25.4.														
761	SO 18-06-10	Žst. Olomouc, společné uzemnění trafostanic TS3 a STS 314B	40 dny	3.11. 14	12.12. 14		27.3.														
762	SO 18-06-11	Žst. Olomouc, společné uzemnění trafostanic TS4 a STS 314	40 dny	24.2. 15	4.4. 15																
763	SO 18-06-12	Žst. Olomouc, společné uzemnění trafostanic TS5 a STS 315	40 dny	27.3. 14	5.5. 14																
764	SO 18-06-13	Žst. Olomouc, společné uzemnění trafostanic TS6 a STS 313	40 dny	27.3. 14	5.5. 14		27.3.	5.5.													
765	SO 18-06-14	Žst. Olomouc, uzemnění trafostanice TS7	40 dny	9.9. 15	18.10. 15		27.3.	5.5.													
766		E.3.9 Přeložky sdělovacích zařízení	633 dny	6.10. 13	30.6. 15																
767	SO 18-10-01	Žst. Olomouc, úprava sítě Českého Telecomu	77 dny	6.10. 13	21.12. 13		6.10.														
768	SO 18-10-02	Žst. Olomouc, úprava sítě jiných správců	44 dny	18.5. 15	30.6. 15																
769	SO 18-10-03	Žst. Olomouc, úpravy a přeložky kabelů ČD a SŽDC	44 dny	18.5. 15	30.6. 15																
770		E.3.10 Přeložky silnoproudých vedení jiných správců	938 dny	6.10. 13	30.4. 16																
771	SO 18-06-21	Žst. Olomouc,úpravy kabelových rozvodů a venkovního osvětlení - most km 85,761	217 dny	26.11. 14	30.6. 15																
772	SO 18-06-22	Žst. Olomouc,úpravy kabelových rozvodů a venkovního osvětlení - most km 86,486	210 dny	6.10. 13	30.11. 15		6.10.														
773	SO 18-06-23	Žst. Olomouc, úprava osvětlení silničního nadjezdu v km 83,484	209 dny	5.10. 15	30.4. 16																
774	SO 18-12-03	Žst. Olomouc, přeložky kabelů vn 22 kV - SME, skupina ČEZ	522 dny	15.5. 14	18.10. 15																
775	SO 18-12-03.1	Žst. Olomouc, přeložky kabelů vn 22 kV - SME, skupina ČEZ	46 dny	15.5. 14	30.6. 14																
776	SO 18-12-03.2	Žst. Olomouc, přeložky kabelů vn 22 kV - SME, skupina ČEZ, přípojka pro provizorní trafostar	139 dny	2.6. 15	18.10. 15																
777		Všeobecný objekt	1073 dny	24.9. 13	31.8. 16		24.9.														31.8.
