



Ždár nad Sázavou



SP 101 Výstavba mostu pod koleji č. 2, č. 4 - 7/2023 - 11/2023


SP 101 Zajištění svahu, výstavba části zárubní zdi u koleje č. 2 - pol. 7/2023 - 8/2023

Odsun koleje č. 2 na vnější stranu v obloucích v mezistaničním úseku Příbyslav - Pohled

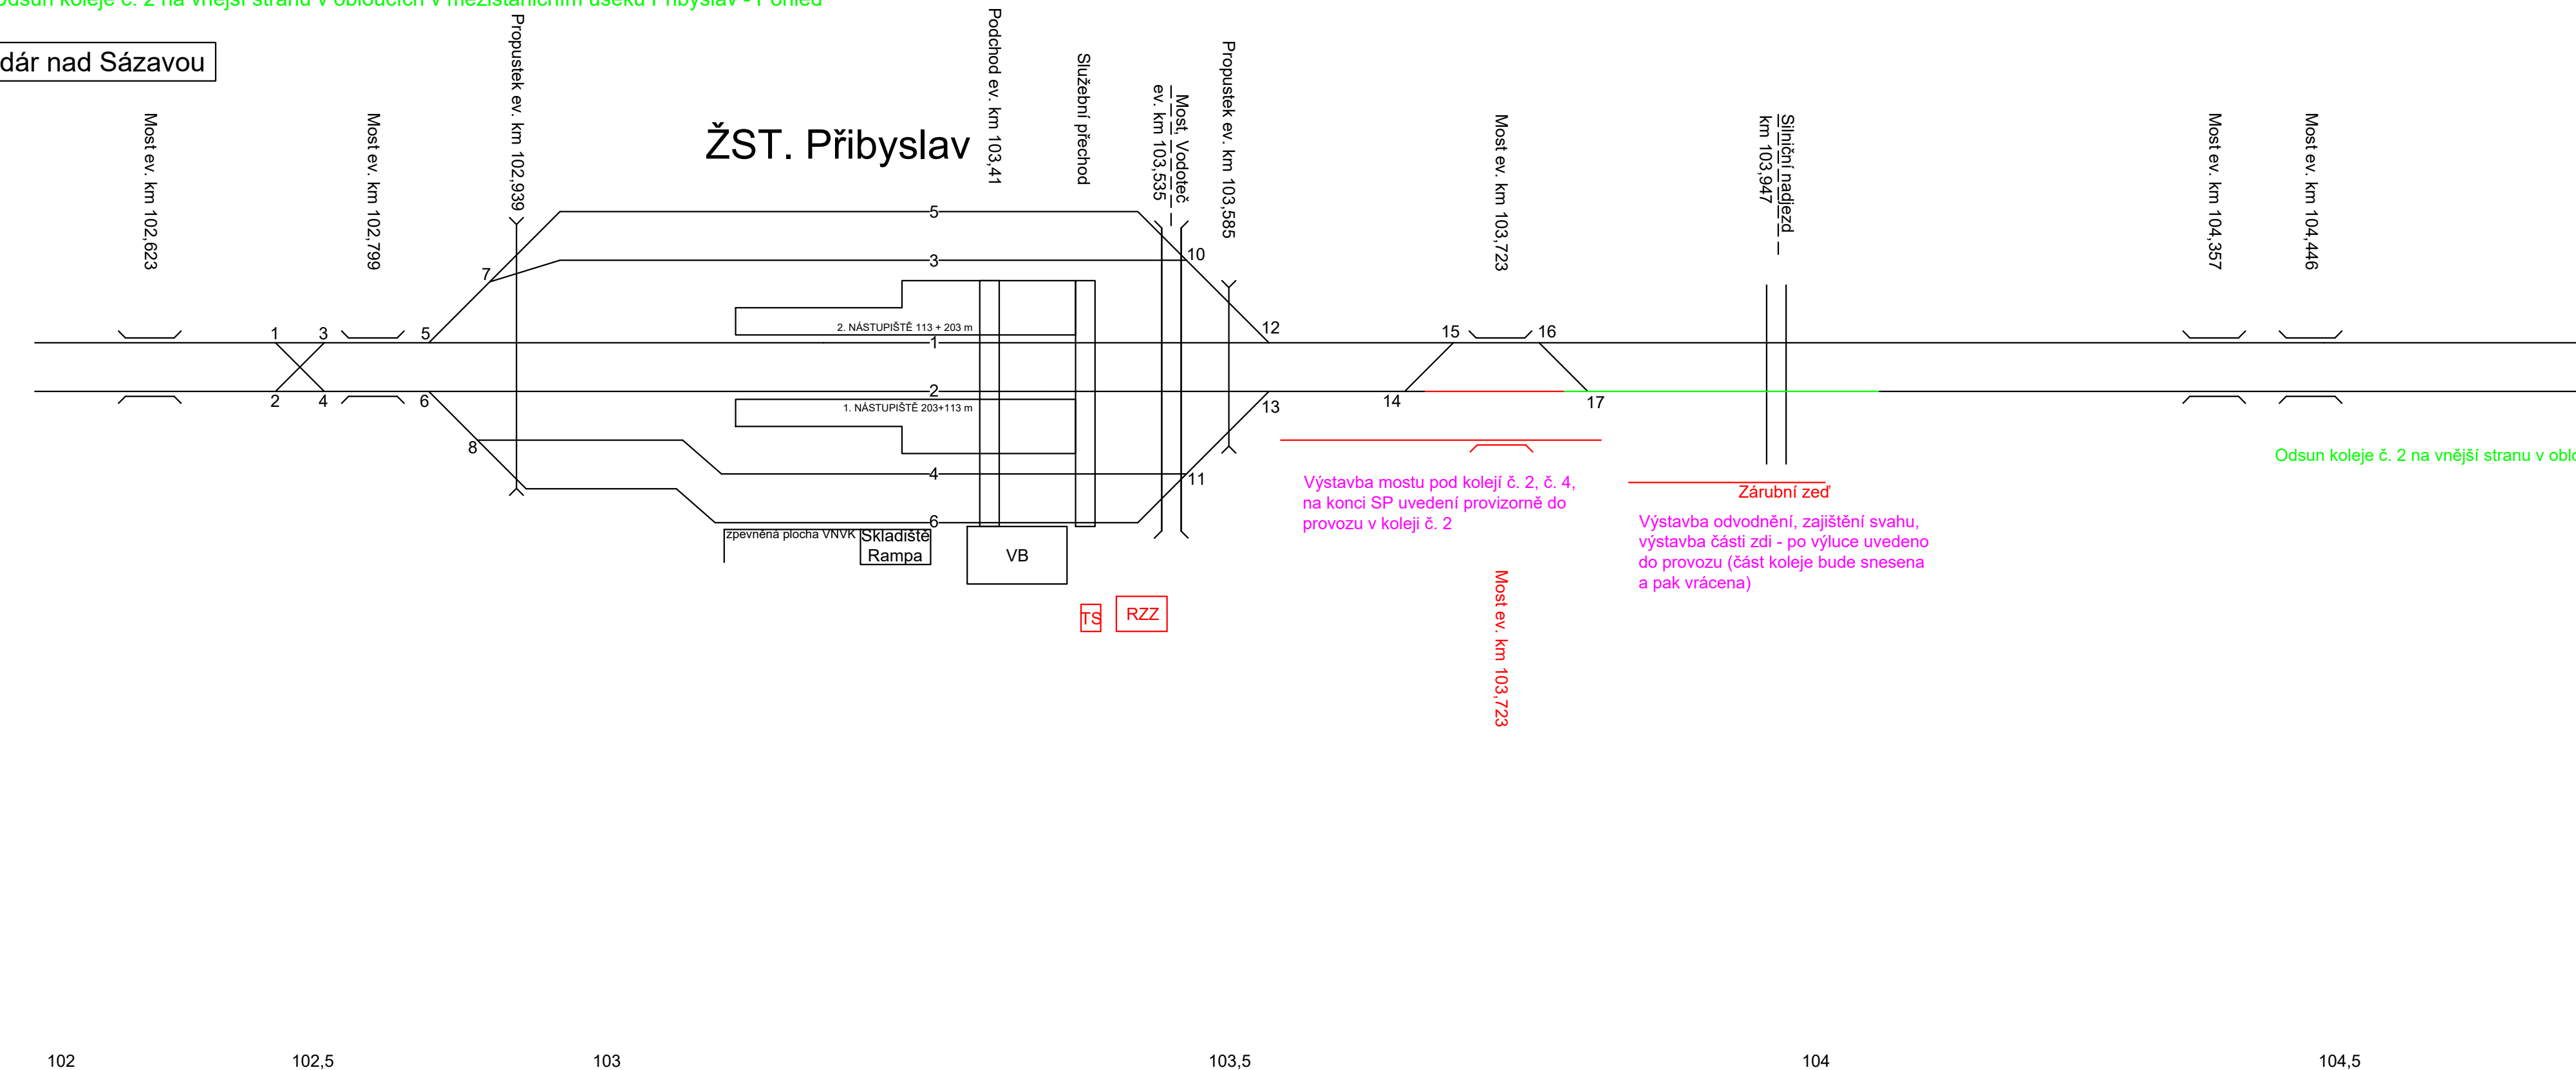


SP 200 - Přípravné práce v mezistaničním úseku - 1/2023 - 6/2023


SP 201 - Zhotovení silničních nadjezdů v předstihu před hlavní stavbou - 7/2023 - 11/2023

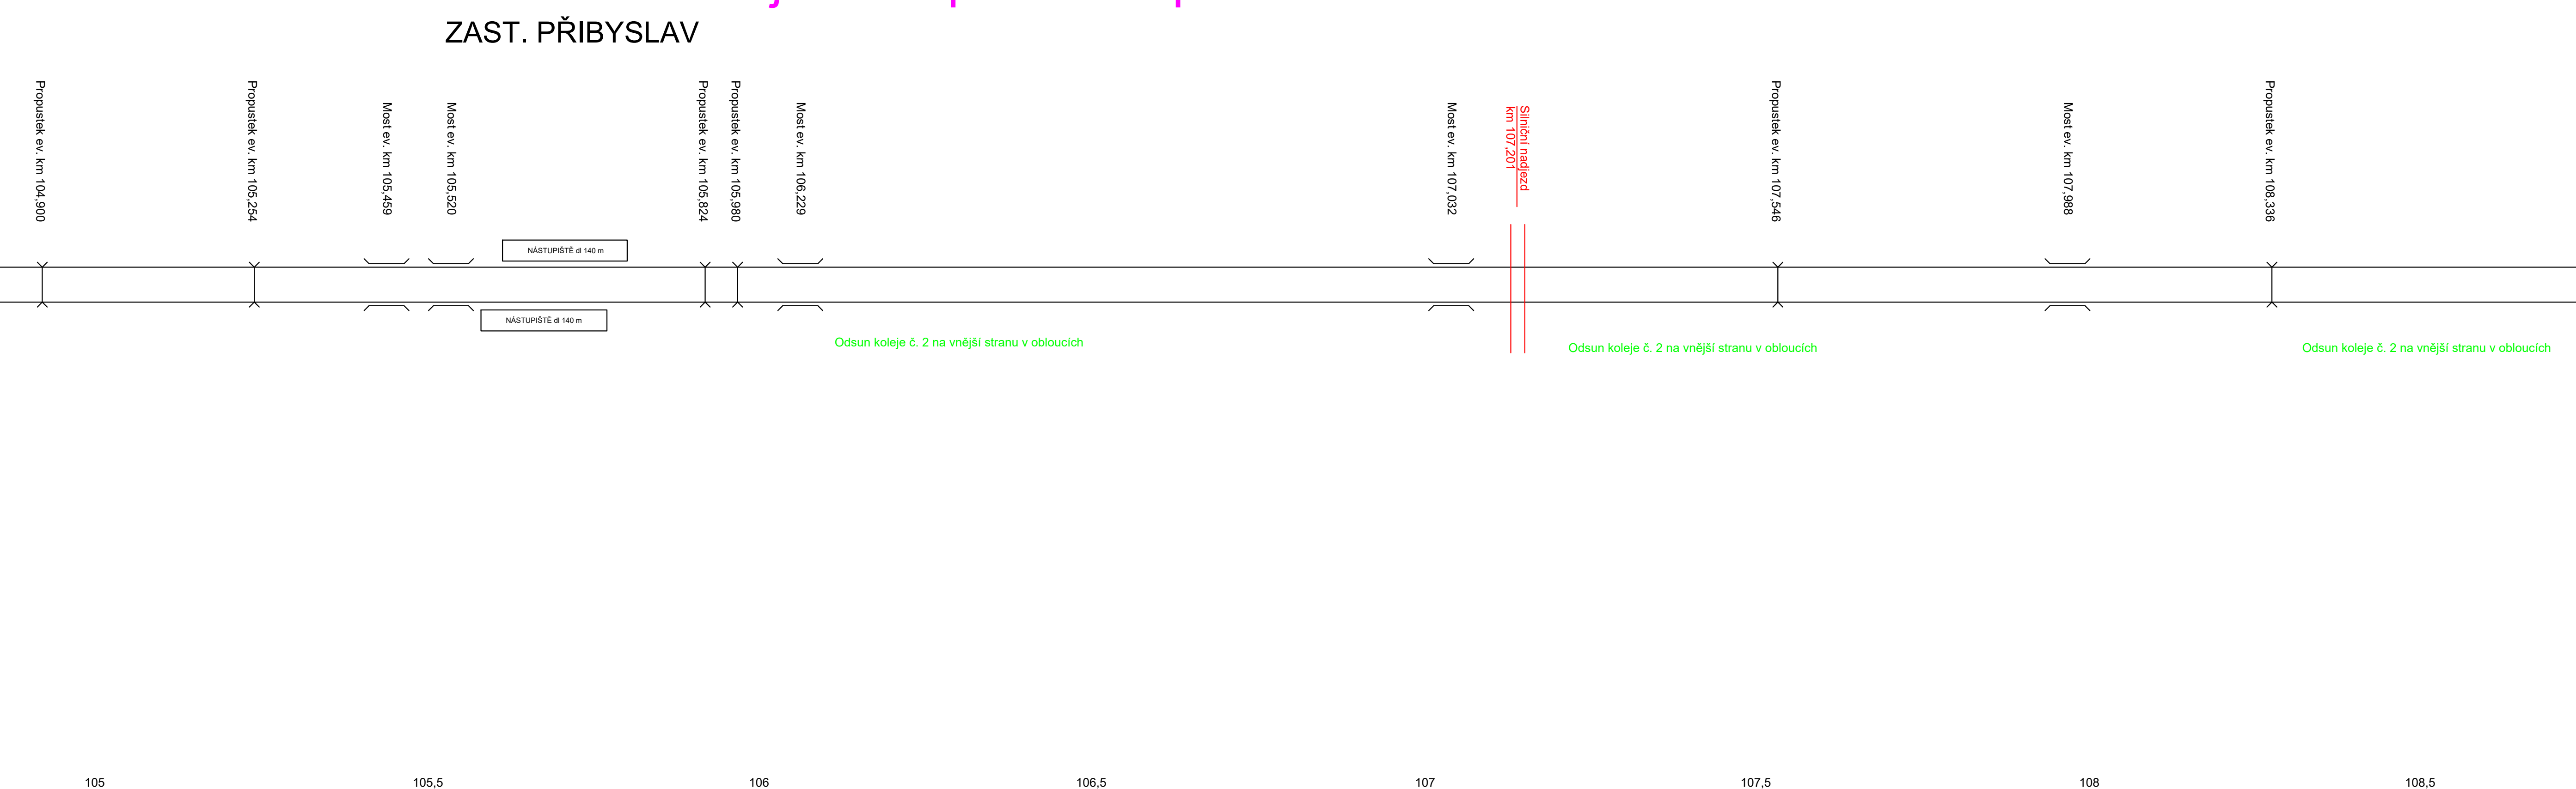

SP 301 - přípravné práce

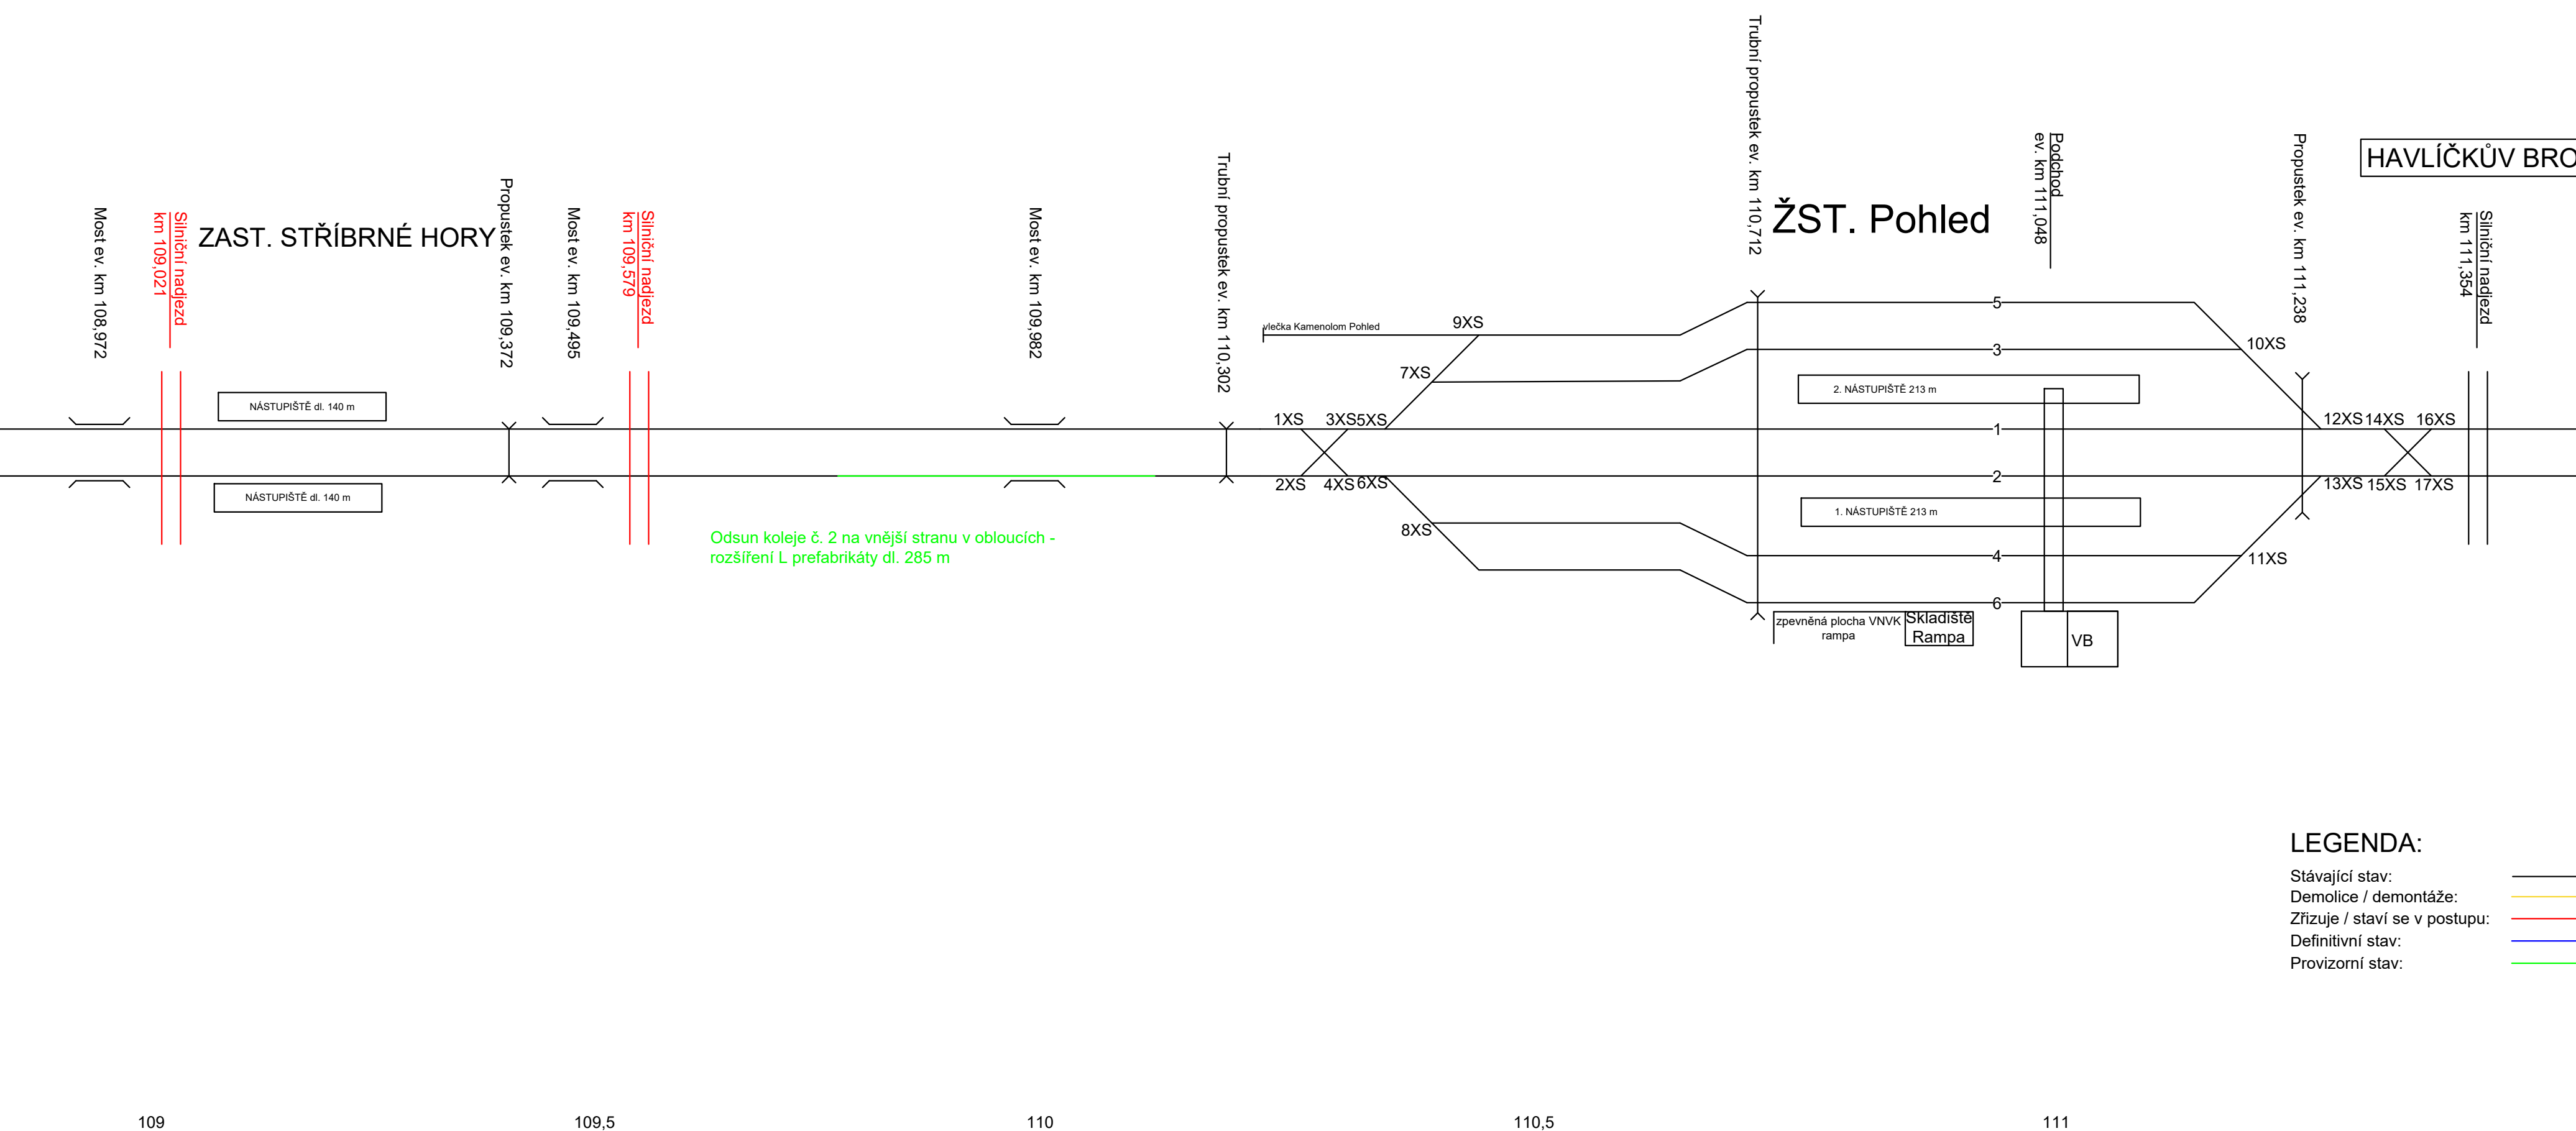


Zimní přestávka 2023/2024




Přibyslav - SP102 (březen - červenec 2024)


Přibyslav - Pohled - SP202 (březen - 1. pol. listopadu 2024)



ŽST. Přibyslav



ZAST. STŘÍBRNÉ HC



Přibyslav - SP103 (srpen - 1.polovina listopadu 2024)

ŽST. Přibyslav


Přibyslav - Pohled - SP202 (březen - 1. pol. listopadu 2024)

ZAST. PŘIBYSLAV

ZAST. STŘÍBRNÉ HORY

ŽST. Pohled


HAVLIČKŮV BROD




LEGENDA:

- Stávající stav: —
- Demolice / demontáže: —
- Zřizuje / staví se v postupu: —
- Definitivní stav: —
- Provizorní stav: —


Přibyslav - SP103 (3. čtvrtině listopadu 2024) - 9 dní



Přibyslav - SP103 (konec 11/2024) - 9 d




Zimní přestávka 2024/2025



Přípravné práce 2025

Přibyslav - Pohled - SP 203 (březen - 1. pol. listopad 2025)


SP 302 - 2025 (březen - 1 týden v dubnu)



Přibyslav - Pohled - SP 203 (březen - 1. pol. listopad 2025)


Pohled - SP 302 (duben - červenec 2025) - úvodní etapa

Pohled - proviz. napojení vlečky - (duben - 7 dní)



Přibyslav - Pohled - SP 203 (březen - 1. pol. listopad 2025)

Pohled - SP 302 (duben - červen 2025)




LEGENDA:

- Stávající stav: —
- Demolice / demontáže: —
- Zrůstuje / staví se v postupu: —
- Definitivní stav: —
- Provizorní stav: —

Přibyslav - Pohled - SP 203 (březen - 1. pol. listopad 2025)


Pohled - SP 302 (červen - červenec 2025)

Pohled - definitivní napojení vlečky - 7 dní




Přibyslav - Pohled - SP 203 (březen - 1. pol. listopad 2025)

Pohled - SP 302 (červen - červenec 2025)




Přibyslav - Pohled - SP 203 (březen - 1. pol. listopad 2025)

Pohled - SP 302 (konec července 2025) - 10 dní




Přibyslav - Pohled - SP 203 (březen - 1. pol. listopad 2025)

Pohled - SP 303 (1.pol. srpna 2025) - 14 dní




Přibyslav - Pohled - SP 203 (březen - 1. pol. listopad 2025)

Pohled - SP 303 (srpen - listopad 2025)




Pohled - SP303 (1 týden ve 4. čtvrtině listopadu 2025) - 7 dní



Dokončovací práce bez výluk

Žďár nad Sázavou

Havlíčkův Brod



LEGENDA:
Stávající stav:
Demolice / demontáže:
Zřizuje / staví se v postupu:
Definitivní stav:
Provizorní stav:

Definitivní stav

