

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	Po zapracování připomínek Správy železnic k DSP	05/2024
02	-	-
03	-	-

Objednatel:		Správa železnic, státní organizace Stavební správa východ Nerudova 1, 779 00 Olomouc
-------------	---	--

Generální projektant:		SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 00 Praha 3 tel.: +420 605 229 020 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu: ING. KAREL KOŠAŘ Garant profese: ING. PETR LAPÁČEK
-----------------------	---	---	--

Středisko:			
ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY			
Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. MARTIN RAIBR	ING. PETR LAPÁČEK	ING. PETR LAPÁČEK	ING. KAREL KOŠAŘ

Název akce:	Číslo smlouvy:	
Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část - II.etapa	19 149 208	
	Projektový stupeň: DSP+PDPS	
Část: DOKLADOVÁ ČÁST OSTATNÍ STANOVISKA, VYJÁDŘENÍ, POSUDKY A VÝSLEDKY JEDNÁNÍ ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY	Datum: 08/2023	
	Číslo části: E.05.08	
Název přílohy:	Měřítko:	Počet formátů:
	-	10A4
DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ BĚHEM STAVBY	Číslo přílohy:	
	4	



SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
208 Středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací techniky

„Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část- II. etapa“

**E.05.08_4 Dopravně inženýrská opatření
silniční část**

**Zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s.
Ing. Petr Lapáček KOMOVIA s.r. o**

**Termín odevzdání: 05/2024-
aktualizace:06/2026**



1	Úvod.....	3
2	Železniční přejezdy	3
2.1	SO 03-12-20-31 ŽST Týniště n. O., železniční přejezd km 49,172.....	3
2.2	SO 03-12-20-32 ŽST Týniště n. O., železniční přejezd km 50,303 – demontáž	3
3	Mostní objekty.....	3
3.1	SO 03-13-20-47 ŽST Týniště n. O., silniční nadjezd.....	3
4	Přílohy technické zprávy:.....	4



1 Úvod

V rámci stavby Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část- II. etapa. Dojde k přeložení stávajícího přejezdu místní komunikace P 4023 v km 49,172 do nové polohy v km 48,830.

Po zprovoznění nového silničního nadjezdu v km 50,119 dojde ke zrušení stávajícího přejezdu P 4024 v km 50,303.

2 Železniční přejezdy

2.1 SO 03-12-20-31 ŽST Týniště n. O., železniční přejezd km 49,172

Předpokládané termíny uzavření přejezdu a termín realizace přejezdu v nové poloze:

- Uzavření přejezdu od 05.05. 2027 do 21.10. 2027
- Zprovoznění přejezdu v nové poloze v km 48,830 - 19.11. 2027

Po dobu uzavření přejezdu P 4023 bude objízdná trasa vedena v jižní části ulicí Nádražní přes stávající přejezd P 4024 v km 50,303 ulicí T.G. Masaryka a v severní části ulicí Za Drahou. Všechny komunikace jsou v majetku města Týniště nad Orlicí.

Dopravní opatření viz příloha č.1

2.2 SO 03-12-20-32 ŽST Týniště n. O., železniční přejezd km 50,303 – demontáž

Tento přejezd může být zrušen až po zprovoznění SO 03-13-20-47 ŽST Týniště n. O., silniční nadjezd v termínech:

- Zprovoznění nadjezdu 18.09. 2028
- Rušení stávající přejezdu P 4024 v km 50,303 je navrženo v termínu 19.09. 2028 až 20.09.2028.

Dopravní opatření viz příloha č.2

3 Mostní objekty

3.1 SO 03-13-20-47 ŽST Týniště n. O., silniční nadjezd

Zprovoznění nového silničního nadjezdu v km 50,119 je podmiňující investicí pro zrušení stávajícího přejezdu P 4024 v km 50,303. Předpokládané termíny realizace:

- Ukončení výstavby střední části nadjezdu nad kolejemi, uvolnění pro další SP a severní části podchodu 15.04. 2028
- Dostavba mostních objektů a podchodu na častolovickém zhlaví, jižní část 27.05.2028 až 18.09. 2028.
- Zprovoznění nadjezdu 18.09. 2028

Současně s výstavbou nadjezdu probíhá realizace těchto SO:

SO 03-13-20-49 ŽST Týniště n. O., podchod pro pěší v km 50,330, část SŽ



SO 03-13-20-49.1 ŽST Týniště n. O., podchod pro pěší v km 50,330, část město Týniště
Navržená dopravní opatření zohledňují jejich realizaci

Dopravní opatření I. část viz příloha č.1


Dopravní opatření II. část viz příloha č.2

4 Přílohy technické zprávy:

Dopravní opatření I. část - příloha č.1

Dopravní opatření II. část- příloha č.2

- © 2026 Microsoft Corporation © 2026 TomTom

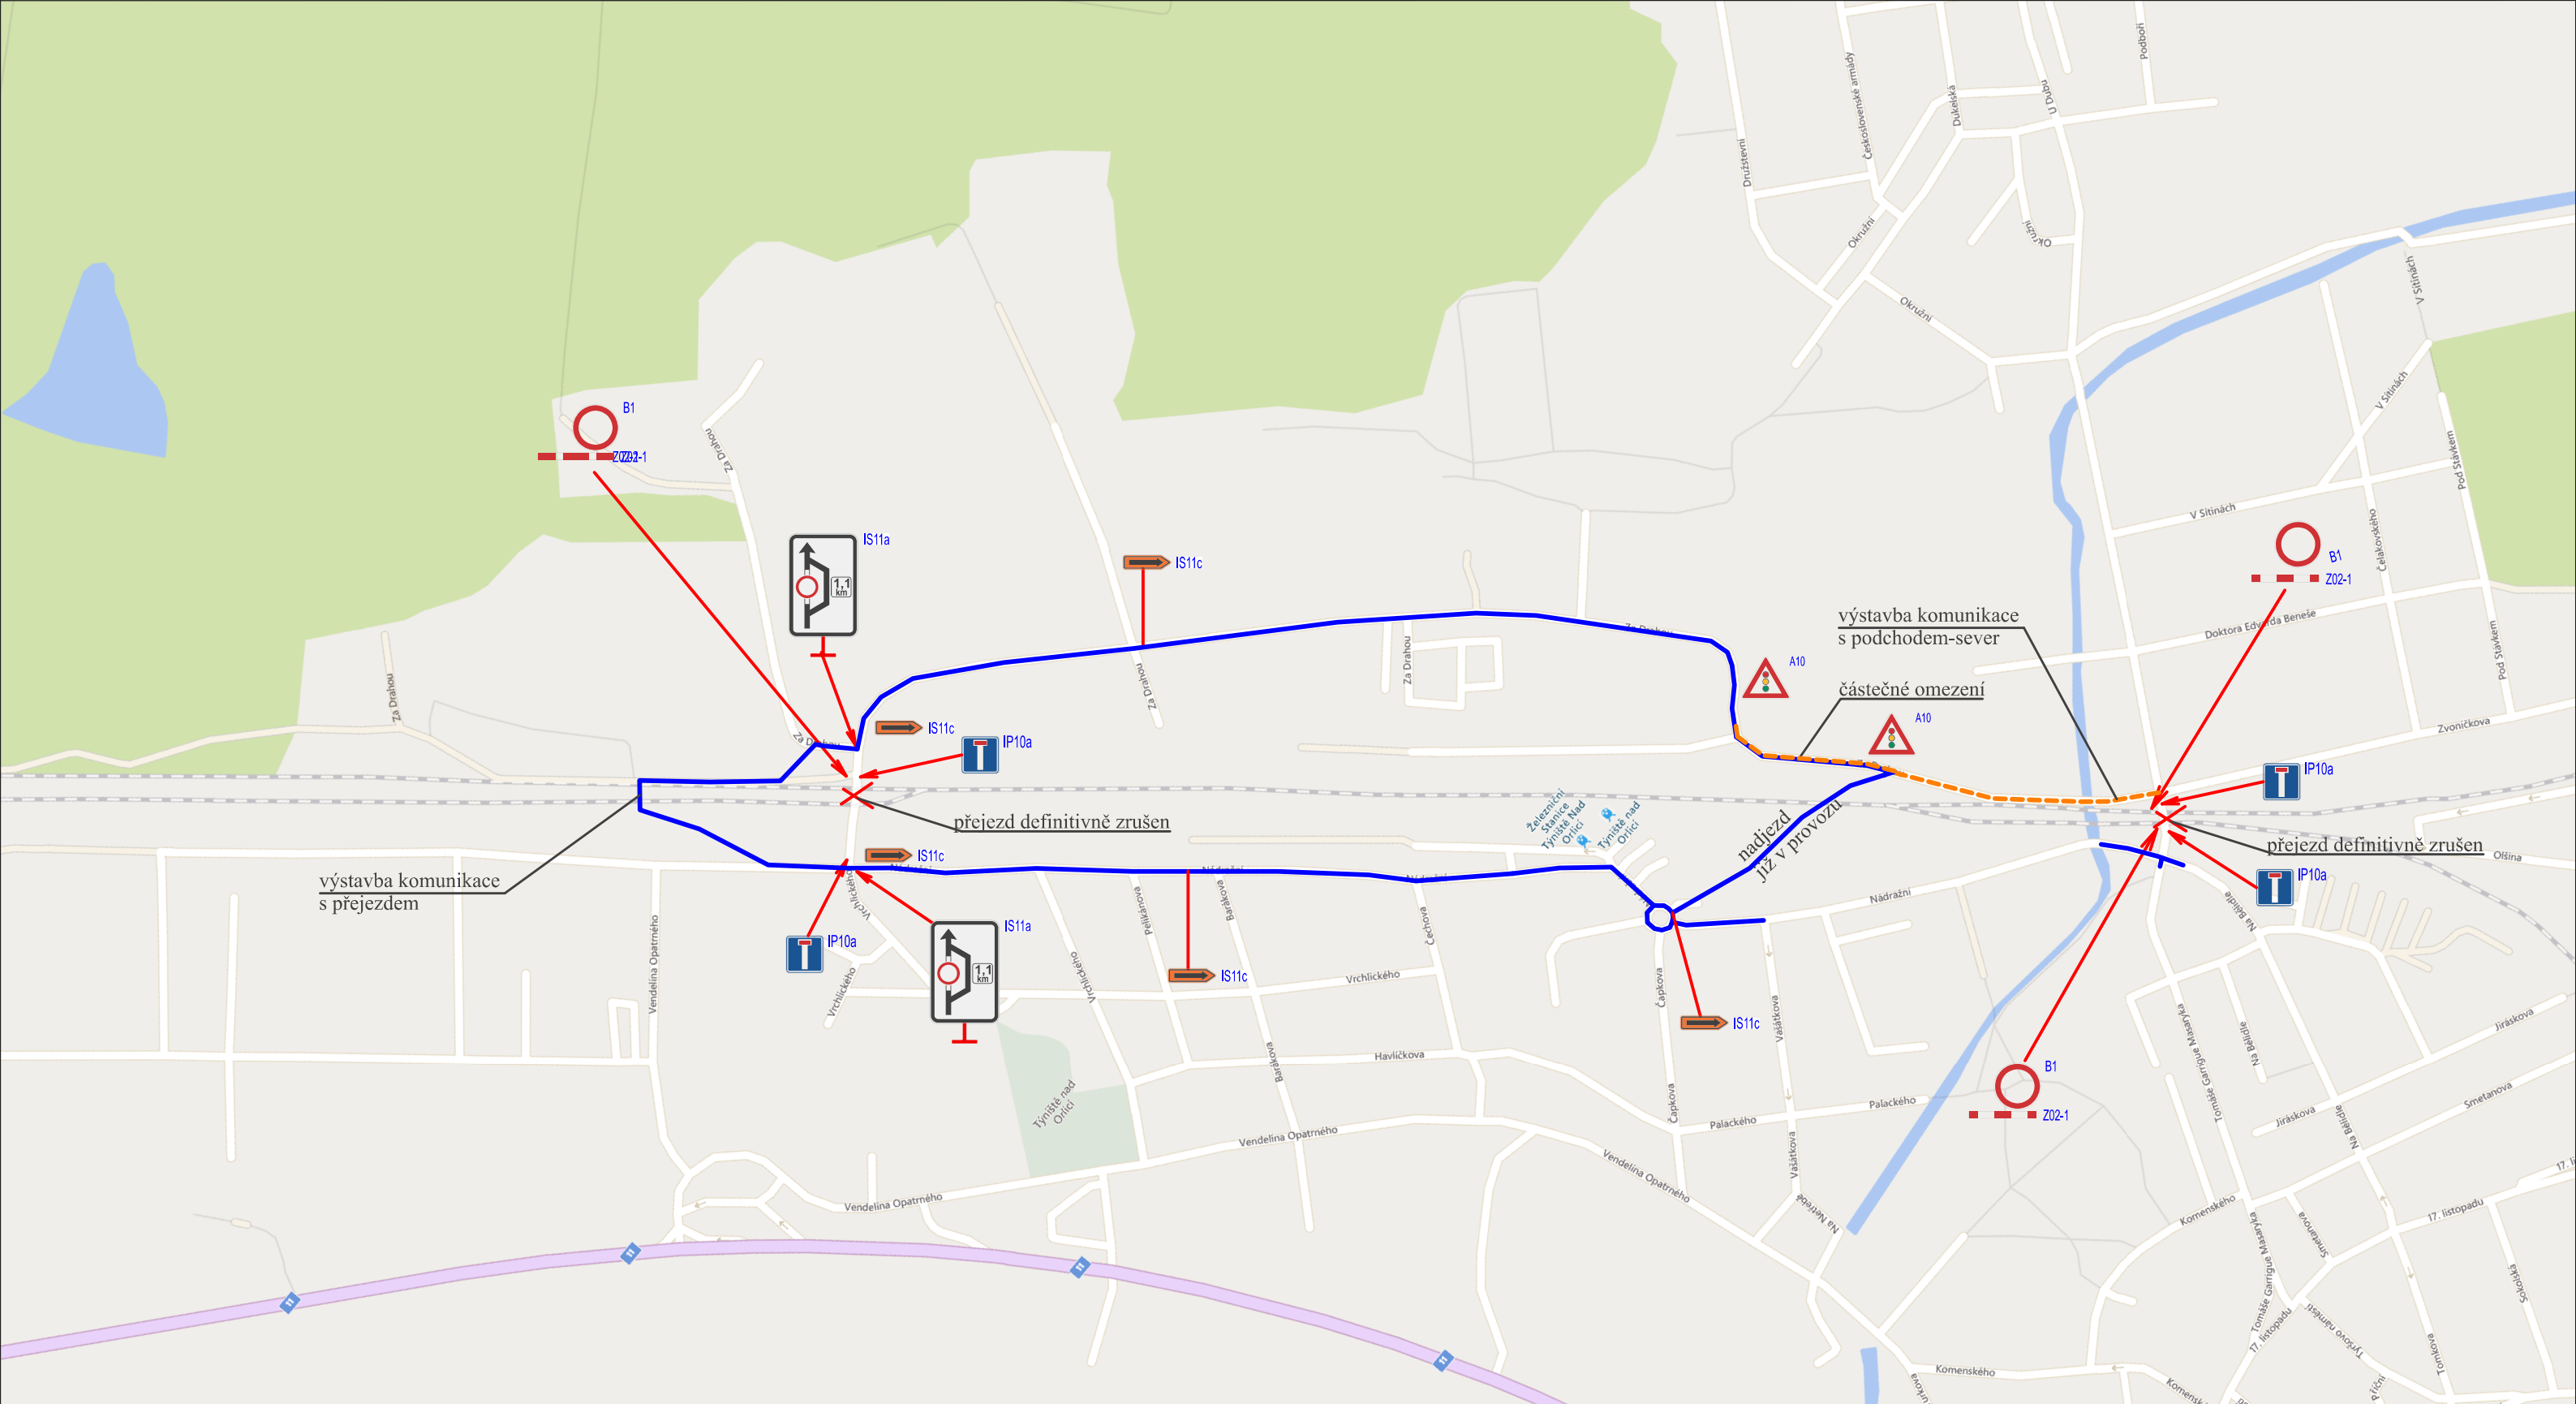

2. část výstavby - přejezd P4024 je uzavírán a rušen, dokončena výstavba nadjezdu, stavba jižní části podchodu v ul. Nádražní hotova, Výstavba severní části podchodu přejezd P4023 zřizován v nové poloze v km 48,830

- komunikace ve výstavbě
- hl. komunikace provozované
- dočasně jednosměrná komunikace
