

Dětmarovice-Petrovice u K.-st. hranice PR, BC - stavební postupy


PP, 1.3.2020-31.7.2020

- kácení
- přeložky sítí
- základy TS v ŽST Dětmarovice, Petrovice a na trati
- kabelové trasy
- výstavba TB v žst. Petrovice

Legenda:

- Ruční konstrukce
- Nové konstrukce s obdobou provedení v úseku stávajícího postupu
- Průběh stávajícího postupu
- Z předchozích stavebních postupů
- Návrhové konstrukce
- Provisionální konstrukce

PROVIZ. NÁST. dl 140m
základy TS
12.5.-22.5.2020
10h denní

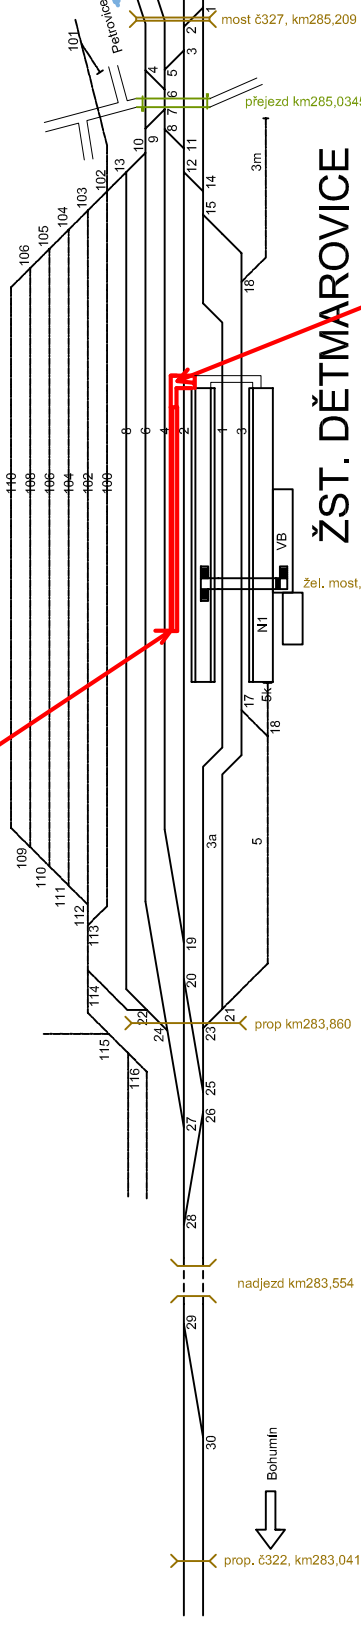

PŘÍSTUP ÚPRAVŮV
STŘEŽENÝ

základy TS
23.3.-13.4.2020
10h denní

ZAST. ZÁVADA

základy TS
14.4.-30.4.2020
10h denní

základy TS
1.5.-11.5.2020
10h denní

ODB. KOUKOLNÁ

základy TS
23.5.-6.6.2020
10h denní

ŽST. PETROVICE

PP
5měs

1.3.-31.7.2020
výstavba TB v žst.
Petrovice

