


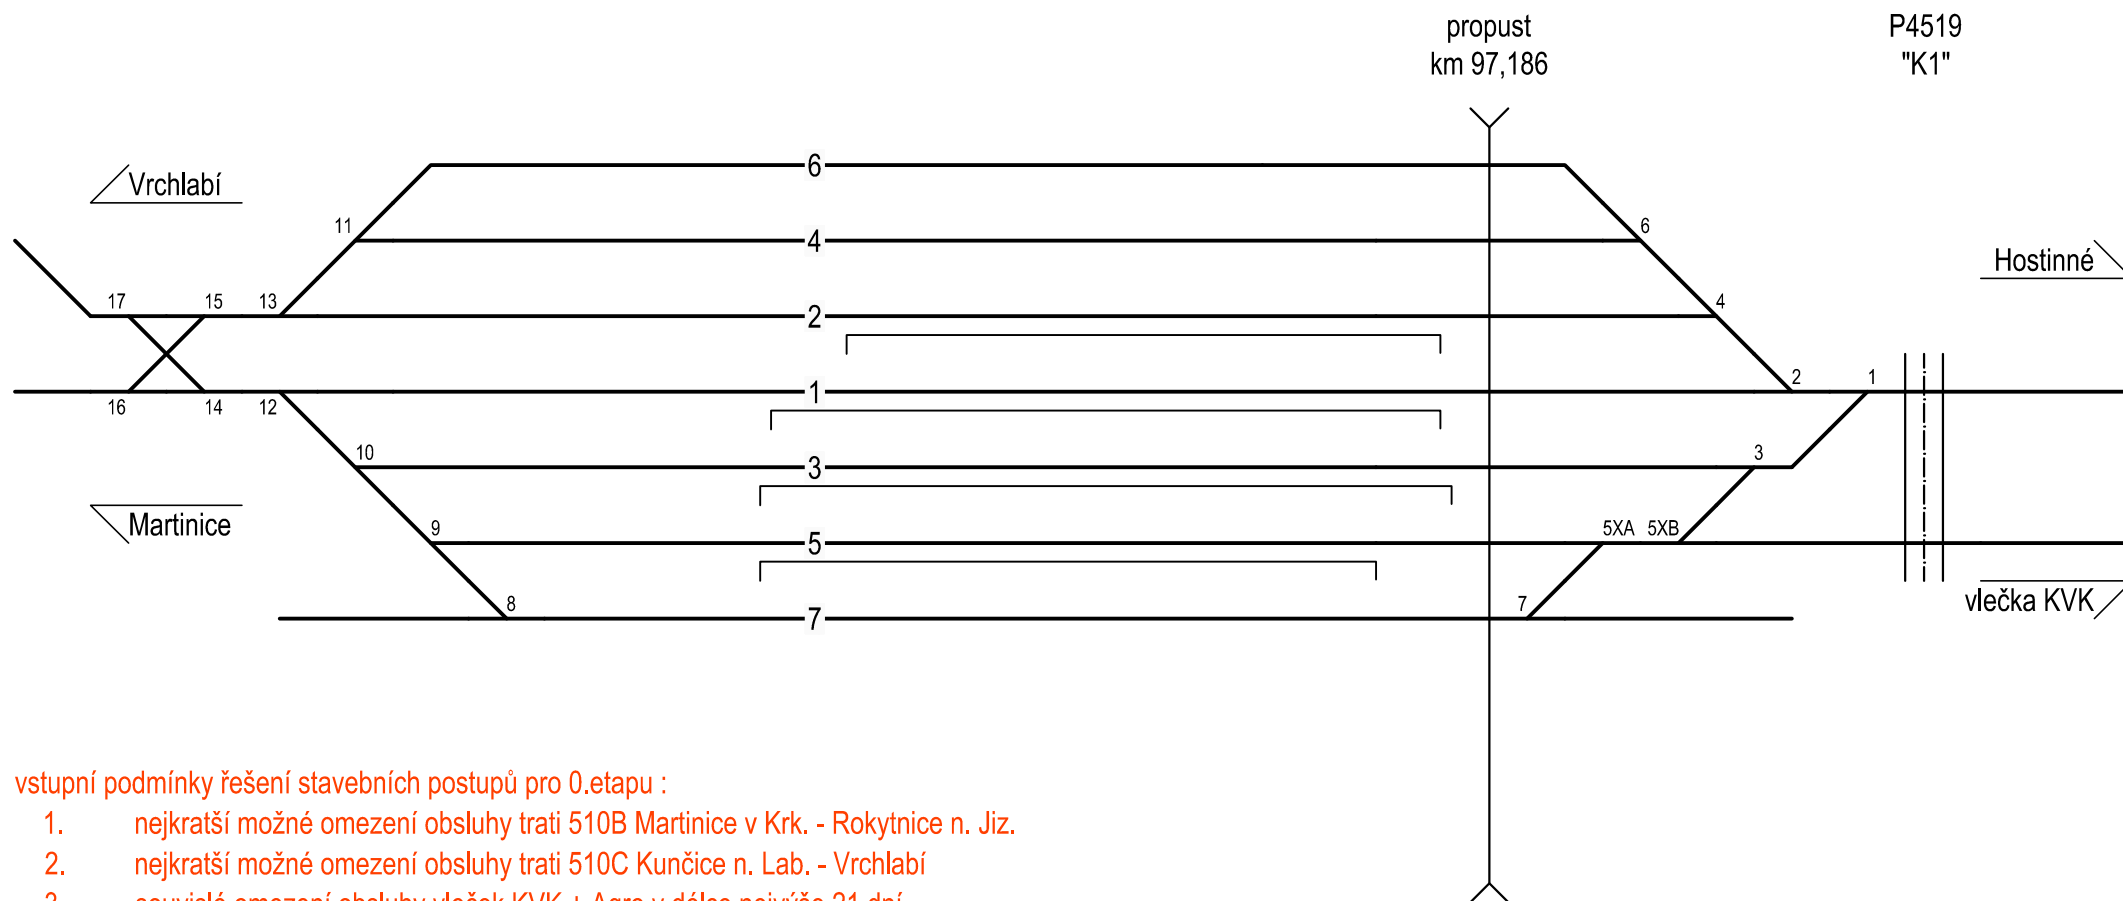
Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	Aktualizace - 0. etapa	10/2023
02	-	-
03	-	-

<b>Objednatel:</b>  <small>Správa železniční dopravní cesty</small>	Správa železniční dopravní cesty, s.o. Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1  Stavební správa východ Nerudova 1, 772 58 Olomouc
--	---

<b>Generální projektant:</b> 	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 fax: +420 224 230 316 e-mail: praha@sudop.cz	<b>Hlavní inženýr projektu:</b> ING. VLADISLAV ŠEFL  <b>Garant profese:</b> ING. LUKÁŠ POHOŘELÝ
---	--	---

<b>Středisko:</b> <b>ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ A UZLŮ</b>			
<b>Vedoucí střediska:</b>	<b>Odpovědný projektant SO, IO, PS:</b>	<b>Vypracoval:</b>	<b>Kontroloval:</b>
ING. PETR BURDA	ING. PETR BURDA	ING. ADAM PETRÁSEK	ING. JAN HAŠEK


<b>Název akce:</b> <b>REVITALIZACE TRATI CHLUMEC NAD CIDLINOU - TRUTNOV</b>		<b>Číslo smlouvy:</b> 18 355 201	
		<b>Projektový stupeň:</b> PROJEKT	
<b>Část:</b>  ORGANIZACE VÝSTAVBY		<b>Datum:</b> 04 / 2019	
		<b>Číslo části:</b> F	
<b>Název přílohy:</b>  SCHÉMA STAVEBNÍCH POSTUPŮ ŽST. KUNČICE NAD LABEM		<b>Měřítko:</b> -	<b>Počet formátů:</b> 20 x A4
		<b>Číslo přílohy:</b> 4.2	



vstupní podmínky řešení stavebních postupů pro 0.etapu :

1. nejkratší možné omezení obsluhy trati 510B Martinice v Krk. - Rokytnice n. Jiz.
2. nejkratší možné omezení obsluhy trati 510C Kunčice n. Lab. - Vrchlabí
3. souvislé omezení obsluhy vleček KVK + Agro v délce nejvýše 21 dní
4. žádná z nepřetržitých výluk TK mezi Trutnovem a Starou Pakou nesmí začít dříve než 17.6.2024
5. všechny výluky (kromě následného podbití) musí proběhnout do konce stavební sezóny 2024

59 dní  
17.6. - 14.8. 2024

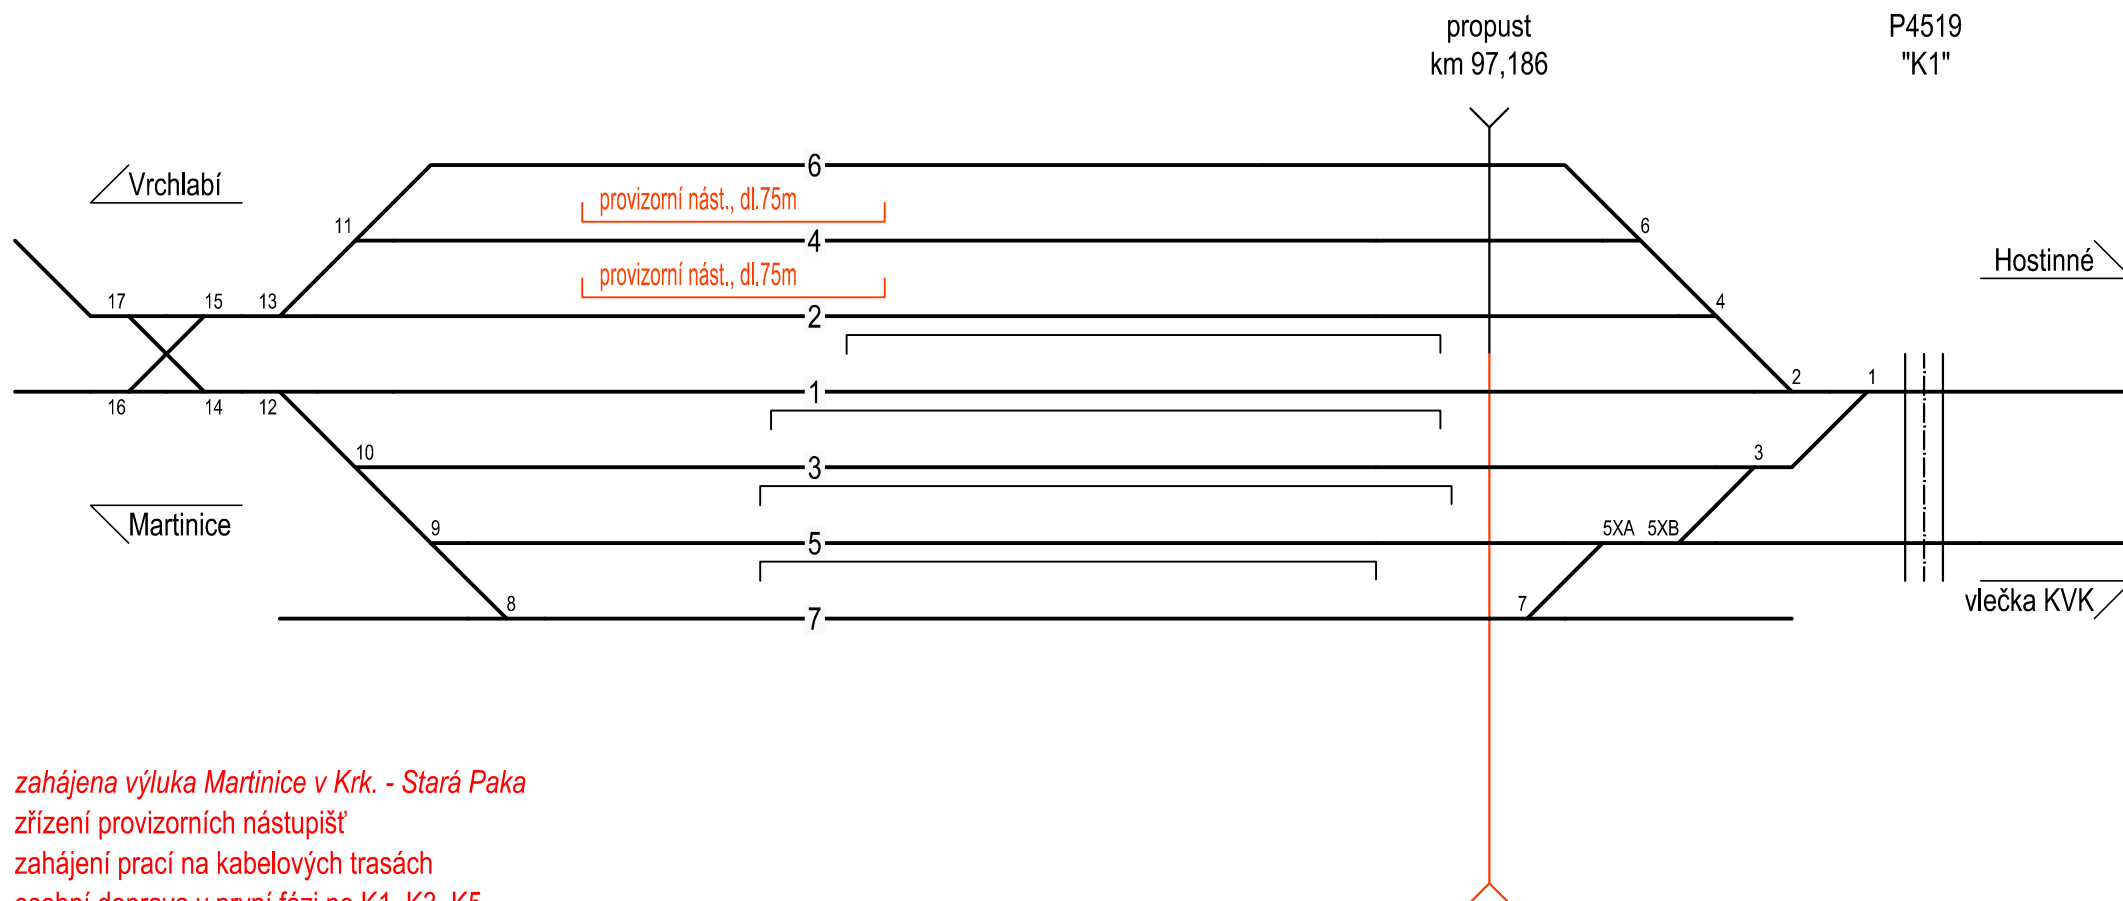

zahájena výluka Martinice v Krk. - Stará Paka

zřízení provizorních nástupišť

zahájení prací na kabelových trasách

osobní doprava v první fázi po K1, K3, K5

v průběhu postupu (nejpozději však na jeho konci) v koordinaci s průběhem prací na kabelových trasách


osobní doprava převedena k provizorním nástupišťům u K2 a K4

(přesný termín bude určen na základě zpracované RDS)

práce na propustku km 97,186 bez zásahu do liché kolejové skupiny

**pokračuje výluka Martinice v Krk. - Stará Paka**  
**obsluha vlečky KVK + Agro úvratí přes V5XB**  
**osobní doprava vedena k provizorním nástupištím u K2 a K4**  
**práce na propustku km 97,186 bez zásahu do liché kolejové skupiny**

11 dní  
4.10. - 14.10. 2024

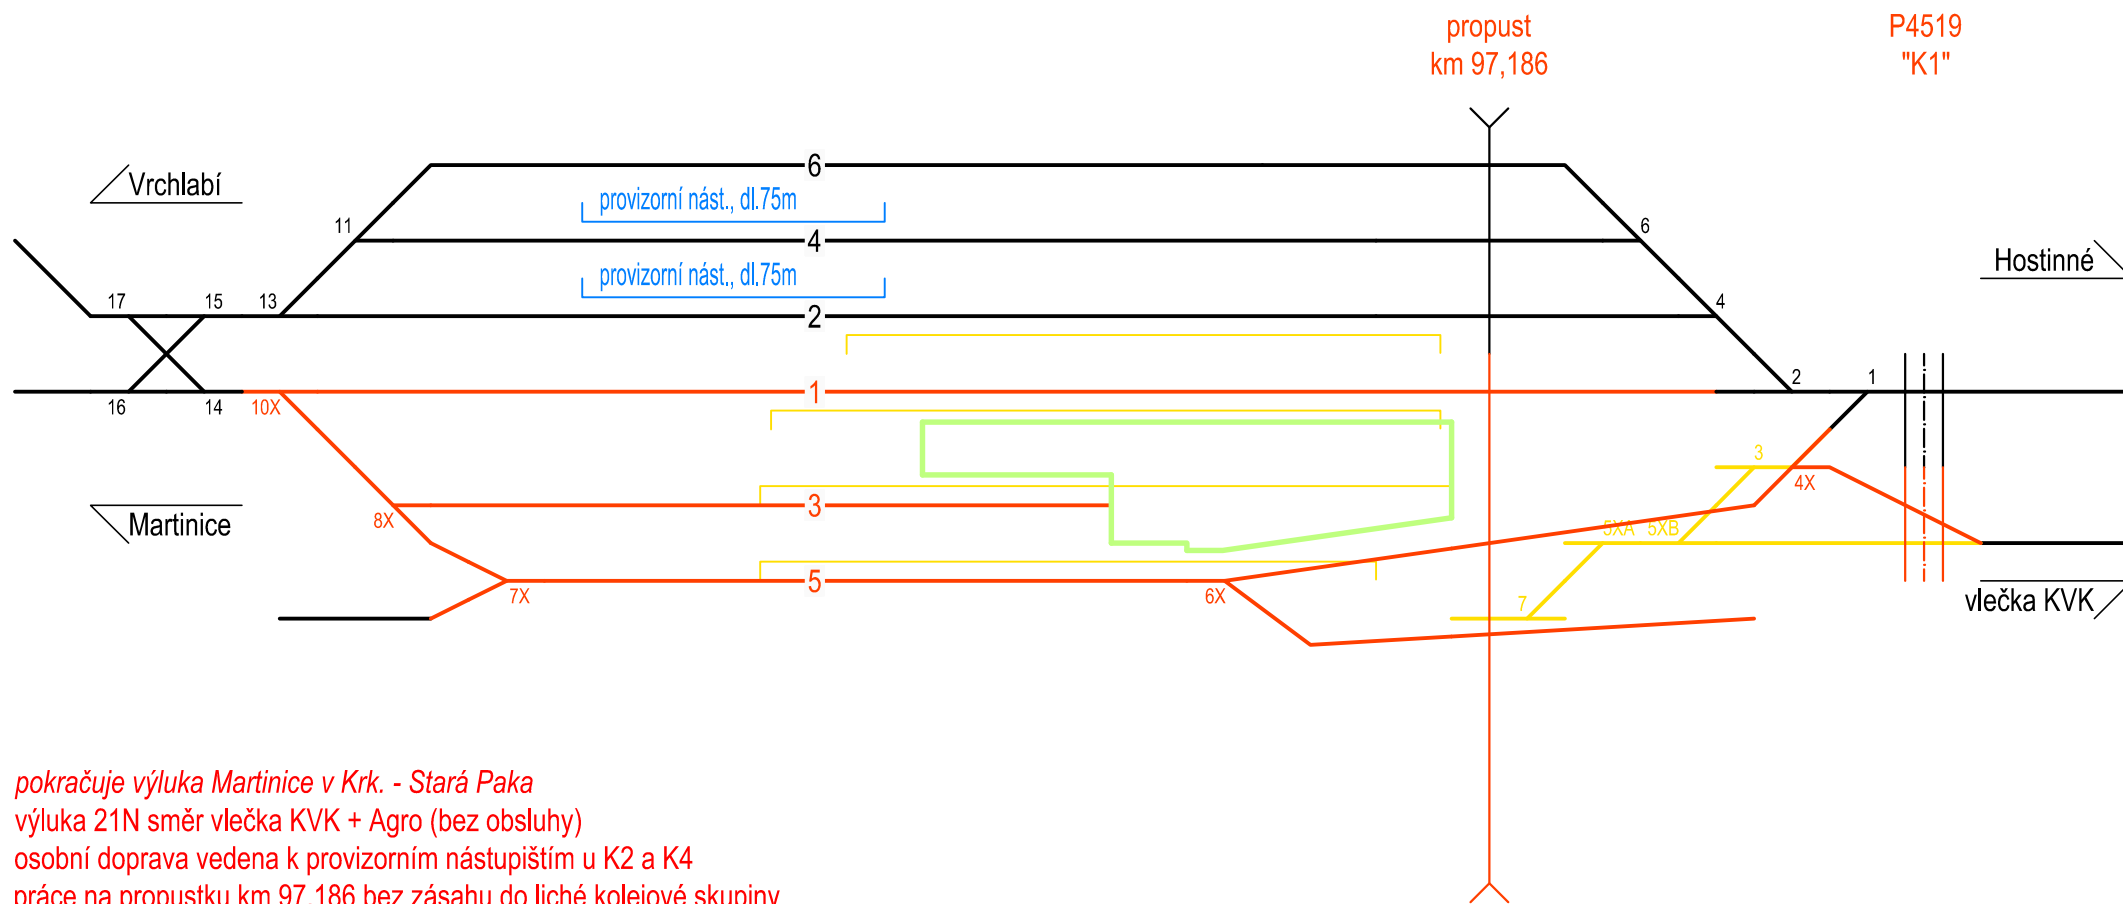

The diagram illustrates the layout of railway track P4519 "K1". It features several horizontal tracks labeled with numbers 1 through 7. A vertical red line indicates a crossing or signal location. Various colored lines (red, yellow, green) represent different types of infrastructure or construction work. Labels include "Vrchlabí", "Martinice", "Hostinné", and "vlečka KVK". Specific notes mention "provizorní nást., dl. 75m" and "výluka 21N směr vlečka KVK + Agro (bez obsluhy)".


**výluka 21N směr vlečka KVK + Agro (bez obsluhy)**

**výluka 10N Hostinné - Stará Paka / Vrchlabí / Rokytnice n. Jiz. (15. - 24.10.2024)**

**NAD Hostinné - Stará Paka / Vrchlabí / Rokytnice n. Jiz. (15. - 24.10.2024)**

**aktivace nového SZZ v žst. Kunčice n. Lab. v rozsahu dle "D 1.1.3.B" (15. - 24.10.2024)**

výluka 21N směr vlečka KVK + Agro (bez obsluhy)  
výluka 10N Hostinné - Stará Paka / Vrchlabí / Rokytnice n. Jiz. (15. - 24.10.2024)  
NAD Hostinné - Stará Paka / Vrchlabí / Rokytnice n. Jiz. (15. - 24.10.2024)  
aktivace nového SZZ v žst. Kunčice n. Lab. v rozsahu dle "D.1.1.3.B" (15. - 24.10.2024)  
práce na propustku km 97,186 bez zásahu do liché kolejové skupiny  
zahájení prací v sudé kolejové skupině

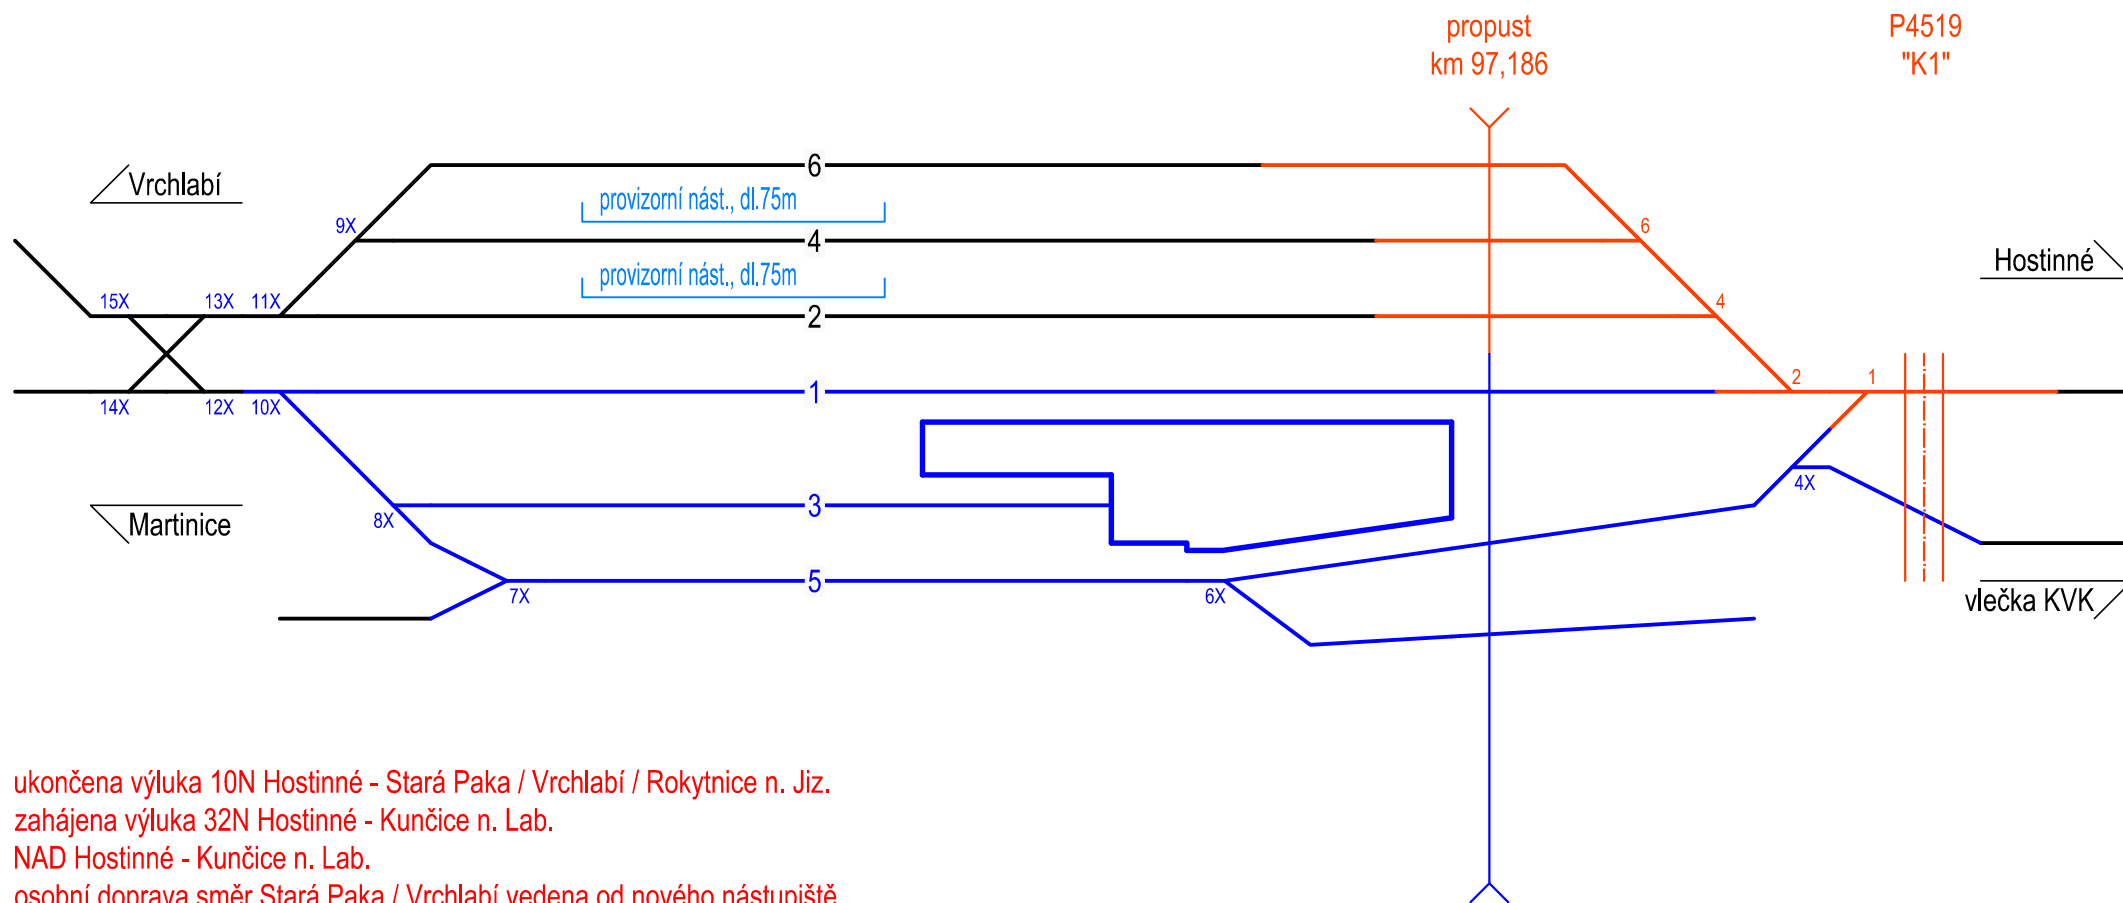


ukončena výluka 10N Hostinné - Stará Paka / Vrchlabí / Rokytnice n. Jiz.  
zahájena výluka 32N Hostinné - Kunčice n. Lab.  
NAD Hostinné - Kunčice n. Lab.  
osobní doprava směr Stará Paka / Vrchlabí vedena od nového nástupiště  
(všechny koleje kusé, vozba vratnými soupravami)  
obsluha vlečky KVK + Agro možná po K5

v provozu nové SZZ žst. Kunčice n. Lab. v rozsahu dle "D.1.1.3.B"

probíhají práce v sudé kolejové skupině

32 dní  
25.10. - 25.11. 2024

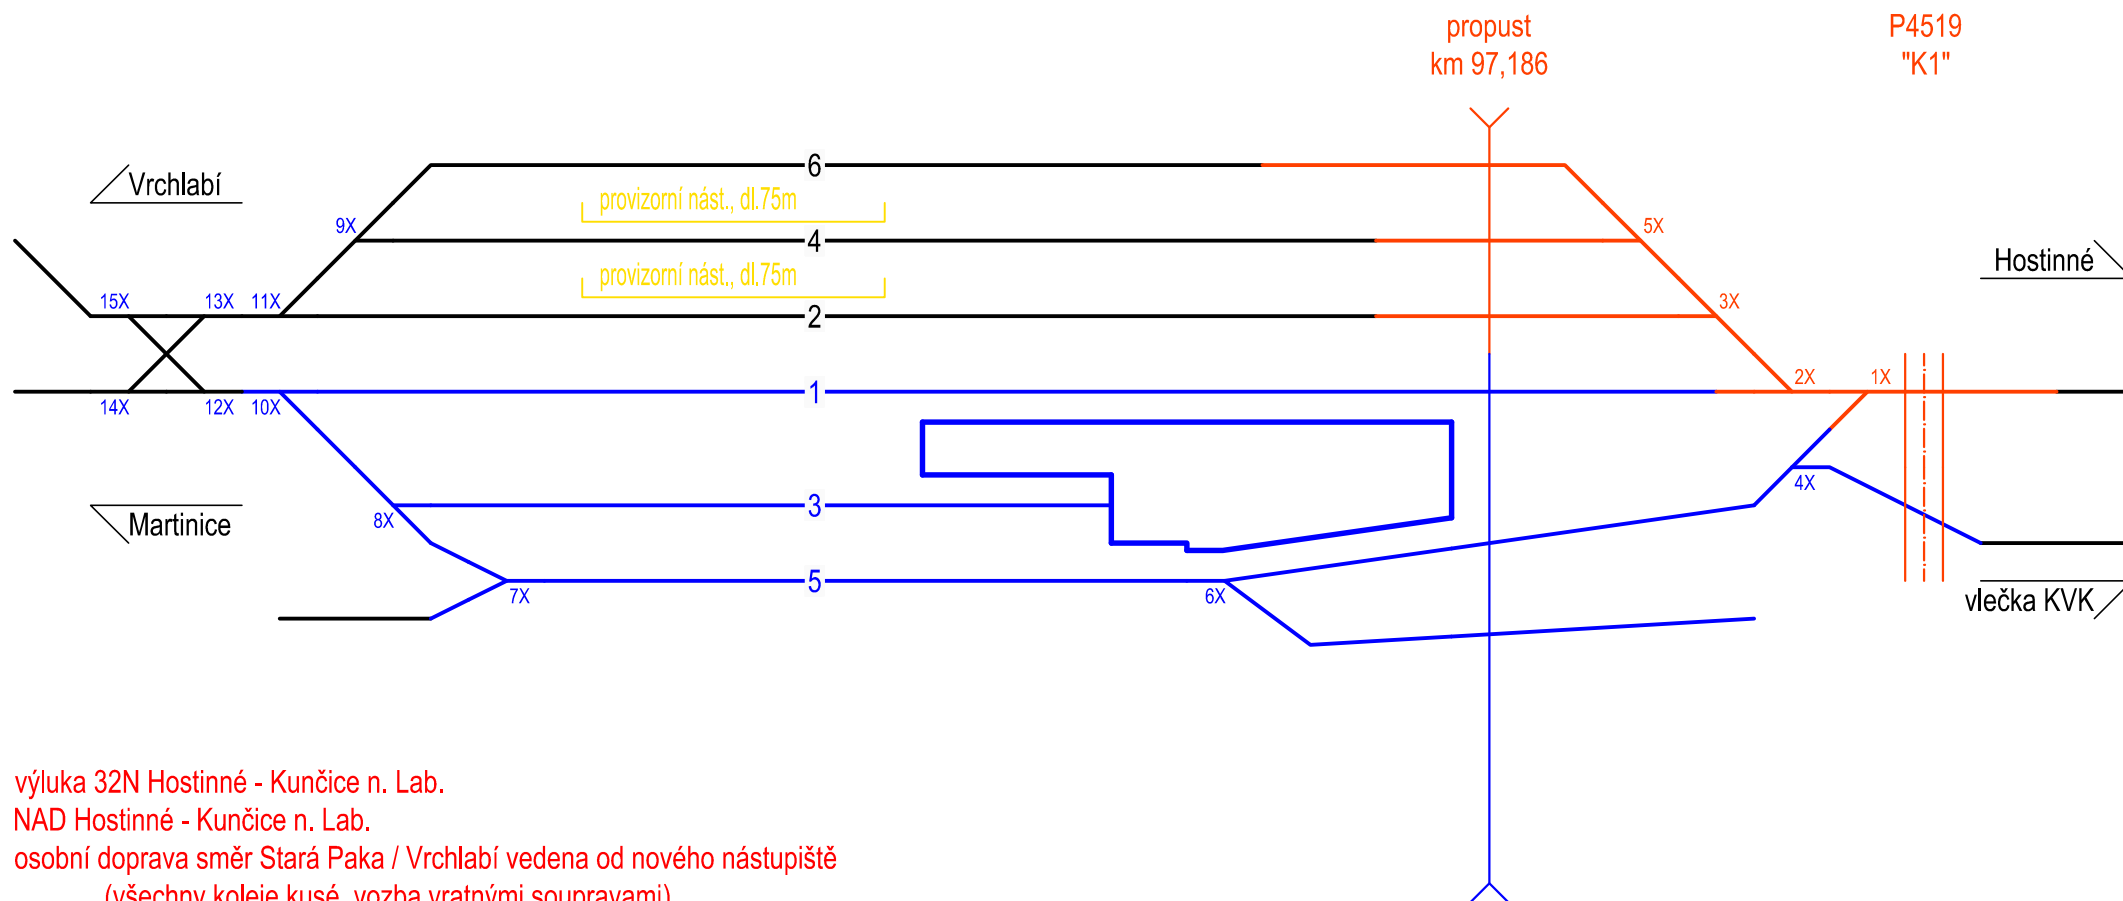

výluka 32N Hostinné - Kunčice n. Lab.

NAD Hostinné - Kunčice n. Lab.

osobní doprava směr Stará Paka / Vrchlabí vedena od nového nástupiště

(všechny koleje kusé, vozba vratnými soupravami)

obsluha vlečky KVK + Agro možná po K5

v provozu nové SZZ žst. Kunčice n. Lab. v rozsahu dle "D.1.1.3.B"

probíhají práce v sudé kolejové skupině

(prvních 10 dní realizováno již v závěru SP1)

aktivace definitivního SZZ v žst. Kunčice n. Lab. v rozsahu dle "D.1.1.3" (16. - 25.11.2024)



