


VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

	Vedoucí projektu	Zodpovědný projektant	Investor	SŽDC s.o., OŘ PLZEŇ
	ING. Š. JAKEŠ <i>Jakeš</i>	ING. R. SKLENÁŘ <i>Sklenář</i>	Místo stavby	DEHTÍN
	Vypracoval	Kontroloval	Formát	A4
	ZDRAŽILOVÁ, JAKEŠ <i>Jakeš</i>	ING. L. MAREK <i>Marek</i>	Datum	11/2019
			Účel	DSP
			Měřítko	
TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8, tel/fax: 284 021 740, email: topcon@topcon.cz			Č.zakázky	63-19
<p align="center">OPRAVA MOSTU V KM 56,688 PLZEŇ – KLATOVY</p>			Číslo kopie	Číslo přílohy
DIO				

Omezení provozu na komunikaci, objížděky – IAD + nákladní vozidla

- Nepřetržitá výluk železniční tratě je plánovaná (schválený roční plán výluk 2020) ve dnech 12.5.-1.6.2020.
- 12.5.-14.5. úplná uzavírka komunikace I/27 pod mostem.
- 14.5.-25.5. částečná uzavírka (jeden jízdní pruh) – od Plzně by se jezdilo po silnici I/27 přes Dehtín (pod mostem v jednom jízdním pruhu), ve směru od Klatov by se jezdilo po objížděce přes Točnick.
- 25.5. – 26.5. úplná uzavírka komunikace I/27 pod mostem.
- Při úplné uzavírci jsou směry objížděk navrženy takto z důvodu odbočování doprava (nekříží trasu), v úseku Malechov – Dehtín musí být pouze jednosměrný provoz s ohledem na šířku komunikace (od Dehtína zákaz vjezdu).

Před zavedením uzavírek budou provedeny pasporty dopravní trasy.

Autobusy

změna trasy, viz DIO - BUS - UZAVŘENÍ PODJEZDU

143104, Dopravce: Autobusy VKJ s.r.o.

Klatovy, aut.nádr. →směr do Plzeň, CAN

431300, Dopravce: ČSAD autobusy Plzeň a.s.

směr z Plzeň, CAN →směr do Klatovy, aut.nádr.

432130, Dopravce: ČSAD autobusy Plzeň a.s.

Chudenice, nám. →směr do Klatovy, aut.nádr.

432290, Dopravce: ČSAD autobusy Plzeň a.s.

Kbel →směr do Klatovy, aut.nádr.

432180, Dopravce: ČSAD autobusy Plzeň a.s.

Klatovy, aut.nádr. →směr do Klatovy, u Gymnázia

Technologie provádění, dráha 21N

Práce prováděné za železničního provozu před výlukou

- Zařízení staveniště stavby.
- Výroba nové ocelové NK mostu s ŽB příčníky.
- Výroba ŽB prefabrikátů úložných prahů.
- Výroba ŽB prefabrikátů křídel.

Práce ve výluce koleje na mostě a na komunikaci – 3 dny (uzavírka I/27)

- Snesení stávající NK mostu vč. kolejnic, mostnic a podlah atd. – bude sneseno automobilovým jeřábem z komunikace.
- Zaříznutí líce kamenného zdiva stěnovou kotoučovou pilou.
- Osazení bet. svodidel, SSZ.

Práce ve výluce koleje na mostě za provozu na komunikaci – 10 dní (SSZ I/27)

- Výkopy pro ZKPP, křídla, opěry.
- Odbourání částí opěr a křídel po danou úroveň.

- Vrtání a osazení mikropilot.
- Doprava prefabrikátů NK a spodní stavby na staveniště.
- * Osazení prefabrikátů ú.p. a křídel – bude osazeno automobilovým jeřábem.
- Sanace stávajících opěr.

* v této době budou další krátkodobá omezení provozu pod mostem např. při osazování prefabrikátů úložných prahů a křídel

Práce ve výluce koleje na mostě a na komunikaci – 2 dny (uzavírka I/27)




- Osazení nové ocelové NK mostu s ŽB příčníky vč. izolace do otvoru – bude osazeno automobilovým jeřábem z komunikace.
- Odstranění bet. svodidel, SSZ.


Práce ve výluce koleje na mostě za provozu na komunikaci – 6 dní

- Izolace spodní stavby.
- Přejížděvací oblasti a ZKPP.
- Zřízení kolejového lože, osazení koleje.
- Montáž zábradlí.
- Hlavní prohlídka, uvedení mostu do provozu.

Práce prováděné za železničního provozu po výluce

- Úprava okolního terénu do původního stavu.

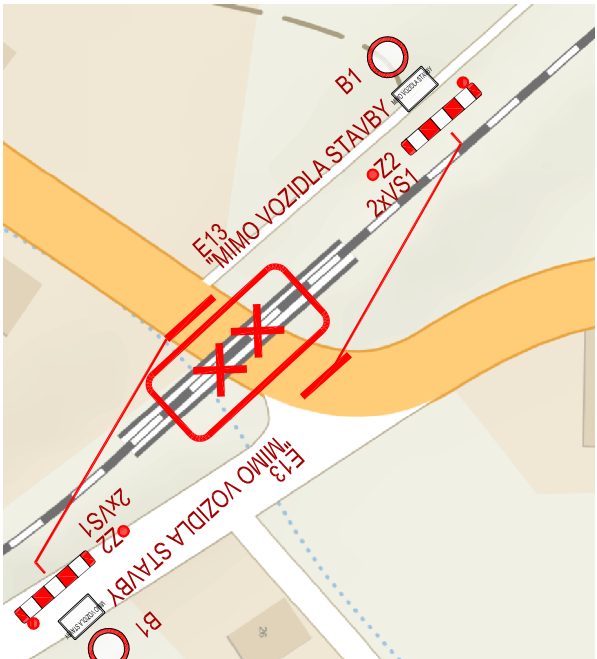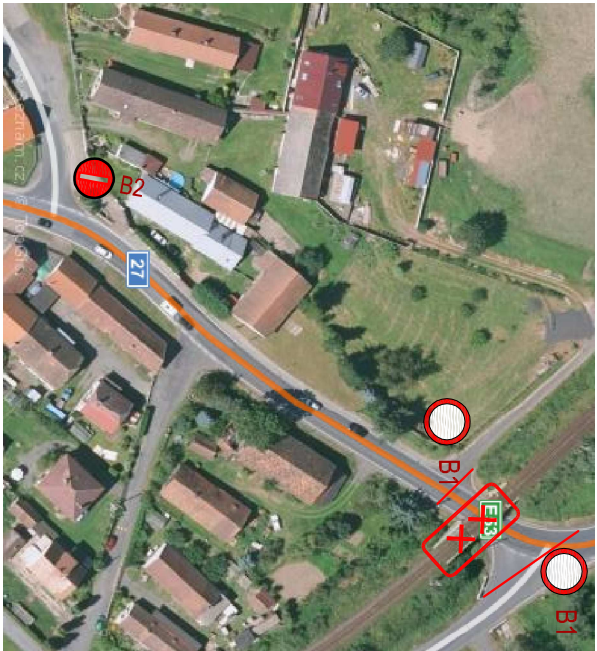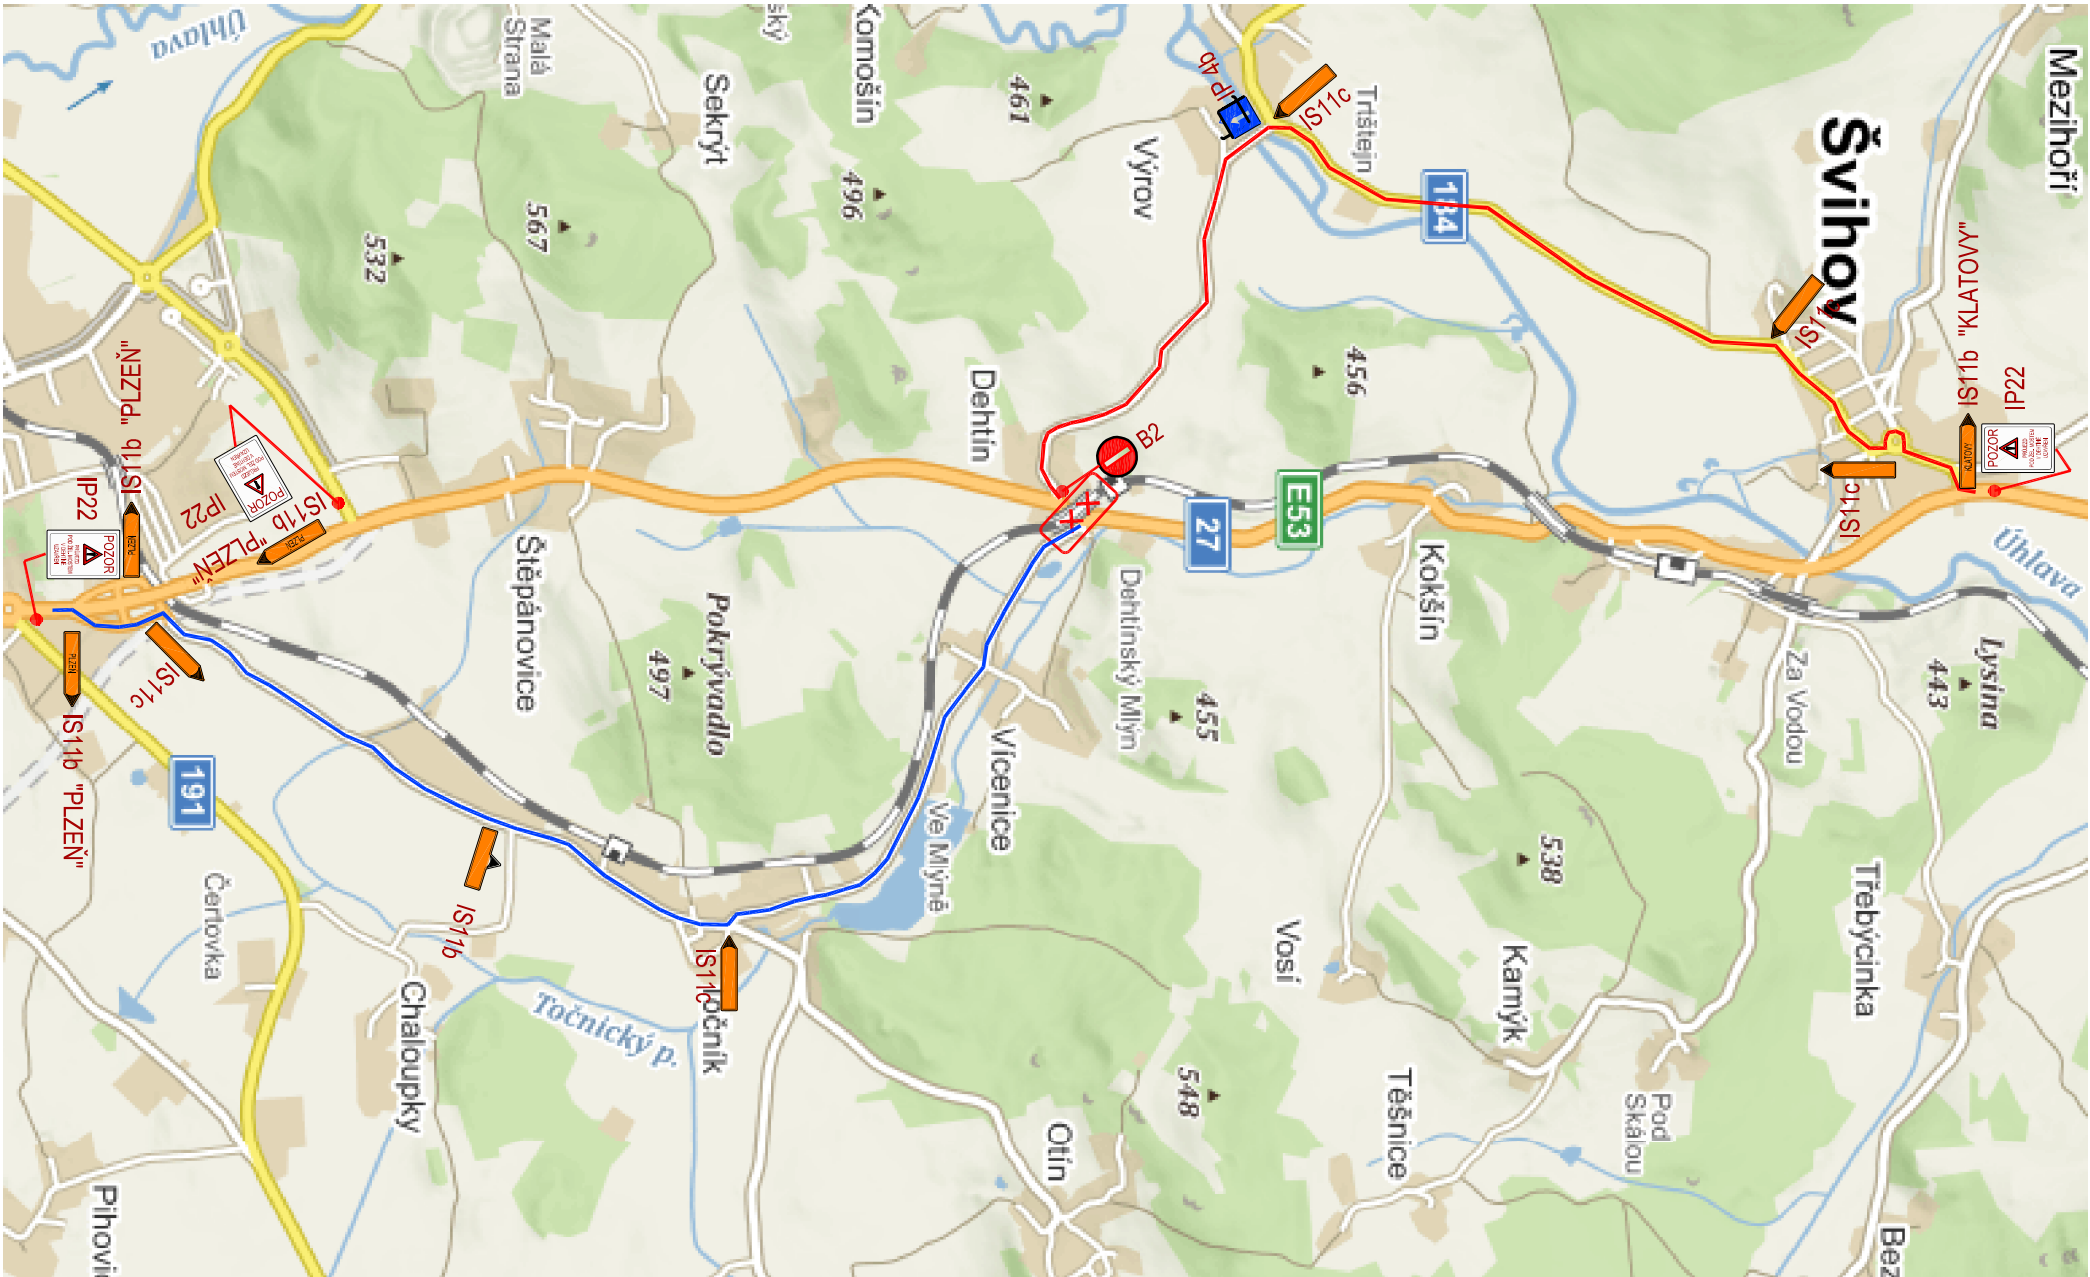


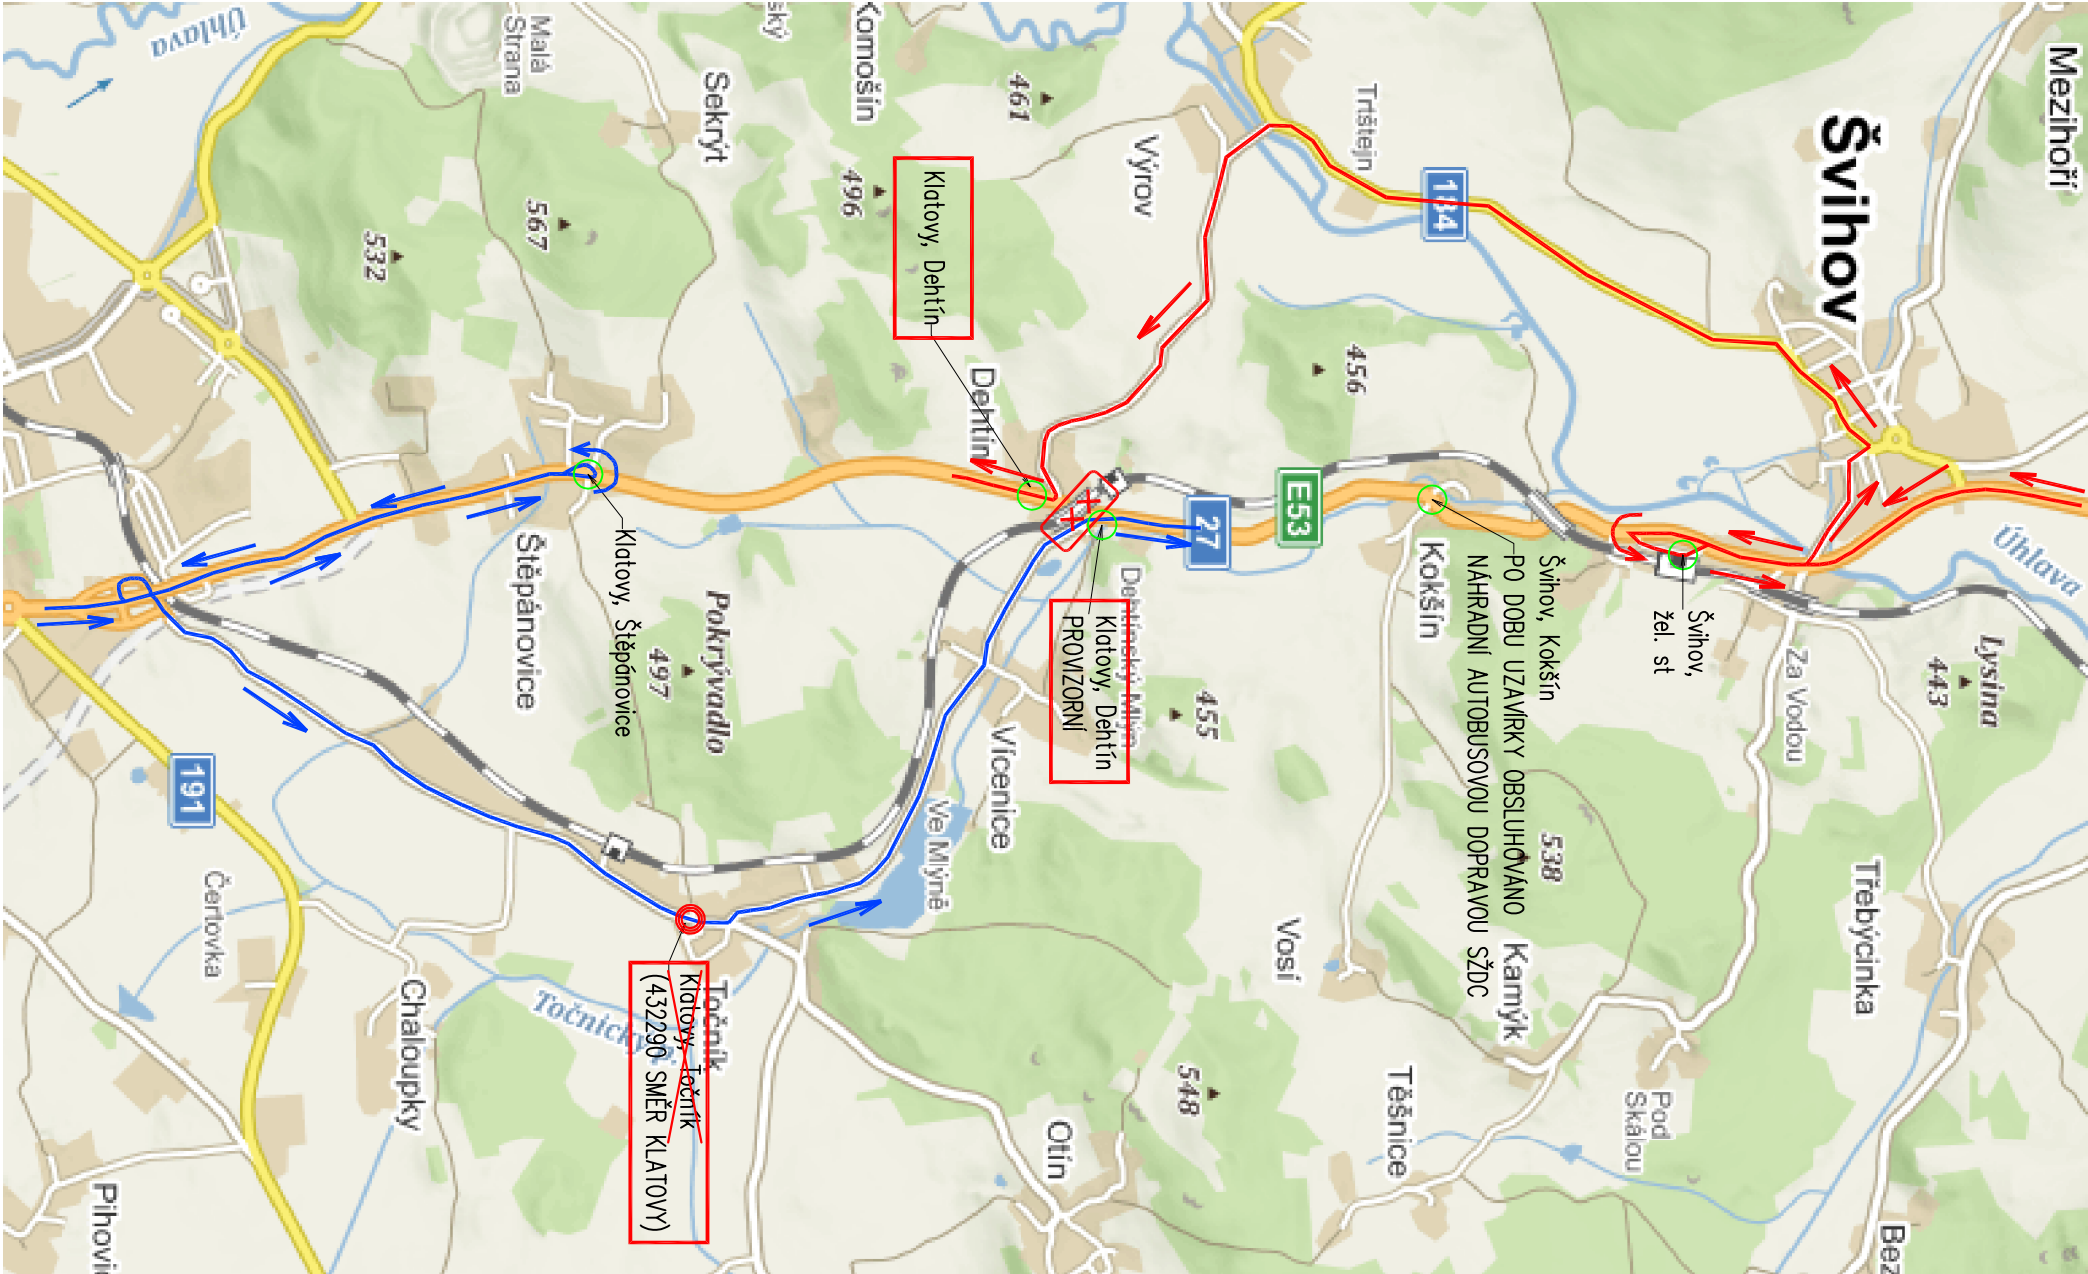

- DOČASNĚ NEOBSLUHOVANÉ ZASTÁVKY
- OBÍJZDNÁ TRASA SMĚR KLATOVY
BUS 431300, 143104, 432290, 432130
PO DOBU CELKOVÉ UZAVÍRKY (3+2 DNY)
- OBÍJZDNÁ TRASA SMĚR PLZEŇ
BUS 431300, 143104, 432290, 432130
PO CELOU DOBU UZAVÍRKY MOSTU (21 DN)
- xx OPRAVA MOSTU

LEGENDA:

BUS č. 431300, 143104, 432290, 432130
OBÍJZDNÉ TRASY PO DOBU CELKOVÉ UZAVÍRKY (3+2 DNY)

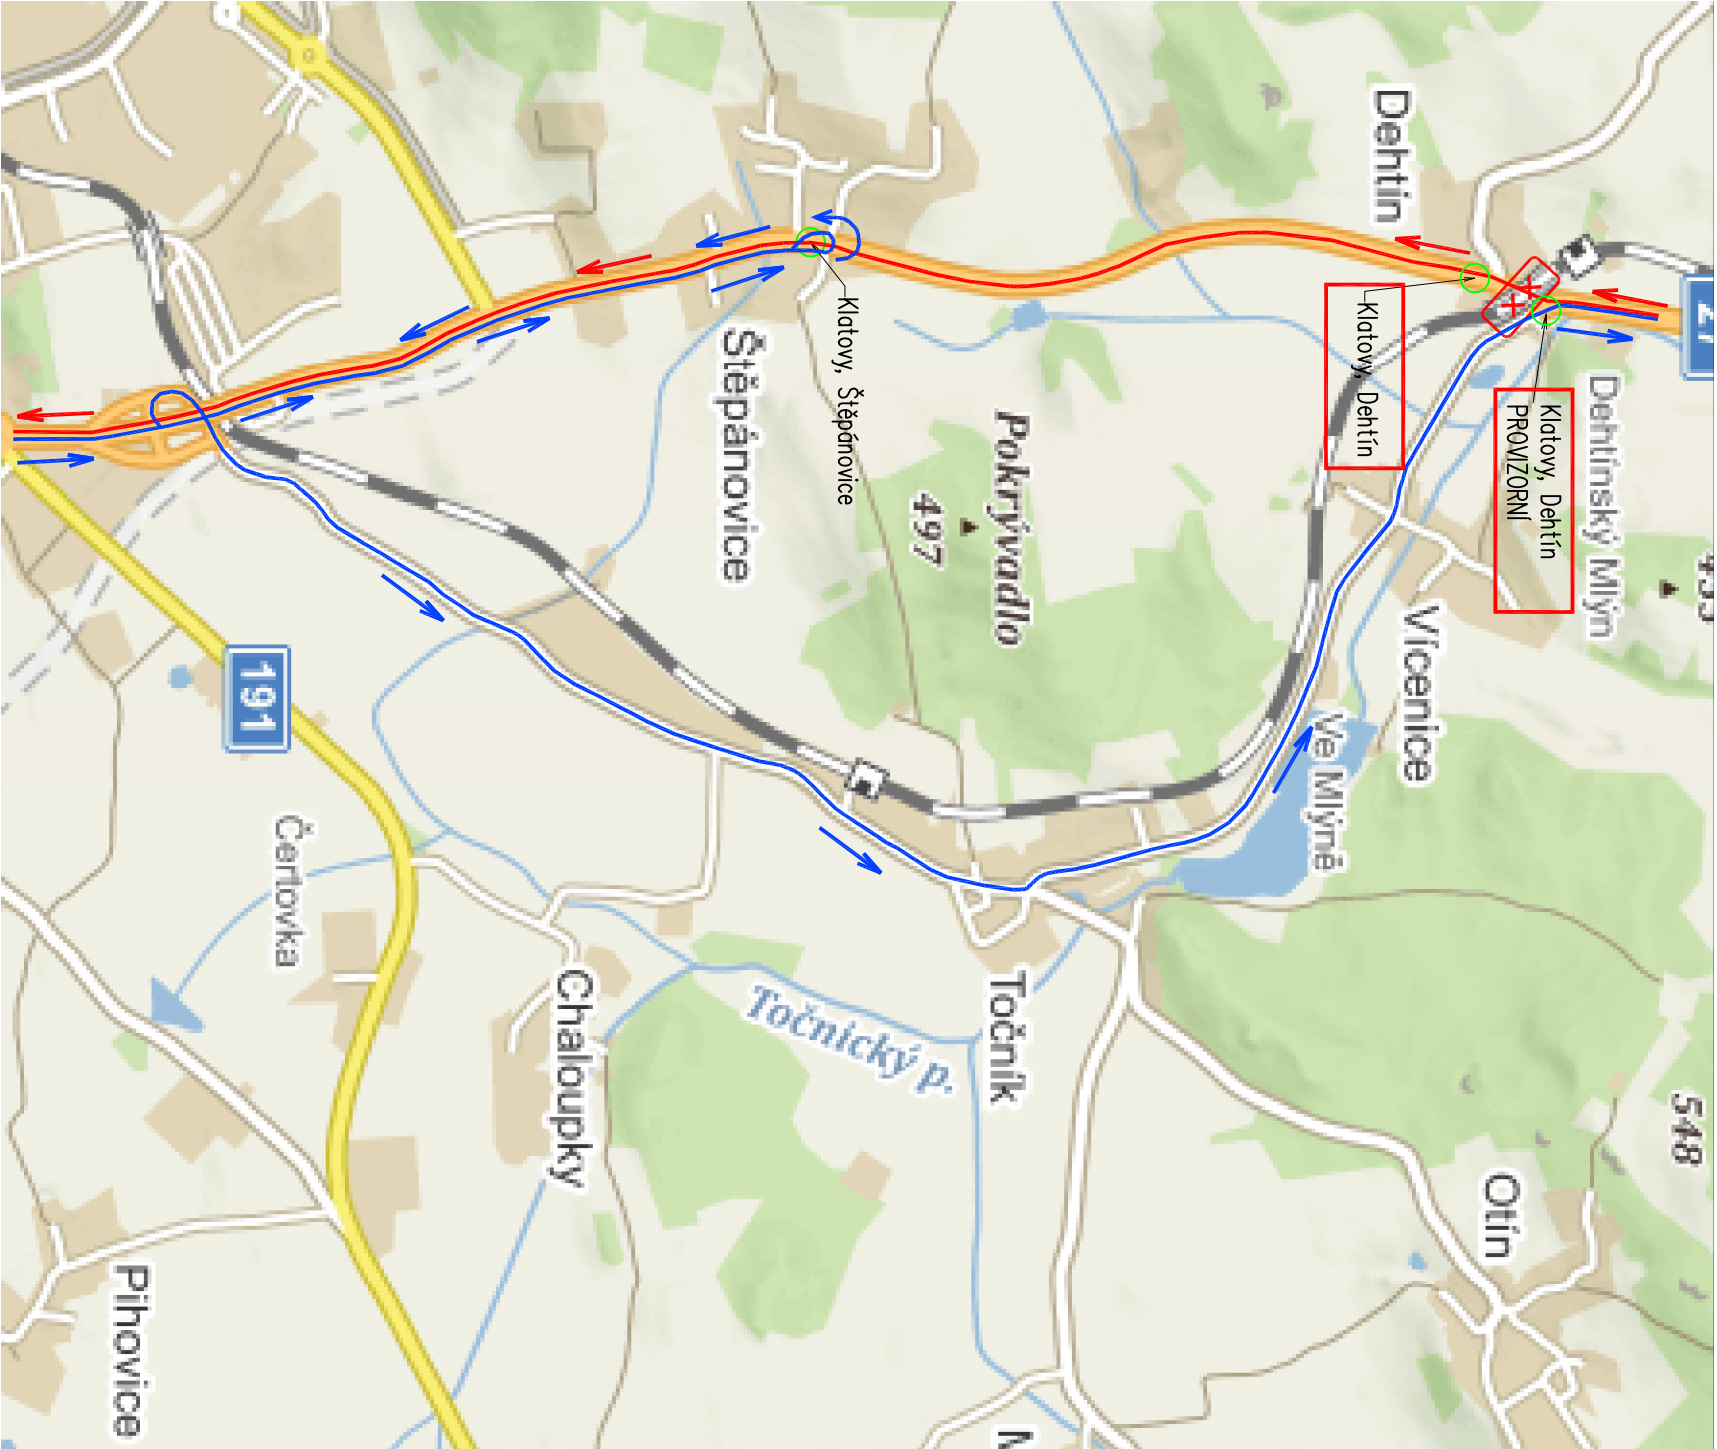


LEGENDA:

TRASA SMĚR KLATOVY BEZE ZMĚN
BUS 431300, 143104, 432290, 432130
PO DOBU ČÁSTEČNĚ UZAVÍRKY (16 DNÍ)

OBÍJZDNÁ TRASA SMĚR PLZEŇ
BUS 431300, 143104, 432290, 432130
PO CELOU DOBU UZAVÍRKY MOSTU (21 DNÍ)

OPRAVA MOSTU

BUS č. 431300, 143104, 432290, 432130
OBÍJZDNÁ TRASA PO DOBU UZAVÍRKY VE SMĚRU PLZEŇ (16 DNÍ)

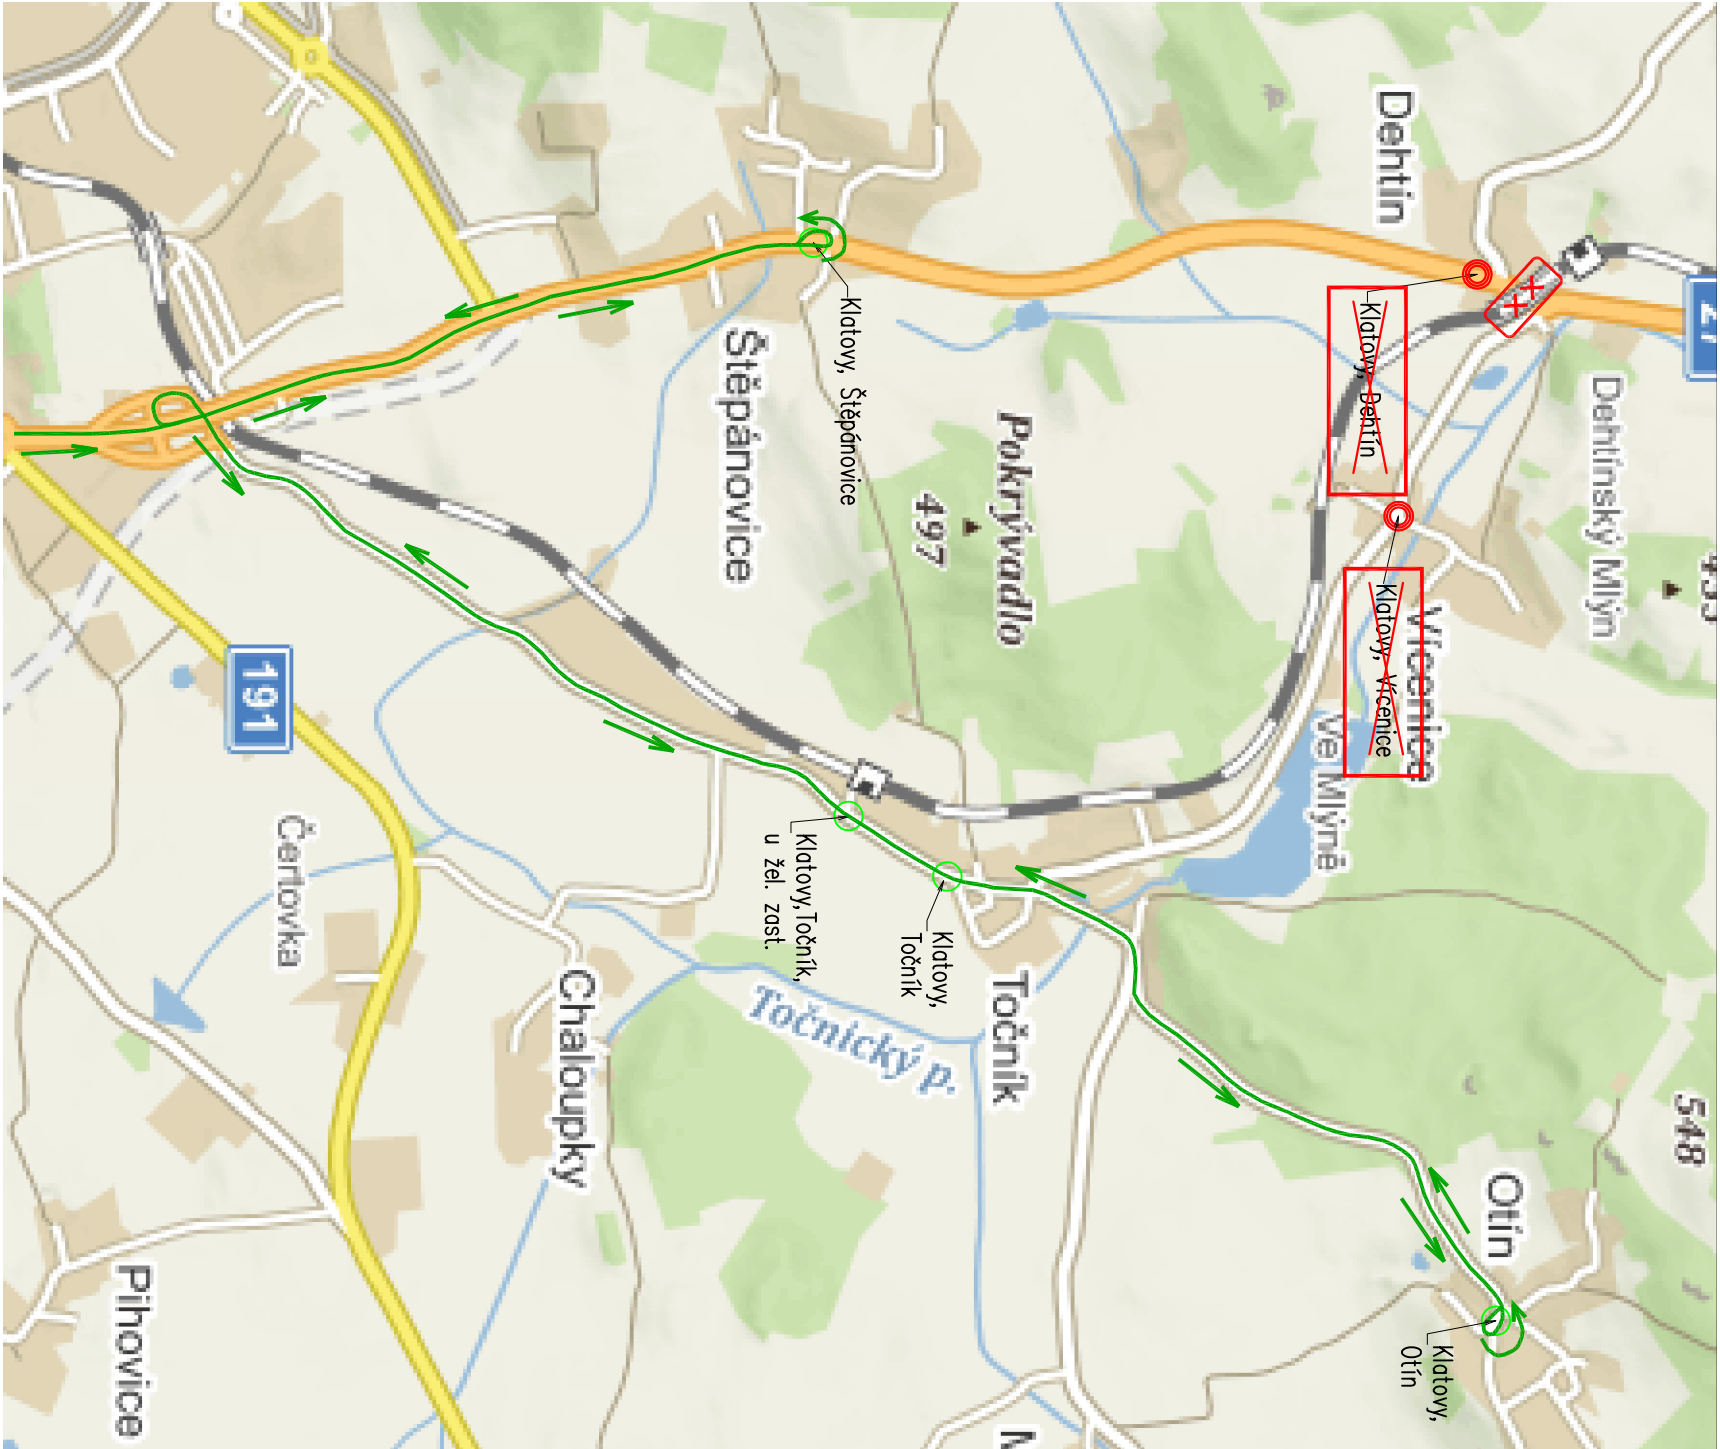


LEGENDA:

- DOČASNĚ NEODSLUHOVANÉ ZASTÁVKY
- OBÍJZDNÁ TRASA
BUS 432180
PO DOBU CELKOVÉ UZAVÍRKY (3+2 DNY)
- XX OPRAVA MOSTU

BUS č. 432180
OBÍJZDNÁ TRASA PO DOBU CELKOVÉ UZAVÍRKY (3+2 DNY)

BUS 432180 – UZAVŘENÍ PODJEZDU	
ČÍSLO PŘÍLOHY	5

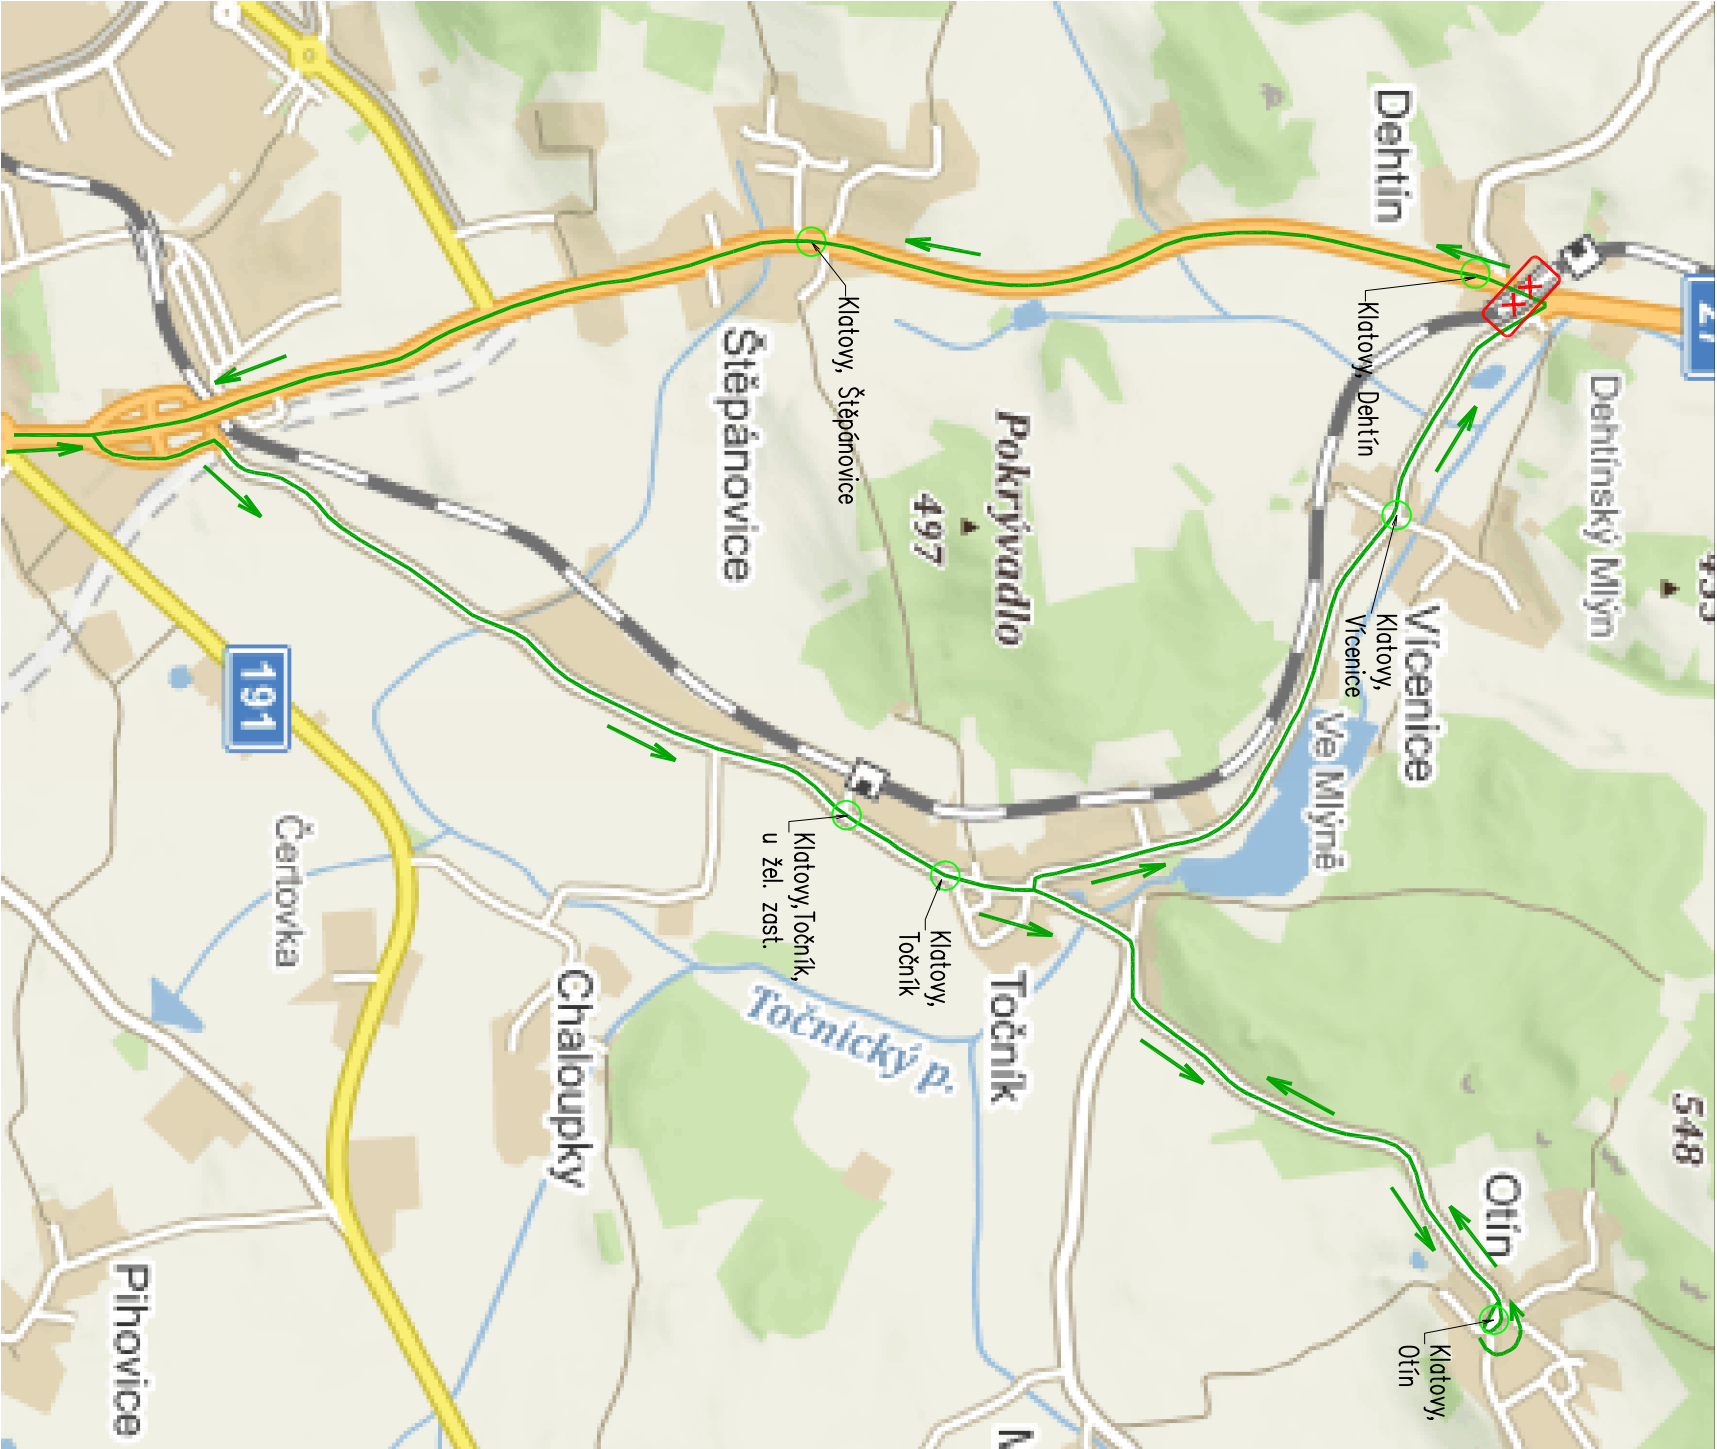

LEGENDA:

OBÍJZDNÁ TRASA – PROTI SMĚRU BĚŽNÉ TRASY
BUS 432180
PO DOBU ČÁSTEČNĚ UZAVÍRKY (16 DNÍ)

XX

OPRAVA MOSTU
