

Rekonstrukce zárubní zdi v km 270,375 - 270,751 v trati Česká Třebová - Praha

Záměr projektu

Situace - SP5
M 1:1000

Česká Třebová

SP1.1 - provizorní spojka
- směrová a výšková úprava koleje
- úprava železničního spodu
- vložení provizorní výhybky 1X
- úprava trakčního vedení (betonáž a osazení stožárů)
- zřízení provizorního zabezpečovacího zařízení
- úprava silnoproudů, zřízení EOY
Délka: 3 dni


SP5.1 - demontáž provizorní spojky
- deaktivace ZabZař provizorní spojky, aktivace stávající 1-3
- demontáž provizorní výhybky 1X
- směrová a výšková úprava koleje
- úprava trakčního vedení do původního stavu, demontáž zatrolejování spojky
- náhrada trolejového drátu v k.č. 1
- demontáž ovzdušného zabezpečovacího zařízení
Délka: 8

SP3 - sanace jižní stěny - 1.část
- nejprve bude zatrolejována provizorní spojka 1X-3X a bude osazeno trakční dělení
- bude aktivována provizorní kolejeva spojka a deaktivována stávající
- odsunutí trolejového drátu, ochrana zařízení žel. svršku, zabřaz ad.
- osazení ostranných sítí proti spadu očištěného materiálu
- očištění a sanace skalních stěn
- zřízení odvodnění v ulici Nad Tunelem
- odstranění stávajícího betonového oplocení a sítí - odvoz očištěného materiálu
- vybudování nového odvodňovacího systému
- Nová ŽB římsa a oplocení
- Zdičné stěny - sanacní opatření
- Betonové sloupky a klenby (obložení) - sanacní opatření
- odstranění ochrany zařízení, návaznosti trolejového drátu do původní polohy
Poznámka: práce na čišění skalních stěn a sanacních opatřeních zdi a klenby nutno střešovat postupem prací z obou stran

SP4 - sanace jižní stěny - 2.část
- odsunutí trolejového drátu, ochrana zařízení žel. svršku, zabřaz ad.
- osazení ochranných sítí proti spadu očištěného materiálu
- očištění a sanace skalních stěn
- zřízení odvodnění v ulici Nad Tunelem
- odstranění stávajícího betonového oplocení a sítí - odvoz očištěného materiálu
- vybudování nového odvodňovacího systému
- Nová ŽB římsa a oplocení
- Zdičné stěny - sanacní opatření
- Betonové sloupky a klenby (obložení) - sanacní opatření
- odstranění ochrany zařízení, návaznosti trolejového drátu do původní polohy
Poznámka: práce na čišění skalních stěn a sanacních opatřeních zdi a klenby nutno střešovat postupem prací z obou stran

LEGENDA SITUACE:
- Stávající osa koleje
- Stávající trakční stožáry
- Trakční vedení - původní plán
- Nové vkladné výhybky (provizorní)
- Směrová a výšková úprava koleje
- Vykoupená kolej
- Sanacní práce na skalních zářezů (zdech)
- Demontáž provizorní spojky
- Stávající kanalizace VAK Jablonné nad Orlicí
- Hranice pozemků Českých drah, a.s.
- Hranice pozemků Správy železnic, s.o.
- Hranice pozemků katastrální mapy
- Stávající stav
Pozn.: Bledším písmem (kresbou) jsou vyznačeny již provedené stavební postupy

Praha

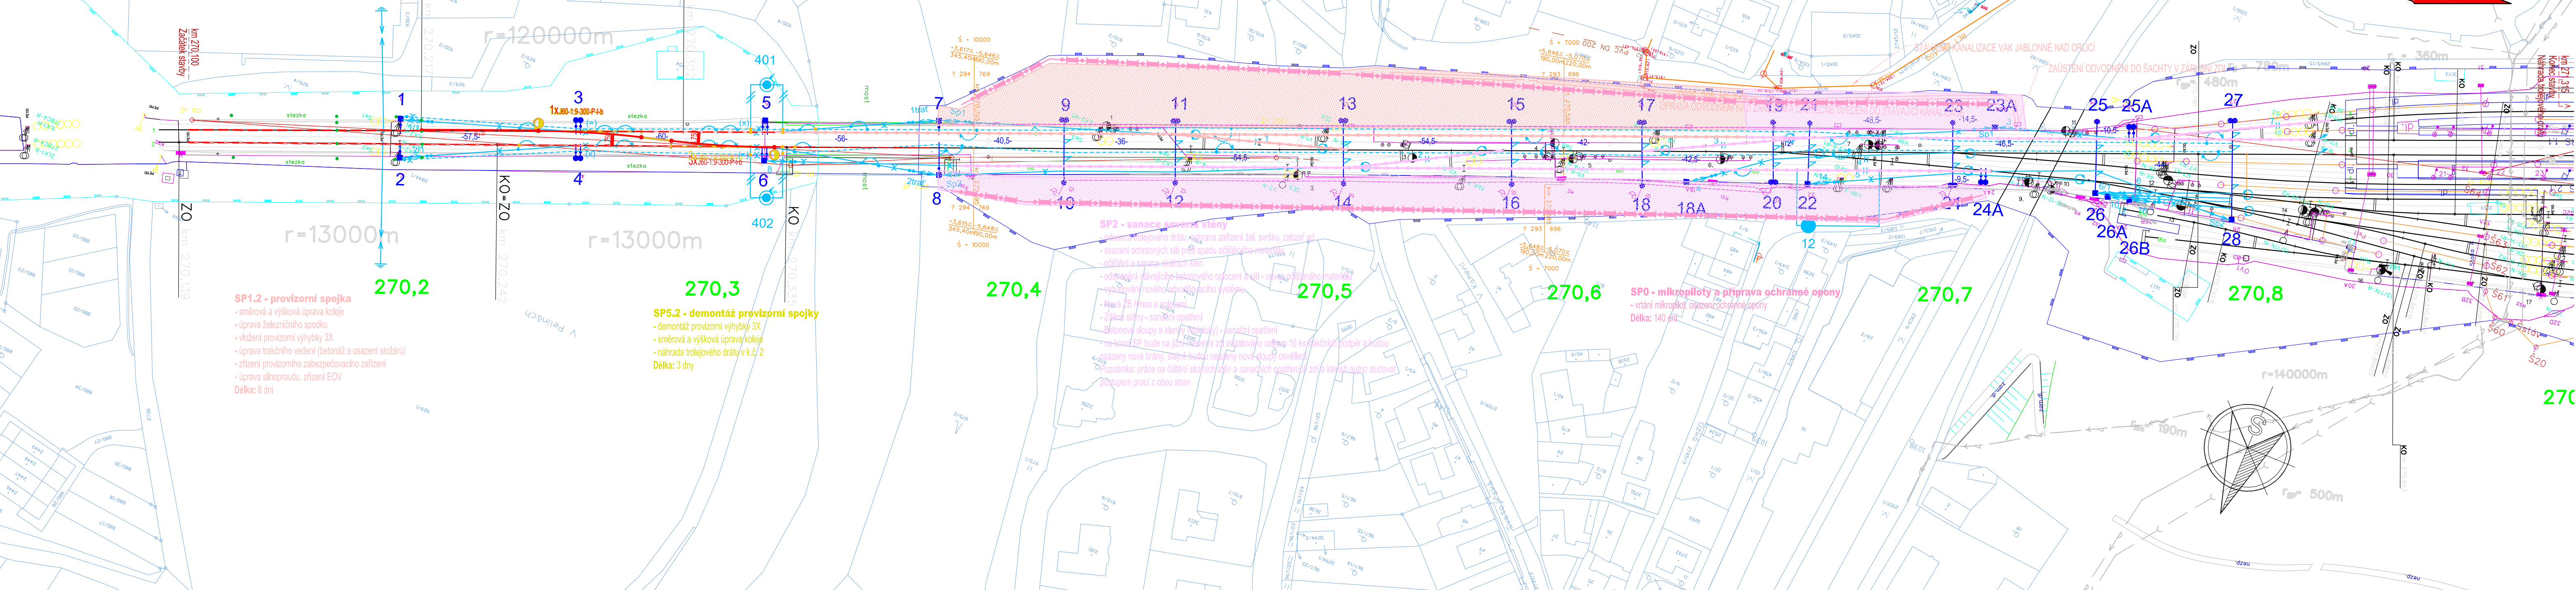

<
