


OPRAVA TRAMVAJOVÉHO KŘÍŽENÍ V KM 4,064
V ŽST. OLOMOUC - MĚSTO
SCHEMA STAVEBNÍCH POSTUPŮ M 1:250

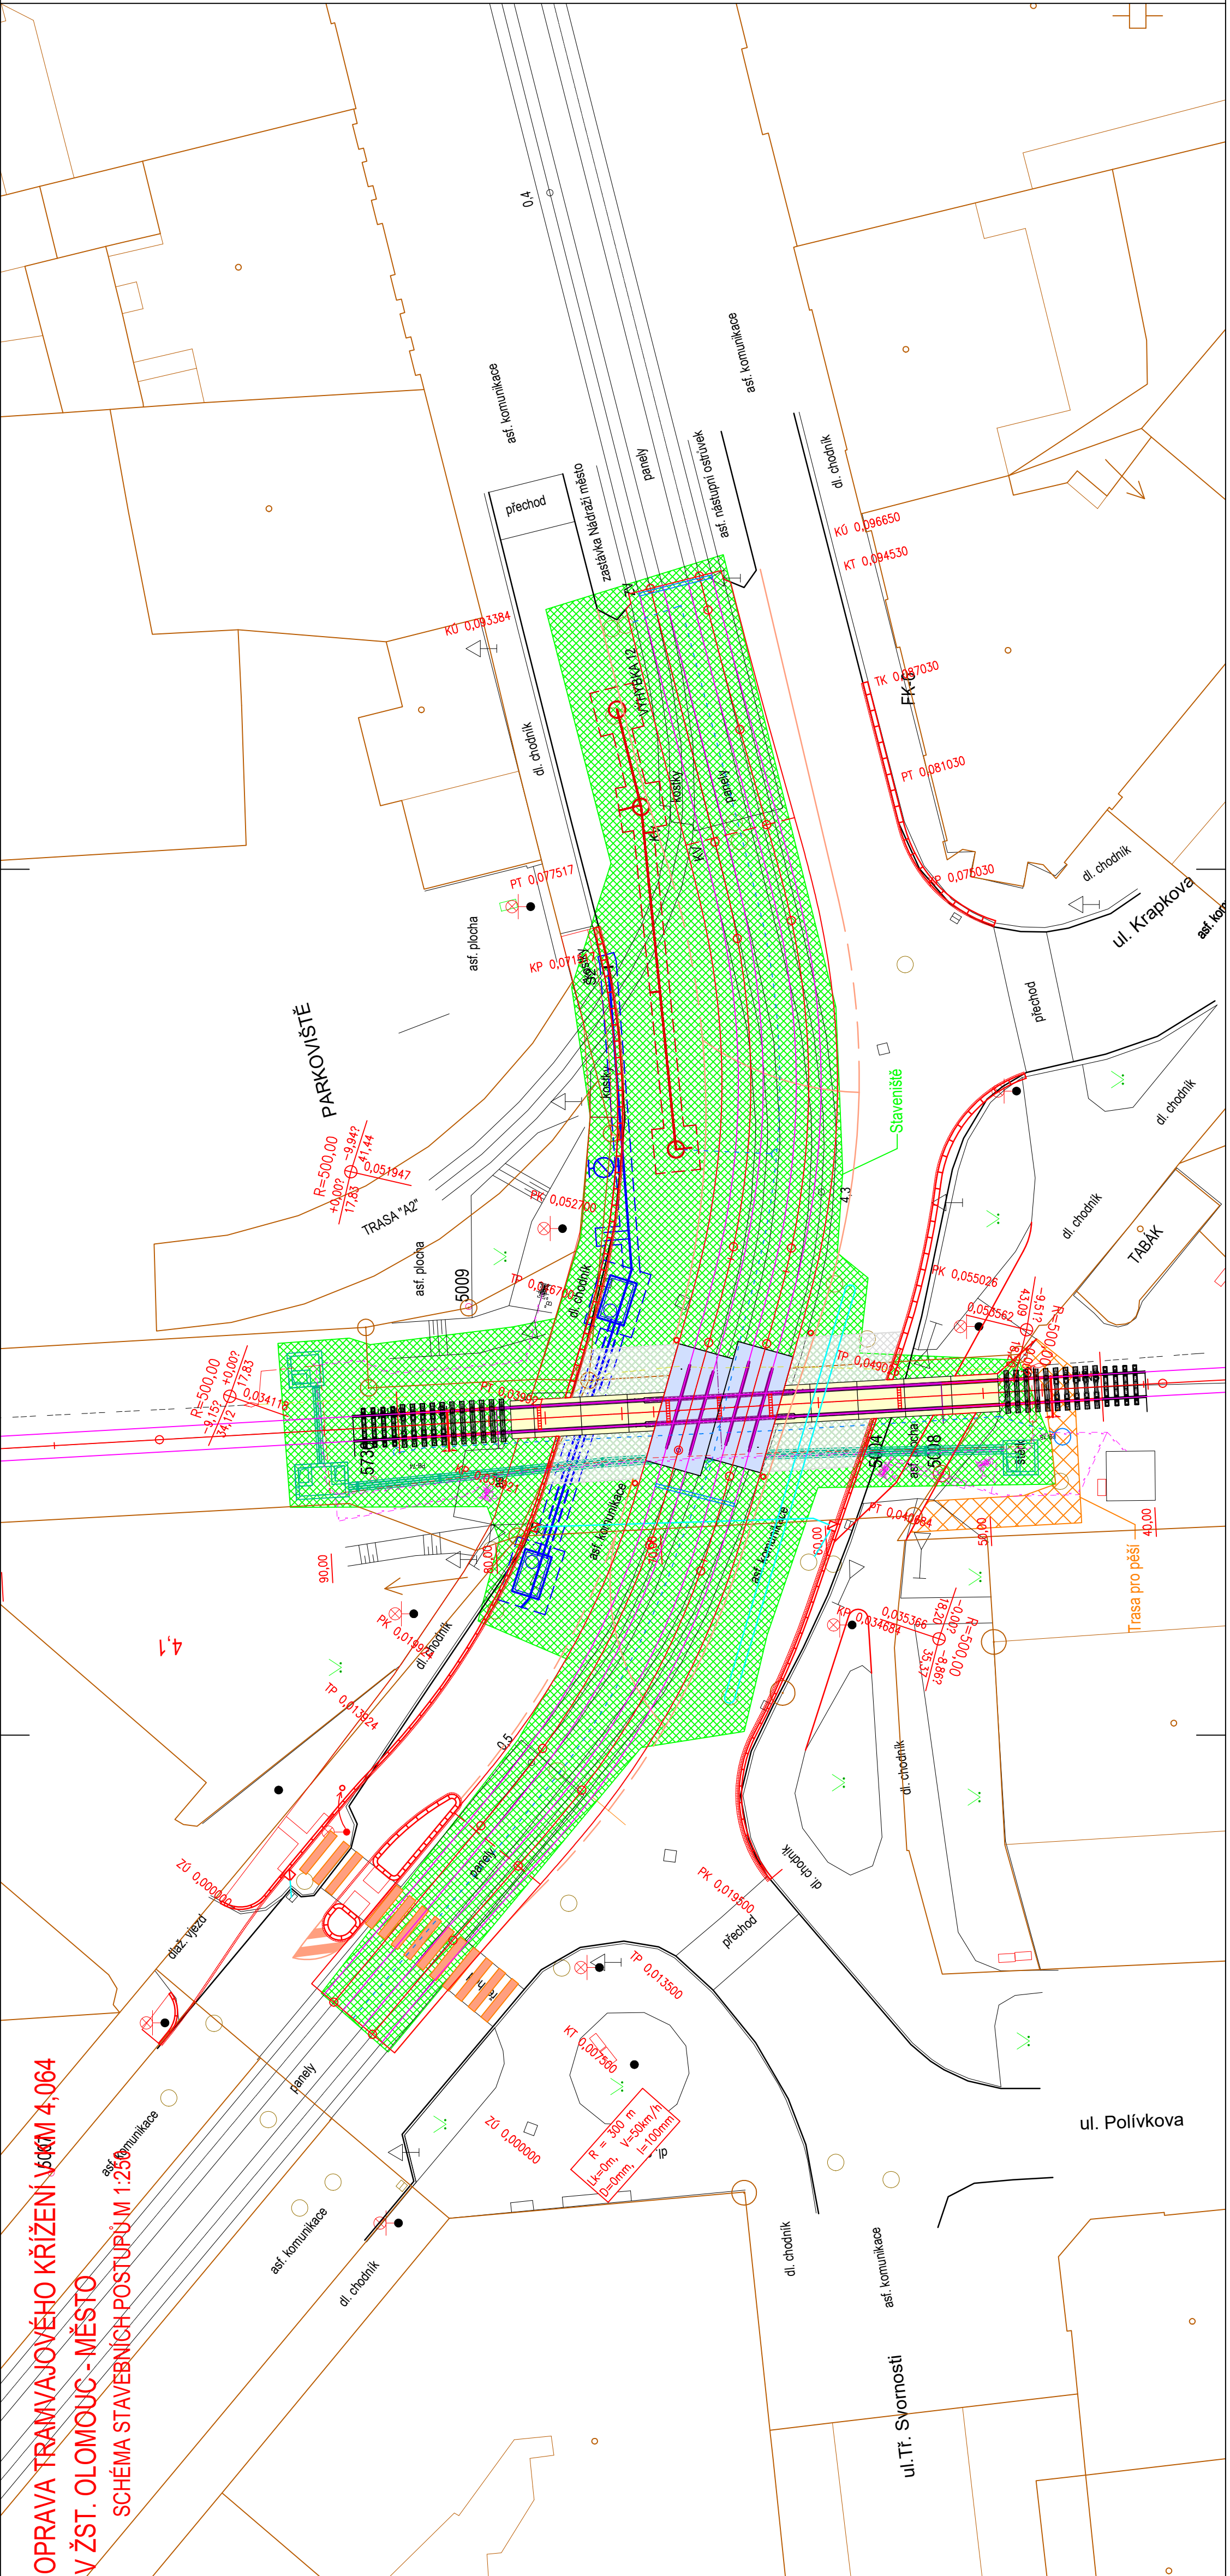

Popis prací - 2. Etapa:
7. 7. 2025 - 13. 7. 2025

- Výkop v místě přeložky vodovodu (SO 301 Přeložka vodovodu), pažení, uložení chráničky, zásyp
- Odstranění tramvajového kolejiště DPMO (SO 662), koleje k rampě a odbočné výhybky (SO 663)
- SO 302 Přeložka kanalizace, zrušení staré kanalizace, přepojení přípojek
- Pokračování prací na SO 403 Drážní kabelovod
- Realizace SO 404 Zajištění kabelovodu CETIN

Datový podklad ČÚZK

Souřadnicový systém : S - JTSK
Výškový systém : B.p.v.

Formát: 4 x A4

Akce : Oprava tramvajového křížení v km 4,064
v žst. Olomouc město

Objednatel :



Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Oblastní ředitelství Ostrava
Muglinovská 1035, 702 00 Ostrava

Objednatel :



Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
Koželušská 563/1, 77900 Olomouc

Hlavní zhotovitel :



PRO CEDOP s.r.o.
Milady Horákové 893
272 01 Kladno
IČ 271 74 069, DIČ CZ 271 74 069

Podzhotovitel :

ING. TOMAŠ TUŽÍN
Trávník 1315/28
750 02 Přerov
IČ 017 88 205, DIČ CZ 8108235707

Souprava :

| | | | |
|---|--|----------|-----------|
| Vedoucí projektu: Ing. Tomáš Tužín Kraj : Olomoucký Obsah : | Kreslil: Ing. Tomáš Tužín KÚ : Nová Ulice | Datum | 12 / 2024 |
| | | Stupeň | PDP5 |
| | | Měřítko | 1 : 250 |
| | | Část PD: | B |

Schéma stavebních postupů

Část dokumentace : Souhrnná technická zpráva

Příloha B.8.4
