Harmonogram - Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Ústí nad Labem - Most
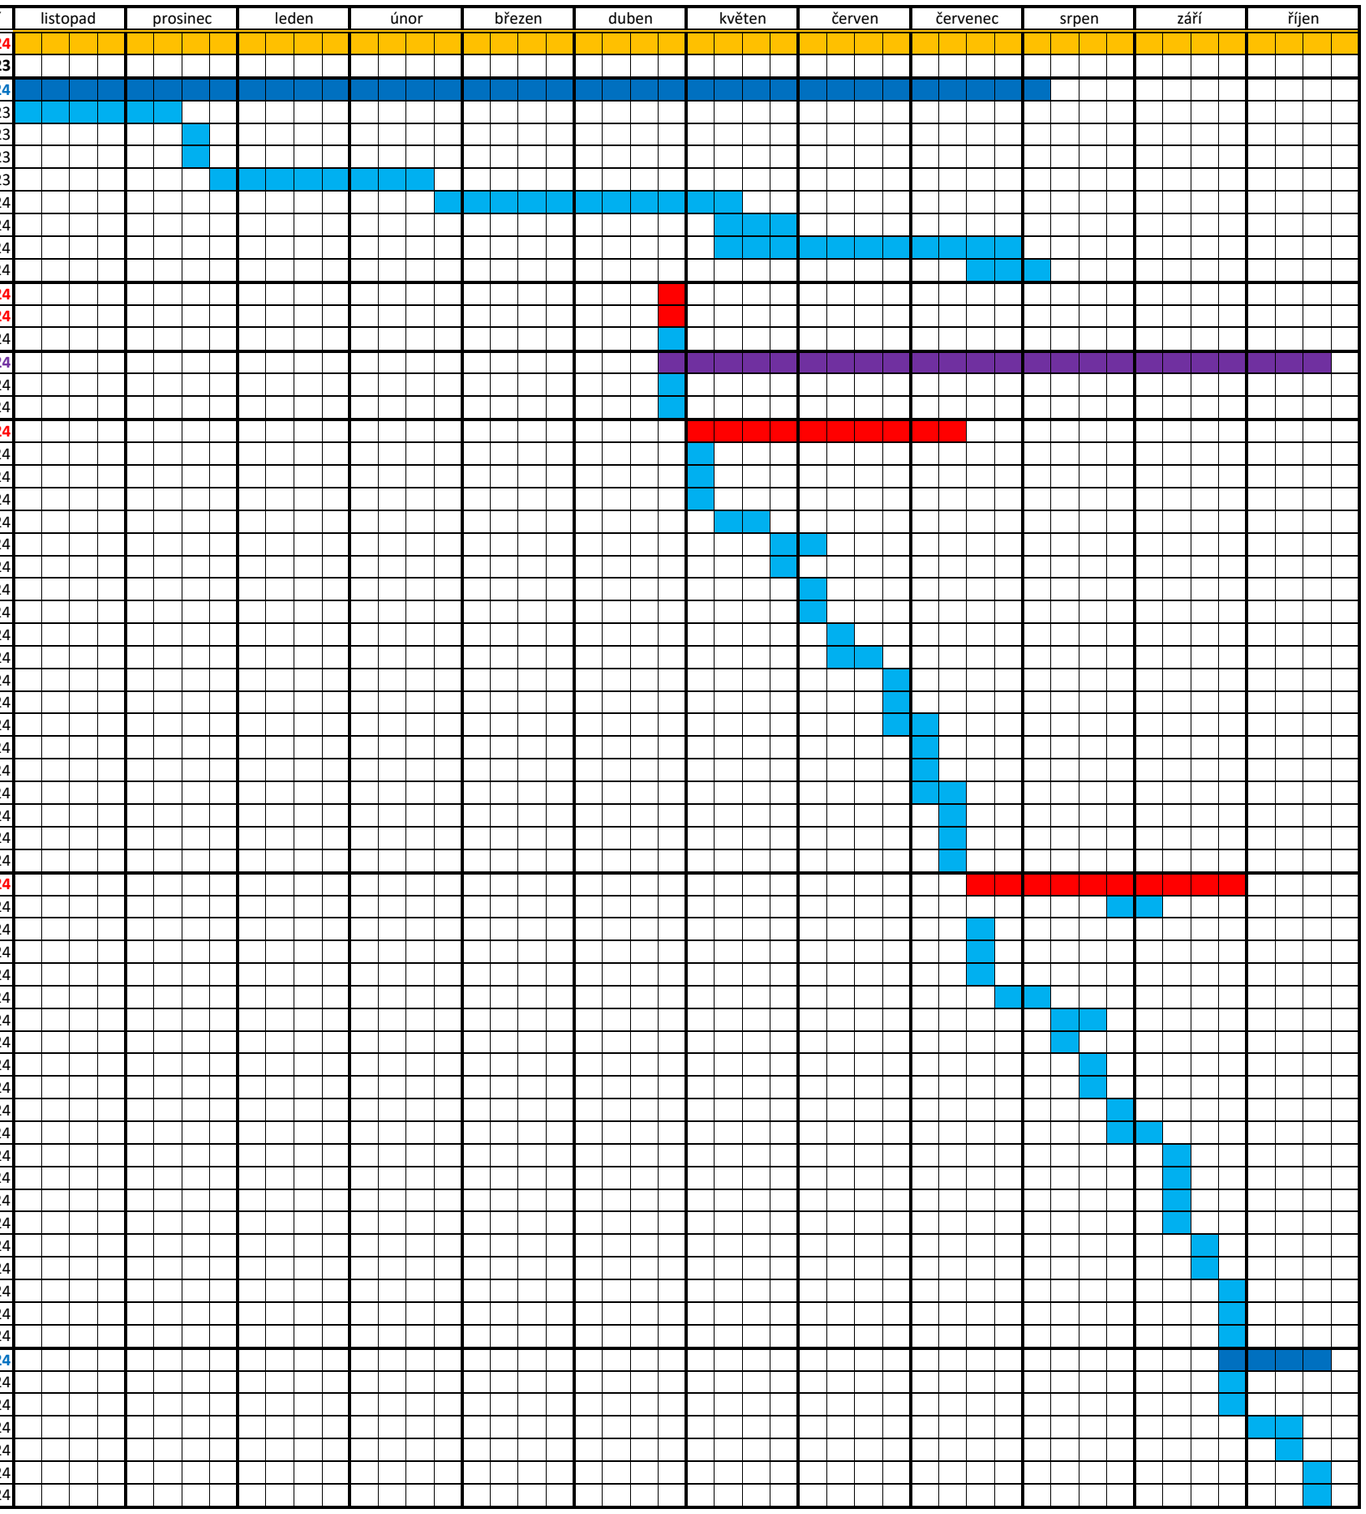
Číslo	Název úkolu	Počet dní	Zahájení	Dokončení
	Harmonogram prací	**545**	**25.4.23**	**20.10.24**
1	**Výběr zhotovitele**	**60**	**25.4.23**	**23.6.23**
2	**Výroba OK a PKO v mostárně**	**281**	**2.7.23**	**7.4.24**
3	Zpracování VTD ložisek, mostních závěrů a OK	45	2.7.23	15.8.23
4	Schválení VTD OK	7	15.8.23	21.8.23
5	Objednávka materiálu	2	21.8.23	22.8.23
6	Dodávka materiálu OK	60	22.8.23	20.10.23
7	Výroba OK koleje č.1 v mostárně	90	20.10.23	17.1.24
8	PKO OK koleje č.1 v mostárně	21	3.1.24	23.1.24
9	Výroba OK koleje č.2 v mostárně	90	3.1.24	1.4.24
10	PKO OK koleje č.2 v mostárně	21	18.3.24	7.4.24
11	**Nickolejný provoz**	**2**	**22.4.24**	**23.4.24**
11	**Nickolejný provoz**	**2**	**29.4.24**	**30.4.24**
12	Zápory a štětovnice pažení	4	22.4.24	30.4.24
13	**Uzavření podjezdu pro silniční dopravu a pěší**	**175**	**29.4.24**	**20.10.24**
14	Zřízení dopravního opatření	1	29.4.24	29.4.24
15	Zařízení staveniště	2	30.4.24	1.5.24
16	**Výluka a práce v koleji č. 1 trati Ústí nad Labem - Most**	**75**	**4.5.24**	**17.7.24**
17	Snesení drážního svršku, přeložení kabelů vedoucích po mostě	1	4.5.24	4.5.24
18	Snesení starých ocelových konstrukcí	1	5.5.24	5.5.24
19	Odbourání staré spodní stavby a výkopy za opěrami	6	6.5.24	11.5.24
20	Hlubinné zakládání nové spodní stavby	14	12.5.24	25.5.24
21	Armování a betonáž úložného prahu, křídel O1 a O3	10	26.5.24	4.6.24
22	Armování a betonáž základů pilířů	4	26.5.24	29.5.24
23	Osazení a betonáž vnitřních prostor pilířů, dobetonávka horní části základů	5	30.5.24	3.6.24
24	Izolace základů pilířů a jejich zásypy	3	4.6.24	6.6.24
25	Osazení montážních podpor (skruže), osazení ocelové části NK	4	7.6.24	10.6.24
26	Armování a betonáž nosných konstrukcí	9	11.6.24	19.6.24
27	Podlití ložisek NOK	1	20.6.24	20.6.24
28	Armování a betonáž závěrných zídek O1 a O2, lamelové mostní závěry	6	21.6.24	26.6.24
29	Izolace nosné konstrukce a rubu opěr	4	27.6.24	30.6.24
30	Zřízení přechodových oblastí včetně izolací a drenáží	4	1.7.24	4.7.24
31	Přeložky kabelů jdoucích po mostě	1	5.7.24	5.7.24
32	ZKPP, stěrkové lože, montáž železničního svršku, finální úprava TV	3	6.7.24	9.7.24
33	Dokončovací práce (zábradlí apod.)	5	10.7.24	15.7.24
34	Hlavní prohlídka	1	16.7.24	16.7.24
35	Zahájení zkušebního provozu	1	17.7.24	17.7.24
36	**Výluka a práce v koleji č. 2 trati Ústí nad Labem - Most**	**75**	**18.7.24**	**30.9.24**
47	Výkopy, armování a betonáž nových základů stožárů TV	6	18.7.24	23.7.24
37	Snesení drážního svršku	1	18.7.24	18.7.24
38	Snesení starých ocelových konstrukcí	1	19.7.24	19.7.24
39	Odbourání staré spodní stavby a výkopy za opěrami	6	20.7.24	25.7.24
40	Hlubinné zakládání nové spodní stavby	14	26.7.24	8.8.24
41	Armování a betonáž úložného prahu, křídel O1 a O3	10	9.8.24	18.8.24
42	Armování a betonáž základů pilířů	4	9.8.24	12.8.24
43	Osazení a betonáž vnitřních prostor pilířů, dobetonávka horní části základů	5	13.8.24	17.8.24
44	Izolace základů pilířů a jejich zásypy	3	18.8.24	20.8.24
45	Osazení montážních podpor (skruže), osazení ocelové části NK	4	21.8.24	24.8.24
46	Armování a betonáž nosných konstrukcí	9	25.8.24	2.9.24
48	Výstavba opěrné zdi z betonových tvarovek před opěrou O2	10	3.9.24	12.9.24
49	Podlití ložisek NOK	1	3.9.24	3.9.24
50	Armování a betonáž závěrných zídek O1 a O2, lamelové mostní závěry	6	4.9.24	9.9.24
51	Izolace nosné konstrukce a rubu opěr	4	10.9.24	13.9.24
52	Zřízení přechodových oblastí včetně izolací a drenáží	4	14.9.24	17.9.24
53	ZKPP, stěrkové lože, montáž železničního svršku, finální úprava TV	4	18.9.24	22.9.24
54	Dokončovací práce (zábradlí, římsy navazujících opěrných zdí apod.)	5	23.9.24	28.9.24
55	Hlavní prohlídka	1	29.9.24	29.9.24
56	Zahájení zkušebního provozu	1	30.9.24	30.9.24
57	**Dokončovací práce**	**20**	**1.10.24**	**20.10.24**
58	Odstranění montážních podpor (skruže)	1	1.10.24	1.10.24
59	Přeložky kabelů vedoucích pod mostem do finální polohy, nový sloup VO	2	2.10.24	3.10.24
60	Obnovení konstrukčních vrstev vozovky a chodníku	10	4.10.24	13.10.24
61	Dokonč. práce, terénní úpravy, dopravní značení, likvidace zařízení staveniště	5	14.10.24	18.10.24
62	Hlavní prohlídka podjezdu	1	19.10.24	19.10.24
63	Otevření podjezdu pro silniční dopravu	1	20.10.24	20.10.24
