
**B.8.3.2 Harmonogram stavby**

*„Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně)-zastávka Havířov střed (mimo)“*

Aktualizace 02/2023

| | Stavební postup/*Výluka*/Vybrané SO | od | dny | do |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Stavební postup č.0,** přípravné práce | **01.10.23** | **84** | **23.12.23** |
| 2 | Technologická budova (stavební část, technologie) | 15.10.23 | 421 | 08.12.24 |
| 3 | Pažení mezi kolejemi pro kanalizaci | 16.10.23 | 5 | 20.10.23 |
| 4 | TS 7003 (stavební a technologická část, zprovoznění) | 15.10.23 | 649 | 24.07.25 |
| 5 | TS 7004 (stavební a technologická část, zprovoznění) | 29.10.23 | 649 | 07.08.25 |
| 6 | Odvodňovací drén před VB, šachta, trubní vedení | 15.10.23 | 424 | 11.12.24 |
| 7 | Provizorní nástupiště mezi SK8 a SK10, zřízení | 23.02.24 | 15 | 08.03.24 |
| 8 | Podchod v km 19,127 | 15.08.24 | 487 | 14.12.25 |
| 9 | **Nástupiště č.1 a 2 v ŽST Havířov, část podchodu, zprovoznění** | 06.07.24 | 160 | **12.12.24** |
| 10 | Most km 19,992 I/11 Ostravská | 15.02.24 | 308 | 18.12.24 |
| 11 | Most km 20,259 Lučina | 15.02.24 | 294 | 04.12.24 |
| 12 | Most km 18,120 II/475 Orlovská | 08.02.25 | 280 | 14.11.25 |
| 13 | Most km 17,965 Sušanka | 08.02.25 | 273 | 07.11.25 |
| 14 | **Podchod v km 19,127 - kompletní dokončení a zprovoznění** | | | **14.12.25** |
| 15 | *Denní, noční a krátkodobé výluky pro pažení a práce na TV.* | *01.10.23* | *68* | *07.12.23* |
| 16 | **Stavební postup č.1** | **08.02.24** | **149** | **05.07.24** |
| 17 | *ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV nepřetržitě, **provizorní oboustranné nástupiště** mezi kolejemi č.8, 10* | *23.02.24* | *15* | *08.03.24* |
| 18 | ***TK2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice nepřetržitě,** mosty km 19,992 a 20,259+výhybky č.42, 45* | ***23.03.24*** | ***105*** | ***05.07.24*** |
| 19 | **Stavební postup č.2** | **06.07.24** | **168** | **20.12.24** |
| 20 | ***TK1+TV Havířov - Ostrava-Bartovice nepřetržitě,** mosty km 19,992 a 20,259+výhybky č.43, 44* | ***06.07.24*** | ***105*** | ***18.10.24*** |
| 21 | *ŽST Havířov, lichá KS+TV, SK2+TV, SK4+TV, SK6+TV, nepřetržitě* | *06.07.24* | *147* | *29.11.24* |
| 22 | *ŽST Havířov, SK20+TV, SK22+TV nepřetržitě* | *06.07.24* | *147* | *29.11.24* |
| 23 | *ŽST Havířov, **vlečka METRANS - Šenov**, kabelovod* | *06.07.24* | *2* | *07.07.24* |
| 24 | ***Práce na aktivaci zab.zař.*** | ***30.11.24*** | ***9*** | ***08.12.24*** |
| 25 | **Stavební postup č.3** | **01.02.25** | **147** | **27.06.25** |
| 26 | ***TK1+TV Albertichce - Havířov nepřetržitě*** | ***10.02.25*** | ***138*** | ***27.06.25*** |
| 27 | *ŽST Havířov, SK16+TV, SK18+TV nepřetržitě* | *15.02.25* | *130* | *24.06.25* |
| 28 | *ŽST Havířov, SK22a+TV nepřetržitě, provizorní propojení* | *25.06.25* | *3* | *27.06.25* |
| 29 | **Stavební postup č.4** | **28.06.25** | **152** | **26.11.25** |
| 30 | ***TK2+TV Albertichce - Havířov nepřetržitě*** | ***28.06.25*** | ***131*** | ***05.11.25*** |
| 31 | *ŽST Havířov, SK2+TV nepřetržitě* | *28.06.25* | *21* | *18.07.25* |
| 32 | *ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV nepřetržitě* | *10.07.25* | *121* | *07.11.25* |
| 33 | ***Práce na aktivaci zab.zař.*** | ***06.11.25*** | ***21*** | ***26.11.25*** |
| 34 | **Stavební postup č.5,** | **27.11.25** | **23** | **19.12.25** |
| 35 | *ŽST Havířov, SK mezi výhybkami č.3, 14XA nepřetržitě* | *27.11.25* | *23* | *19.12.25* |
| 36 | *ŽST Havířov, SK7b nepřetržitě* | *27.11.25* | *23* | *19.12.25* |
| 37 | **Stavební postup č.6,** přepojení **vl. METRANS-Šenov** do SK12 | **01.02.26** | **21** | **21.02.26** |
| 38 | *ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV nepřetržitě* | *01.02.26* | *21* | *21.02.26* |
| 39 | *ŽST Havířov, SK22a+TV nepřetržitě* | *01.02.26* | *5* | *05.02.26* |
| 40 | *ŽST Havířov, **vlečka METRANS - Šenov** nepřetržitě* | *01.02.26* | *2* | *02.02.26* |
| 41 | **Stavební postup č.7** | **22.02.26** | **21** | **14.03.26** |

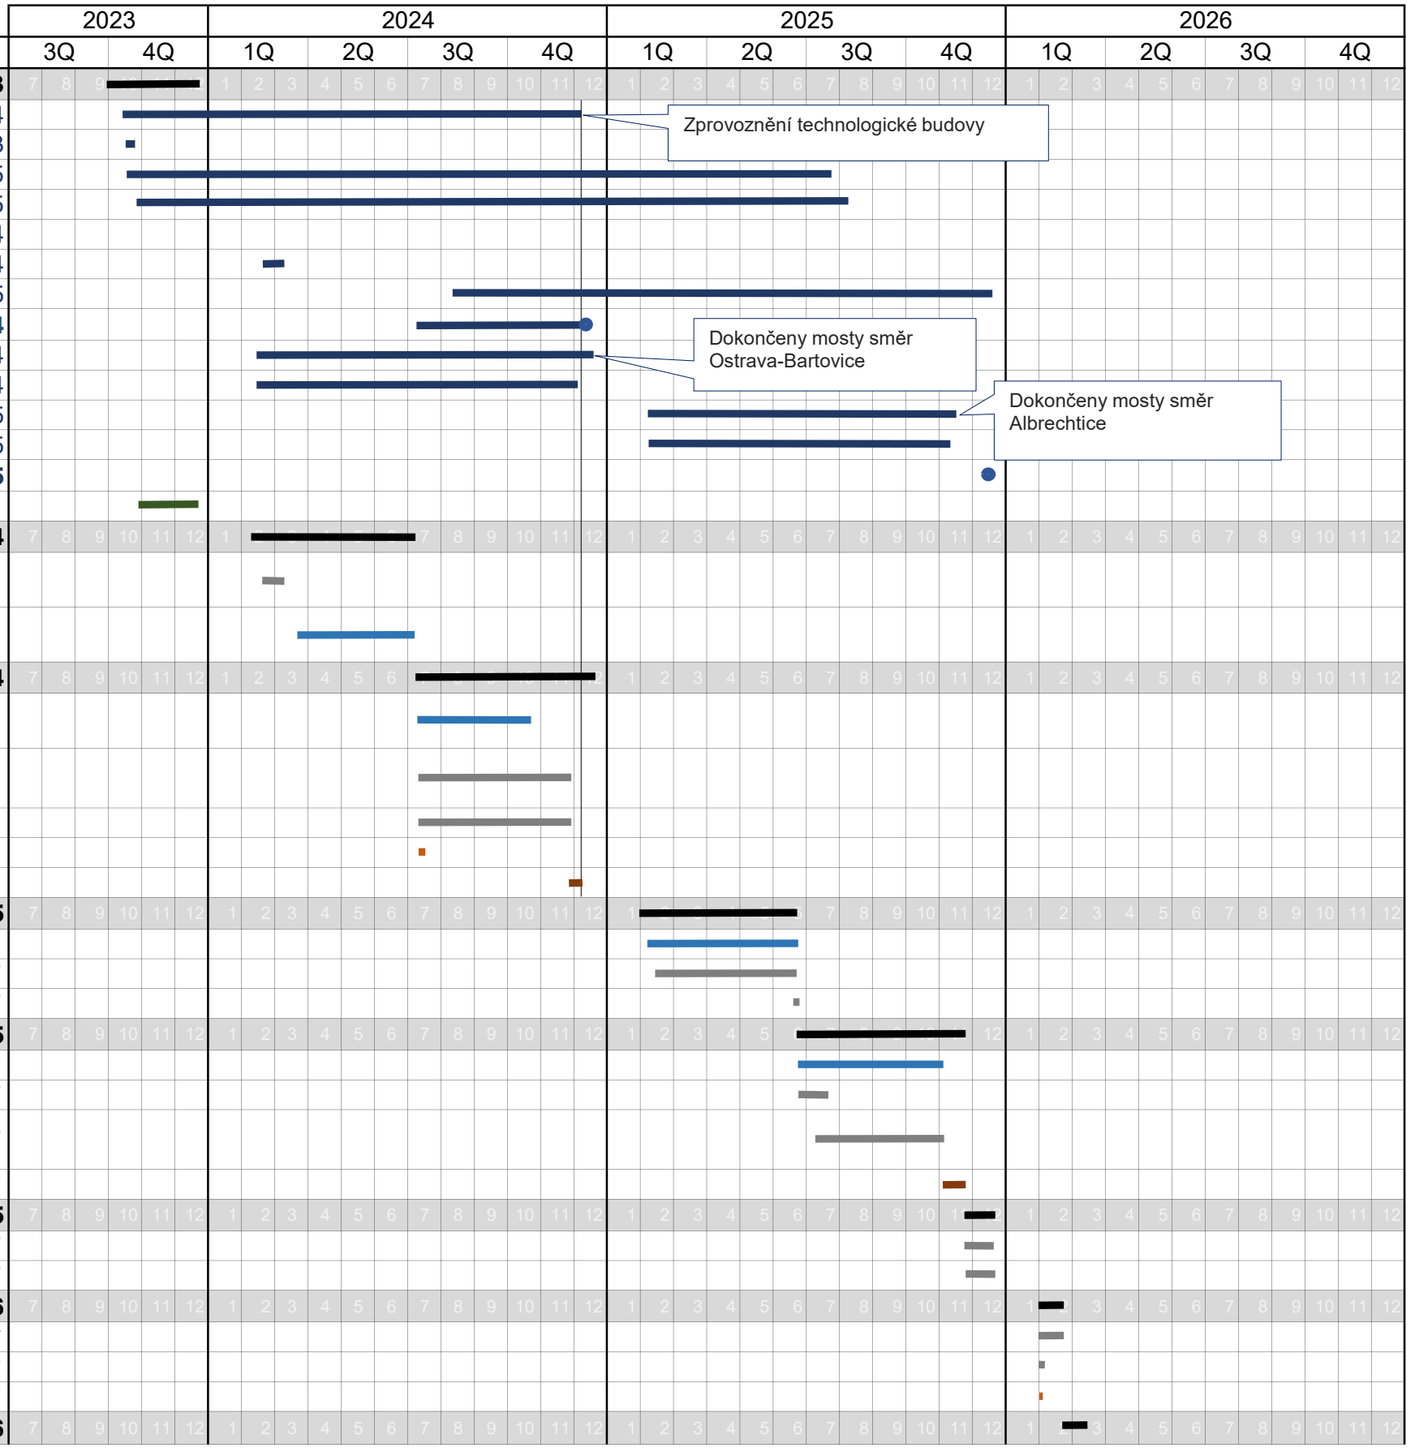

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | *ŽST Havířov, SK6, SK8, SK10, SK14, SK16, SK18, SK20, SK22 na bartovickém zhlaví kusé* | *22.02.26* | *21* | *14.03.26* | |
| 43 | **Stavební postup č.8** | **15.03.26** | **21** | **04.04.26** | |
| 44 | *ŽST Havířov, SK2+TV nepřetržitě, přednostně zprovozněna kolejová spojka výhybek č.39/41* | *15.03.26* | *21* | *04.04.26* | |
| 45 | *ŽST Havířov, SK6, SK8, SK10, SK14, SK16, SK18, SK20, SK22 na bartovickém zhlaví kusé* | *15.03.26* | *9* | *23.03.26* | |
| 46 | **Stavební postup č.9** | **05.04.26** | **86** | **29.06.26** | |
| 47 | *ŽST Havířov,* ***vlečka METRANS - Šenov*** *nepřetržitě* | *05.04.26* | *3* | *07.04.26* | |
| 48 | *ŽST Havířov,* ***vlečka METRANS - Šenov*** *nepřetržitě* | *21.04.26* | *3* | *23.04.26* | |
| 49 | *ŽST Havířov, SK12+TV až SK22+TV na bart.zhlaví nepř.* | *05.04.26* | *3+3* | *23.04.26* | |
| | **Stavba celkem** | **01.10.23** | **1003** | **29.06.26** | |
