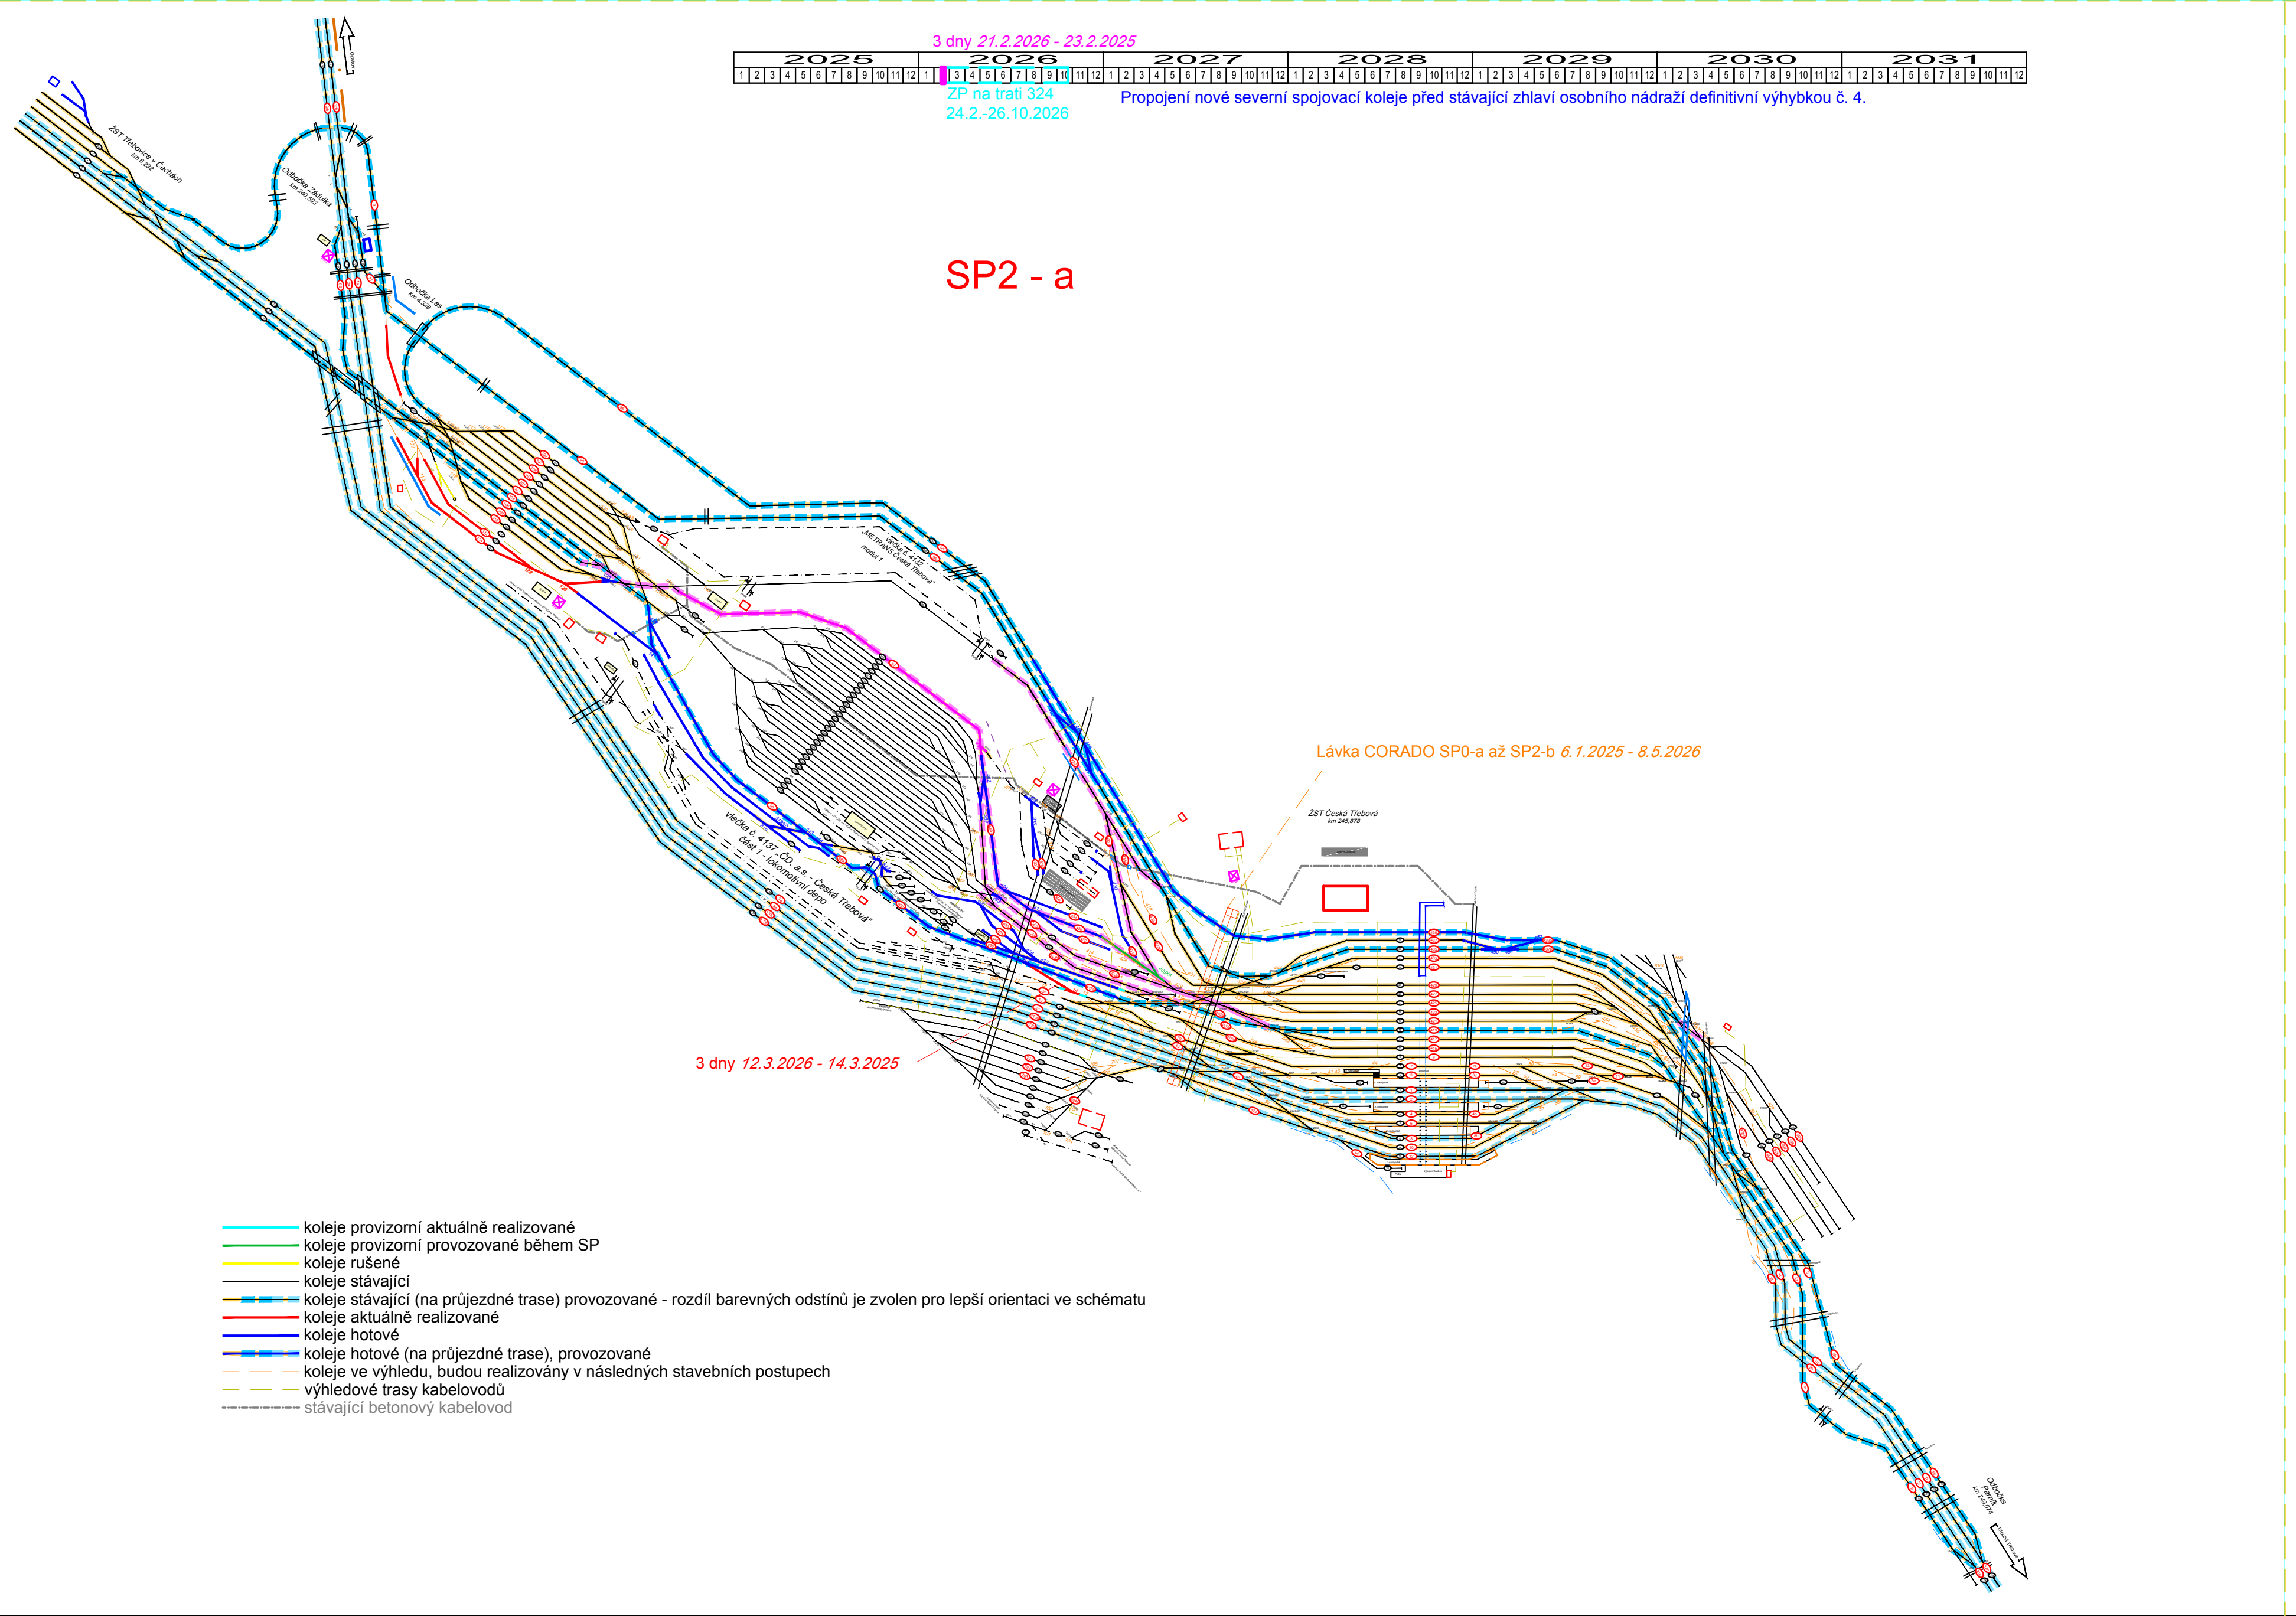
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
ŽST Třebovice v Čechách km 6,232
Odbočka Zádulka km 240,903
ŽST Česká Třebová km 245,878
vlečka č. 4137 ČD, a.s. - Česká Třebová" část 1 - lokomotivní depo
Odbočka Parník km 249,074
Dlouhá Třebová

SP2 - a

3 dny *21.2.2026 - 23.2.2025*

ZP na trati 324
24.2.-26.10.2026

Propojení nové severní spojovací koleje před stávající zhlaví osobního nádraží definitivní výhybkou č. 4.

Lávka CORADO SP0-a až SP2-b *6.1.2025 - 8.5.2026*

3 dny *12.3.2026 - 14.3.2025*

- koleje provizorní aktuálně realizované
- koleje provizorní provozované během SP
- koleje rušené
- koleje stávající
- koleje stávající (na průjezdné trase) provozované - rozdíl barevných odstínů je zvolen pro lepší orientaci ve schématu
- koleje aktuálně realizované
- koleje hotové
- koleje hotové (na průjezdné trase), provozované
- koleje ve výhledu, budou realizovány v následných stavebních postupech
- výhledové trasy kabelovodů
- stávající betonový kabelovod

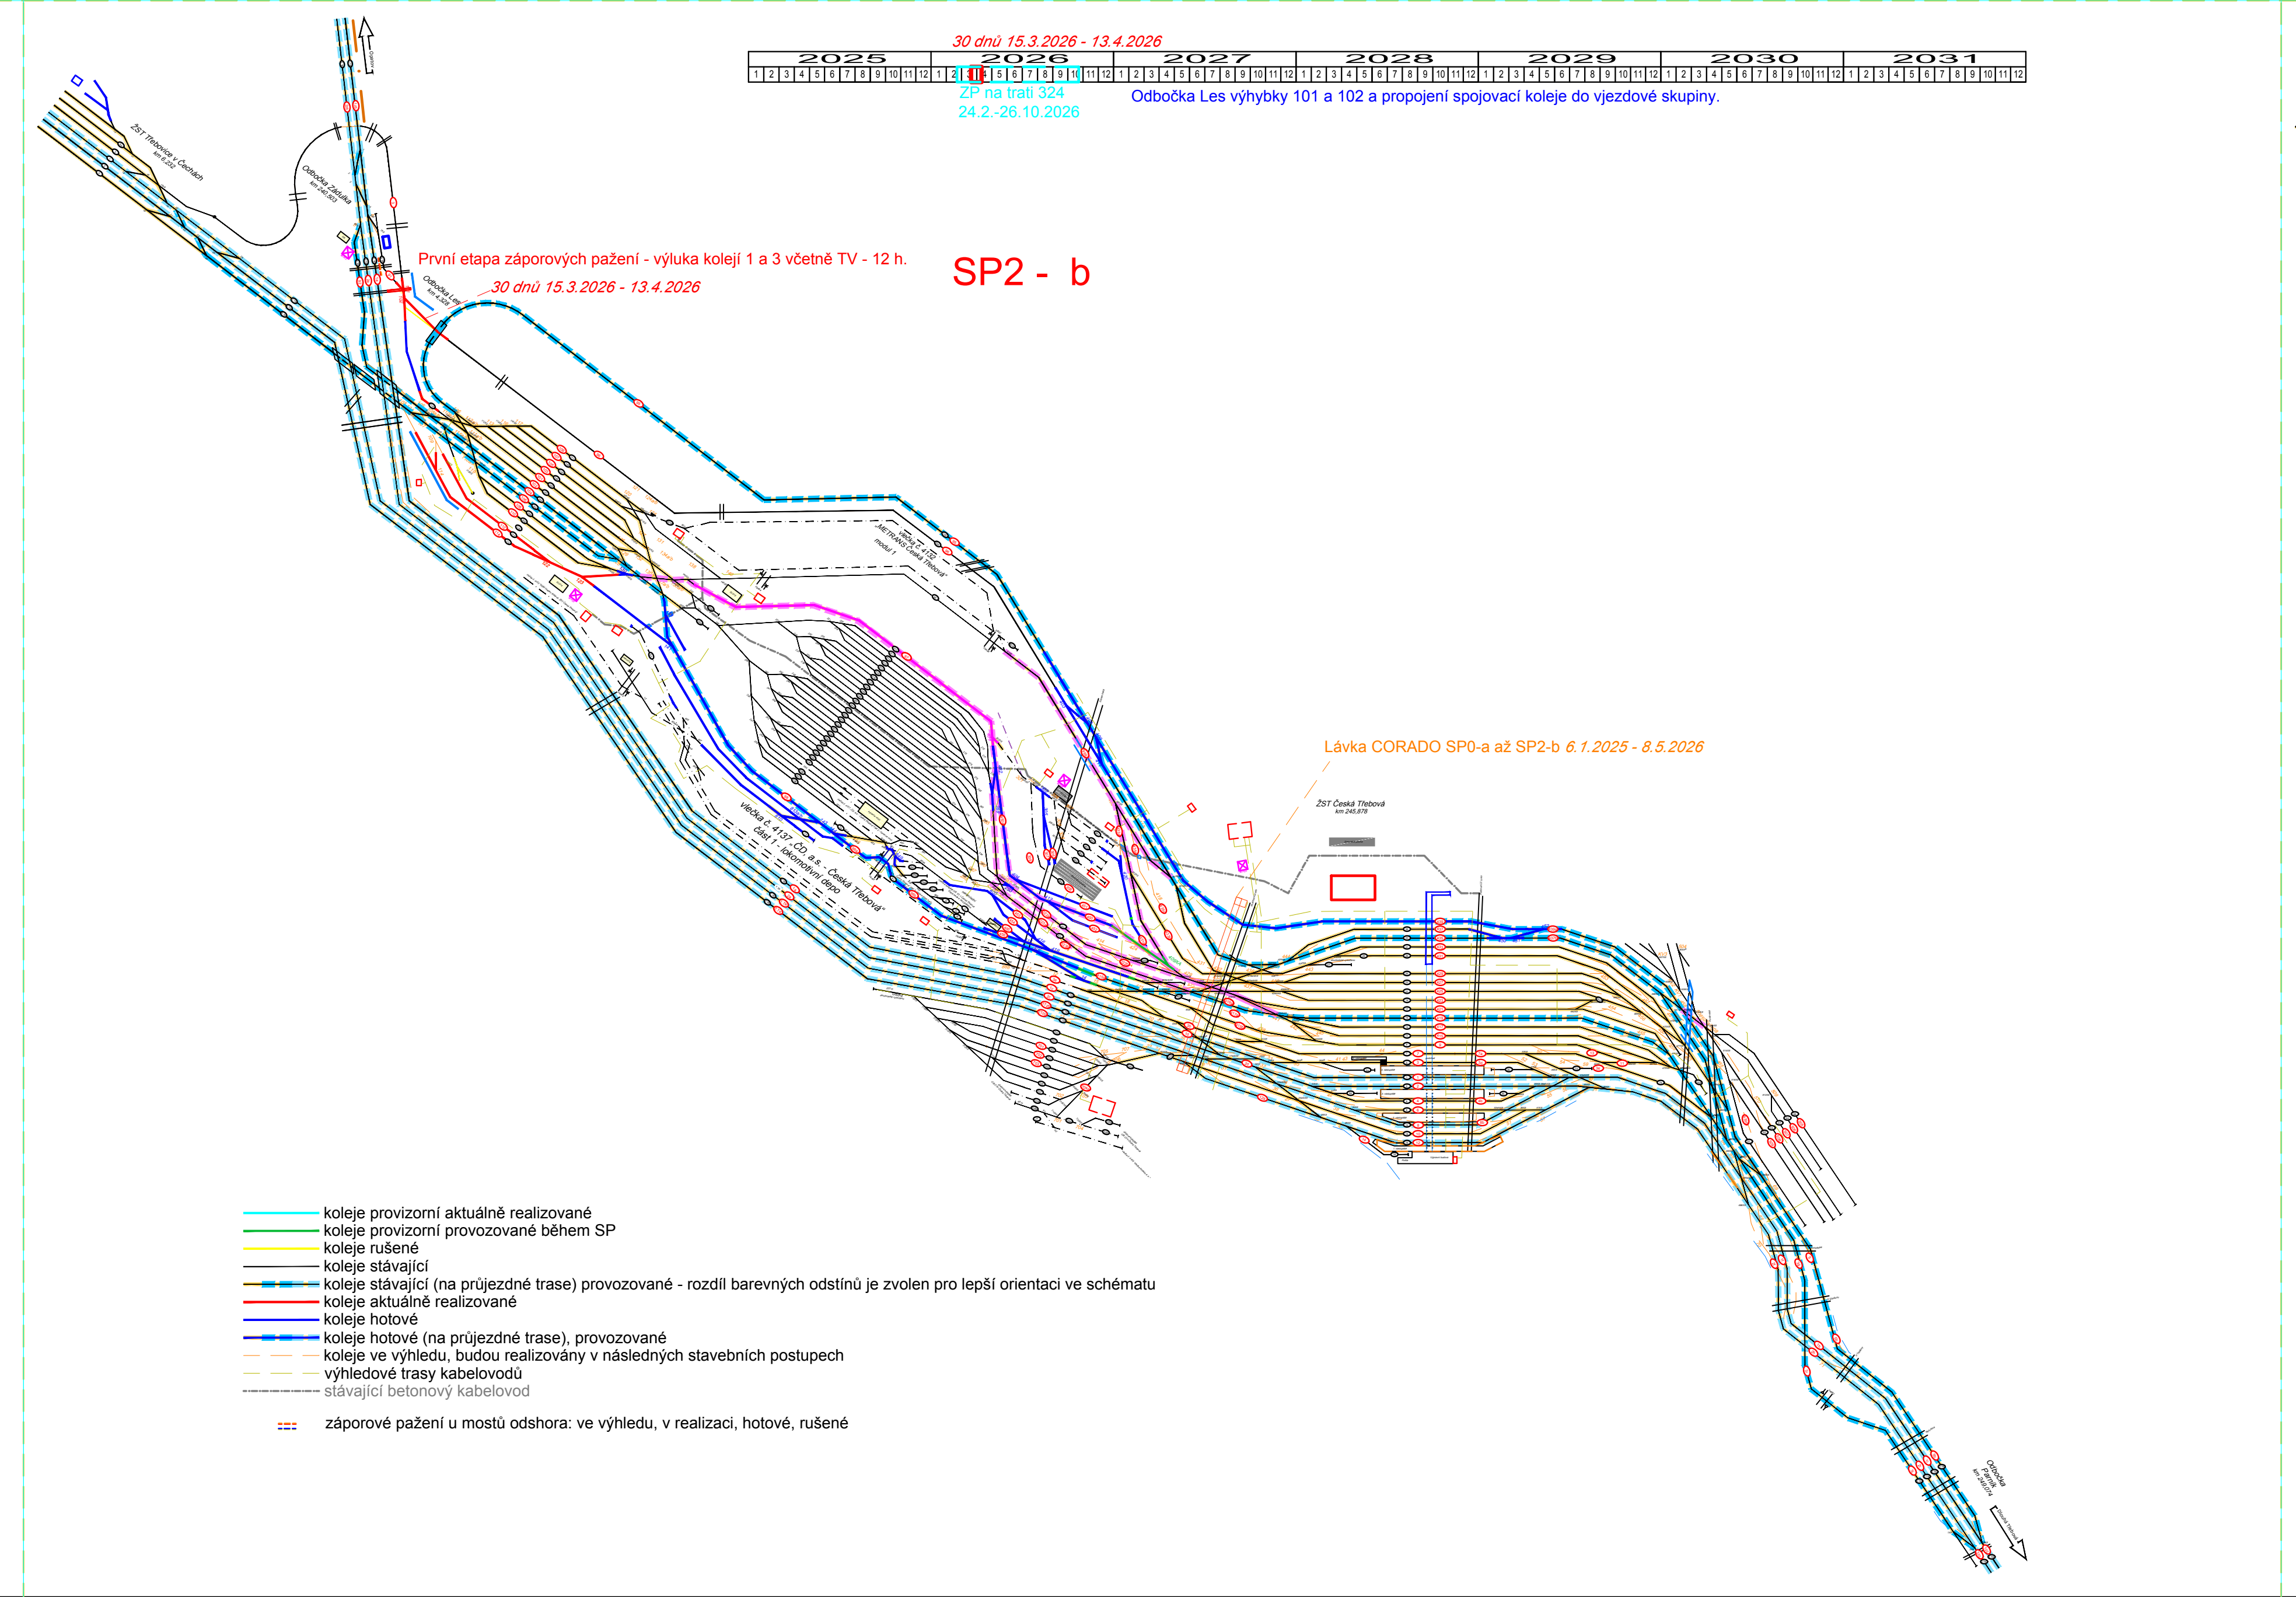
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
ŽST Třebovice v Čechách km 6,232
Odbočka Zádulka km 240,903
ŽST Česká Třebová km 245,878

SP2 - b

30 dnů *15.3.2026 - 13.4.2026*

ZP na trati 324
24.2.-26.10.2026

Odbočka Les výhybky 101 a 102 a propojení spojovací koleje do vjezdové skupiny.

První etapa záporových pažení - výluka kolejí 1 a 3 včetně TV - 12 h.

Lávka CORADO SP0-a až SP2-b *6.1.2025 - 8.5.2026*

- koleje provizorní aktuálně realizované
- koleje provizorní provozované během SP
- koleje rušené
- koleje stávající
- koleje stávající (na průjezdné trase) provozované - rozdíl barevných odstínů je zvolen pro lepší orientaci ve schématu
- koleje aktuálně realizované
- koleje hotové
- koleje hotové (na průjezdné trase), provozované
- koleje ve výhledu, budou realizovány v následných stavebních postupech
- výhledové trasy kabelovodů
- stávající betonový kabelovod

záporové pažení u mostů odshora: ve výhledu, v realizaci, hotové, rušené

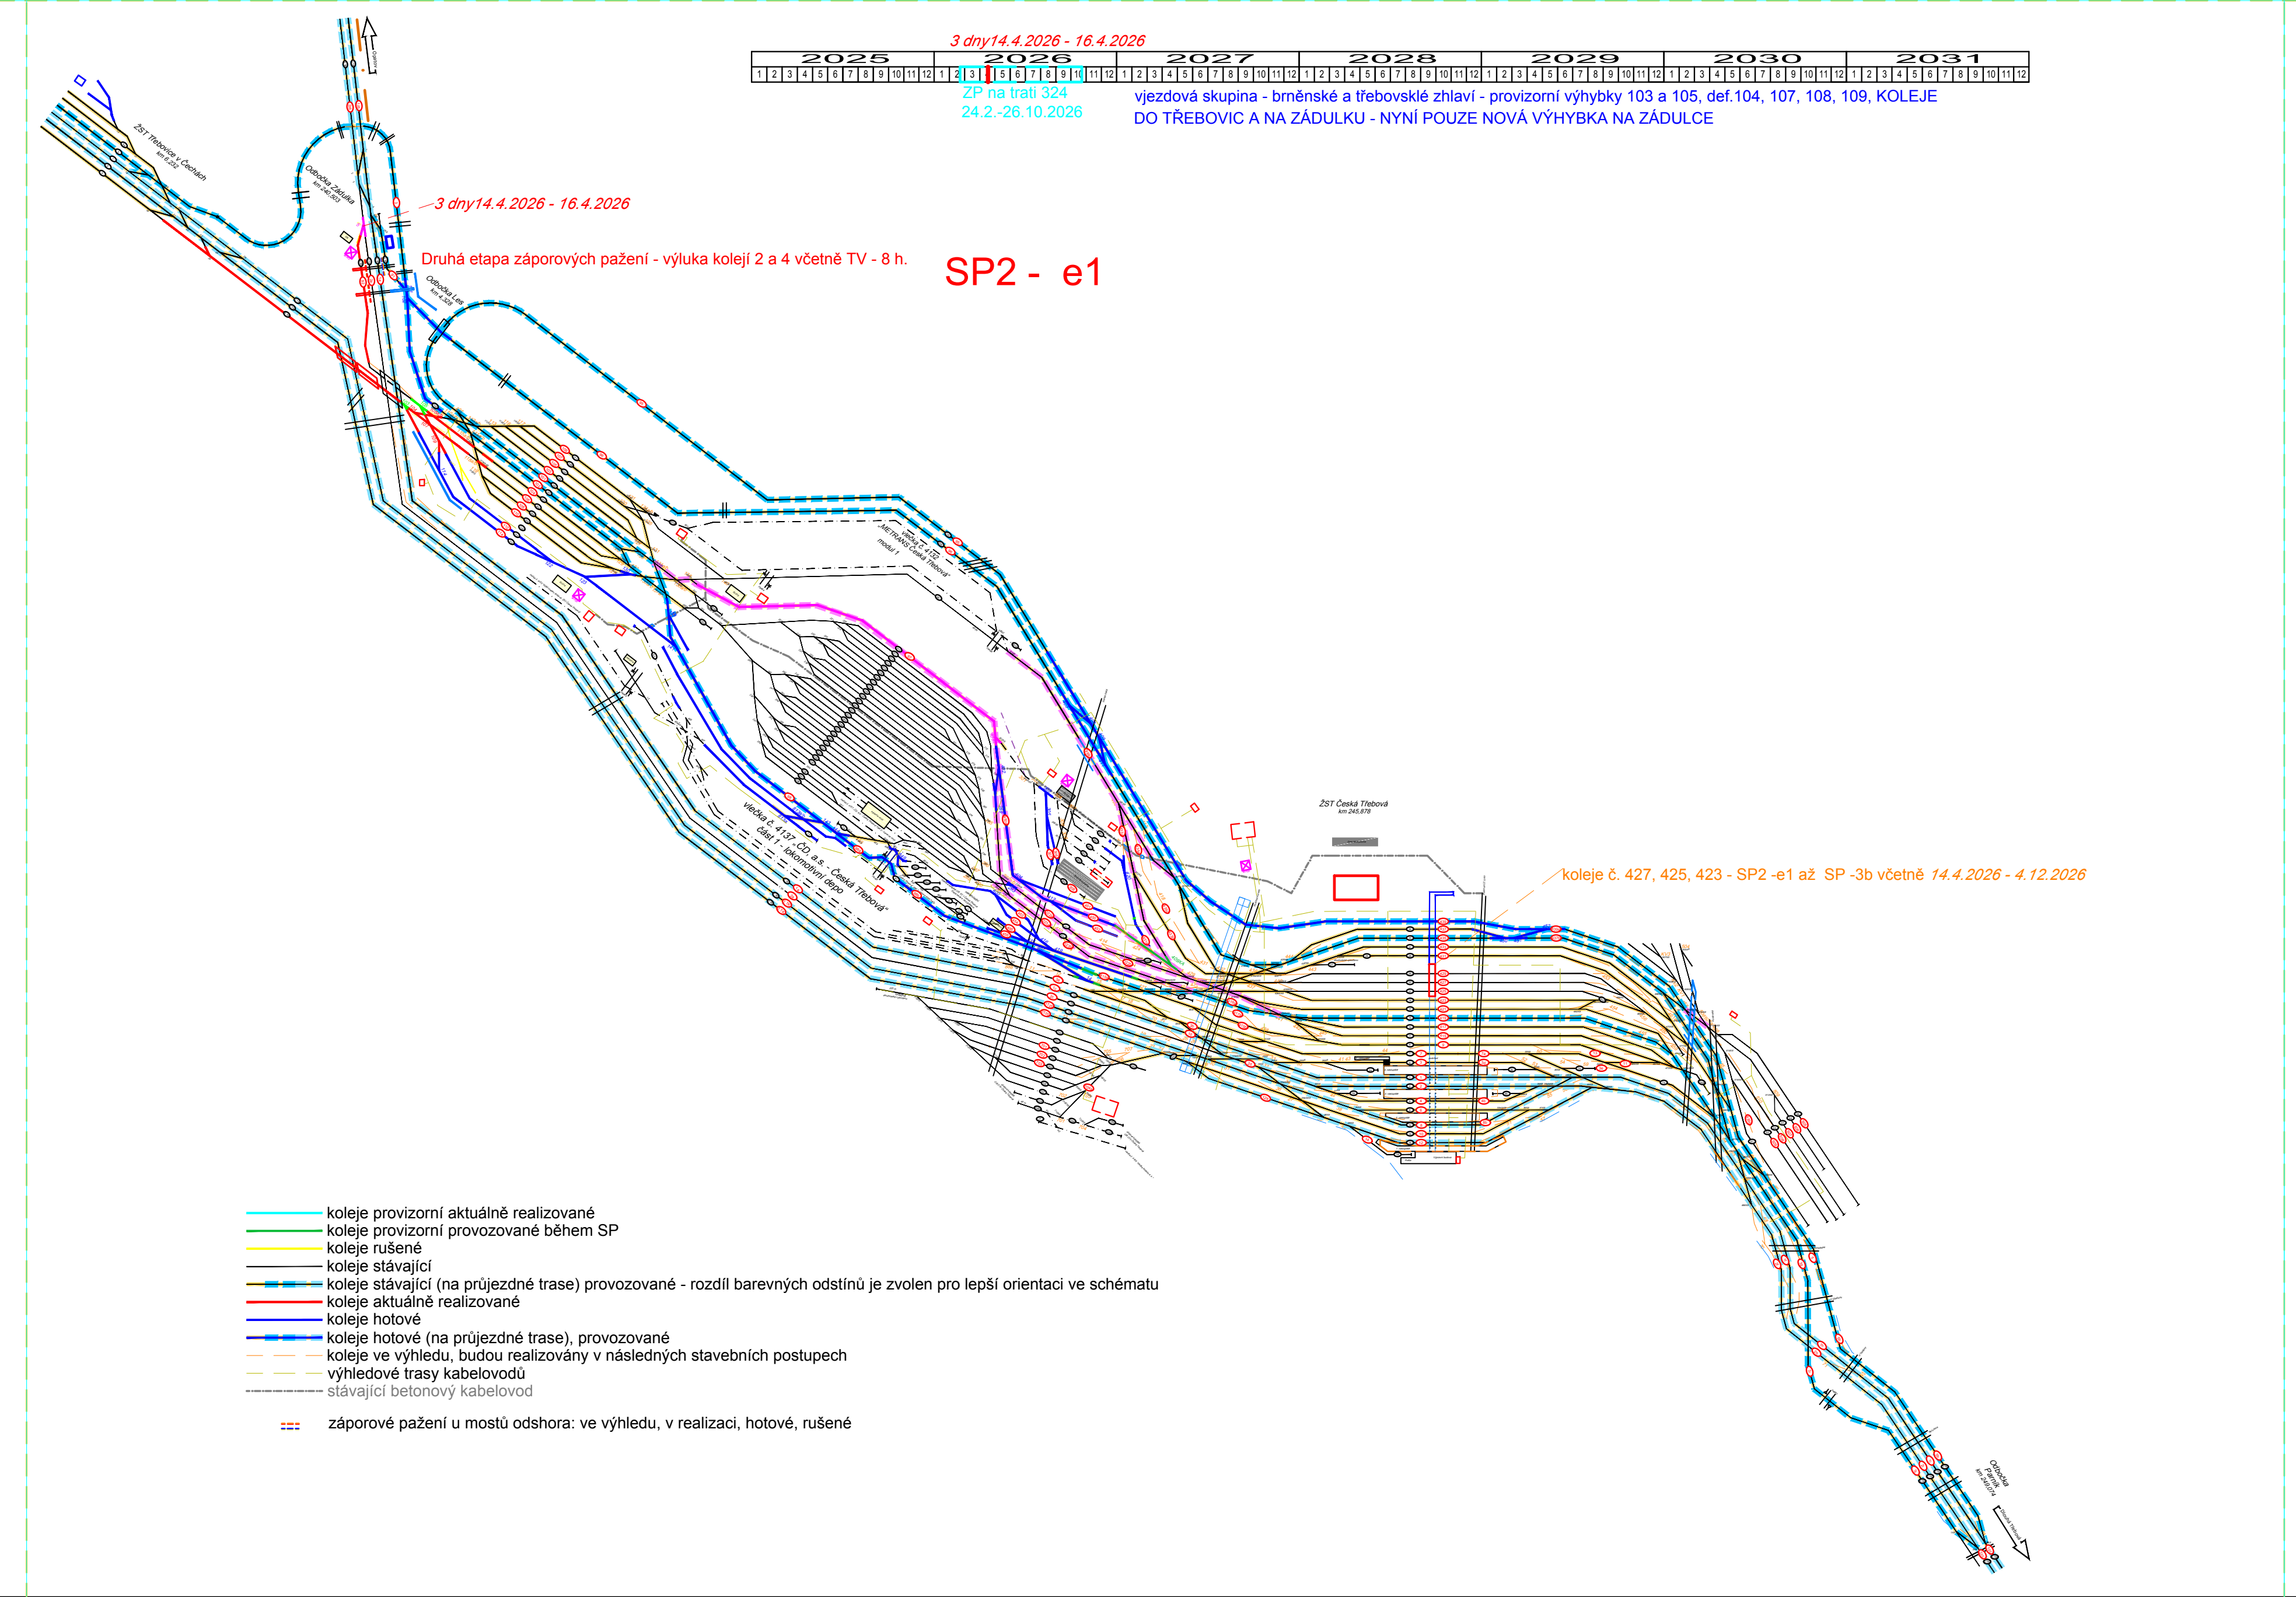
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
ŽST Třebovice v Čechách km 6,232
Odbočka Zádulka km 240,903
ŽST Česká Třebová km 245,878

SP2 - e1

3 dny14.4.2026 - 16.4.2026

ZP na trati 324
24.2.-26.10.2026

vjezdová skupina - brněnské a třebovsklé zhlaví - provizorní výhybky 103 a 105, def.104, 107, 108, 109, KOLEJE DO TŘEBOVIC A NA ZÁDULKU - NYNÍ POUZE NOVÁ VÝHYBKA NA ZÁDULCE

3 dny14.4.2026 - 16.4.2026

Druhá etapa záporových pažení - výluka kolejí 2 a 4 včetně TV - 8 h.

koleje č. 427, 425, 423 - SP2 -e1 až SP -3b včetně *14.4.2026 - 4.12.2026*

- koleje provizorní aktuálně realizované
- koleje provizorní provozované během SP
- koleje rušené
- koleje stávající
- koleje stávající (na průjezdné trase) provozované - rozdíl barevných odstínů je zvolen pro lepší orientaci ve schématu
- koleje aktuálně realizované
- koleje hotové
- koleje hotové (na průjezdné trase), provozované
- koleje ve výhledu, budou realizovány v následných stavebních postupech
- výhledové trasy kabelovodů
- stávající betonový kabelovod

záporové pažení u mostů odshora: ve výhledu, v realizaci, hotové, rušené

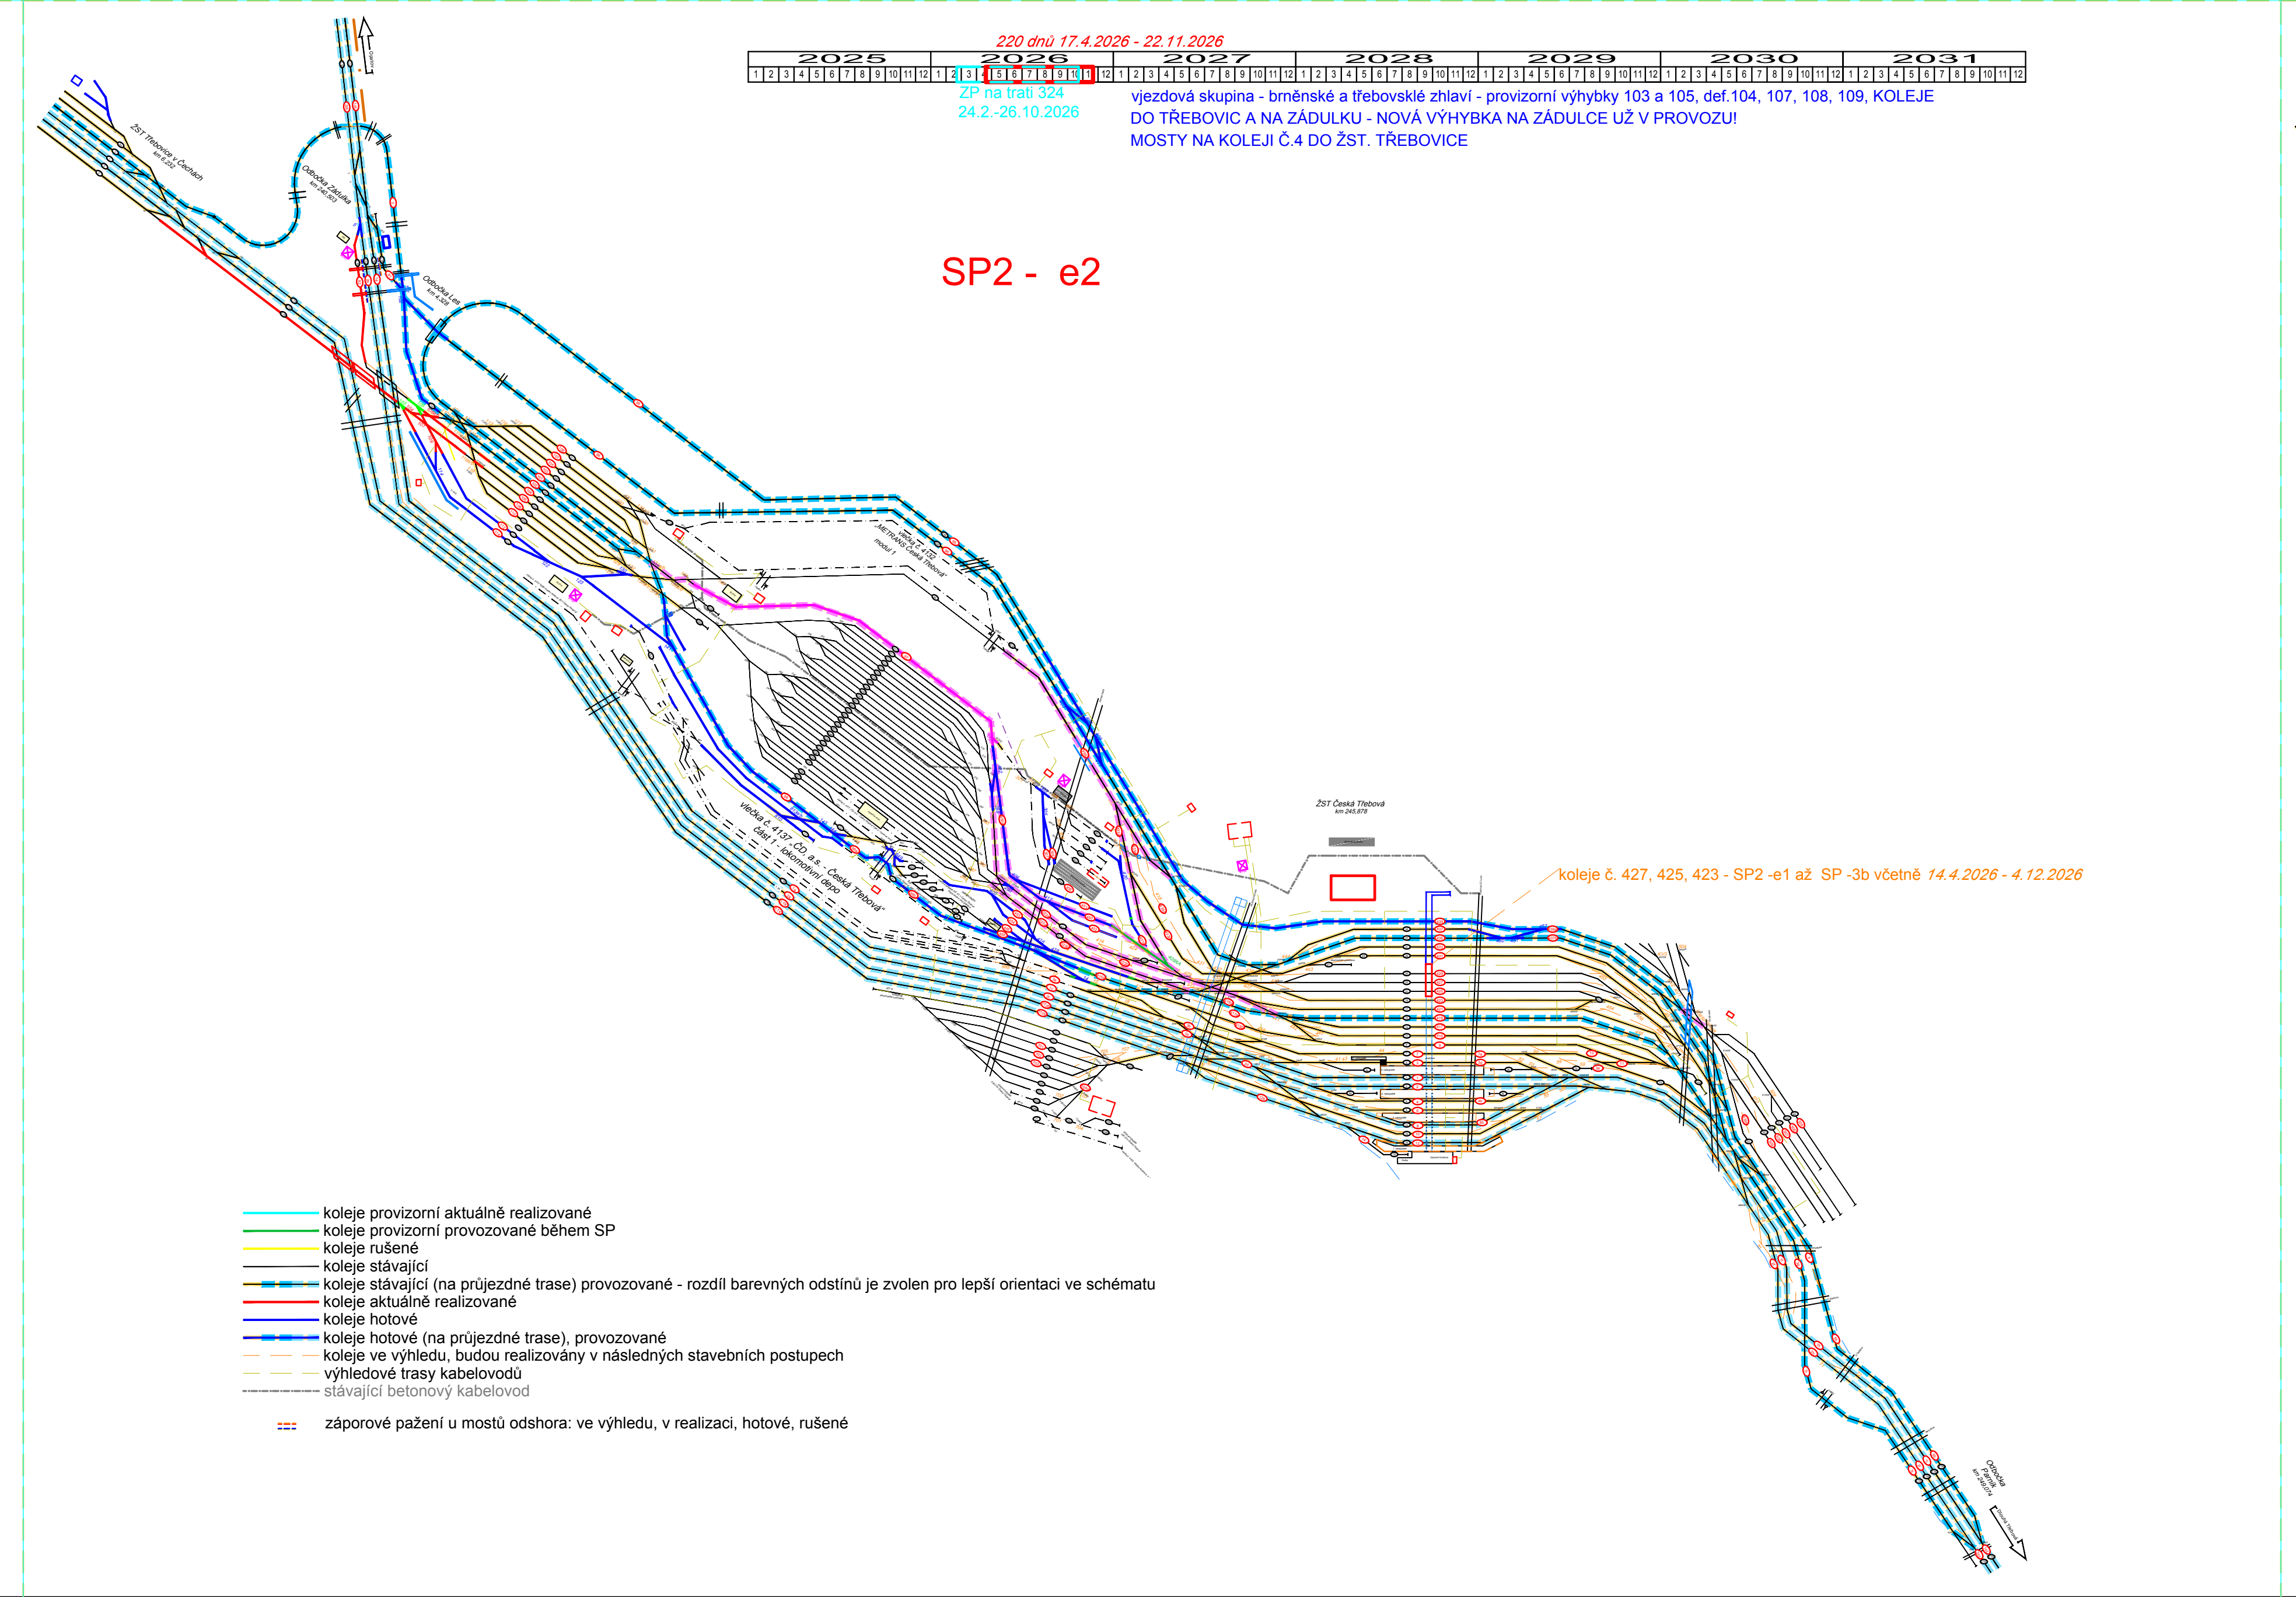
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
ŽST Třebovice v Čechách km 6,232
Odbočka Zádulka km 240,903
ŽST Česká Třebová km 245,878

SP2 - e2

220 dnů 17.4.2026 - 22.11.2026

ZP na trati 324
24.2.-26.10.2026

vjezdová skupina - brněnské a třebovsklé zhlaví - provizorní výhybky 103 a 105, def.104, 107, 108, 109, KOLEJE DO TŘEBOVIC A NA ZÁDULKU - NOVÁ VÝHYBKA NA ZÁDULCE UŽ V PROVOZU! MOSTY NA KOLEJI Č.4 DO ŽST. TŘEBOVICE

koleje č. 427, 425, 423 - SP2 -e1 až SP -3b včetně *14.4.2026 - 4.12.2026*

- koleje provizorní aktuálně realizované
- koleje provizorní provozované během SP
- koleje rušené
- koleje stávající
- koleje stávající (na průjezdné trase) provozované - rozdíl barevných odstínů je zvolen pro lepší orientaci ve schématu
- koleje aktuálně realizované
- koleje hotové
- koleje hotové (na průjezdné trase), provozované
- koleje ve výhledu, budou realizovány v následných stavebních postupech
- výhledové trasy kabelovodů
- stávající betonový kabelovod

záporové pažení u mostů odshora: ve výhledu, v realizaci, hotové, rušené

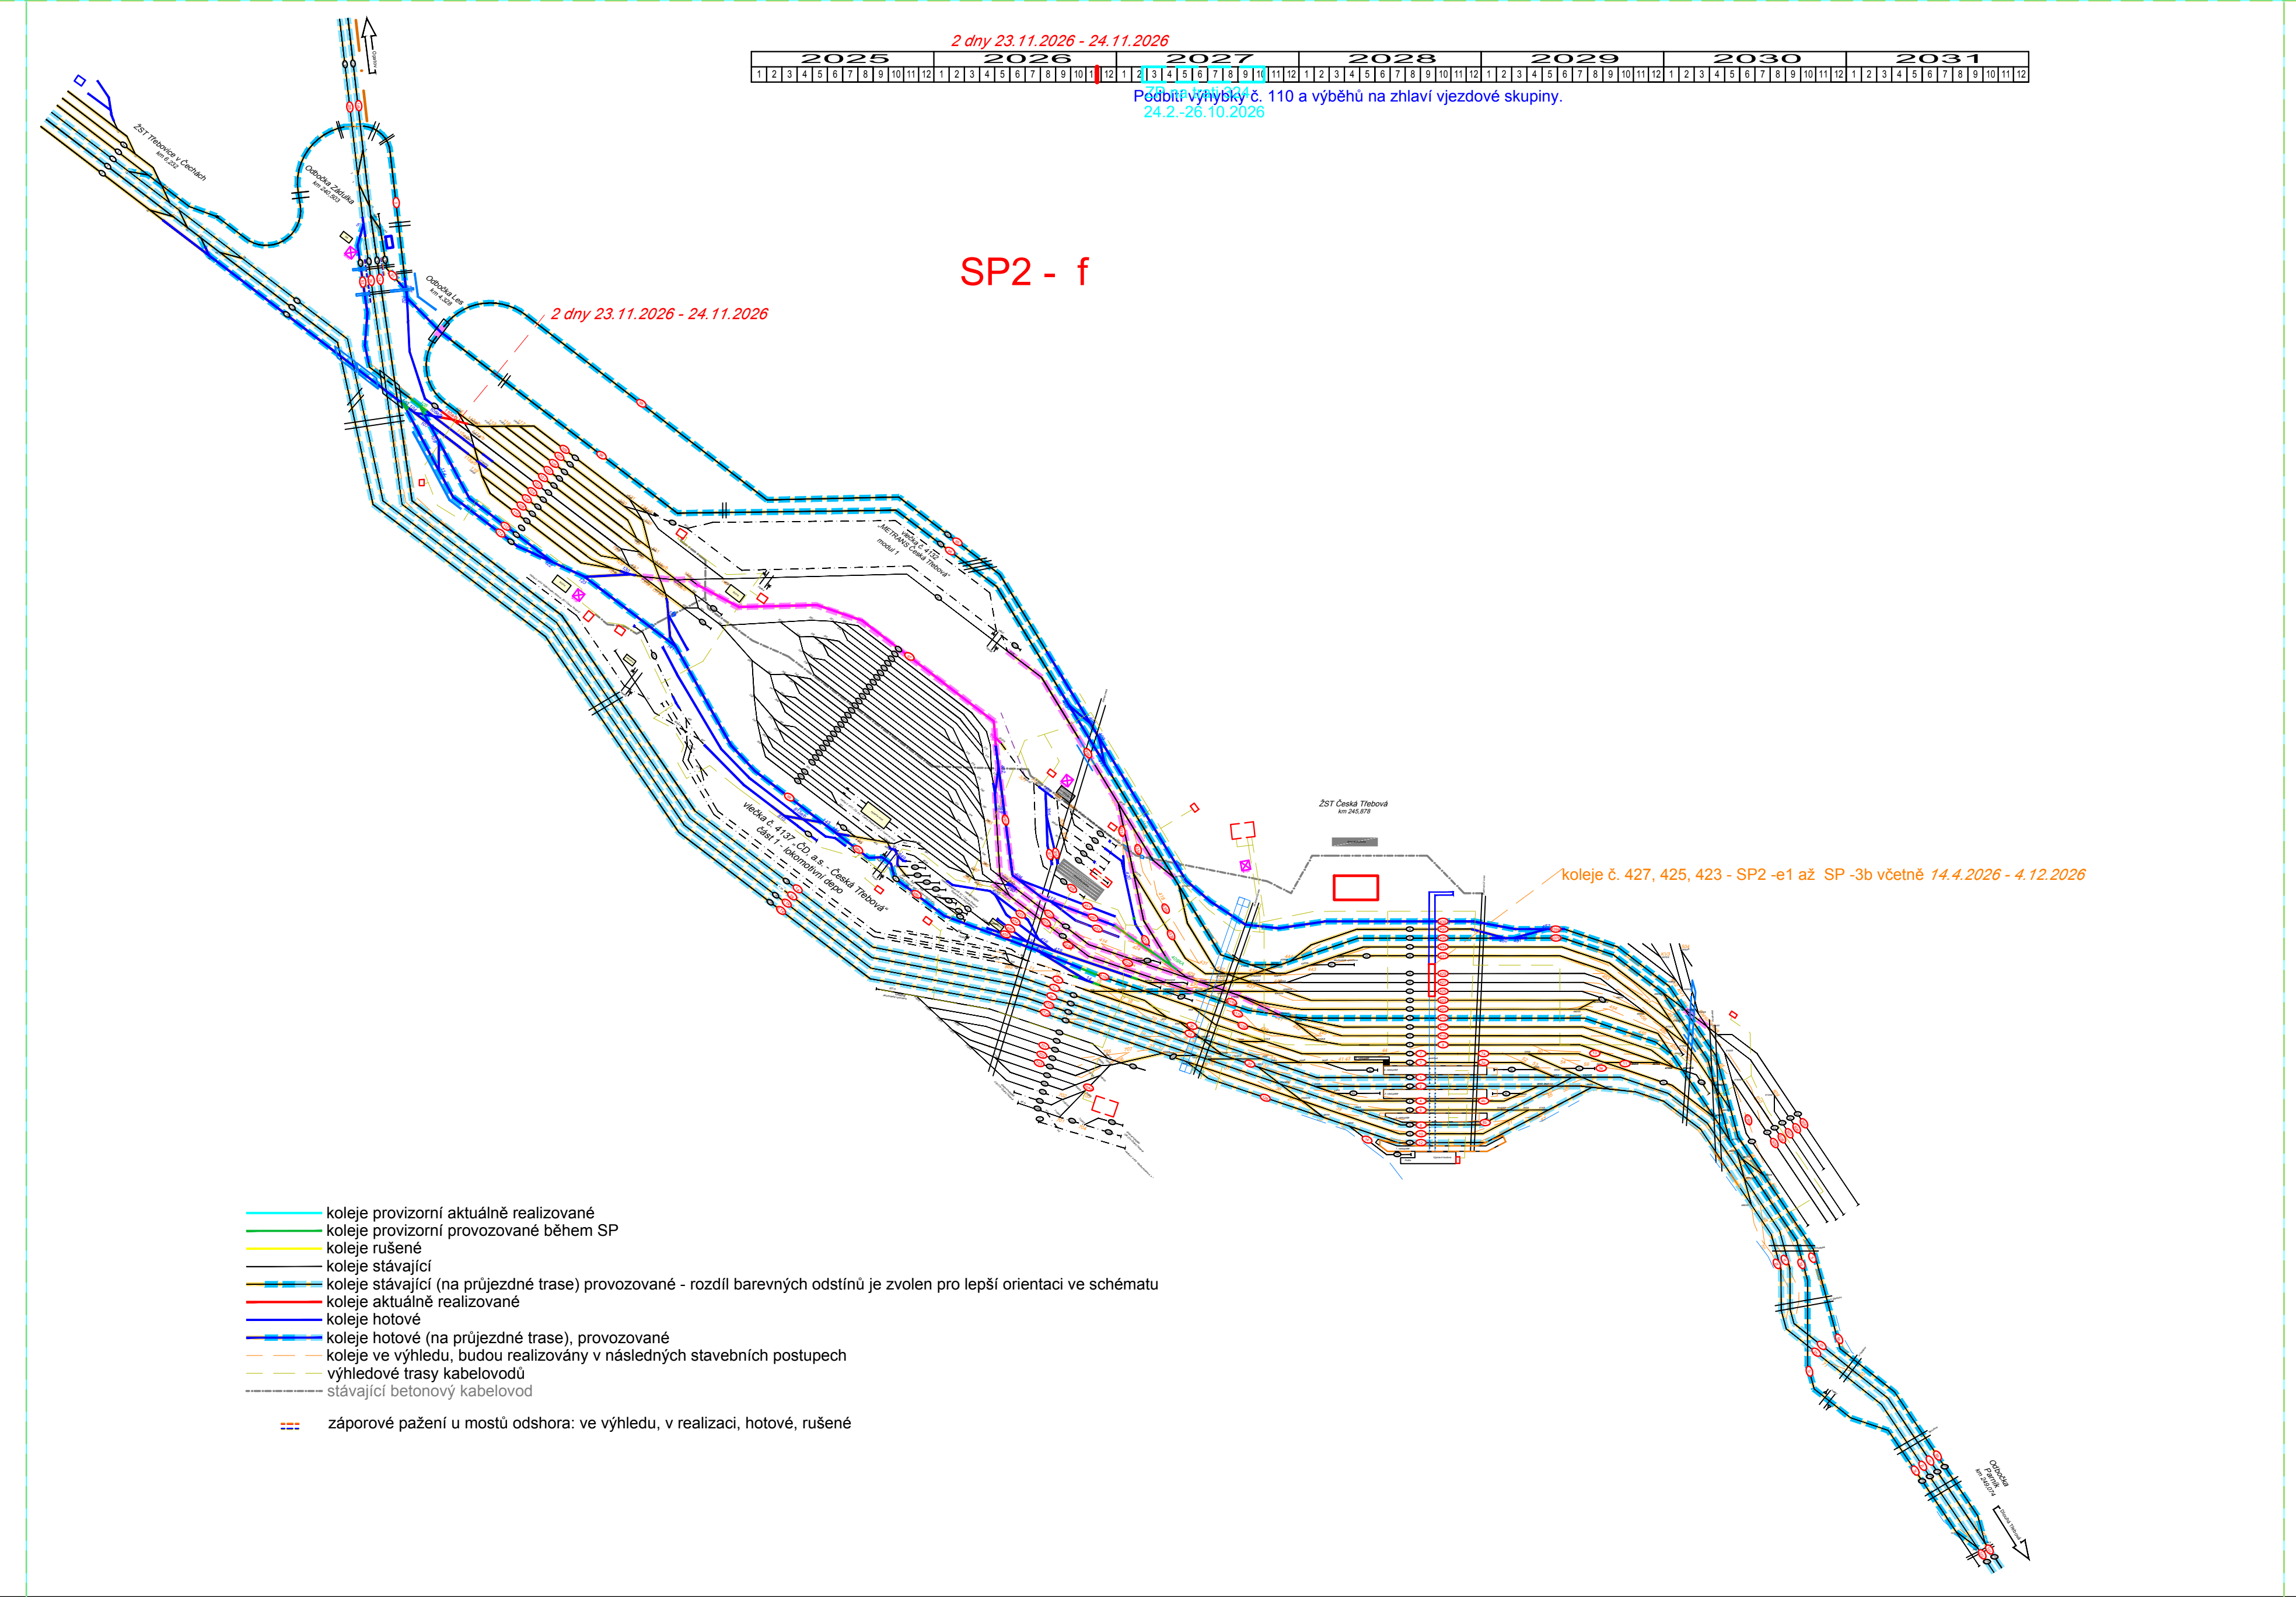
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
ŽST Třebovice v Čechách km 6,232
Odbočka Zádulka km 240,903
ŽST Česká Třebová km 245,878

SP2 - f

2 dny 23.11.2026 - 24.11.2026

ZP na trati 324
24.2.-26.10.2026

Podbití výhybky č. 110 a výběhů na zhlaví vjezdové skupiny.

koleje č. 427, 425, 423 - SP2 -e1 až SP -3b včetně *14.4.2026 - 4.12.2026*

- koleje provizorní aktuálně realizované
- koleje provizorní provozované během SP
- koleje rušené
- koleje stávající
- koleje stávající (na průjezdné trase) provozované - rozdíl barevných odstínů je zvolen pro lepší orientaci ve schématu
- koleje aktuálně realizované
- koleje hotové
- koleje hotové (na průjezdné trase), provozované
- koleje ve výhledu, budou realizovány v následných stavebních postupech
- výhledové trasy kabelovodů
- stávající betonový kabelovod

záporové pažení u mostů odshora: ve výhledu, v realizaci, hotové, rušené

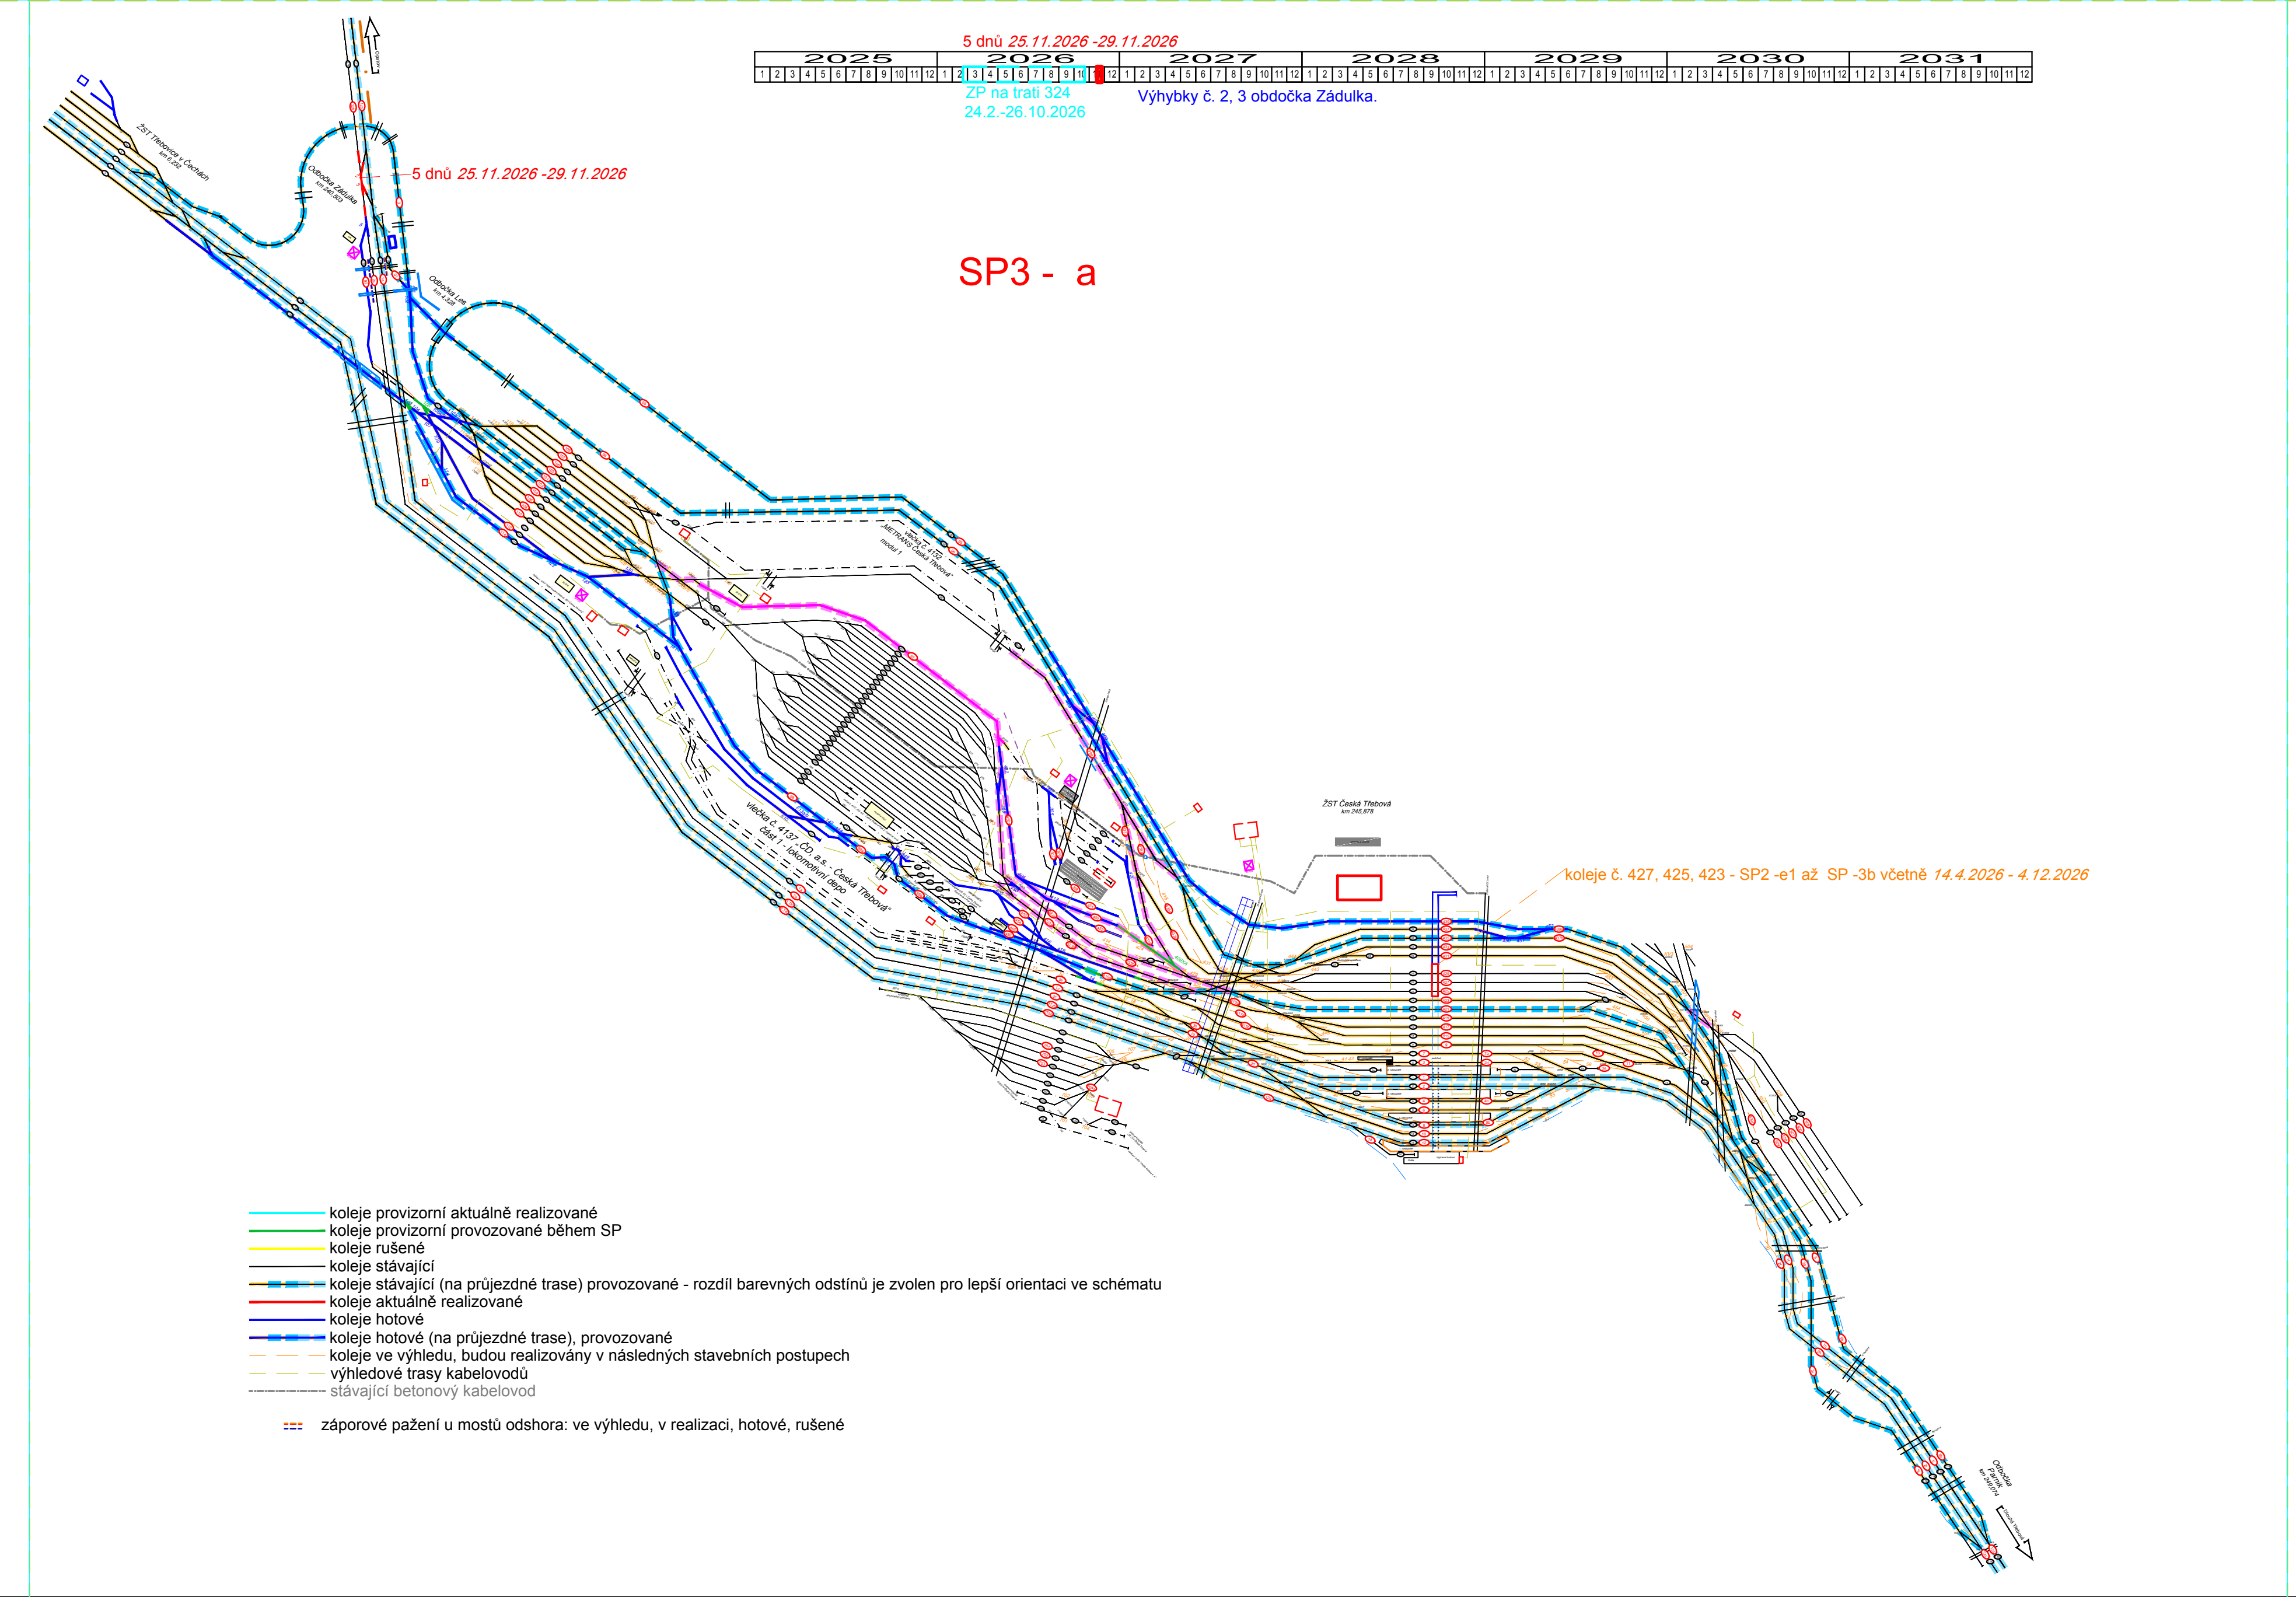
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
ŽST Třebovice v Čechách km 6,232
Odbočka Zádulka km 240,903
ŽST Česká Třebová km 245,878

SP3 - a

5 dnů *25.11.2026 -29.11.2026*

ZP na trati 324
24.2.-26.10.2026

Výhybky č. 2, 3 obdočka Zádulka.

5 dnů *25.11.2026 -29.11.2026*

koleje č. 427, 425, 423 - SP2 -e1 až SP -3b včetně *14.4.2026 - 4.12.2026*

- koleje provizorní aktuálně realizované
- koleje provizorní provozované během SP
- koleje rušené
- koleje stávající
- koleje stávající (na průjezdné trase) provozované - rozdíl barevných odstínů je zvolen pro lepší orientaci ve schématu
- koleje aktuálně realizované
- koleje hotové
- koleje hotové (na průjezdné trase), provozované
- koleje ve výhledu, budou realizovány v následných stavebních postupech
- výhledové trasy kabelovodů
- stávající betonový kabelovod

záporové pažení u mostů odshora: ve výhledu, v realizaci, hotové, rušené

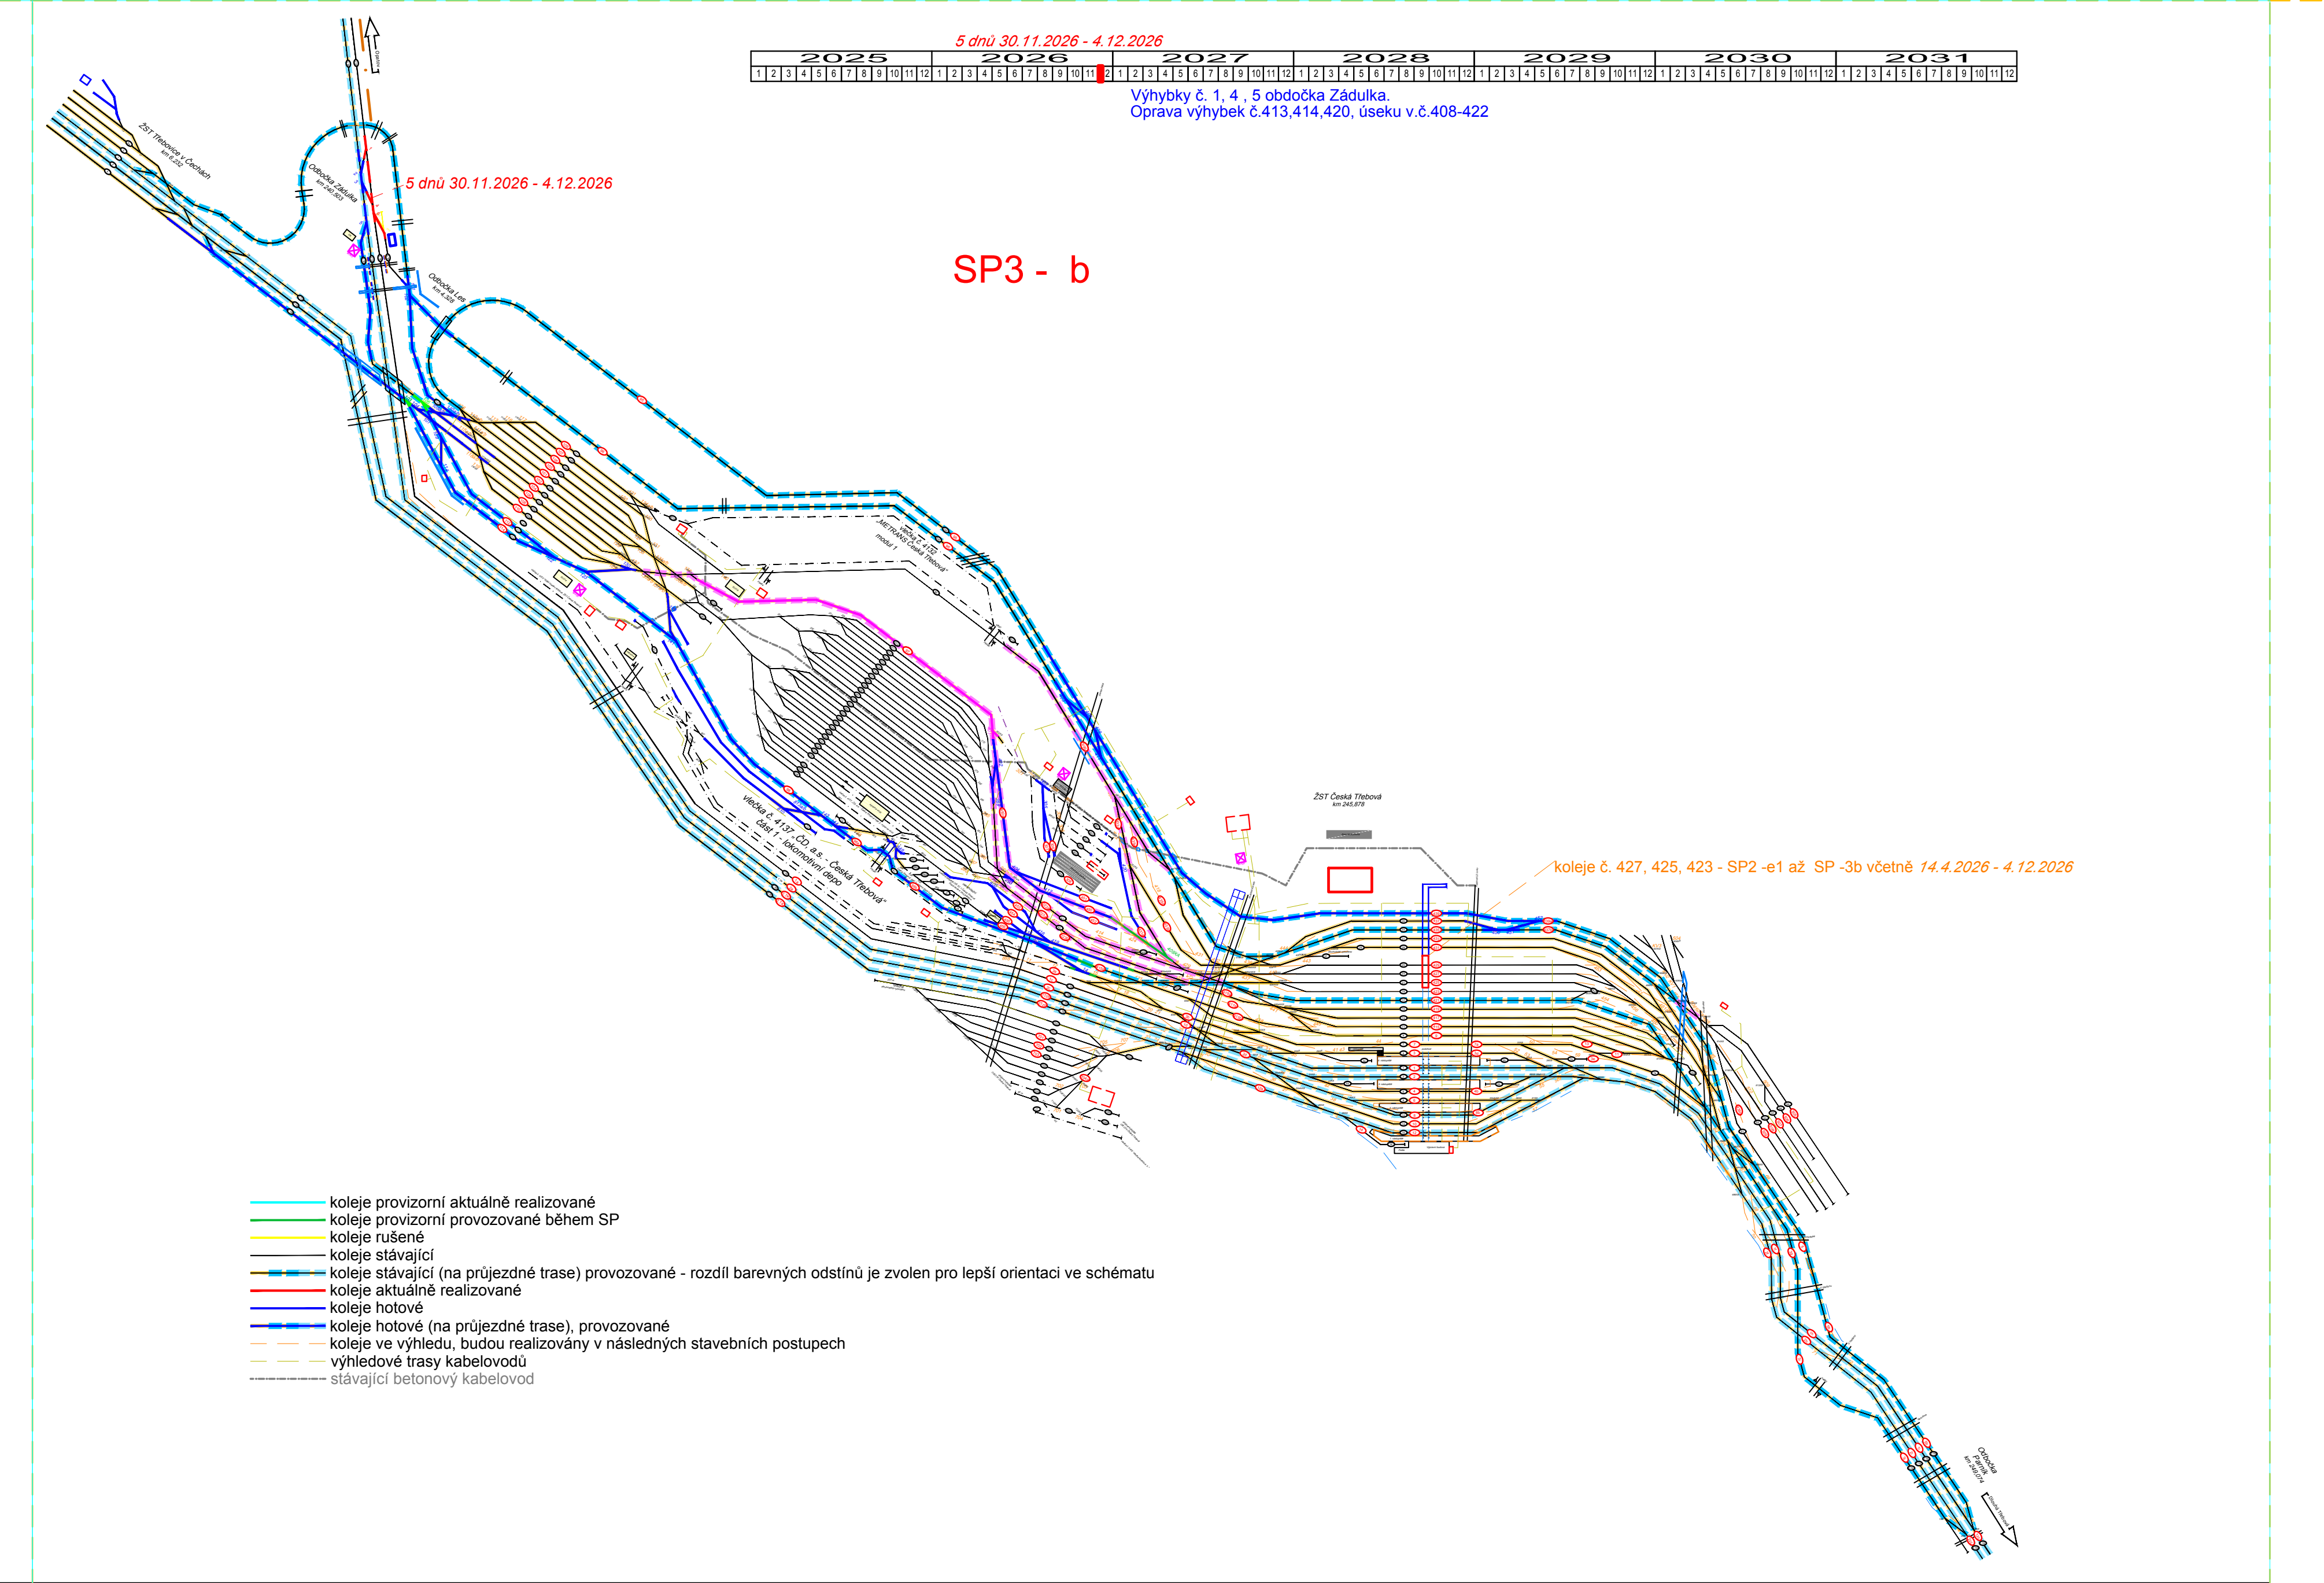
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
ŽST Třebovice v Čechách km 6,232
Odbočka Zádulka km 240,903
ŽST Česká Třebová km 245,878
Odbočka Parník km 249,074
Dlouhá Třebová

SP3 - b

5 dnů 30.11.2026 - 4.12.2026

Výhybky č. 1, 4 , 5 obdočka Zádulka.
Oprava výhybek č.413,414,420, úseku v.č.408-422

5 dnů 30.11.2026 - 4.12.2026

koleje č. 427, 425, 423 - SP2 -e1 až SP -3b včetně *14.4.2026 - 4.12.2026*

- koleje provizorní aktuálně realizované
- koleje provizorní provozované během SP
- koleje rušené
- koleje stávající
- koleje stávající (na průjezdné trase) provozované - rozdíl barevných odstínů je zvolen pro lepší orientaci ve schématu
- koleje aktuálně realizované
- koleje hotové
- koleje hotové (na průjezdné trase), provozované
- koleje ve výhledu, budou realizovány v následných stavebních postupech
- výhledové trasy kabelovodů
- stávající betonový kabelovod

záporové pažení u mostů odshora: ve výhledu, v realizaci, hotové, rušené

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	1.11.2023	Definitivní odevzdání dokumentace	ing. Petr Rotschein

Název části:	Zásady oragnizace výstavby		Označení části: **B.8**
Název objektu/dílčí části:	**Schémata stavebních postupů**		Označení objektu/komplexu: **B.8.4**
Název přílohy: Název dílčí části přílohy:	Schéma stavebních postupů SP 2 a SP 3		Číslo přílohy (typ/pořadí): **3.**
Odpovědný projektant: Bc. Tomáš Cádrik	Zpracovatel přílohy: Ing. Josef Ferenc	Měřítko: Formáty: 15xA4	Stupeň dokumentace: **PDPS**
Kraj: Pardubický	Katastrální území: viz. textová část	TUDU: viz. textová část	Smluvní datum zpracování: **11/2023**

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 2 1 5 0 0 5 7 7	_ P D P S	_ _ B 8 X X	_ _ _ _ _ _ B 8 4	_ _ _	_ 3 _ _ _ _ _	0 0 0

[Prostor pro další informace]
