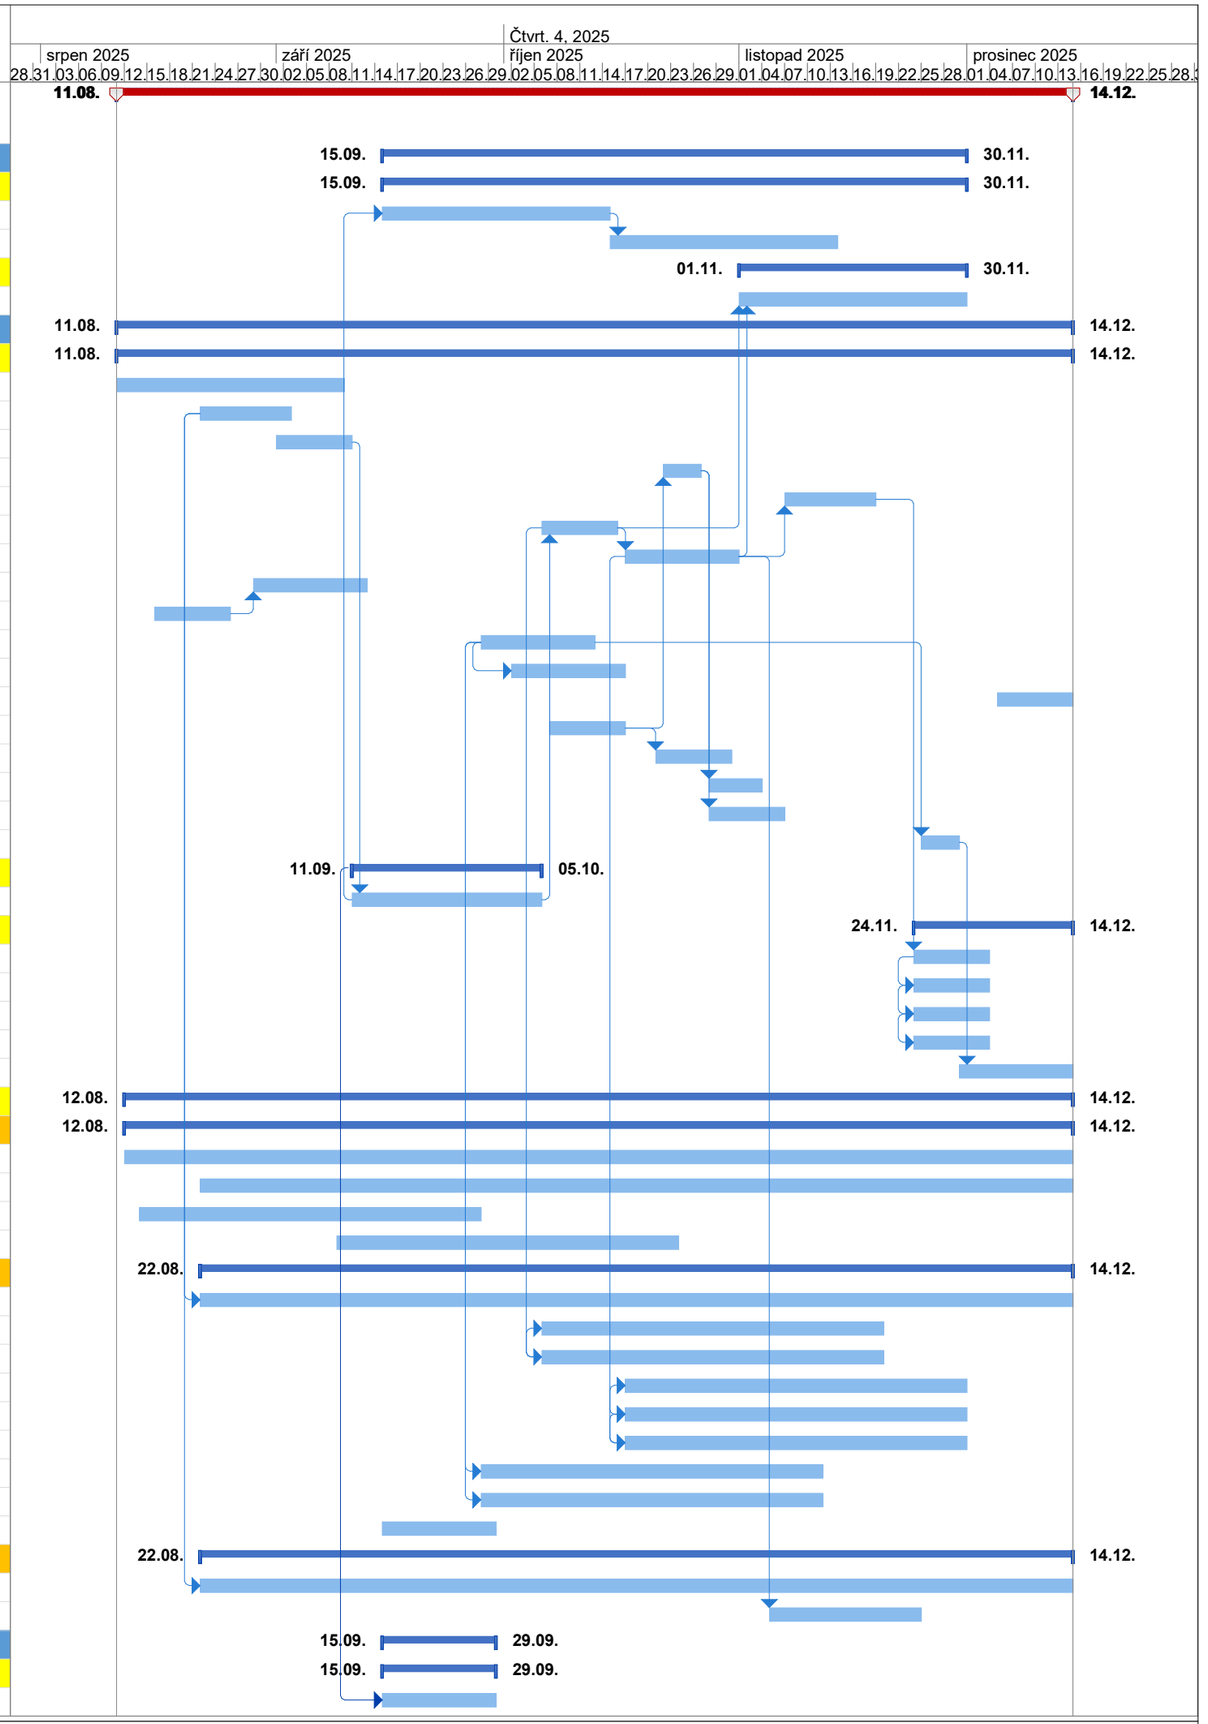ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
0		**Odstranění havarijního stavu po povodních v úseku Vápenná – Javorník ve Slezsku**	**126 dny**	**11.08. 25**	**14.12. 25**	
1		**D.1.1 Zabezpečovací zařízení**	**77 dny**	**15.09. 25**	**30.11. 25**	
2		**D.1.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení**	**77 dny**	**15.09. 25**	**30.11. 25**	
3		PS 11-01-11 Obnova SZZ, ŽST Žulová	30 dny	15.09. 25	14.10. 25	27SS+4 dny
4		PS 13-01-11 Obnova SZZ, ŽST Velká Kraš	30 dny	15.10. 25	13.11. 25	3
5		**D.1.1.1 Traťové zabezpečovací zařízení**	**30 dny**	**01.11. 25**	**30.11. 25**	
6		PS 11-01-11 Obnova SZZ, ŽST Žulová	30 dny	01.11. 25	30.11. 25	14;15
7		**D.2.1 Inženýrské objekty**	**126 dny**	**11.08. 25**	**14.12. 25**	
8		**D.2.1.1 Železniční svršek a spodek**	**126 dny**	**11.08. 25**	**14.12. 25**	
9		SO 11-10-01 Železniční svršek, km 12,500 - km 13,400	30 dny	11.08. 25	09.09. 25	
10		SO 11-11-01 Železniční spodek, km 12,500 - km 12,800	12 dny	22.08. 25	02.09. 25	
11		SO 11-11-02 Železniční spodek, km 13,115 - km 13,300	10 dny	01.09. 25	10.09. 25	
12		SO 12-10-01 Propracování koleje, km 13,400 - km 17,850	5 dny	22.10. 25	26.10. 25	21
13		SO 12-10-02 Železniční svršek, km 17,850 - km 19,900	12 dny	07.11. 25	18.11. 25	15
14		SO 12-11-01 Železniční spodek, km 18,100 - km 18,600	10 dny	06.10. 25	15.10. 25	27
15		SO 12-11-02 Železniční spodek, km 18,900 - km 19,900	15 dny	17.10. 25	31.10. 25	14
16		SO 13-10-01 Železniční svršek, ŽST Velká Kraš	15 dny	29.08. 25	12.09. 25	17
17		SO 13-11-01 Oprava odvodnění, ŽST Velká Kraš	10 dny	16.08. 25	25.08. 25	
18		SO 14-10-01 Železniční svršek, km 0,800 - km 2,400	15 dny	28.09. 25	12.10. 25	
19		SO 14-11-01 Železniční spodek, km 0,950 - km 1,450	15 dny	02.10. 25	16.10. 25	18SS+4 dny
20		SO 11-14-01 Výstroj trati, km 12,500 - km 13,400	10 dny	05.12. 25	14.12. 25	
21		SO 12-14-01 Výstroj trati, km 13,400 - km 17,850	10 dny	07.10. 25	16.10. 25	
22		SO 12-14-02 Výstroj trati, km 17,850 - km 19,880	10 dny	21.10. 25	30.10. 25	21
23		SO 12-10-01.2 Přejezdy v úseku propracování koleje, km 13,400 - km 17,850	7 dny	28.10. 25	03.11. 25	12FS+1 den
24		SO 12-10-01.3 Nástupiště v úseku propracování koleje, km 13,400 - km 17,850	10 dny	28.10. 25	06.11. 25	12FS+1 den
25		SO 00-10-01 Úprava GPK v úseku Velká Kraš - Bernartice - Javorník ve Slezsku	5 dny	25.11. 25	29.11. 25	18
26		**D.2.1.2 Nástupiště**	**25 dny**	**11.09. 25**	**05.10. 25**	
27		SO 11-13-01 Obnova nástupiště, ŽST Žulová	25 dny	11.09. 25	05.10. 25	11
28		**D.2.1.3 Železniční přejezdy**	**21 dny**	**24.11. 25**	**14.12. 25**	
29		SO 12-14-01 Oprava přejezdu P4360, evid.km 18,024	10 dny	24.11. 25	03.12. 25	13
30		SO 12-14-02 Obnova přejezdu P4361, evid.km 18,112	10 dny	24.11. 25	03.12. 25	29SS
31		SO 12-14-03 Oprava přejezdu P4362, evid.km 18,814	10 dny	24.11. 25	03.12. 25	30SS
32		SO 12-14-04 Obnova přejezdu P4363, evid.km 19,194	10 dny	24.11. 25	03.12. 25	31SS
33		SO 00-14-01 Přejezdy v úseku Velká Kraš - Bernartice - Javorník ve Slezsku	15 dny	30.11. 25	14.12. 25	25
34		**D.2.1.4 Mosty, propustky, zdi**	**125 dny**	**12.08. 25**	**14.12. 25**	
35		**D.2.1.4.1. Železniční mosty**	**125 dny**	**12.08. 25**	**14.12. 25**	
36		SO 11-20-01 Oprava mostu, evid.km 13,279	125 dny	12.08. 25	14.12. 25	
37		SO 12-20-01 Oprava mostu, evid.km 16,335	115 dny	22.08. 25	14.12. 25	
38		SO 14-20-01 Oprava mostu, evid.km 2,055	45 dny	14.08. 25	27.09. 25	
39		SO 00-20-11 Drobné opravné práce na objektech mostů	45 dny	09.09. 25	23.10. 25	
40		**D.2.1.4.2. Propustky**	**115 dny**	**22.08. 25**	**14.12. 25**	
41		SO 11-21-01 Obnova propustku, evid.km 12,766 (součást zdi SO 11-23-01)	115 dny	22.08. 25	14.12. 25	10SS
42		SO 11-21-02 Oprava propustku, evid.km 12,852	45 dny	06.10. 25	19.11. 25	43SS
43		SO 12-21-01 Obnova propustku, evid.km 18,268	45 dny	06.10. 25	19.11. 25	14SS
44		SO 12-21-02 Obnova propustku, evid.km 18,368	45 dny	17.10. 25	30.11. 25	45SS
45		SO 12-21-03 Obnova propustku, evid.km 18,477	45 dny	17.10. 25	30.11. 25	46SS
46		SO 12-21-04 Obnova propustku, evid.km 19,175	45 dny	17.10. 25	30.11. 25	15SS
47		SO 14-21-01 Obnova propustku, evid.km 1,166	45 dny	28.09. 25	11.11. 25	18SS
48		SO 14-21-02 Obnova propustku, evid.km 1,262	45 dny	28.09. 25	11.11. 25	18SS
49		SO 00-21-11 Drobné opravné práce na objektech propustků	15 dny	15.09. 25	29.09. 25	
50		**D.2.1.4.3 Opěrné zdi**	**115 dny**	**22.08. 25**	**14.12. 25**	
51		SO 11-23-01 Obnova opěrné zdi, km 12,600 - km 12,800	115 dny	22.08. 25	14.12. 25	10SS
52		SO 12-23-01 Obnova opěrné zdi, km 19,789 - km 19,864	20 dny	05.11. 25	24.11. 25	15
53		**D.2.3 Trakční a energetická zařízení**	**15 dny**	**15.09. 25**	**29.09. 25**	
54		**D.2.3.6 Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů**	**15 dny**	**15.09. 25**	**29.09. 25**	
55		SO 11-86-01 ŽST Žulová, osvětlení nástupiště	15 dny	15.09. 25	29.09. 25	26SS+4 dny
