Tab. 11 Casový plán výluk

SP č.	Popis a umístění výluk	měsíc / týden / Doba trvání - dní	Zahájení	ukončení	
		měsíc			
		týden			
		49-1			
	Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u D (mimo) - Litvínov	578			
PP	Přípravné práce - kácení, přístupové cesty, zařízení staveniště				
	Krátkodobé výluky (Litvínov celá žst., Litvínov - Louka)				
	Litvínov, základy stožárů TV	3x12 h	1.3.2019	3.3.2019	3
	Litvínov-Louka u L.,TK, základy stožárů TV	4x12h	28.2.2019	3.3.2019	4
	Litvínov-Louka u L.,TK, nadjezd l/27	1x4 h	2.3.2019	2.3.2019	1
	Litvínov-Louka u L., žel.most km 54,816	1x12 h	1.3.2019	1.3.2019	1
SP1+2	**Nepřetržité výluky (Litvínov celá žst., Litvínov - Louka, Louka 2. a 5. SK)**	**89 dní**	**4.3.2019**	**31.5.2019**	**89**
	Litvínov, snesení SK 5,5a,5b,3,1,2,4a,4	21 dní	4.3.2019	31.5.2019	89
	Litvínov-Louka, TK	21 dní	4.3.2019	31.5.2019	89
	Louka u Litvínova, demolice SK 2a 5	21 dní	29.4.2019	19.5.2019	21
	Litvínov-Louka u L., nadjezd, silnice l/27 km 54,710	42 dní	4.3.2019	14.4.2019	42
	Litvínov-Louka u L., železniční most v km 54,816	35 dní	4.3.2019	7.4.2019	35
	Litvínov-louka u L., železniční propustek v km 54,150	35 dní	11.3.2019	14.4.2019	35
	Litvínov, snesení stáv. nástupiště	14 dní	18.3.2019	31.3.2019	14
	Litvínov-Louka u L. úprava PZZ km 54,582 a 55,070	2x 7d	18.3.2019	31.3.2019	14
	Litvínov-Louka u L., železniční svršek a spodek	35 dní	15.4.2019	19.5.2019	35
	Litvínov, železniční spodek a svršek	35 dní	15.4.2019	19.5.2019	35
	Litvínov, nové nástupiště	14 dní	1.4.2019	14.4.2019	14
	Litvínov a Litvínov-Louka u L., nové TV	35 dní	15.4.2019	19.5.2019	35
	Litvínov, nástupištní přístřešky	14 dní	15.4.2019	28.4.2019	14
	Louka u L., provizorní prodloužení nástupiště kol.č.9 (7x8hod)	7 dní	29.4.2019	5.5.2019	7
	Litvínov, instalace EOV	5 dní	20.5.2019	24.5.2019	5
	Louka u L., provizorní propojení TV přes výh. č. 1	5 dní	13.5.2019	17.5.2019	5
SP3	**Nepřetržité výluky (žst. Louka, postupně dle SP):**	**92 dní**	**1.6.2019**	**31.8.2019**	**92**
	Louka u L., krátkodobé pro základy nových stožárů TV	19 dní	13.5.2019	31.5.2019	19
	Louka u L., SK 2,1,3,5	92 dní	1.6.2019	31.8.2019	92
	Louka u L., TV nad SK č, 2, 1a, 1, 3	48 dní	15.7.2019	31.8.2019	48
	Louka u L., nástupiště	21 dní	15.7.2019	4.8.2019	21
	Louka u L., nástupištní přístřešky	14 dní	5.8.2019	18.8.2019	14
	Louka u L., SK 7, 7a, 9, TK do všech směrů	27 dní	5.8.2019	31.8.2019	27
	Louka u L., EOV	13 dní	19.8.2019	31.8.2019	13
	Louka u L., PZZ na žel. přejezdu v km 53,980	7 dní	19.8.2019	25.8.2019	7
	Louka u L., aktivace SZZ, TZZ Litvínov-Louka u L., SZZ Litvínov	7 dní	19.8.2019	31.8.2019	13
SP4	**Nepřetržité výluky (Louka - Osek, Louka)**	**91 dní**	**1.9.2019**	**30.11.2019**	**91**
	Louka u L.-Osek, krátkodobé pro základy nových stožárů TV	20 dní	12.8.2019	31.8.2019	20
	Louka u L-Osek, demontáž TK a nástupiště Lom u M	91 dní	1.9.2019	30.11.2019	91
	Louka u L., dokončení SK č. 5	22 dní	1.9.2019	22.9.2019	22
	železniční propustky v km 48,795 a 48,525	14 dní	23.9.2019	6.10.2019	14
	zastávka Lom u Mostu, nástupiště	14 dní	23.9.2019	6.10.2019	14
	zastávka Lom u Mostu, nástupištní přístřešky	14 dní	30.9.2019	13.10.2019	14
	železniční přejezd v km 49,972	6 dní	1.10.2019	6.10.2019	6
	provizorní propojení na louckém záhlaví v Oseku	6 dní	25.11.2019	30.11.2019	6
TP	Provoz v celé trati a v plném rozsahu	85 dní	1.12.2019	23.2.2020	85
SP 5+6	Přípravné práce - kácení, přístupové cesty	53 dní	2.1.2020	23.2.2020	53
	Osek-Oldřichov u D, krátkodobé pro základy nových stožárů	21 dní	3.2.2020	23.2.2020	21
	Nepřetržité výluky (žst. Osek, SK 1, 2, 3, 4)	**70 dní**	**24.2.2020**	**3.5.2020**	**70**
	Osek, SK 1,2,3,4, snesení TV celá stanice a demolice kolejí	21 dní	24.2.2020	3.5.2020	70
	demolice železniční propustek v km 46,585	7 dní	9.3.2020	15.3.2020	7
	Osek, žel.spodek a svršek SK 1,2,2a včetně nástupiště	35 dní	16.3.2020	19.4.2020	35
	Osek, nové centrální poloostrovní nástupiště	21 dní	13.4.2020	3.5.2020	21
	železniční propustek v km 47,494 a 43,615	14 dní	13.4.2020	26.4.2020	14
	železniční most v km 46,629	7 dní	27.4.2020	3.5.2020	7
	Louka u L(mimo)-Osek(včetně), montáž nového TV	28 dní	6.4.2020	3.5.2020	28
	Osek montáž nového SZZ	31 dní	31.3.2020	30.4.2020	31
	Osek, aktivace nového SZZ	9 dní	22.6.2020	30.6.2020	9
SP 7+8	**Nepřetržité výluky (Osel - Oldřichov, žst. Osek, SK 3a, 5)**	**58 dní**	**4.5.2020**	**30.6.2020**	**58**
	Osek, snesení SK 3a, 5 a DKS, napojení vlečky, montáž EOV	35 dní	4.5.2020	7.6.2020	35
	Osek-Oldřichov. Snesení TK	58 dní	4.5.2020	30.6.2020	58
	žel.mosty v km 46,242; 46,075 a 43.774	35 dní	4.5.2020	7.6.2020	35
	žel.přejezdy v km 44,638 a 45,645	14 dní	4.5.2020	17.5.2020	14
	Osek, nástupištní přístřešek	14 dní	4.5.2020	17.5.2020	14
	Louka u L(mimo)-Osek(včetně), montáž nového TV	14 dní	4.5.2020	17.5.2020	14
	žel.mosty v km 46,242; 46,075 a 43.774 - dokončení	21 dní	8.6.2020	28.6.2020	21
	Háj u Duchcova , nástupiště	14 dní	18.5.2020	31.5.2020	14
	Osek-Oldřichov u D., železniční spodek	35 dní	18.5.2020	21.6.2020	35
	Osek-Oldřichov u D., montáž nové TK	35 dní	25.5.2020	28.6.2020	35
	Háj u Duchcova, nástupištní přístřešky	14 dní	25.5.2020	7.6.2020	14
	žel.propustek v žkm 46,164; 45,290 a 45,110	21 dní	18.5.2020	7.6.2020	21
	Osek-Oldřichov u D., montáž nového TV nad TK	28 dní	1.6.2020	28.6.2020	28
	Olda-Litvínov, výstroj trati	21 dní	8.6.2020	28.6.2020	21
	Osek - Oldřichov u D., aktivace nového TZZ	9 dní	22.6.2020	30.6.2020	9

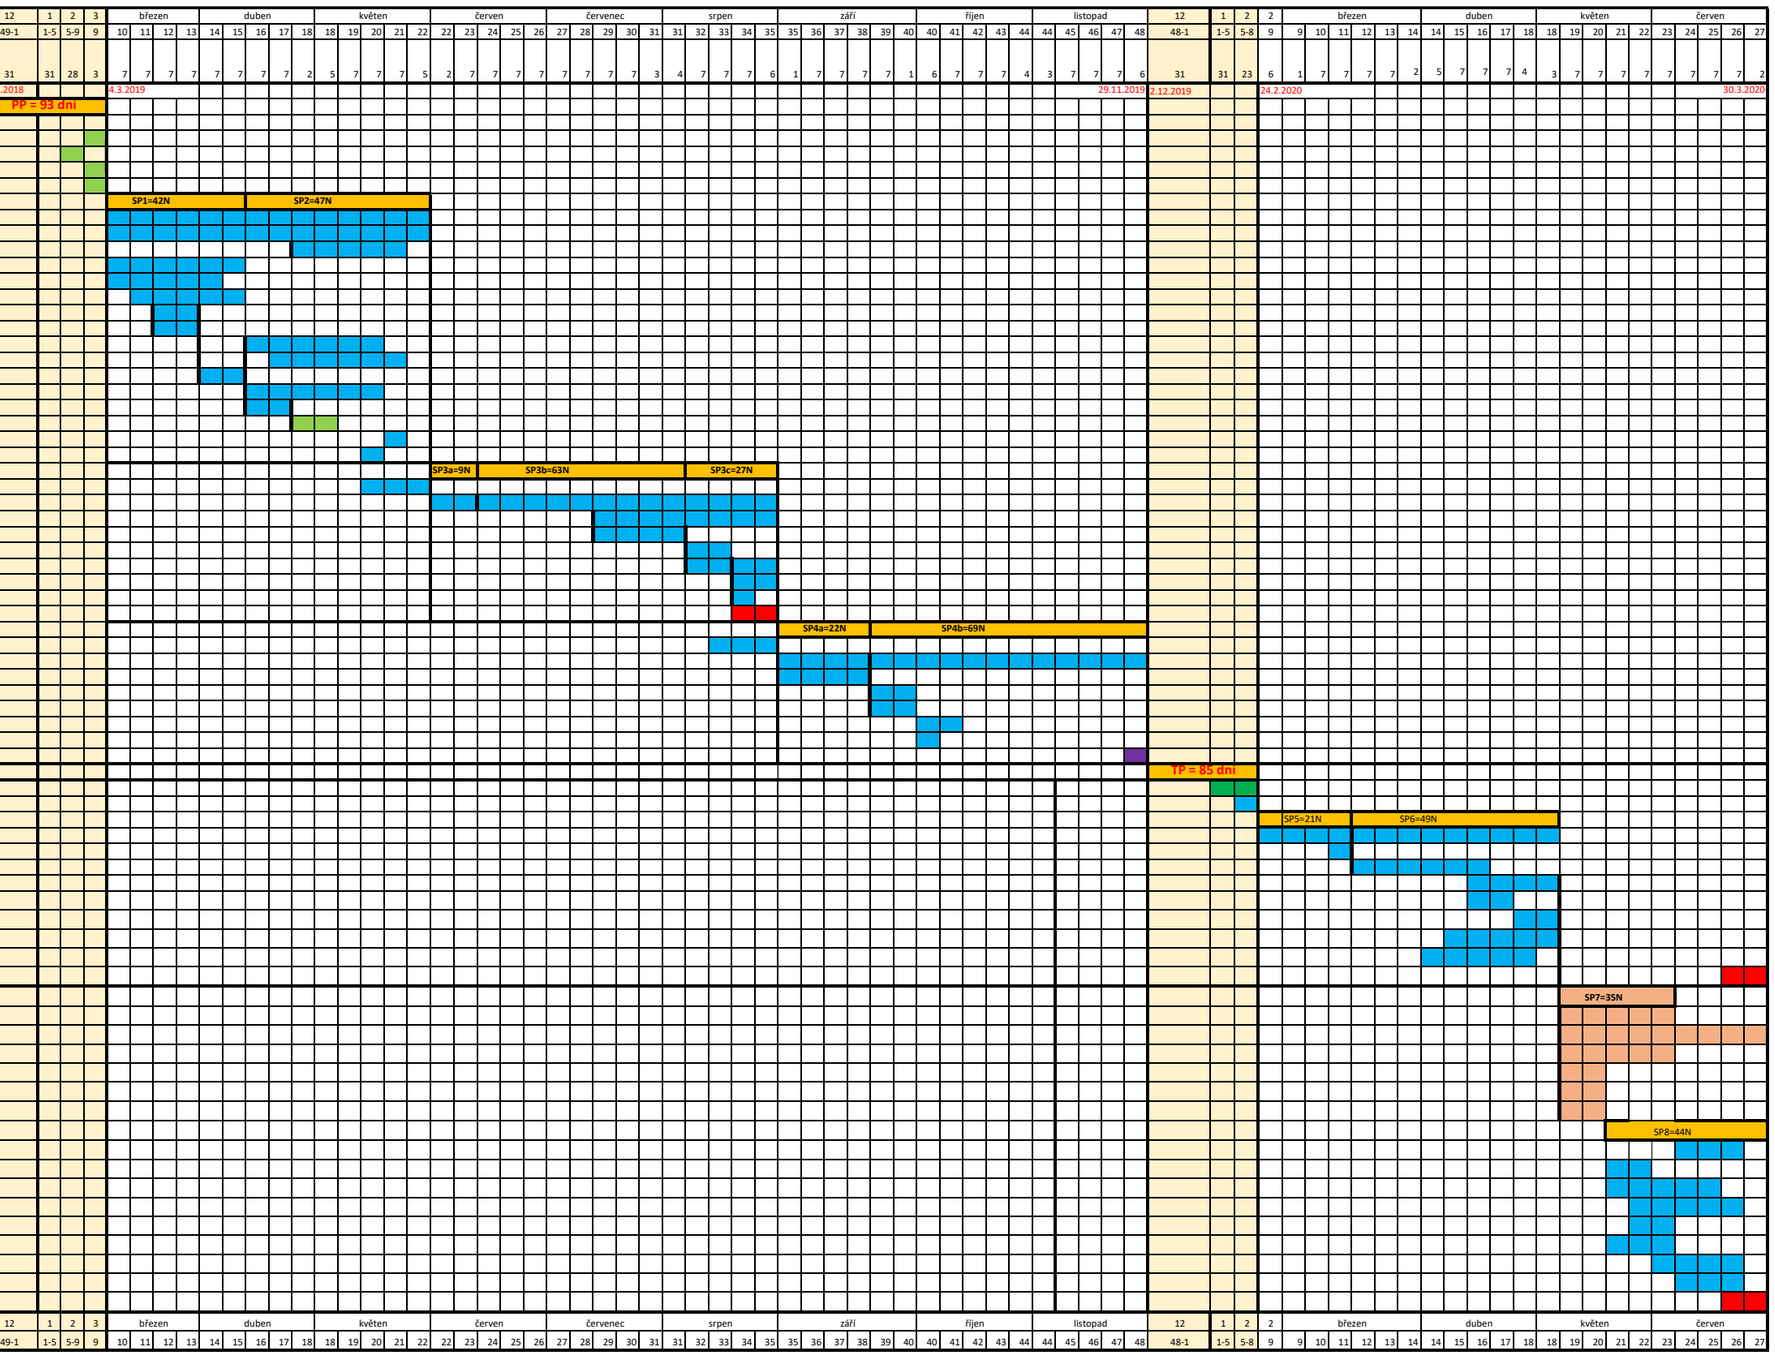

Ing. Zbyněk Budiš, 10/2017
