Spolufinancováno Evropskou unií

Nástroj pro propojení Evropy

Projekt „Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati“ je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

F

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	**úprava**	**24.5.2017**
02	**úprava**	**14.6.2017**
03	**úprava**	**27.6.2017**

Objednatel:

SŽDC Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, statní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

Generální projektant:

SUDOP PRAHA

SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
fax: +420 224 230 316
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:
ING. PAVEL KUBÁT

Garant profese:
-

Středisko:
240 - PROJEKTOVÉ STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

Vedoucí střediska:	*Odpovědný projektant SO, IO, PS:*	*Vypracoval:*	*Kontroloval:*
ING. MIROSLAV VAŇA	ING. IVAN GRISA	ING. IVAN GRISA	ING. PAVEL KUBÁT

Název akce:

UZEL PLZEŇ, 3.STAVBA
- PŘESMYK DOMAŽLICKÉ TRATI

Číslo smlouvy: 14-209.250

Projektový stupeň: PROJEKT

Část:

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Datum: 30. 5. 2015

Číslo části: F

Název přílohy:

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Měřítko: -

Počet formátů: -

Číslo přílohy: **04**

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.

Řádkový harmonogram výstavby

Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati

Legenda:

- zabezpečovací a sdělovací zařízení
- kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž)/pozemní komunikace
- mostní objekty (podchody vč.zastřešení)
- trakční vedení, elektro
- pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice
- kanalizace, potrubní vedení
- hlavní milníky přípravy a výstavby
- měsíce zimního období
- délka dílčího stavebního postupu
- přípravné a dokončovací práce
- zkušební provoz
- omezení silničního provozu

Stavební úsek	Etapy	Popis činností Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)	doba trvání (milníky) od	-	do	měs.	týdny	dny
stavba Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati	hlavní milníky přípravy a výstavby (vč. klíčových prací na zab.zař.)	stavební povolení: nabytí právní moci	1. říjen 2017					
		zahájení soutěže na dodavatele	2. červenec 2017					
		výběr dodavatele	1. říjen 2017					
		uzavření smlouvy a předání staveniště dodavateli	31. říjen 2017					
		zahájení stavby - přípravné práce v žst. Plzeň hl. n., obvod Jižní předměstí	1. listopad 2017					
		ukončení hlavních stavebních prací v žst. Plzeň hl. n., obvod Jižní předměstí	22. květen 2019					
		konec dokončovacích prací v žst. Plzeň hl. n., obvod Jižní předměstí	10. červen 2019					
		zahájení připravných a stavebních prací v trati Plzeň - Cheb	1. listopad 2017					
		ukončení hlavních stavebních prací v trati Plzeň - Cheb	14. září 2019					
		konec dokončovacích prací v trati Plzeň - Cheb	14. září 2019					
		zahájení připravných a stavebních prací v trati Plzeň - Domažlice	1. listopad 2017					
		ukončení hlavních stavebních prací v trati Plzeň - Domažlice	14. září 2019					
		konec dokončovacích prací v trati Plzeň - Domažlice	14. září 2019					
		zahájení připravných a stavebních prací na vlečkách a v areálu Škoda Investment	1. listopad 2017					
		ukončení hlavních stavebních prací na vlečkách a v areálu Škoda Investment	14. září 2019					
		konec dokončovacích prací na vlečkách a v areálu Škoda Investment	14. září 2019					
		zahájení připravných a stavebních prací v Domažlické	1. listopad 2017					
		ukončení hlavních stavebních prací v Domažlické	14. září 2019					
		konec dokončovacích prací v Domažlické	14. září 2019					
Žst. Plzeň hl. n., obvod Jižní předměstí	0	**Přípravné a stavební práce**	1. listopad 2017	-	28. únor 2018	4,0	17,1	120
		Kolej 501z (směr Plzeň - Cheb, TK 2), 15 výluk 4h	6. listopad 2017	-	26. listopad 2017	0,7	3,0	21
		35-35-01 podpěry TV pro SP 1	6. listopad 2017	-	26. listopad 2017	0,7	3,0	21
		přístupy, kácení, plochy ZS, vytýčení IS	1. listopad 2017	-	28. únor 2018	4,0	17,1	120
	1	**Most Břeňkova, 1. část**	1. březen 2018	-	30. květen 2018	3,0	13,0	91
		koleje 501z + 511z + 512z (směr Plzeň - Cheb, obě koleje) 10 x 9.00 - 14.00 (vždy Pd)	31. březen 2018	-	13. duben 2018	0,5	2,0	14
		kolej 502z (směr Plzeň - Domažlice)	1. březen 2018	-	30. květen 2018	3,0	13,0	91
		Uzavírka ulice Břeňkova	31. březen 2018	-	30. květen 2018	2,0	8,7	61
		Práce na zabezpečovacím zařízení (viz TZ + příslušné PS)	1. březen 2018	-	30. květen 2018	3,0	13,0	91
		35-38-01 Silniční most v km 105,409 trati Plzeň – Domažlice (Břeňkova): tryskova injektáž jižní opěry	1. březen 2018	-	10. březen 2018	0,3	1,4	10
		35-38-01 Silniční most v km 105,409 trati Plzeň – Domažlice (Břeňkova): demolice NK	31. březen 2018	-	13. duben 2018	0,5	2,0	14
		35-38-01 Silniční most v km 105,409 trati Plzeň – Domažlice (Břeňkova): sanace jižní opěry + nový úložný práh jižní opěry	14. duben 2018	-	30. květen 2018	1,6	6,7	47
		36-39-24 Úpravy vodovodů v km 350,965 - Vodárna Plzeň: pod kolejí 511	1. březen 2018	-	31. březen 2018	1,0	4,4	31
		35-35-01 ŽST. Plzeň hl.n.,obvod Jižní předměstí, trakční vedení: kabelovod + neutrální pole Břeňkova	11. březen 2018	-	30. březen 2018	0,7	2,9	20
		35-35-02 ŽST. Plzeň hl.n.,obvod Jižní předměstí, úprava připojení SpS na trakční vedení	11. březen 2018	-	30. březen 2018	0,7	2,9	20
		35-36-02 Zast. Plzeň jižní předměstí, EOV: demontáž dle postupů svršku a mostů	1. březen 2018	-	31. březen 2018	1,0	4,4	31
		35-36-01 Zast. Plzeň jižní předměstí, úprava rozvodu nn a osvětlení: úpravy dle postupů svršku a mostů	1. březen 2018	-	31. březen 2018	1,0	4,4	31
		35-36-03 Zast. Plzeň jižní předměstí, DOUO: úpravy dle postupů svršku a mostů	1. březen 2018	-	31. březen 2018	1,0	4,4	31
		35-35-21 ŽST. Plzeň hl.n.,obvod Jižní předměstí, ukolejnění vodivých konstrukcí: úpravy dle postupů svršku a mostů	1. březen 2018	-	31. březen 2018	1,0	4,4	31
	2	**Most Břeňkova, 2. část**	31. květen 2018	-	29. září 2018	4,1	17,4	122
		koleje 501z + 511z + 512z (směr Plzeň - Cheb, obě koleje) 10 x výluka 9.00 - 14.00 20. - 31. 7. 2018 (nosníky NK), obě koleje: 10 x výluka noc 1. - 10. 8. 2018 (bednění NK), obě koleje: 10 x výluka noc 1. - 10. 9. 2018 (odbednění NK)	31. květen 2018	-	10. září 2018	3,4	14,7	103
		kolej 502z (směr Plzeň - Domažlice) 10 x výluka 9.00 - 14.00 20. - 31. 7. 2018 (nosníky NK), 10 x výluka noc 1. - 10. 8. 2018 (bednění NK), 10 x výluka noc 1. - 10. 9. 2018 (odbednění NK)	31. květen 2018	-	10. září 2018	3,4	14,7	103
		Uzavírka ulice Břeňkova	31. květen 2018	-	29. září 2018	4,1	17,4	122
		Práce na zabezpečovacím zařízení (viz TZ + příslušné PS)	31. květen 2018	-	29. září 2018	4,1	17,4	122
		35-33-41 Obvod Jižní předměstí, úrovňové křížení v km 105,245: staveništní přejezd	31. květen 2018	-	30. srpen 2018	3,1	13,1	92
		35-38-01 Silniční most v km 105,409 trati Plzeň – Domažlice (Břeňkova): nový úložný práh severní opěry, trysková injektáž severní opěry, nová NK, dokončení	31. květen 2018	-	29. srpen 2018	3,0	13,0	91
		35-38-51 Záruční zeď v km 105,329 - 105,403 trati Plzeň - Domažlice (vpravo): nutný prostup pro 35-37-02	31. květen 2018	-	29. srpen 2018	3,0	13,0	91
		36-39-24 Úpravy vodovodů v km 350,965 - Vodárna Plzeň: pod kolejí 512 a nástupištěm JP	31. květen 2018	-	30. červen 2018	1,0	4,4	31
		35-33-61 Obvod Jižní předměstí, kabelová trasa	30. srpen 2018	-	29. září 2018	1,0	4,4	31
		35-36-06 Silniční most v km 105,409 trati Plzeň – Domažlice (Břeňkova), přeložka kabelu VO SVSMP	30. srpen 2018	-	29. září 2018	1,0	4,4	31
		35-36-09 Přeložka kabelů DP v km 104,966 - 105,927	30. srpen 2018	-	29. září 2018	1,0	4,4	31
		35-37-21 Odvodnění komunikace Břeňkova km 105,400	30. srpen 2018	-	29. září 2018	1,0	4,4	31
		35-32-02 Úprava Břeňkovy ulice po výstavbě přemostění	30. srpen 2018	-	29. září 2018	1,0	4,4	31
		35-35-01 ŽST. Plzeň hl.n.,obvod Jižní předměstí, trakční vedení: úpravy dle postupů svršku a mostů	31. květen 2018	-	10. červenec 2018	1,4	5,9	41
		35-36-02 Zast. Plzeň jižní předměstí, EOV: demontáž dle postupů svršku a mostů	31. květen 2018	-	10. červenec 2018	1,4	5,9	41
		35-36-01 Zast. Plzeň jižní předměstí, úprava rozvodu nn a osvětlení: úpravy dle postupů svršku a mostů	31. květen 2018	-	10. červenec 2018	1,4	5,9	41
		35-36-03 Zast. Plzeň jižní předměstí, DOUO: úpravy dle postupů svršku a mostů	31. květen 2018	-	10. červenec 2018	1,4	5,9	41
		35-35-21 ŽST. Plzeň hl.n.,obvod Jižní předměstí, ukolejnění vodivých konstrukcí: úpravy dle postupů svršku a mostů	31. květen 2018	-	10. červenec 2018	1,4	5,9	41
	3	**Úpravy pro nový přesmyk**	30. září 2018	-	19. prosinec 2018	2,7	11,6	81
		koleje 511z + 512z (směr Plzeň - Cheb, kolej 1)	10. listopad 2018	-	19. listopad 2018	0,3	1,4	10
		výjezd z koleje 501z směr Plzeň - Cheb, kolej 2	20. listopad 2018	-	29. listopad 2018	0,3	1,4	10
		Práce na zabezpečovacím zařízení (viz TZ + příslušné PS)	14. říjen 2018	-	28. únor 2019	4,6	19,7	138
		35-33-41 Obvod Jižní předměstí, úrovňové křížení v km 105,245: staveništní přejezd: zřízení	29. listopad 2018	-	29. listopad 2018	0,0	0,1	1
		36-39-24 Úpravy vodovodů v km 350,965 - Vodárna Plzeň: pod kolejemi 501, 502, napojení Hálkova, uvedení do provozu	30. září 2018	-	19. říjen 2018	0,7	2,9	20
		35-35-01 ŽST. Plzeň hl.n.,obvod Jižní předměstí, trakční vedení: stavba základů v místech definitivního spodku	30. září 2018	-	30. říjen 2018	1,0	4,4	31
		35-36-02 Zast. Plzeň jižní předměstí, EOV: dokončení	30. září 2018	-	30. říjen 2018	1,0	4,4	31
		35-36-03 Zast. Plzeň jižní předměstí, DOUO: úpravy dle postupů svršku a mostů	30. září 2018	-	30. říjen 2018	1,0	4,4	31
		35-35-21 ŽST. Plzeň hl.n.,obvod Jižní předměstí, ukolejnění vodivých konstrukcí: úpravy dle postupů svršku a mostů	30. září 2018	-	30. říjen 2018	1,0	4,4	31
		35-36-01 Zast. Plzeň jižní předměstí, úprava rozvodu nn a osvětlení: úpravy dle postupů svršku a mostů	30. září 2018	-	30. říjen 2018	1,0	4,4	31
		36-39-25 Obvod Jižní předměstí - přesmyk - směr Domažlice, úpravy kabelů TA Systems	30. září 2018	-	30. říjen 2018	1,0	4,4	31
		36-39-13 Obvod Jižní předměstí - přesmyk - směr Cheb, úpravy kabelů ČEZnet a.s.	30. září 2018	-	30. říjen 2018	1,0	4,4	31
	ZP2	zimní přestávka 2	20. prosinec 2018	-	28. únor 2019	2,4	10,1	71
	4	**Úpravy pro nový přesmyk**	1. březen 2019	-	14. březen 2019	0,5	2,0	14
		koleje 501z + 512z (směr Plzeň - Cheb, kolej 2)	4. březen 2019	-	14. březen 2019	0,4	1,6	11
		koleje 501z + 502z (směr Plzeň - Domažlice)	1. březen 2019	-	14. březen 2019	0,5	2,0	14
		35-33-41 Obvod Jižní předměstí, úrovňové křížení v km 105,245: staveništní přejezd: likvidace	14. březen 2019	-	14. březen 2019	0,0	0,1	1
		35-35-01 ŽST. Plzeň hl.n.,obvod Jižní předměstí, trakční vedení: úpravy dle 36-33-02	1. březen 2019	-	14. březen 2019	0,5	2,0	14
		35-36-03 Zast. Plzeň jižní předměstí, DOUO: dokončení	1. březen 2019	-	14. březen 2019	0,5	2,0	14
		35-35-21 ŽST. Plzeň hl.n.,obvod Jižní předměstí, ukolejnění vodivých konstrukcí: dokončení	1. březen 2019	-	14. březen 2019	0,5	2,0	14
	5	**Úpravy pro nový přesmyk**	15. březen 2019	-	22. květen 2019	2,3	9,9	69
		kolej 511z (směr Plzeň - Cheb, kolej 1)	1. květen 2019	-	22. květen 2019	0,7	3,1	22
		35-35-01 ŽST. Plzeň hl.n.,obvod Jižní předměstí, trakční vedení: dokončení	15. březen 2019	-	9. duben 2019	0,9	3,7	26
		Likvidace zařízení staveniště A	10. duben 2019	-	29. duben 2019	0,7	2,9	20

Stavební úsek	Etapy	Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)	doba trvání (milníky)					
		Popis činnosti	od	-	do	měs.	týdny	dny
Trať Plzeň - Cheb		**Přípravné a stavební práce**	1. listopad 2017	-	28. únor 2018	4,0	17,1	120
	0	Plzeň - Cheb, TK 2, 15 výluk 4h	6. listopad 2017	-	26. listopad 2017	0,7	3,0	21
		Plzeň - Cheb, TK 2, tři výluky 4h (vložení neutrálního pole pod přesmykem)	23. únor 2018	-	25. únor 2018	0,1	0,4	3
		Plzeň - Cheb, TK 1, tři výluky 4h (vložení neutrálního pole pod přesmykem)	26. únor 2018	-	28. únor 2018	0,1	0,4	3
		36-35-03 Plzeň - Křimice, úprava trakčního vedení: podpěry TV pro SP 1	6. listopad 2017	-	26. listopad 2017	0,7	3,0	21
		36-35-03 Plzeň - Křimice, vložení neutrálních polí do kolejí 1, 2 pod přesmykem	23. únor 2018	-	28. únor 2018	0,2	0,9	6
		přístupy, kácení, plochy ZS, vytýčení IS	1. listopad 2017	-	28. únor 2018	4,0	17,1	120
		Práce na zabezpečovacím zařízení (viz TZ + příslušné PS)	1. listopad 2017	-	30. leden 2018	3,0	13,0	91
		Příprava na stavbu nového přesmyku	1. březen 2018	-	30. květen 2018	3,0	13,0	91
		Plzeň - Cheb, obě koleje 10 x 9.00 - 14.00 (vždy Pd)	20. březen 2018	-	31. březen 2018	0,4	1,7	12
		Plzeň - Cheb, obě koleje 14 x 00.00 - 4.00	31. březen 2018	-	13. duben 2018	0,5	2,0	14
		Plzeň - Cheb, kolej 1	1. březen 2018	-	9. květen 2018	2,3	10,0	70
		Plzeň - Cheb, kolej 2	10. květen 2018	-	29. květen 2018	0,7	2,9	20
		36-33-12 Trať Plzeň - Cheb, železniční spodek: kolej 511 km 350,774 - 351,580	1. březen 2018	-	30. březen 2018	1,0	4,3	30
		36-33-02 Trať Plzeň - Cheb, železniční svršek: 1A kolej 511 km 350,774 - 351,580 do def. stavu	1. březen 2018	-	30. březen 2018	1,0	4,3	30
		36-33-02 Trať Plzeň - Cheb, železniční svršek: 1B kolej 511/1 km 351,580 - 352,320 dočasná úprava	20. březen 2018	-	25. březen 2018	0,2	0,9	6
	1	36-33-02 Trať Plzeň - Cheb, železniční svršek: 1C kolej 2 km 351,700 - 352,230 dočasná úprava	10. květen 2018	-	15. květen 2018	0,2	0,9	6
		36-33-52 Trať Plzeň - Cheb, výstroj a značení trati: kolej 511 km 350,774 - 351,580	30. březen 2018	-	9. duben 2018	0,4	1,6	11
		35-38-42 Krakorec v km 351,374 trati Plzeň - Cheb (vlevo)	1. březen 2018	-	28. březen 2018	0,9	4,0	28
		35-38-44 Krakorec v km 351,450 trati Plzeň - Cheb (vlevo)	1. březen 2018	-	28. březen 2018	0,9	4,0	28
		35-38-52 Zárubní zeď 351,008 - 351,399	1. březen 2018	-	4. duben 2018	1,2	5,0	35
		36-39-26 Přeložky vodovodů v km 351,100: startovací jáma u koleje 511, protlak	1. březen 2018	-	31. březen 2018	1,0	4,4	31
		35-35-01 Plzeň - Křimice, úprava trakčního vedení: úpravy TV dle postupů svršku a mostů	1. březen 2018	-	30. květen 2018	3,0	13,0	91
		35-35-02 Plzeň - Křimice, provizorní úpravy ZOK - ČDT: úpravy dle postupů svršku a mostů	11. březen 2018	-	30. březen 2018	0,7	2,9	20
		36-35-21 Plzeň - Křimice, ukolejnění vodivých konstrukcí: úpravy dle postupů svršku a mostů	1. březen 2018	-	30. květen 2018	3,0	13,0	91
		Rekonstrukce koleje 2, 1. část	31. květen 2018	-	29. září 2018	4,1	17,4	122
		Plzeň - Cheb, kolej 2	31. květen 2018	-	1. srpen 2018	2,1	9,0	63
		Plzeň - Cheb, kolej 1	2. srpen 2018	-	29. září 2018	2,0	8,4	59
		Práce na zabezpečovacím zařízení (viz TZ + příslušné PS)	31. květen 2018	-	1. srpen 2018	2,1	9,0	63
		36-33-12 Trať Plzeň - Cheb, železniční spodek: kolej 501/2 úpravy 350,970 - 351,600	31. květen 2018	-	20. červen 2018	0,7	3,0	21
	2	36-33-02 Trať Plzeň - Cheb, železniční svršek: kolej 501/2 úpravy 350,970 - 351,600	31. květen 2018	-	20. červen 2018	0,7	3,0	21
		36-33-52 Trať Plzeň - Cheb, výstroj a značení trati: pro upravenou kolej 501/2	21. červen 2018	-	25. červen 2018	0,2	0,7	5
		36-38-51 Opěrná zeď v km 351,294 - 351,590 trati Plzeň - Cheb (vpravo)	31. květen 2018	-	11. červenec 2018	1,4	6,0	42
		35-35-01 Plzeň - Křimice, úprava trakčního vedení: úpravy TV dle postupů svršku a mostů	31. květen 2018	-	10. červenec 2018	1,4	5,9	41
		35-35-02 Plzeň - Křimice, provizorní úpravy ZOK - ČDT: úpravy dle postupů svršku a mostů	31. květen 2018	-	10. červenec 2018	1,4	5,9	41
		36-35-21 Plzeň - Křimice, ukolejnění vodivých konstrukcí: úpravy dle postupů svršku a mostů	31. květen 2018	-	10. červenec 2018	1,4	5,9	41
		Stavba nového přesmyku, 1. část	30. září 2018	-	19. prosinec 2018	2,7	11,6	81
		Plzeň - Cheb, kolej 1	10. listopad 2018	-	19. listopad 2018	0,3	1,4	10
		Plzeň - Cheb, kolej 2	20. listopad 2018	-	29. listopad 2018	0,3	1,4	10
		Plzeň - Cheb, obě koleje 00.00 - 4.00	29. listopad 2018	-	29. listopad 2018	0,0	0,1	1
	3	Práce na zabezpečovacím zařízení (viz TZ + příslušné PS)	30. září 2018	-	19. prosinec 2018	2,7	11,6	81
		36-33-02 Trať Plzeň - Cheb, železniční svršek: 3A posun polohy koleje 1 pod 37-38-01	10. listopad 2018	-	19. listopad 2018	0,3	1,4	10
		36-33-02 Trať Plzeň - Cheb, železniční svršek: 3B posun polohy koleje 2 pod 37-38-01	20. listopad 2018	-	29. listopad 2018	0,3	1,4	10
		35-35-01 Plzeň - Křimice, úprava trakčního vedení: úpravy TV dle postupů svršku a mostů	10. listopad 2018	-	29. listopad 2018	0,7	2,9	20
		35-35-02 Plzeň - Křimice, provizorní úpravy ZOK - ČDT: úpravy dle postupů svršku a mostů	10. listopad 2018	-	29. listopad 2018	0,7	2,9	20
		36-35-21 Plzeň - Křimice, ukolejnění vodivých konstrukcí: úpravy dle postupů svršku a mostů	10. listopad 2018	-	29. listopad 2018	0,7	2,9	20
	ZP2	zimní přestávka 2	20. prosinec 2018	-	28. únor 2019	2,4	10,1	71
		Stavba nového přesmyku, 2. část	1. březen 2019	-	14. březen 2019	0,5	2,0	14
		Plzeň - Cheb, kolej 2	4. březen 2019	-	14. březen 2019	0,4	1,6	11
	4	36-33-02 Trať Plzeň - Cheb, železniční svršek: kolej 512/2 definitivně výjezd z JP, km 351,580 - 352,320 dočasná úprava	4. březen 2019	-	14. březen 2019	0,4	1,6	11
		36-33-52 Trať Plzeň - Cheb, výstroj a značení trati: dle 36-33-02	14. březen 2019	-	14. březen 2019	0,0	0,1	1
		36-38-51 Opěrná zeď v km 351,294 - 351,590 trati Plzeň - Cheb (vpravo): demolice dočasné části z armovaných zemin	4. březen 2019	-	14. březen 2019	0,4	1,6	11
		36-35-21 Plzeň - Křimice, ukolejnění vodivých konstrukcí: úpravy dle postupů svršku a mostů	4. březen 2019	-	14. březen 2019	0,4	1,6	11
		Stavba nového přesmyku, 3. část	15. březen 2019	-	22. květen 2019	2,3	9,9	69
		Plzeň - Cheb, kolej 2	15. březen 2019	-	30. duben 2019	1,6	6,7	47
	5	Plzeň - Cheb, kolej 1	1. květen 2019	-	22. květen 2019	0,7	3,1	22
		36-33-12 Trať Plzeň - Cheb, železniční spodek: propojení kolejí 511 a 1 (JP)	1. květen 2019	-	22. květen 2019	0,7	3,1	22
		36-33-52 Trať Plzeň - Cheb, výstroj a značení trati: dle 36-33-02	18. květen 2019	-	22. květen 2019	0,2	0,7	5
		Definitivní kolej 1	23. květen 2019	-	31. červenec 2019	2,3	10,0	70
		Plzeň - Cheb, kolej 2	23. květen 2019	-	5. červen 2019	0,5	2,0	14
		Plzeň - Cheb, kolej 1	6. červen 2019	-	25. červenec 2019	1,7	7,1	50
		Plzeň - Cheb, kolej 2	26. červenec 2019	-	31. červenec 2019	0,2	0,9	6
		36-33-12 Trať Plzeň - Cheb, železniční spodek: definitivní kolej 1	16. červenec 2019	-	25. červenec 2019	0,3	1,4	10
	6	36-33-02 Trať Plzeň - Cheb, železniční svršek: definitivní kolej 1	21. červenec 2019	-	25. červenec 2019	0,2	0,7	5
		36-33-52 Trať Plzeň - Cheb, výstroj a značení trati: dle 36-33-02	21. červenec 2019	-	25. červenec 2019	0,2	0,7	5
		36-38-52 Zárubní zeď v km 351,640 - 351,962 trati Plzeň - Cheb (vlevo)	6. červen 2019	-	15. červenec 2019	1,3	5,7	40
		36-37-27 Posílení shybky v km 352,125 - Vodárna Plzeň	23. květen 2019	-	31. červenec 2019	2,3	10,0	70
		35-35-01 Plzeň - Křimice, úprava trakčního vedení: úpravy TV dle postupů svršku a mostů	26. červenec 2019	-	31. červenec 2019	0,2	0,9	6
		35-35-02 Plzeň - Křimice, provizorní úpravy ZOK - ČDT: úpravy dle postupů svršku a mostů	26. červenec 2019	-	31. červenec 2019	0,2	0,9	6
		36-35-21 Plzeň - Křimice, ukolejnění vodivých konstrukcí: úpravy dle postupů svršku a mostů	26. červenec 2019	-	31. červenec 2019	0,2	0,9	6
		Definitivní kolej 2	1. srpen 2019	-	14. září 2019	1,5	6,4	45
		Plzeň - Cheb, kolej 2	1. srpen 2019	-	14. září 2019	1,5	6,4	45
		Práce na zabezpečovacím zařízení (viz TZ + příslušné PS)	1. srpen 2019	-	14. září 2019	1,5	6,4	45
		36-33-12 Trať Plzeň - Cheb, železniční spodek: definitivní kolej 2	25. srpen 2019	-	14. září 2019	0,7	3,0	21
	7	36-33-02 Trať Plzeň - Cheb, železniční svršek: definitivní kolej 2	4. září 2019	-	14. září 2019	0,4	1,6	11
		36-33-52 Trať Plzeň - Cheb, výstroj a značení trati: dle 36-33-02	10. září 2019	-	14. září 2019	0,2	0,7	5
		36-38-53 Zárubní zeď v km 352,007 - 352,072 trati Plzeň - Cheb (vpravo)	1. srpen 2019	-	9. září 2019	1,3	5,7	40
		35-35-01 Plzeň - Křimice, úprava trakčního vedení: úpravy TV dle postupů svršku a mostů	31. srpen 2019	-	14. září 2019	0,5	2,1	15
		35-35-02 Plzeň - Křimice, provizorní úpravy ZOK - ČDT: úpravy dle postupů svršku a mostů	1. srpen 2019	-	14. září 2019	1,5	6,4	45
		36-35-21 Plzeň - Křimice, ukolejnění vodivých konstrukcí: úpravy dle postupů svršku a mostů	31. srpen 2019	-	14. září 2019	0,5	2,1	15
		Likvidace zařízení staveniště B	10. září 2019	-	14. září 2019	0,2	0,7	5

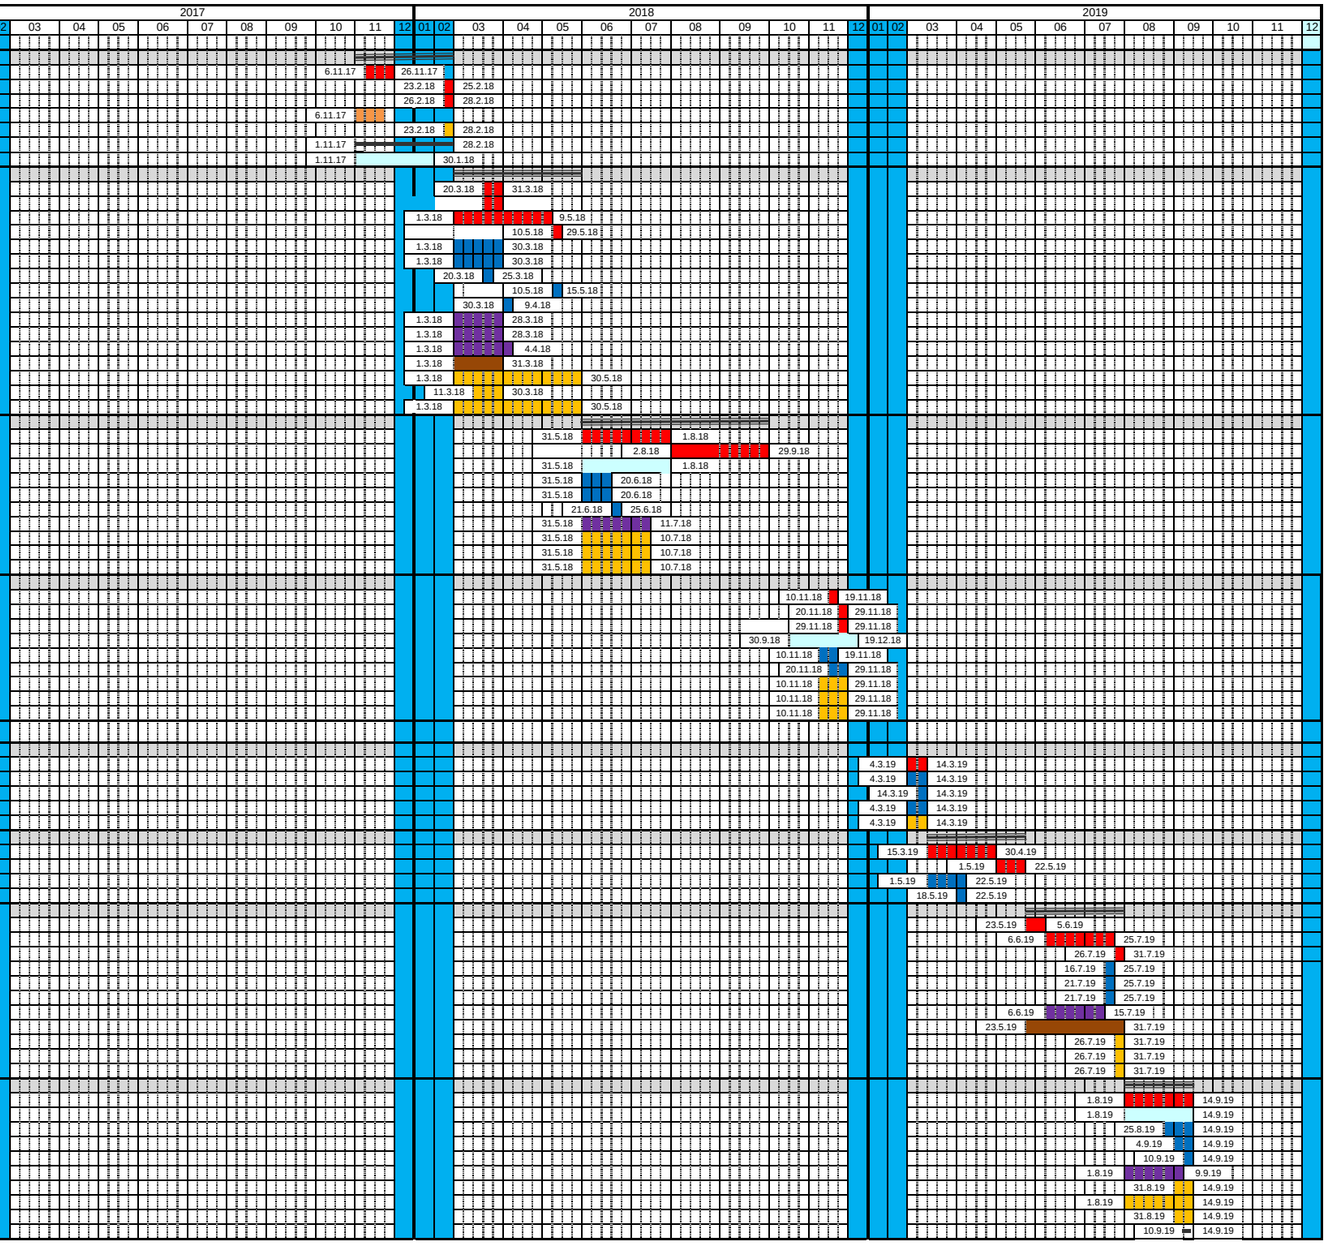

Stavební úsek	Etapy	Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)	doba trvání (milníky)					
		Popis činnosti	od	-	do	měs.	týdny	dny
Traťový úsek Plzeň - Domažlice	0	**Přípravné práce**	1. listopad 2017	-	28. únor 2018	4,0	17,1	120
		36-38-63 Kolektor v km 106,543 trati Plzeň - Domažlice: zahájení	1. listopad 2017	-	28. únor 2018	4,0	17,1	120
		přístupy, kácení, plochy ZS, vytýčení IS	1. listopad 2017	-	28. únor 2018	4,0	17,1	120
		Práce na zabezpečovacím zařízení (viz TZ + příslušné PS)	1. listopad 2017	-	30. leden 2018	3,0	13,0	91
	1	**1. přeložka**	1. březen 2018	-	30. květen 2018	3,0	13,0	91
		výluka traťové koleje	1. březen 2018	-	30. květen 2018	3,0	13,0	91
		36-33-11 Trať Plzeň - Domažlice, železniční spodek: 1. přeložka	1. březen 2018	-	30. květen 2018	3,0	13,0	91
		36-33-01 Trať Plzeň - Domažlice, železniční svršek: 1. přeložka včetně provis. mostu a přejezdu v km 112,500	1. březen 2018	-	30. květen 2018	3,0	13,0	91
		36-33-51 Trať Plzeň - Domažlice, výstroj a značení trati: pro 1. přeložku	20. květen 2018	-	30. květen 2018	0,4	1,6	11
		36-33-21 Zastávka Plzeň Skvrňany, nástupiště: původní - zkrácení	1. březen 2018	-	10. březen 2018	0,3	1,4	10
		36-38-01 Železniční most v km 106,164 trati Plzeň - Domažlice (tunel): demolice východní části stávajícího mostu	22. březen 2018	-	2. květen 2018	1,4	6,0	42
		36-38-01 Železniční most v km 106,164 trati Plzeň - Domažlice (tunel): pažení koleje vlečky	22. březen 2018	-	2. květen 2018	1,4	6,0	42
		36-38-01 Železniční most v km 106,164 trati Plzeň - Domažlice (tunel): stavba mostního provisoria pro domažlickou trať	3. květen 2018	-	9. květen 2018	0,2	1,0	7
		36-38-02 Železniční most v km 106,164 trati Plzeň - Domažlice (přesmyk): 1B nad kolejí 1: vložení PIŽMO	30. březen 2018	-	8. duben 2018	0,3	1,4	10
		36-38-02 Železniční most v km 106,164 trati Plzeň - Domažlice (přesmyk): 1C nad kolejí 2: vložení PIŽMO, demolice NK	16. květen 2018	-	29. květen 2018	0,5	2,0	14
		36-38-03 Železniční most v km 106,673 trati Plzeň – Domažlice (podchod zast. Skvrňany): zahájení	1. březen 2018	-	30. květen 2018	3,0	13,0	91
		36-38-04 Železniční most v km 107,541 (ev. km 113,580) trati Plzeň – Domažlice, demolice: stavba kanalisace, příprava na zásyp pod kolejí 982, zásyp pod kolejí 982	1. březen 2018	-	30. květen 2018	3,0	13,0	91
		36-38-31 Železniční propustek v km 107,821 (ev. km 113,874) trati Plzeň - Domažlice	1. březen 2018	-	9. květen 2018	2,3	10,0	70
		36-38-32 Železniční propustek v km 107,909 (ev. km 113,962) trati Plzeň - Domažlice	6. březen 2018	-	11. duben 2018	1,2	5,3	37
		37-38-51 Opěrná zeď v km 105,840 - 106,110 trati Plzeň - Domažlice (vpravo), armování a betonáž části s pilotovým založením po 30. 4. 2018 (demolice původní zdi 37-38-52, přeložka koleje 101)	1. březen 2018	-	31. květen 2018	3,1	13,1	92
		36-38-55 Opěrná zeď v km 106,187 - 106,340 trati Plzeň - Domažlice, sanace (vpravo)	1. březen 2018	-	9. květen 2018	2,3	10,0	70
		36-38-63 Kolektor v km 106,543 trati Plzeň - Domažlice: dokončení	1. březen 2018	-	7. březen 2018	0,2	1,0	7
		36-36-06 Propustek v km 113,874, přeložky kabelů DP	11. květen 2018	-	20. květen 2018	0,3	1,4	10
		36-36-06 Obvod Jižní předměstí - přesmyk - směr Domažlice, úpravy kabelů UPC: Nová Hospoda	11. květen 2018	-	20. květen 2018	0,3	1,4	10
		298-36-17 Obvod Jižní předměstí - přesmyk - směr Domažlice, úpravy kabelů Plzeňská energetika: provisorní přeložka	1. březen 2018	-	31. březen 2018	1,0	4,4	31
		35-37-02 Úpravy vodovodů v km 350,965 - Vodárna Plzeň	1. březen 2018	-	31. březen 2018	1,0	4,4	31
		35-37-03 Přeložky vodovodů v km 351,100	1. březen 2018	-	31. březen 2018	1,0	4,4	31
		298-37-02 Úprava vodovodu DN 80 v ulici Na výspě, Na stráních a Na pile - Vodárna Plzeň	1. březen 2018	-	31. březen 2018	1,0	4,4	31
		298-37-04 Přeložka vodovodu DN 150 km 0,760-0,957 - Vodárna Plzeň	1. březen 2018	-	31. březen 2018	1,0	4,4	31
		298-32-14 Stanoviště pro novostavbu pro ZZ, směr Vejprnice	11. květen 2018	-	20. květen 2018	0,3	1,4	10
	2	**2. přeložka**	31. květen 2018	-	29. září 2018	4,1	17,4	122
		výluka traťové koleje	20. září 2018	-	29. září 2018	0,3	1,4	10
		Práce na zabezpečovacím zařízení (viz TZ + příslušné PS)	31. květen 2018	-	29. září 2018	4,1	17,4	122
		36-33-11 Trať Plzeň - Domažlice, železniční spodek: 2. přeložka	31. červenec 2018	-	29. září 2018	2,0	8,7	61
		36-33-01 Trať Plzeň - Domažlice, železniční svršek: 2. přeložka	30. srpen 2018	-	29. září 2018	1,0	4,4	31
		36-33-51 Trať Plzeň - Domažlice, výstroj a značení trati: pro 2. přeložku	20. září 2018	-	29. září 2018	0,3	1,4	10
		36-33-21 Zastávka Plzeň Skvrňany, nástupiště: nová - zahájení	1. červenec 2018	-	29. září 2018	3,0	13,0	91
		36-38-01 Železniční most v km 106,164 trati Plzeň - Domažlice (tunel): NK východní část, demolice západní části	31. květen 2018	-	29. září 2018	4,1	17,4	122
		36-38-02 Železniční most v km 106,164 trati Plzeň - Domažlice (přesmyk): 2A nad kolejí 2: stavba opěry a stojky	31. květen 2018	-	1. srpen 2018	2,1	9,0	63
		36-38-02 Železniční most v km 106,164 trati Plzeň - Domažlice (přesmyk): 2B nad kolejí 1: stavba opěry	2. srpen 2018	-	29. září 2018	2,0	8,4	59
		36-38-03 Železniční most v km 106,673 trati Plzeň – Domažlice (podchod zast. Skvrňany): dokončení	31. květen 2018	-	31. srpen 2018	3,1	13,3	93
		36-38-04 Železniční most v km 107,541 (ev. km 113,580) trati Plzeň – Domažlice, demolice: zásyp pod kolejí 982	31. květen 2018	-	29. září 2018	4,1	17,4	122
		36-34-40 PhS, Skvrňany	31. květen 2018	-	30. červen 2018	1,0	4,4	31
		36-34-30 Zastřešení nástupišť, Skvrňany	31. červenec 2018	-	30. srpen 2018	1,0	4,4	31
		36-34-31 Zastřešení podchodu zastávka Plzeň-Skvrňany	31. červenec 2018	-	30. srpen 2018	1,0	4,4	31
		36-36-05 Podchod v km 106,673 trati Plzeň - Domažlice, zast. Skvrňany, osvětlení	31. srpen 2018	-	29. září 2018	1,0	4,3	30
	3	**definitivní koleje, 1. část**	30. září 2018	-	19. prosinec 2018	2,7	11,6	81
		Práce na zabezpečovacím zařízení (viz TZ + příslušné PS)	30. září 2018	-	19. prosinec 2018	2,7	11,6	81
		36-33-11 Trať Plzeň - Domažlice, železniční spodek: def. kolej 502/982 km 105,175 - 106,1, def. kolej 501 km 105,5 - 105,7, def. kolej 982 přesmyk - Nová Hospoda	30. listopad 2018	-	19. prosinec 2018	0,7	2,9	20
		36-33-01 Trať Plzeň - Domažlice, železniční svršek: def. kolej 502/982 km 105,175 - 106,1, def. kolej 501 km 105,5 - 105,7, def. kolej 982 přesmyk - Nová Hospoda	30. listopad 2018	-	19. prosinec 2018	0,7	2,9	20
		36-33-51 Trať Plzeň - Domažlice, výstroj a značení trati: pro rozsah 36-33-01	20. prosinec 2018	-	21. prosinec 2018	0,1	0,3	2
		36-33-21 Zastávka Plzeň Skvrňany, nástupiště: nová - dokončení	30. září 2018	-	30. říjen 2018	1,0	4,4	31
		36-38-01 Železniční most v km 106,164 trati Plzeň - Domažlice (tunel): nová NK západní části	30. září 2018	-	14. prosinec 2018	2,5	10,9	76
		36-38-02 Železniční most v km 106,164 trati Plzeň - Domažlice (přesmyk): nad oběma kolejemi: postupně vybednění, zřízení NK, dokončovací práce (odbedňování postupně nad kolejí 1 a 2)	30. září 2018	-	29. listopad 2018	2,0	8,7	61
		35-38-43 Krakorec v km 105,790 trati Plzeň - Domažlice (vpravo)	30. září 2018	-	30. říjen 2018	1,0	4,4	31
		36-38-41 Krakorec v km 106,481 trati Plzeň - Domažlice (vlevo)	30. září 2018	-	30. říjen 2018	1,0	4,4	31
		36-38-62 Kolektor v km 106,917 trati Plzeň - Domažlice: pod starou Domažlickou a novou trati	30. září 2018	-	29. listopad 2018	2,0	8,7	61
		36-33-61 Zastávka Plzeň-Skvrňany, kabelová trasa	31. říjen 2018	-	30. listopad 2018	1,0	4,4	31
		35-34-70 Oplocení, Domažlická, p.č. 9017 (nástupiště Skvrňany)	31. říjen 2018	-	30. listopad 2018	1,0	4,4	31
		36-34-81 Zastávka Plzeň-Skvrňany, orientační systém pro cestující	31. říjen 2018	-	30. listopad 2018	1,0	4,4	31
		36-35-01 Plzeň -Skvrňany, trakční vedení: stavba základů v místech definitivního spodku	31. říjen 2018	-	30. listopad 2018	1,0	4,4	31
		36-36-01 Zast. Plzeň Skvrňany kabelový rozvod nn a osvětlení	31. říjen 2018	-	30. listopad 2018	1,0	4,4	31
	ZP2	zimní přestávka 2	20. prosinec 2018	-	28. únor 2019	2,4	10,1	71
	4	**3. přeložka, odbočka Nová Hospoda 1. část**	1. březen 2019	-	14. březen 2019	0,5	2,0	14
		výluka traťové koleje	1. březen 2019	-	14. březen 2019	0,5	2,0	14
		36-33-11 Trať Plzeň - Domažlice, železniční spodek: def. kolej 502/982 km 105,175 - 106,1, def. kolej 501 km 105,5 - 105,7, def. kolej 982 přesmyk - Nová Hospoda	1. březen 2019	-	14. březen 2019	0,5	2,0	14
		36-33-01 Trať Plzeň - Domažlice, železniční svršek: 3. přeložka 106,1 - 106,4, demontáž původní traťové koleje přesmyk - N. Hospoda, výhybka Nová Hospoda	1. březen 2019	-	14. březen 2019	0,5	2,0	14
		36-33-51 Trať Plzeň - Domažlice, výstroj a značení trati: pro rozsah 36-33-01	11. březen 2019	-	14. březen 2019	0,1	0,6	4
		36-38-01 Železniční most v km 106,164 trati Plzeň - Domažlice (tunel): demontáž provisoria	1. březen 2019	-	14. březen 2019	0,5	2,0	14
	5	**Demontáž původní traťové koleje**	15. březen 2019	-	22. květen 2019	2,3	9,9	69
		36-33-01 Trať Plzeň - Domažlice, železniční svršek: demontáž původní traťové koleje přesmyk - N. Hospoda	15. březen 2019	-	9. duben 2019	0,9	3,7	26
		36-33-51 Trať Plzeň - Domažlice, výstroj a značení trati: pro rozsah 36-33-01	9. duben 2019	-	9. duben 2019	0,0	0,1	1
		36-33-21 Zastávka Plzeň Skvrňany, nástupiště: demolice původního nástupiště	10. duben 2019	-	30. duben 2019	0,7	3,0	21
		36-38-01 Železniční most v km 106,164 trati Plzeň - Domažlice (tunel): dokončení prostoru bývalého provisoria	15. březen 2019	-	15. květen 2019	2,1	8,9	62
		36-38-03 Železniční most v km 106,673 trati Plzeň – Domažlice (podchod zast. Skvrňany): demolice původního podchodu	10. duben 2019	-	30. duben 2019	0,7	3,0	21
		36-38-04 Železniční most v km 107,541 (ev. km 113,580) trati Plzeň – Domažlice, demolice: dokončení pod kolejí 981	15. březen 2019	-	12. květen 2019	2,0	8,4	59
		36-38-56 Opěrná zeď v km 106,910 - 107,001 trati Plzeň - Domažlice (vlevo): zahájení	22. duben 2019	-	22. květen 2019	1,0	4,4	31
		36-38-62 Kolektor v km 106,917 trati Plzeň - Domažlice: pod novou Emingerovou a starou trati	15. březen 2019	-	14. duben 2019	1,0	4,4	31
		36-35-01 Plzeň -Skvrňany, trakční vedení: stavba základů v místech definitivního spodku	15. březen 2019	-	22. květen 2019	2,3	9,9	69
		36-39-26 Obvod Jižní předměstí - přesmyk - směr Domažlice, úpravy kabelů Plzeňská energetika: přeložka do kolektoru, přeložka v areálu ŠI	15. duben 2019	-	30. duben 2019	0,5	2,3	16
	6	**Definitivní kolej 1 Plzeň-Skvrňany - odb. Nová Hospoda**	23. květen 2019	-	31. červenec 2019	2,3	10,0	70
		Plzeň - Domažlice, kolej 501/981	23. květen 2019	-	31. červenec 2019	2,3	10,0	70
		36-33-11 Trať Plzeň - Domažlice, železniční spodek: definitivní kolej 501/981 zastávka P-Skvrňany - Nová Hospoda	23. květen 2019	-	10. červenec 2019	1,6	7,0	49
		36-33-01 Trať Plzeň - Domažlice, železniční svršek: definitivní kolej 501/981 zastávka P-Skvrňany - Nová Hospoda	23. červen 2019	-	31. červenec 2019	1,3	5,6	39
		36-33-51 Trať Plzeň - Domažlice, výstroj a značení trati: pro rozsah 36-33-01	26. červenec 2019	-	31. červenec 2019	0,2	0,9	6
		36-38-56 Opěrná zeď v km 106,910 - 107,001 trati Plzeň - Domažlice (vlevo): dokončení	23. květen 2019	-	22. červen 2019	1,0	4,4	31
		36-37-22 Plzeň Skvrňany - dešťová kanalizace	23. květen 2019	-	22. červen 2019	1,0	4,4	31
		36-34-70 Oplocení, Skvrňany	16. červenec 2019	-	31. červenec 2019	0,5	2,3	16
		36-35-01 Plzeň -Skvrňany, trakční vedení: stavba základů v místech definitivního spodku	26. červenec 2019	-	31. červenec 2019	0,2	0,9	6
		36-35-02 Plzeň -Skvrňany, připojení transf. na trakční vedení	26. červenec 2019	-	31. červenec 2019	0,2	0,9	6
		36-36-02 Plzeň, obvod Nová Hospoda, DOUO	23. červen 2019	-	31. červenec 2019	1,3	5,6	39
		36-36-03 Plzeň, obvod Nová Hospoda, EOV	23. červen 2019	-	31. červenec 2019	1,3	5,6	39
		Likvidace zařízení staveniště C, D	26. červenec 2019	-	31. červenec 2019	0,2	0,9	6
	7	**Definitivní koleje Jižní Předměstí - Plzeň-Skvrňany**	1. srpen 2019	-	14. září 2019	1,5	6,4	45
		Plzeň - Domažlice, kolej 501/981	1. srpen 2019	-	15. srpen 2019	0,5	2,1	15
		Plzeň - Domažlice, kolej 502/982	16. srpen 2019	-	9. září 2019	0,8	3,6	25
		Práce na zabezpečovacím zařízení (viz TZ + příslušné PS)	1. srpen 2019	-	14. září 2019	1,5	6,4	45
		36-33-11 Trať Plzeň - Domažlice, železniční spodek: 7A definitivní kolej 501/981 přesmyk - zastávka P-Skvrňany	1. srpen 2019	-	10. srpen 2019	0,3	1,4	10
		36-33-11 Trať Plzeň - Domažlice, železniční spodek: 7B definitivní kolej 502/982 přesmyk - zastávka P-Skvrňany	16. srpen 2019	-	26. srpen 2019	0,4	1,6	11
		36-33-01 Trať Plzeň - Domažlice, železniční svršek: 7A definitivní kolej 501/981 přesmyk - zastávka P-Skvrňany	6. srpen 2019	-	15. srpen 2019	0,3	1,4	10
		36-33-01 Trať Plzeň - Domažlice, železniční svršek: 7B definitivní kolej 502/982 přesmyk - zastávka P-Skvrňany	21. srpen 2019	-	9. září 2019	0,7	2,9	20
		36-33-51 Trať Plzeň - Domažlice, výstroj a značení trati: pro rozsah 36-33-01	10. září 2019	-	14. září 2019	0,2	0,7	5
		36-35-01 Plzeň -Skvrňany, trakční vedení: dokončení	1. srpen 2019	-	14. září 2019	1,5	6,4	45
		36-35-22 Plzeň -Skvrňany, ukolejnění vodivých konstrukcí	1. srpen 2019	-	14. září 2019	1,5	6,4	45
		Likvidace zařízení staveniště B	10. září 2019	-	14. září 2019	0,2	0,7	5

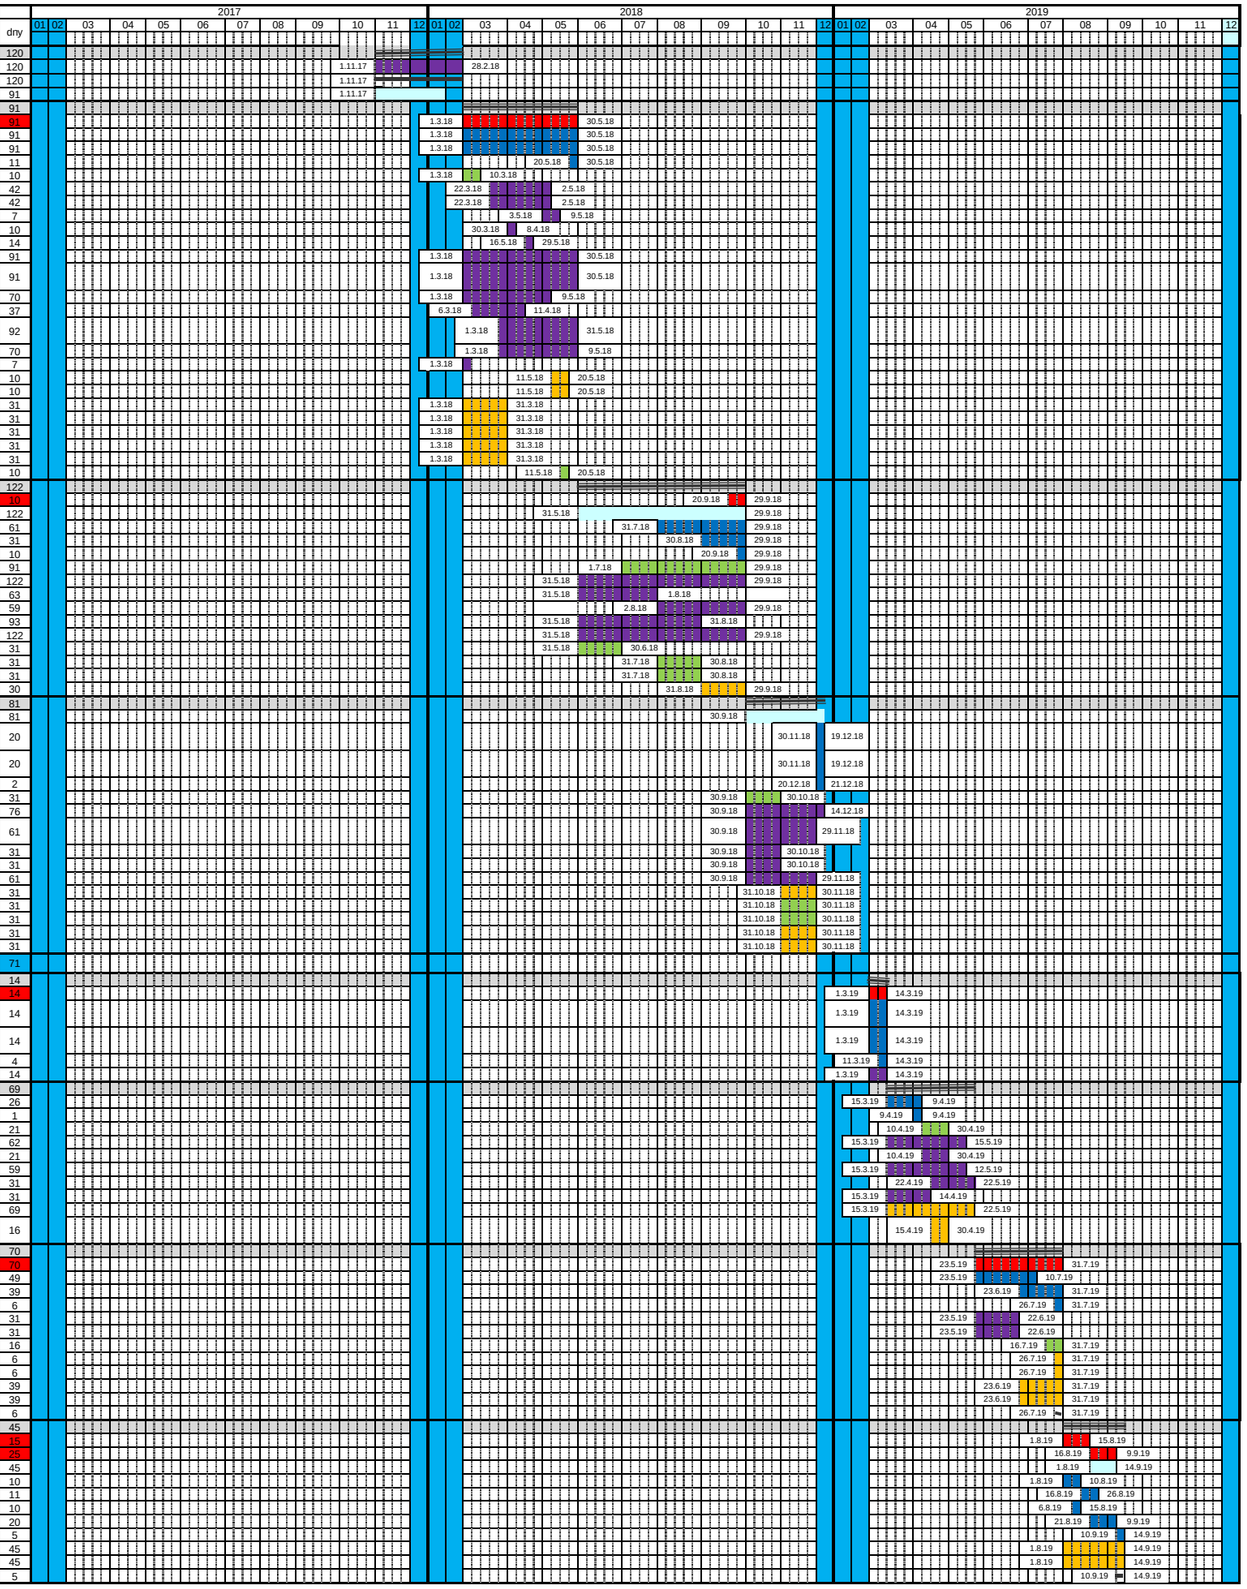

Stavební úsek	Etapy	Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy) / Popis činnosti	doba trvání (milníky) od		do	měs.	týdny	dny
Vlečky + areál ŠKODA INVESTMENT		**Přípravné a stavební práce**	1. listopad 2017	-	21. listopad 2017	0,7	3,0	21
	0	37-37-02 Přeložka vodovodů na Faltusově mostu a hlavního přivaděče DN 500 - Plzeňská energetika: dočasná přeložka u rampy Faltusova mostu	1. listopad 2017	-	21. listopad 2017	0,7	3,0	21
		přístupy, kácení, plochy ZS, vytýčení IS	1. listopad 2017	-	21. listopad 2017	0,7	3,0	21
	ZP1	zimní přestávka 1	22. listopad 2017	-	28. únor 2018	3,3	14,1	99
		Úpravy v prostoru Faltusova mostu, demontáž IT Bohemia	1. březen 2018	-	30. květen 2018	3,0	13,0	91
		vlečka IT Bohemia	1. březen 2018	-	30. květen 2018	3,0	13,0	91
		vlečka ŠKODA INVESTMENT, koleje 101 + 103 (21 x 8h)	1. březen 2018	-	21. březen 2018	0,7	3,0	21
		vlečka ŠKODA INVESTMENT, koleje pod spirálovou rampou Faltusova mostu	1. březen 2018	-	21. březen 2018	0,7	3,0	21
		vlečka ŠKODA INVESTMENT, koleje v prostoru zdi SO 37-38-52	16. březen 2018	-	8. červen 2018	2,8	12,1	85
		vlečka ŠKODA INVESTMENT, kolej 109	1. březen 2018	-	30. květen 2018	3,0	13,0	91
	1	37-33-01 Vlečkové koleje Škoda, železniční svršek: kolej podél zdi 37-35-51 37-38-52 do def. stavu, kolej 101 do nového stavu nad zdí 37-38-52 a v tunelu, prostor nových výhybek 14 - 17, náhrada původních výhybek 14, 18 kolejovými poli	1. březen 2018	-	21. březen 2018	0,7	3,0	21
		37-33-11 Vlečkové koleje Škoda, železniční spodek	1. březen 2018	-	21. březen 2018	0,7	3,0	21
		37-33-02 Vlečkové koleje IT Bohemia, železniční svršek: demontáž	1. březen 2018	-	10. březen 2018	0,3	1,4	10
		37-38-02 Most v km 106,366 trati Plzeň - Domažlice (Faltusův most): demolice spirály, nutno zachovat armokomoru	1. březen 2018	-	21. březen 2018	0,7	3,0	21
		36-38-55.1 Přeložka osvětlení Škoda Investment: demolice stávajícího osvětlení	1. březen 2018	-	21. březen 2018	0,7	3,0	21
		37-38-52 Opěrná zeď v km 0,654 - 0,724 vlečky Škoda Plzeň (vpravo)	10. březen 2018	-	28. duben 2018	1,7	7,1	50
		36-38-61 Kolektor v km 351,906 trati Plzeň - Cheb (místo Faltuse): zahájení	1. březen 2018	-	30. květen 2018	3,0	13,0	91
		36-37-03 Plzeň - Domažlice, zrušení stávajících přípojek km 106,100 - 106,240 - Vodárna Plzeň	1. březen 2018	-	21. březen 2018	0,7	3,0	21
		36-37-04 Novostavba pro Sokol - přípojky vody	11. březen 2018	-	30. březen 2018	0,7	2,9	20
		298-37-01 Úprava vodovodů DN 500 km 0,410 - Plzeňská Energetika	11. březen 2018	-	30. březen 2018	0,7	2,9	20
		Úpravy v prostoru Faltusova mostu	31. květen 2018	-	29. září 2018	4,1	17,4	122
		vlečka IT Bohemia	31. květen 2018	-	29. září 2018	4,1	17,4	122
		vlečka ŠKODA INVESTMENT, kolej 109	31. květen 2018	-	29. září 2018	4,1	17,4	122
	2	36-38-61 Kolektor v km 351,906 trati Plzeň - Cheb (místo Faltuse): dokončení	31. květen 2018	-	17. září 2018	3,7	15,7	110
		36-36-07 Plzeň Skvrňany, měrný objekt Škoda, Emingerova, přípojka NN PE a.s.	30. srpen 2018	-	29. září 2018	1,0	4,4	31
		37-37-02 Přeložka vodovodů na Faltusově mostu a hlavního přivaděče DN 500 - Plzeňská energetika	18. září 2018	-	29. září 2018	0,4	1,7	12
		Napojení Jižní Předměstí	30. září 2018	-	19. prosinec 2018	2,7	11,6	81
		vlečka IT Bohemia	30. září 2018	-	28. únor 2019	5,1	21,7	152
		vlečka ŠKODA INVESTMENT, kolej 109	30. září 2018	-	19. prosinec 2018	2,7	11,6	81
		vlečka ŠKODA INVESTMENT, napojení "Sever"	31. říjen 2018	-	30. listopad 2018	1,0	4,4	31
		37-33-01 Vlečkové koleje Škoda, železniční svršek: napojení Jižní Předměstí	31. říjen 2018	-	30. listopad 2018	1,0	4,4	31
		37-33-11 Vlečkové koleje Škoda, železniční spodek: napojení Jižní Předměstí	31. říjen 2018	-	30. listopad 2018	1,0	4,4	31
		37-38-01 Železniční most v km 1,003 vlečky Škoda Plzeň: 3A nad kolejí 1: vložení PIŽMO	14. listopad 2018	-	19. listopad 2018	0,2	0,9	6
	3	37-38-01 Železniční most v km 1,003 vlečky Škoda Plzeň: 3B nad kolejí 2: vložení PIŽMO	24. listopad 2018	-	29. listopad 2018	0,2	0,9	6
		37-38-02 Most v km 106,366 trati Plzeň - Domažlice (Faltusův most): odstrojení 1. část (sever, mimo koleje)	31. říjen 2018	-	4. listopad 2018	0,2	0,7	5
		37-38-02 Most v km 106,366 trati Plzeň - Domažlice (Faltusův most): odstrojení 2. část (střed, nad domažlickou tratí a vlečkou)	5. listopad 2018	-	14. listopad 2018	0,3	1,4	10
		37-38-02 Most v km 106,366 trati Plzeň - Domažlice (Faltusův most): odstrojení 3. část (jih, nad kolejí 1 a jižně od ní)	15. listopad 2018	-	19. listopad 2018	0,2	0,7	5
		37-38-02 Most v km 106,366 trati Plzeň - Domažlice (Faltusův most): demontáž odstrojené konstrukce	24. listopad 2018	-	29. listopad 2018	0,2	0,9	6
		36-38-55.1 Přeložka osvětlení Škoda Investment: montáž nového osvětlení	5. listopad 2018	-	30. listopad 2018	0,9	3,7	26
	ZP2	zimní přestávka 2	20. prosinec 2018	-	28. únor 2019	2,4	10,1	71
		Dočasná přeložka spojovací koleje	1. březen 2019	-	14. březen 2019	0,5	2,0	14
		vlečka IT Bohemia	1. březen 2019	-	14. březen 2019	0,5	2,0	14
		vlečka ŠKODA INVESTMENT, napojení "Jih"	1. březen 2019	-	2. březen 2019	0,1	0,3	2
	4	vlečka ŠKODA INVESTMENT, kolej 109	1. březen 2019	-	14. březen 2019	0,5	2,0	14
		vlečka ŠKODA INVESTMENT, kolej 101 (12 x 8h)	3. březen 2019	-	14. březen 2019	0,4	1,7	12
		37-38-02 Most v km 106,366 trati Plzeň - Domažlice (Faltusův most): demolice opěr a armokomory	1. březen 2019	-	15. březen 2019	0,5	2,1	15
		37-33-01 Vlečkové koleje Škoda, železniční svršek: přeložka na most 36-38-01	1. březen 2019	-	14. březen 2019	0,5	2,0	14
		37-33-11 Vlečkové koleje Škoda, železniční spodek: přeložka na most 36-38-01	1. březen 2019	-	14. březen 2019	0,5	2,0	14
		Definitivní přeložka spojovací koleje, zahájení	15. březen 2019	-	22. květen 2019	2,3	9,9	69
		vlečka IT Bohemia	15. březen 2019	-	22. květen 2019	2,3	9,9	69
	5	vlečka ŠKODA INVESTMENT, kolej 109	15. březen 2019	-	22. květen 2019	2,3	9,9	69
		37-38-01 Železniční most v km 1,003 vlečky Škoda Plzeň: 5A nad oběma kolejemi demolice NK	15. březen 2019	-	30. březen 2019	0,5	2,3	16
		37-38-01 Železniční most v km 1,003 vlečky Škoda Plzeň: 5B nad kolejí 2: demolice opěry a stojky, stavba opěry	30. březen 2019	-	30. duben 2019	1,1	4,6	32
		37-38-01 Železniční most v km 1,003 vlečky Škoda Plzeň: 5C nad kolejí 1: demolice opěry, stavba opěry a stojky	1. květen 2019	-	22. květen 2019	0,7	3,1	22
		Definitivní přeložka spojovací koleje, dokončení, vlečka IT Bohemia	23. květen 2019	-	31. červenec 2019	2,3	10,0	70
		vlečka IT Bohemia	23. květen 2019	-	31. červenec 2019	2,3	10,0	70
		vlečka ŠKODA INVESTMENT, kolej 109	23. květen 2019	-	31. červenec 2019	2,3	10,0	70
		vlečka ŠKODA INVESTMENT, kolej 101	29. červenec 2019	-	31. červenec 2019	0,1	0,4	3
	6	37-33-01 Vlečkové koleje Škoda, železniční svršek: definitivní kolej 101	26. červenec 2019	-	31. červenec 2019	0,2	0,9	6
		37-33-11 Vlečkové koleje Škoda, železniční spodek: definitivní kolej 101	26. červenec 2019	-	31. červenec 2019	0,2	0,9	6
		37-33-02 Vlečkové koleje IT Bohemia, železniční svršek: stavba nové vlečky	23. červen 2019	-	31. červenec 2019	1,3	5,6	39
		37-33-12 Vlečkové koleje IT Bohemia, železniční spodek: stavba nové vlečky	23. květen 2019	-	30. červen 2019	1,3	5,6	39
		37-38-01 Železniční most v km 1,003 vlečky Škoda Plzeň: 6A nad kolejí 2: vybednění	23. květen 2019	-	5. červen 2019	0,5	2,0	14
		37-38-01 Železniční most v km 1,003 vlečky Škoda Plzeň: 6B nad kolejí 1: vybednění. Nad oběma kolejemi: stavba NK a dokončovací práce. Nad kolejí 1 odbednění, nad kolejí 2 odbednění	6. červen 2019	-	31. červenec 2019	1,9	8,0	56
		Definitivní přeložka spojovací koleje, dokončení, vlečka IT Bohemia	1. srpen 2019	-	14. září 2019	1,5	6,4	45
	7	vlečka ŠKODA INVESTMENT, kolej 109	1. srpen 2019	-	14. září 2019	1,5	6,4	45
		37-33-01 Vlečkové koleje Škoda, železniční svršek: definitivní napojení koleje 109	9. září 2019	-	14. září 2019	0,2	0,9	6
		37-33-11 Vlečkové koleje Škoda, železniční spodek: definitivní napojení koleje 109	9. září 2019	-	14. září 2019	0,2	0,9	6

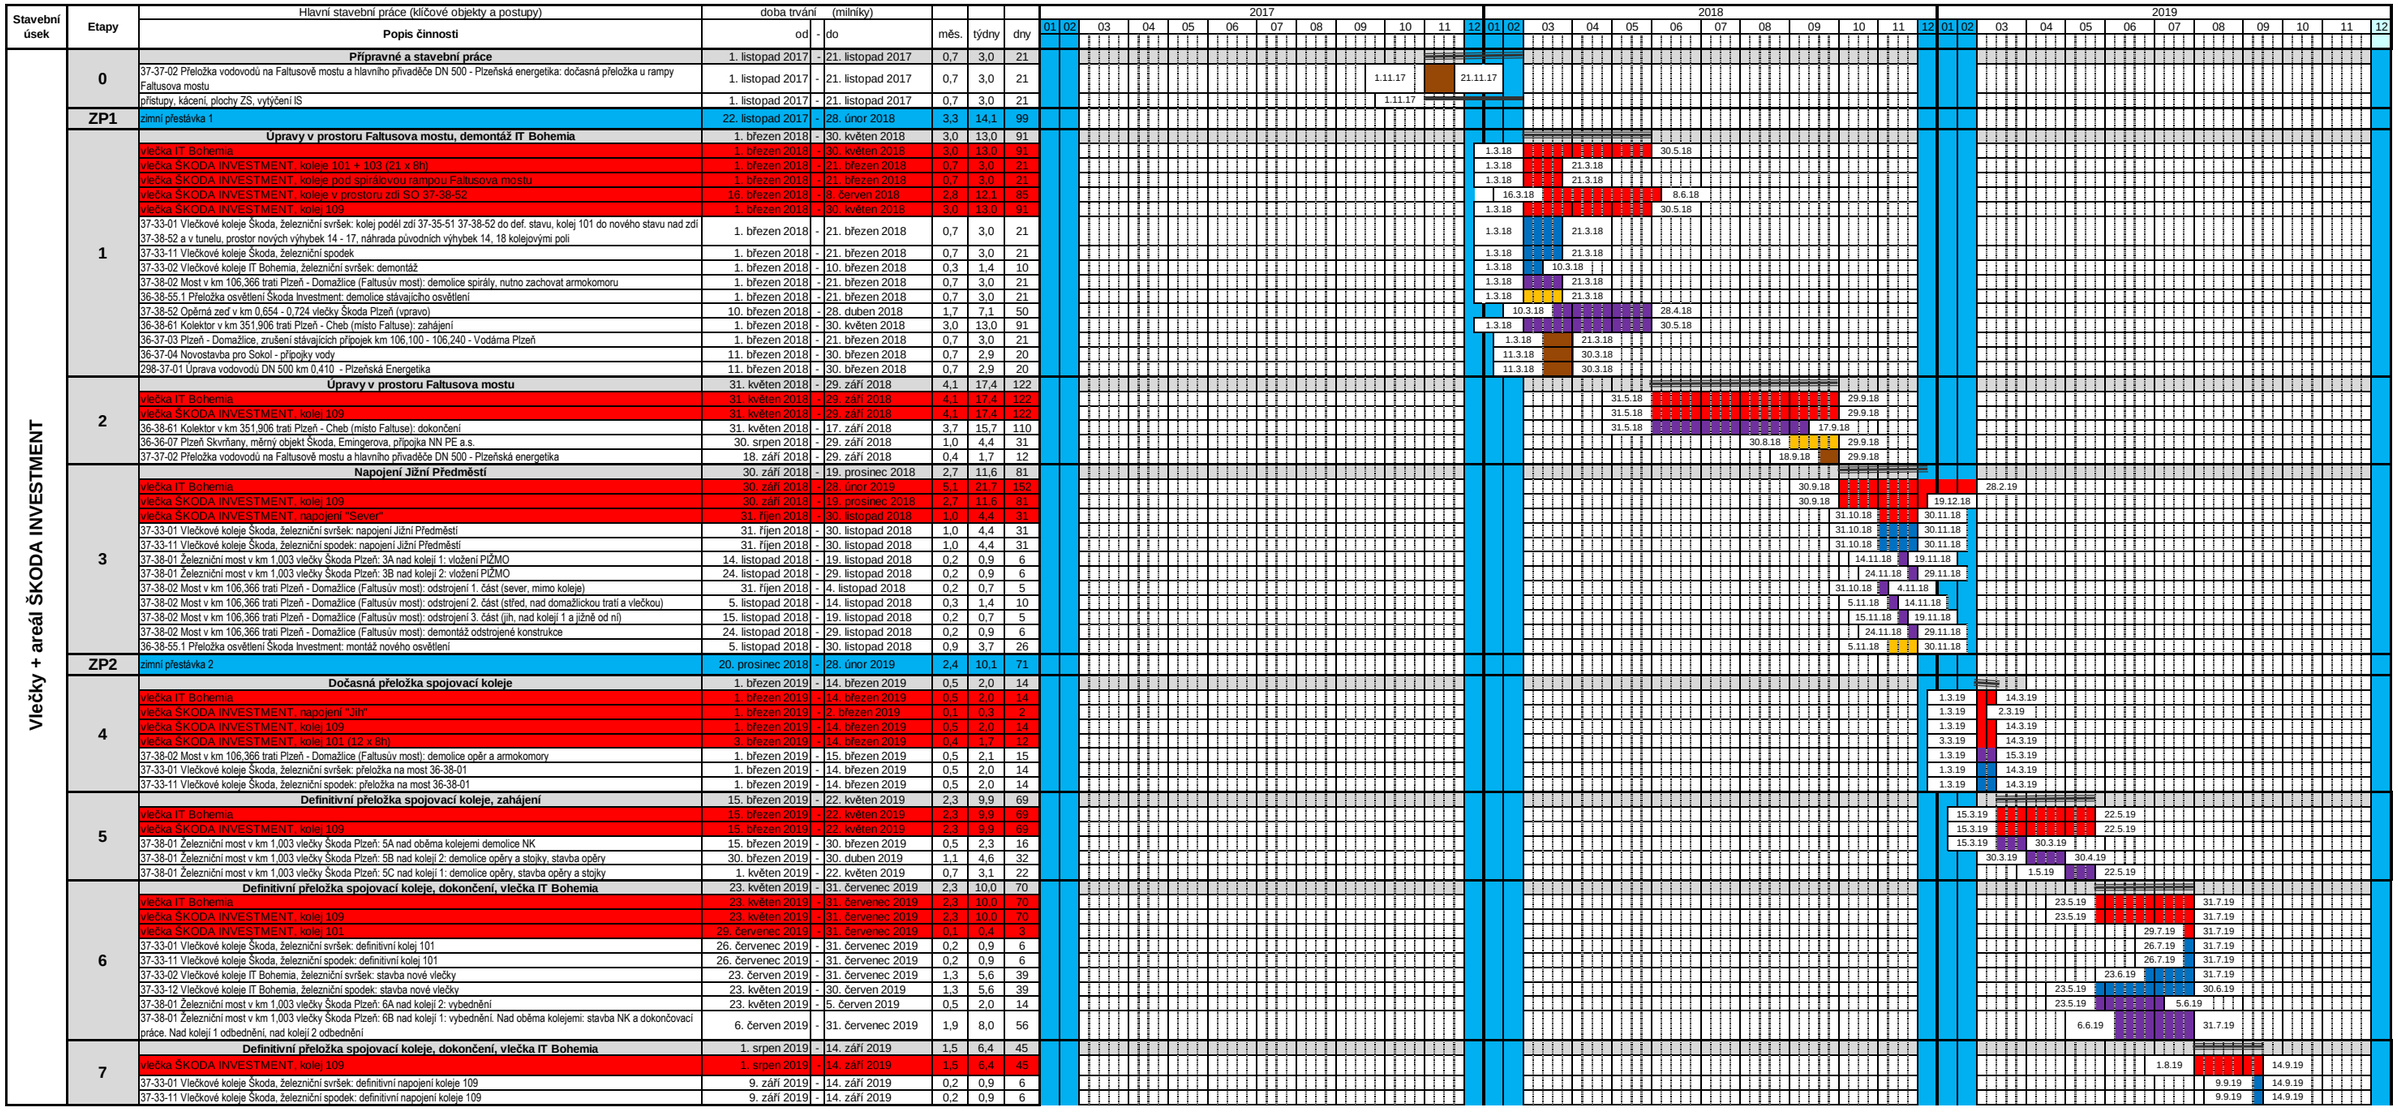
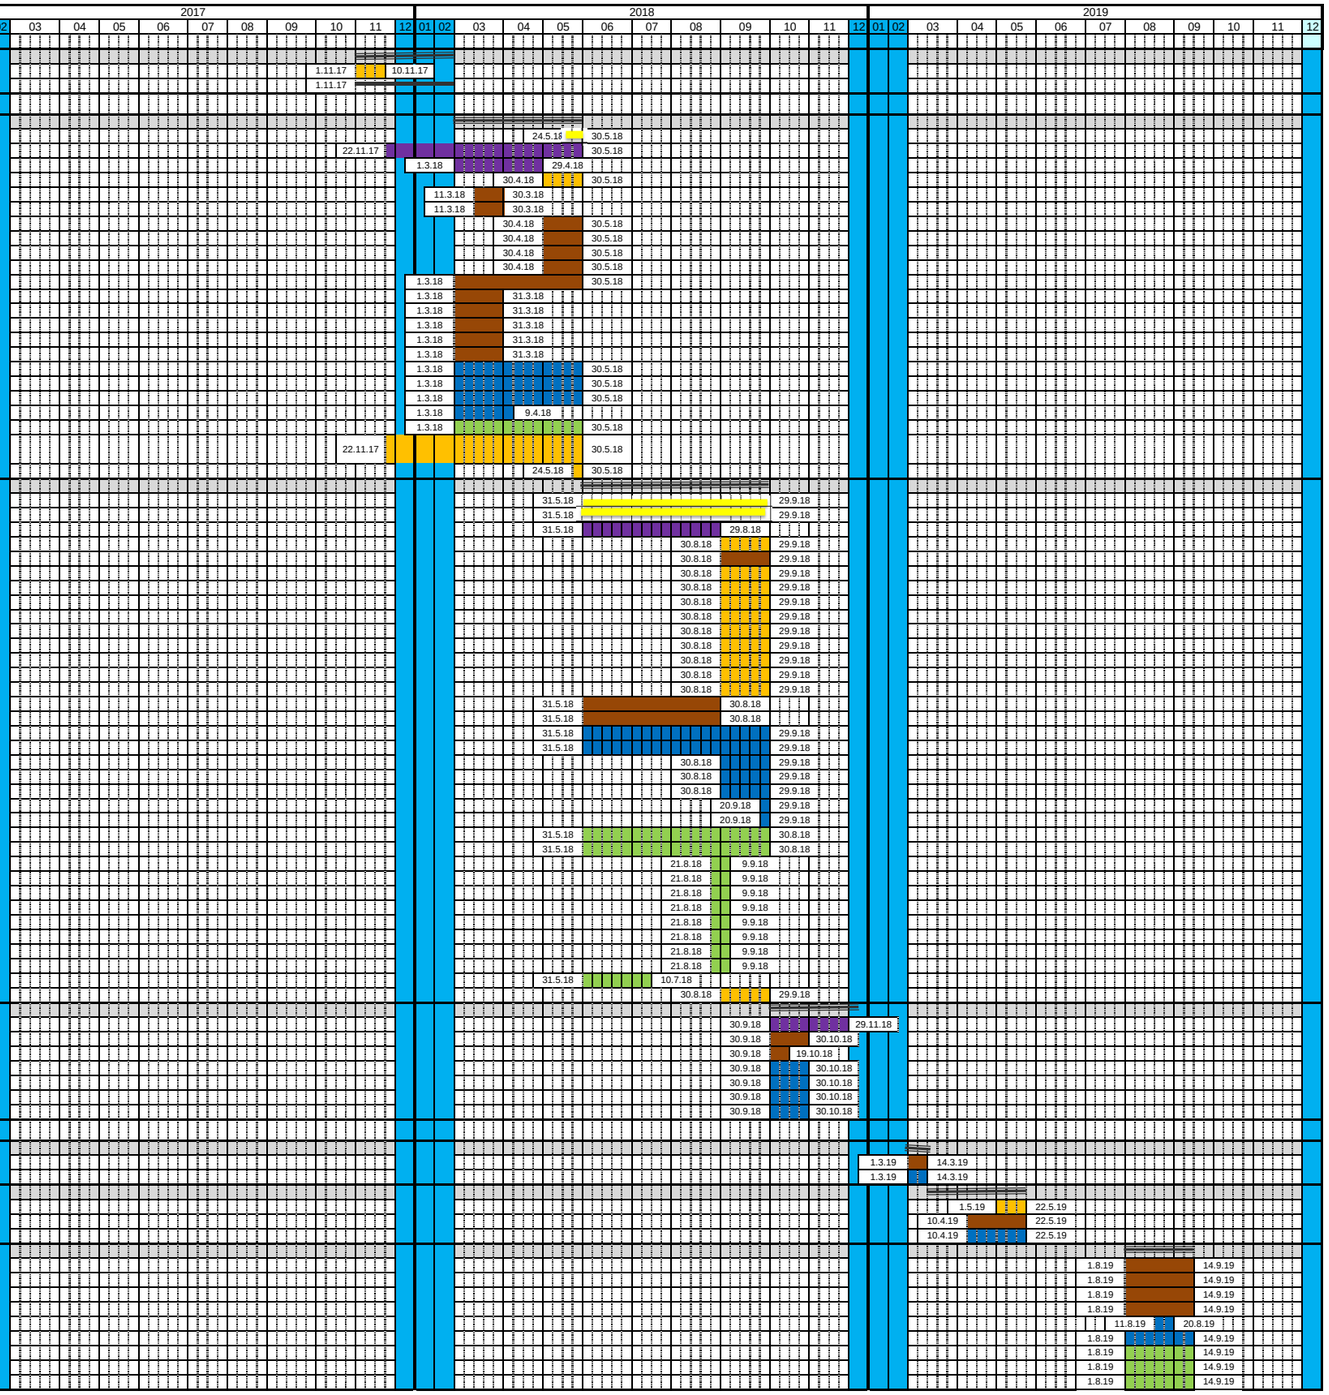
Stavební úsek	Etapy	Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)	doba trvání (milníky)					
		Popis činnosti	od	- do	měs.	týdny	dny	
Domažlická ulice		**Přípravné a stavební práce**	1. listopad 2017	- 21. listopad 2017	0,7	3,0	21	
	0	298-39-03 Světelné signalizační zařízení Domažlická - U dráhy: napojení ZS B	1. listopad 2017	- 10. listopad 2017	0,3	1,4	10	
		přístupy, kácení, plochy ZS, vytýčení IS	1. listopad 2017	- 21. listopad 2017	0,7	3,0	21	
	ZP1	zimní přestávka 1	22. listopad 2017	- 28. únor 2018	3,3	14,1	99	
		Zahájení stavby nadjezdu	1. březen 2018	- 30. květen 2018	3,0	13,0	91	
		Provoz linky 12 vozidly s pomocným pohonem	24. květen 2018	- 30. květen 2018	0,2	1,0	7	
		298-38-01 Silniční most v km 107,090 přes trať Plzeň – Domažlice (Domažlická): stavba opěr a pilířů, bednění nad tratí PD	22. listopad 2017	- 30. květen 2018	6,3	27,1	190	
		36-38-55 Opěrná zeď v km 0,654 - 0,724 vlečky Škoda Plzeň (vpravo): pod novou Domažlickou	1. březen 2018	- 29. duben 2018	2,0	8,6	60	
		36-38-63 Napojení bývalého areálu ŠKODA, osvětlení SVSMP: úsek od OK k přejezdu	30. duben 2018	- 30. květen 2018	1,0	4,4	31	
		36-37-04 Novostavba pro Sokol - přípojky vody	11. březen 2018	- 30. březen 2018	0,7	2,9	20	
		298-37-02 Úprava vodovodu DN 80 v ulici Na výspě, Na stráních a Na pile - Vodárna Plzeň	11. březen 2018	- 30. březen 2018	0,7	2,9	20	
		298-37-21 Odvodnění komunikace Domažlická km 0,00-0,596	30. duben 2018	- 30. květen 2018	1,0	4,4	31	
		298-37-22 Odvodnění komunikace Domažlická km 0,596-0,985	30. duben 2018	- 30. květen 2018	1,0	4,4	31	
		298-37-24 Kanalizace v ulici Domažlická, Na výspě, Na stráních a Na pile: ulice Na výspě, Na stráních, Na pile	30. duben 2018	- 30. květen 2018	1,0	4,4	31	
		298-37-25 Úprava měrného objektu, km 0,170	30. duben 2018	- 30. květen 2018	1,0	4,4	31	
	1	298-37-26 Přeložka stoky, Zátišský sběrač v km 0,750 - 0,980: od ul. Na pile za domažlickou trať (křížení se stávajícím sběračem)	1. březen 2018	- 30. květen 2018	3,0	13,0	91	
		298-37-27 Odvodnění kolektoru 2 - km 0,400	1. březen 2018	- 31. březen 2018	1,0	4,4	31	
		298-37-28 Rušení stok vyvolané přeložkou žel. tratě - Vodárna Plzeň	1. březen 2018	- 31. březen 2018	1,0	4,4	31	
		37-37-62 Přeložka horkovodu do areálu ŠKODA	1. březen 2018	- 31. březen 2018	1,0	4,4	31	
		37-37-63 Přípojka teplovodu pro Sokol Skvrňany	1. březen 2018	- 31. březen 2018	1,0	4,4	31	
		298-37-61 Přeložka horkovodu Domažlická ulice	1. březen 2018	- 31. březen 2018	1,0	4,4	31	
		298-32-01 Komunikace I/26: zahájení: sypání náspů, stavba okružní křižovatky (1. část)	1. březen 2018	- 30. květen 2018	3,0	13,0	91	
		298-32-02 Komunikace pro pěší a cyklisty podel I/26: zahájení: sypání náspů	1. březen 2018	- 30. květen 2018	3,0	13,0	91	
		298-32-14 Napojení bývalého areálu Škoda: úsek od OK k přejezdu	1. březen 2018	- 30. květen 2018	3,0	13,0	91	
		298-32-15 Místní komunikace k objektu Domažlická 1133/45	1. březen 2018	- 9. duben 2018	1,3	5,7	40	
		298-34-70 Oplocení, Domažlická, Škoda	1. březen 2018	- 30. květen 2018	3,0	13,0	91	
		298-35-01 Domažlická ulice, úprava trakčního vedení trolejbusu: stavba základů podpěr TV v místech budoucího náspu Domažlické ulice	22. listopad 2017	- 30. květen 2018	6,3	27,1	190	
		298-35-01 Domažlická ulice, úprava trakčního vedení trolejbusu: 1B v závěru SP demontáž původního TV	24. květen 2018	- 30. květen 2018	0,2	1,0	7	
		Dokončení stavby nadjezdu	31. květen 2018	- 29. září 2018	4,1	17,4	122	
		Provoz linky 12 vozidly s pomocným pohonem	31. květen 2018	- 29. září 2018	4,1	17,4	122	
		Provoz po Domažlické omezen (střídavě jen dva pruhy)	31. květen 2018	- 29. září 2018	4,1	17,4	122	
		298-38-01 Silniční most v km 107,090 přes trať Plzeň – Domažlice (Domažlická): stavba NK	31. květen 2018	- 29. srpen 2018	3,0	13,0	91	
		36-36-07 Plzeň Skvrňany, měrný objekt Škoda, Emingerova, přípojka NN PE a.s.	30. srpen 2018	- 29. září 2018	1,0	4,4	31	
		37-37-02 Přeložka vodovodu na Faltusově mostu a hlavního přivaděče DN 500 - Plzeňská energetika	30. srpen 2018	- 29. září 2018	1,0	4,4	31	
		298-36-01 Komunikace I/26 Domažlická, osvětlení SVSMP	30. srpen 2018	- 29. září 2018	1,0	4,4	31	
		298-36-03 Komunikace I/26 Domažlická, přeložky kabelů DP	30. srpen 2018	- 29. září 2018	1,0	4,4	31	
		298-36-04 Rekonstrukce ulice Na Pile, osvětlení SVSMP	30. srpen 2018	- 29. září 2018	1,0	4,4	31	
		298-36-05 Rekonstrukce ulice Na Výspě, osvětlení SVSMP	30. srpen 2018	- 29. září 2018	1,0	4,4	31	
		298-36-06 Rekonstrukce stávající Domažlické ul., osvětlení SVSMP	30. srpen 2018	- 29. září 2018	1,0	4,4	31	
		298-36-07 Komunikace pro pěší a cyklistů podél 1/26, osvětlení SVSMP	30. srpen 2018	- 29. září 2018	1,0	4,4	31	
		298-36-08 Místní komunikace podél trati SŽDC Plzeň Domažlická vpravo, osvětlení SVSMP	30. srpen 2018	- 29. září 2018	1,0	4,4	31	
		298-36-15 Komunikace I/26 Domažlická, kolektor 2, přeložky kabelů NN a VN PE a.s.	30. srpen 2018	- 29. září 2018	1,0	4,4	31	
		298-36-18 Komunikace I/26 Domažlická, přípojky NN soukromých objektů	30. srpen 2018	- 29. září 2018	1,0	4,4	31	
		298-37-23 Sedimentační nádrž km 0,140	31. květen 2018	- 30. srpen 2018	3,1	13,1	92	
		298-37-26 Přeložka stoky, Zátišský sběrač v km 0,750 - 0,980: pod starou Domažlickou	31. květen 2018	- 30. srpen 2018	3,1	13,1	92	
	2	298-32-01 Komunikace I/26	31. květen 2018	- 29. září 2018	4,1	17,4	122	
		298-32-02 Komunikace pro pěší a cyklisty podel I/26	31. květen 2018	- 29. září 2018	4,1	17,4	122	
		298-32-03 Přístupová komunikace p.p.č 937 a 932/1	30. srpen 2018	- 29. září 2018	1,0	4,4	31	
		298-32-11 Rekonstrukce ulice Na pile	30. srpen 2018	- 29. září 2018	1,0	4,4	31	
		298-32-22 Příjezdová komunikace ke kolektoru v km 0.030	30. srpen 2018	- 29. září 2018	1,0	4,4	31	
		298-32-62 Dopravní značení (ŘSD)	20. září 2018	- 29. září 2018	0,3	1,4	10	
		298-32-63 Dopravní značení (Město Plzeň)	20. září 2018	- 29. září 2018	0,3	1,4	10	
		298-34-40 PhS, Domažlická	31. květen 2018	- 30. srpen 2018	3,1	13,1	92	
		298-34-41 PhS, okružní křižovatka (ul.Domažlická)	31. květen 2018	- 30. srpen 2018	3,1	13,1	92	
		298-34-72 Oplocení, Domažlická, p.č. 544/1	21. srpen 2018	- 9. září 2018	0,7	2,9	20	
		298-34-73 Oplocení, Domažlická, p.č. 542	21. srpen 2018	- 9. září 2018	0,7	2,9	20	
		298-34-74 Oplocení, Domažlická, p.č. 543	21. srpen 2018	- 9. září 2018	0,7	2,9	20	
		298-34-75 Oplocení, Domažlická, p.č. 565/1	21. srpen 2018	- 9. září 2018	0,7	2,9	20	
		298-34-76 Oplocení, Domažlická, p.č. 566/1	21. srpen 2018	- 9. září 2018	0,7	2,9	20	
		298-34-77 Oplocení, Domažlická, p.č. 545/2	21. srpen 2018	- 9. září 2018	0,7	2,9	20	
		298-34-79 Oplocení, Domažlická, č.p. 936/1	21. srpen 2018	- 9. září 2018	0,7	2,9	20	
		298-34-80 Oplocení, Domažlická, p.č. 945/20	21. srpen 2018	- 9. září 2018	0,7	2,9	20	
		298-34-50 IPO, Domažlická	31. květen 2018	- 10. červenec 2018	1,4	5,9	41	
		298-35-01 Domažlická ulice, úprava trakčního vedení trolejbusu: nové TV	30. srpen 2018	- 29. září 2018	1,0	4,4	31	
		Úpravy ve stávajících ulicích	30. září 2018	- 19. prosinec 2018	2,7	11,6	81	
		298-38-61 Kolektor - stavební úpravy	30. září 2018	- 29. listopad 2018	2,0	8,7	61	
		298-37-03 Přeložka vodovodu DN 80 km 0,570 - Vodárna Plzeň	30. září 2018	- 30. říjen 2018	1,0	4,4	31	
	3	298-37-24 Kanalizace v ulici Domažlická, Na výspě, Na stráních a Na pile: ulice Domažlická	30. září 2018	- 19. říjen 2018	0,7	2,9	20	
		298-32-12 Rekonstrukce ulice Na výspě	30. září 2018	- 30. říjen 2018	1,0	4,4	31	
		298-32-13 Rekonstrukce stávající Domažlické ulice	30. září 2018	- 30. říjen 2018	1,0	4,4	31	
		298-32-21 Místní komunikace podél trati Plzeň - Domažlice vpravo	30. září 2018	- 30. říjen 2018	1,0	4,4	31	
		298-32-23 Příjezdová komunikace ke kolektoru v km 0.406	30. září 2018	- 30. říjen 2018	1,0	4,4	31	
	ZP2	zimní přestávka 2	20. prosinec 2018	- 28. únor 2019	2,4	10,1	71	
		Stavba nových komunikací, 1. část	1. březen 2019	- 14. březen 2019	0,5	2,0	14	
	4	298-37-29 Odvodnění komunikace Emingerova: zahájení	1. březen 2019	- 14. březen 2019	0,5	2,0	14	
		298-32-14 Napojení bývalého areálu Škoda: od přejezdu k VII. bráně: zahájení	1. březen 2019	- 14. březen 2019	0,5	2,0	14	
		Stavba nových komunikací, 2. část	15. březen 2019	- 22. květen 2019	2,3	9,9	69	
	5	36-38-63 Napojení bývalého areálu ŠKODA, osvětlení SVSMP: dokončení	1. květen 2019	- 22. květen 2019	0,7	3,1	22	
		298-37-29 Odvodnění komunikace Emingerova: dokončení	10. duben 2019	- 22. květen 2019	1,4	6,1	43	
		298-32-14 Napojení bývalého areálu Škoda: od přejezdu k VII. bráně: dokončení	10. duben 2019	- 22. květen 2019	1,4	6,1	43	
		Práce v areálu Sokola, dokončovací práce	1. srpen 2019	- 14. září 2019	1,5	6,4	45	
		36-37-01 Plzeň-Cheb, přeložka vodovodu DN 100 v ulici Domažlická - Vodárna Plzeň: u kurtů Sokola	1. srpen 2019	- 14. září 2019	1,5	6,4	45	
		36-37-25 Novostavby pro Sokol - přípojky kanalizace	1. srpen 2019	- 14. září 2019	1,5	6,4	45	
		36-37-26 Novostavby pro Sokol - odvodnění hřišť	1. srpen 2019	- 14. září 2019	1,5	6,4	45	
		37-37-63 Přípojka teplovodu pro šatny Sokol Skvrňany	1. srpen 2019	- 14. září 2019	1,5	6,4	45	
	7	36-32-01 Příjezdová plocha pro údržbu horkovodu za Sokolovnou	11. srpen 2019	- 20. srpen 2019	0,3	1,4	10	
		298-32-71 Úprava stávajících komunikací	1. srpen 2019	- 14. září 2019	1,5	6,4	45	
		36-34-02 Novostavba šaten pro Sokol, Skvrňany	1. srpen 2019	- 14. září 2019	1,5	6,4	45	
		36-34-03 Novostavba hřišť pro Sokol, Skvrňany	1. srpen 2019	- 14. září 2019	1,5	6,4	45	
		298-34-78 Oplocení, Domažlická, IT Bohemia	1. srpen 2019	- 14. září 2019	1,5	6,4	45
