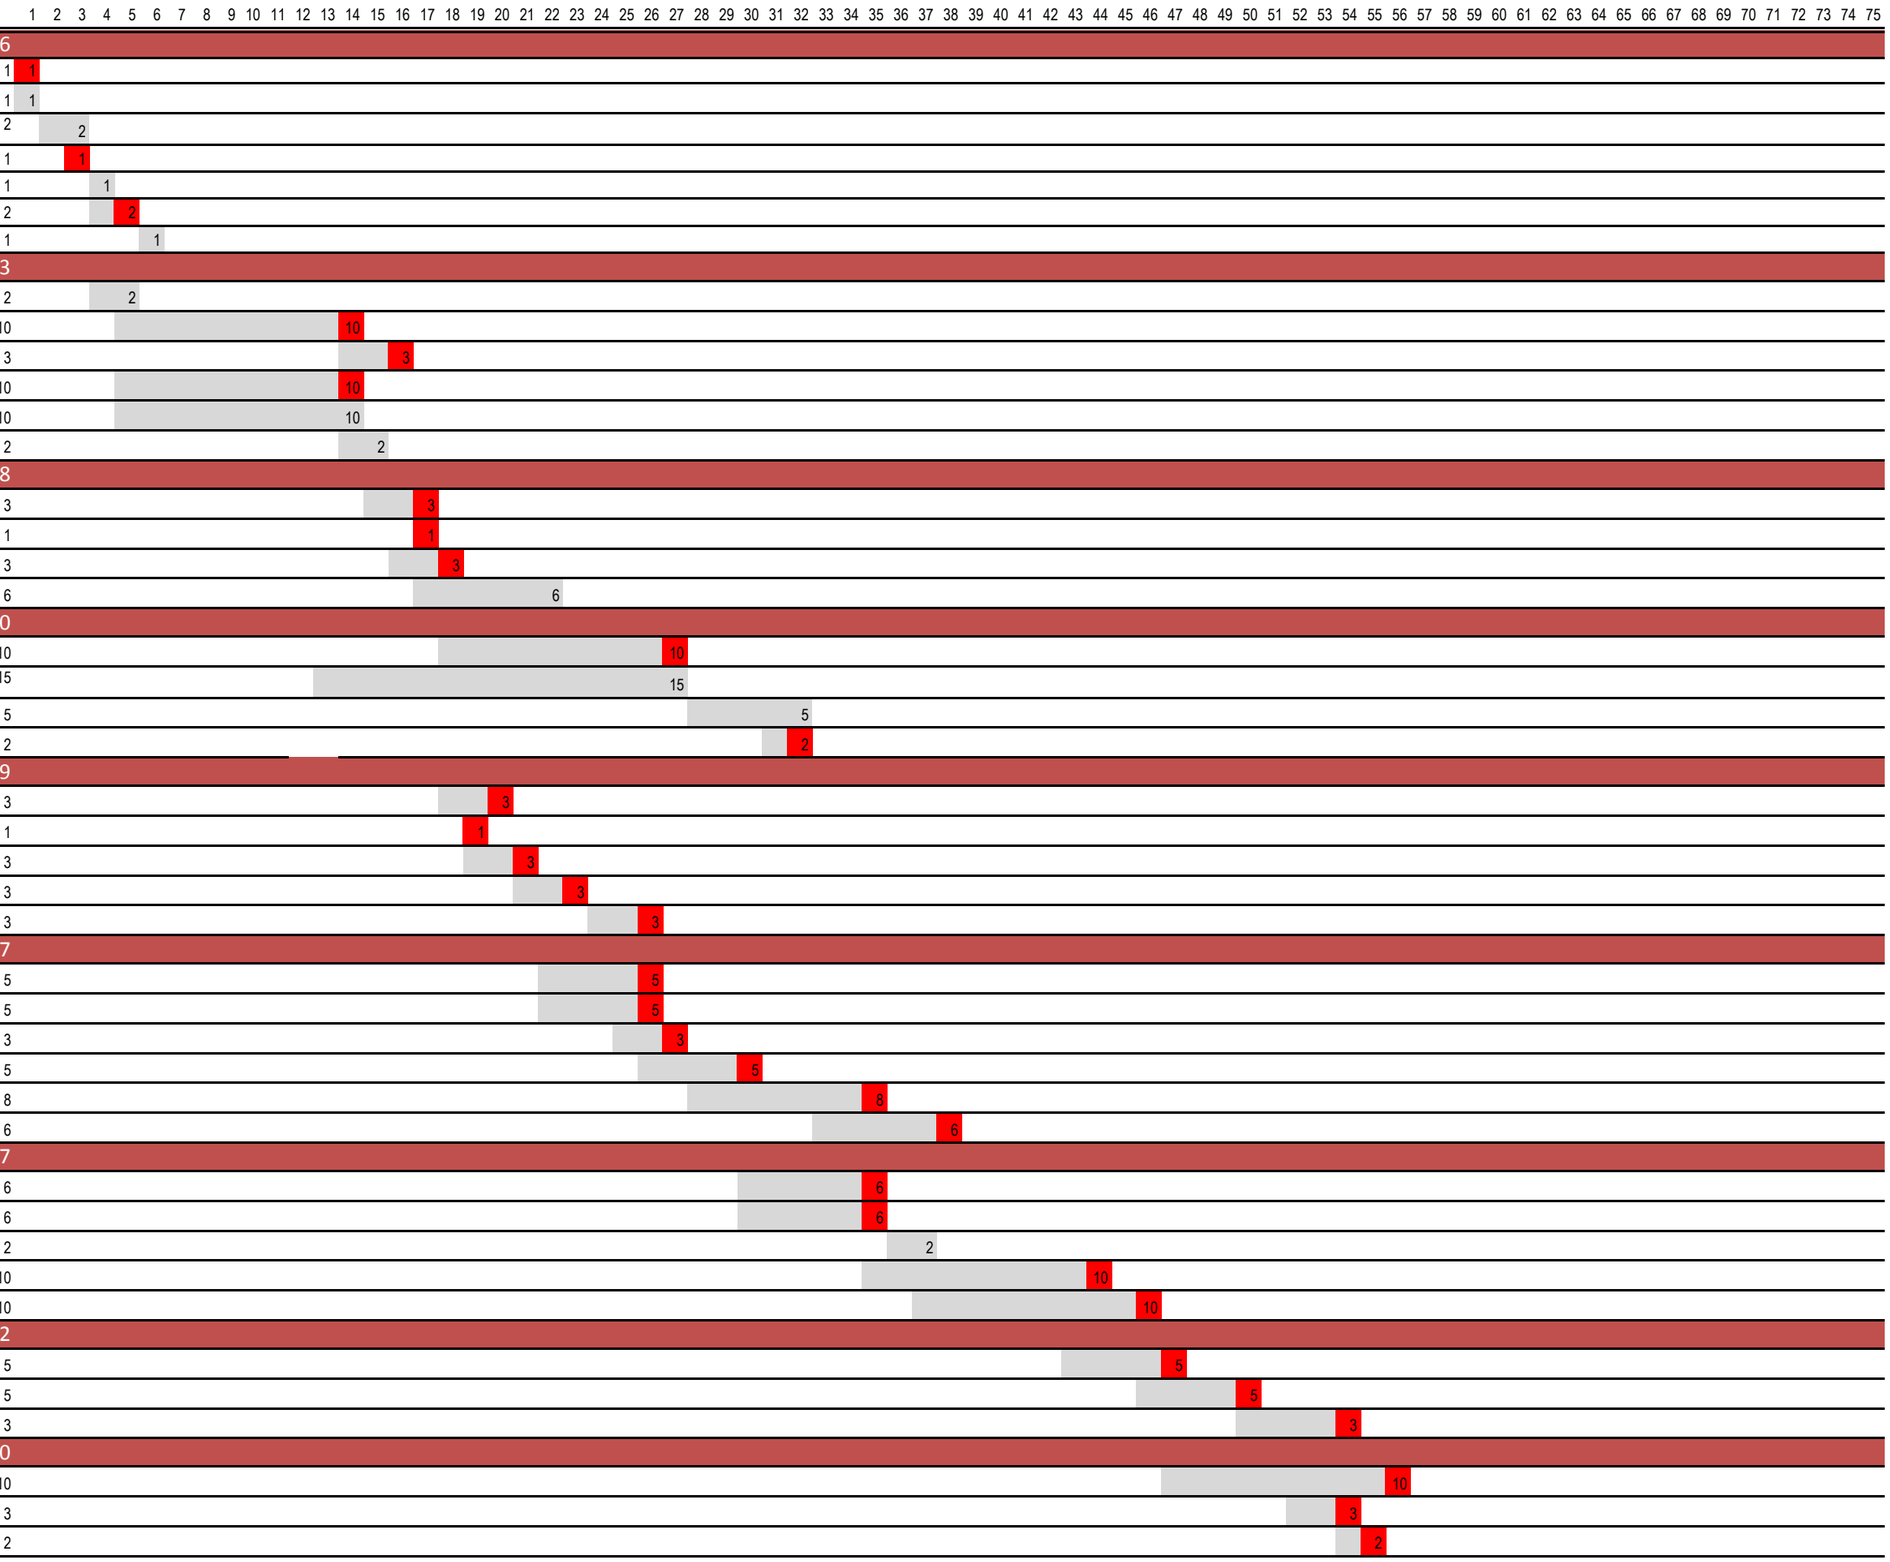č.	proces	počet týdnů
	I. FÁZE	**6**
1	kontejner na suť, zábory	1
2	přesun zaměstnanců ČD Cargo	1
3	příprava staveniště, zázemí stavby, vjezd na staveniště	2
4	stavební lešení, oplocení demolovaných ploch	1
5	demolice kiosku	1
6	odstranění přístavku útulny	2
7	odstranění lešení, provizorní revitalizace ploch po demolici	1
	II. FÁZE	**13**
8	oplocení	2
8	zemní práce - sanace z exteriéru	10
9	zateplení sokolvé části	3
10	zemní práce - přípojky, drenáže	10
11	sanace 1PP	10
12	venkovní úpravy - živičný kryt, do původní podoby	2
	III. FÁZE	**8**
13	lešení, stavební výtah	3
14	odstranění krytiny	1
15	úprava komínů	3
16	krov a střecha hlavní budovy	6
	IV. FÁZE	**20**
17	obálka budovy, TI, tektonické prvky	10
18	okna, dveře, vyměření, výroba, instalace	15
19	kompletace fasády, začištění	5
20	odstranění lešení	2
	V. FÁZE	**9**
21	odstranění střech krytého přístřešku a přístaveb	3
22	provizorní zakrytí stropů (zvláště nad dopravní kanceláří), parobrzda, TI	1
23	základy pod litinové sloupy v nové ÚT	3
24	montáž vazníky a krokve - přístavky a krytý přístřešek	3
25	položení střešní krytiny, návaznosti na KZS, klempířina	3
	VI. FÁZE	**17**
26	bourací práce půda, 2NP - interiér, stěny	5
27	bourací práce půda, 2NP - interiér, podlahy	5
28	stavební práce - půda, 2NP	3
29	stavební práce - půda, 2NP	5
30	instalace - půda, 2NP	8
31	hrubé podlahy - půda, 2NP	6
	VII. FÁZE	**17**
32	bourací práce 1PP,1NP - interiér, stěny	6
33	bourací práce 1PP,1NPP - interiér, podlahy	6
34	stavební práce 1PP	2
35	stavební práce - 1NP	10
36	instalace - 1PP,1NP	10
	VIII. FÁZE	**12**
37	kompletace technologických místností	5
38	interiér veřejných prostor	5
39	kompletační práce, odstranění vad a nedodělků	3
	IX. FÁZE	**10**
40	venkovní úpravy - pochozí plochy	10
41	odstranění venkovního zařízení stavby	3
42	odvoz mezideponie, vsakovací pole	2
