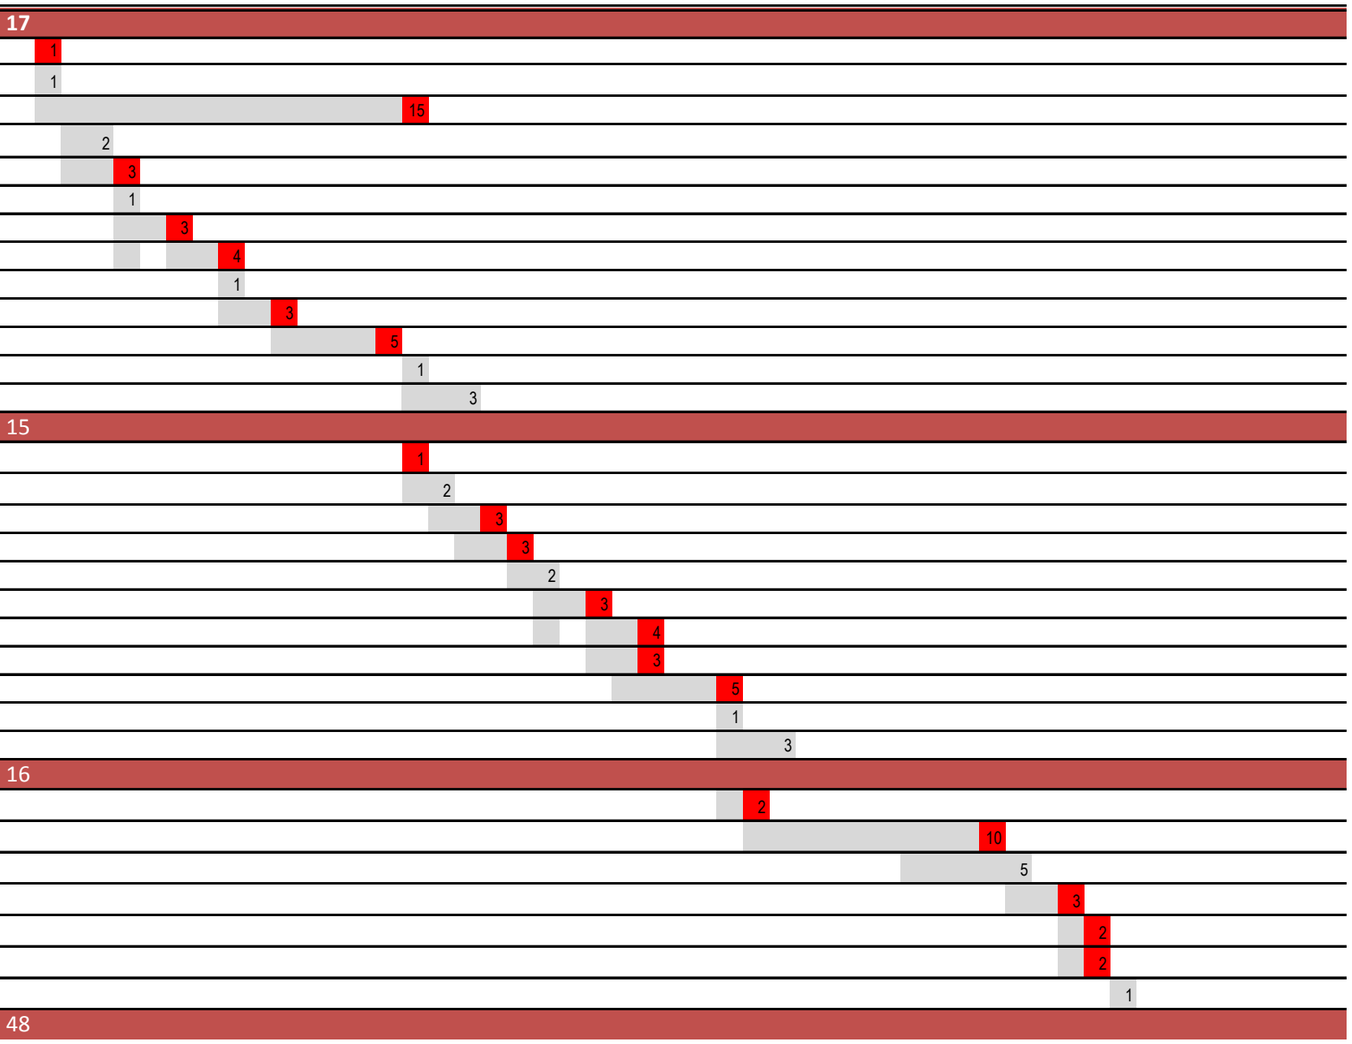č.	proces	počet týdnů bez současnosti	počet týdnů se současností
	I. FÁZE - 2NP	43	17
1	kontejner na suť	1	
2	příprava staveniště, zázemí stavby, vjezd na staveniště	1	
3	okna, dveře, vyměření, výroba, 1NP+2NP	15	
4	bourací práce, dispozice 2NP	2	
5	bourací práce, podlahy, 2NP	3	
6	bourací práce, rozvody, radiátory 2NP	1	
7	nvoé podlahové souvrství, hrubá podlaha, 2NP	3	
8	nové rozvody, radiátory, VZT, 2NP	4	
9	prostupy na střechu, HI	1	
10	nové rozvody SLN, SLB, 2NP	3	
11	stavební úpravy, 2NP	5	
12	osazení okna, dveře, 2NP	1	
13	kompletační práce, odstranění vad a nedodělků	3	
	II. FÁZE - 1NP	30	15
1	kontejner na suť	1	
2	bourací práce, dispozice 1NP	2	
3	bourací práce, kanál - podlahy, 1NP	3	
4	bourací práce, broušení podlahy, 1NP	3	
5	bourací práce, rozvody, radiátory, VZT 1NP	2	
6	sanace podlaha, 1NP	3	
7	nové rozvody, radiátory, VZT, 1NP	4	
8	nové rozvody SLN, SLB, 1NP	3	
9	stavební úpravy, 1NP	5	
10	osazení okna, dveře, 1NP	1	
11	kompletační práce, odstranění vad a nedodělků	3	
	III. FÁZE - EXTERIÉR	25	16
1	Výstavba lešení, oplocení, ochranné prvky BOZP	2	
2	obálka budovy, tektonické prvky	10	
3	kompletace fasády, začištění	5	
4	kompletační práce, odstranění vad a nedodělků	3	
5	odstranění lešení	2	
6	venkovní úpravy - živičný kryt, do původní podoby	2	
7	převzetí díla	1	
	celkem	98	48
