Elektrizace trati vč. PEÚ Otrokovice-Zlín-Vizovice
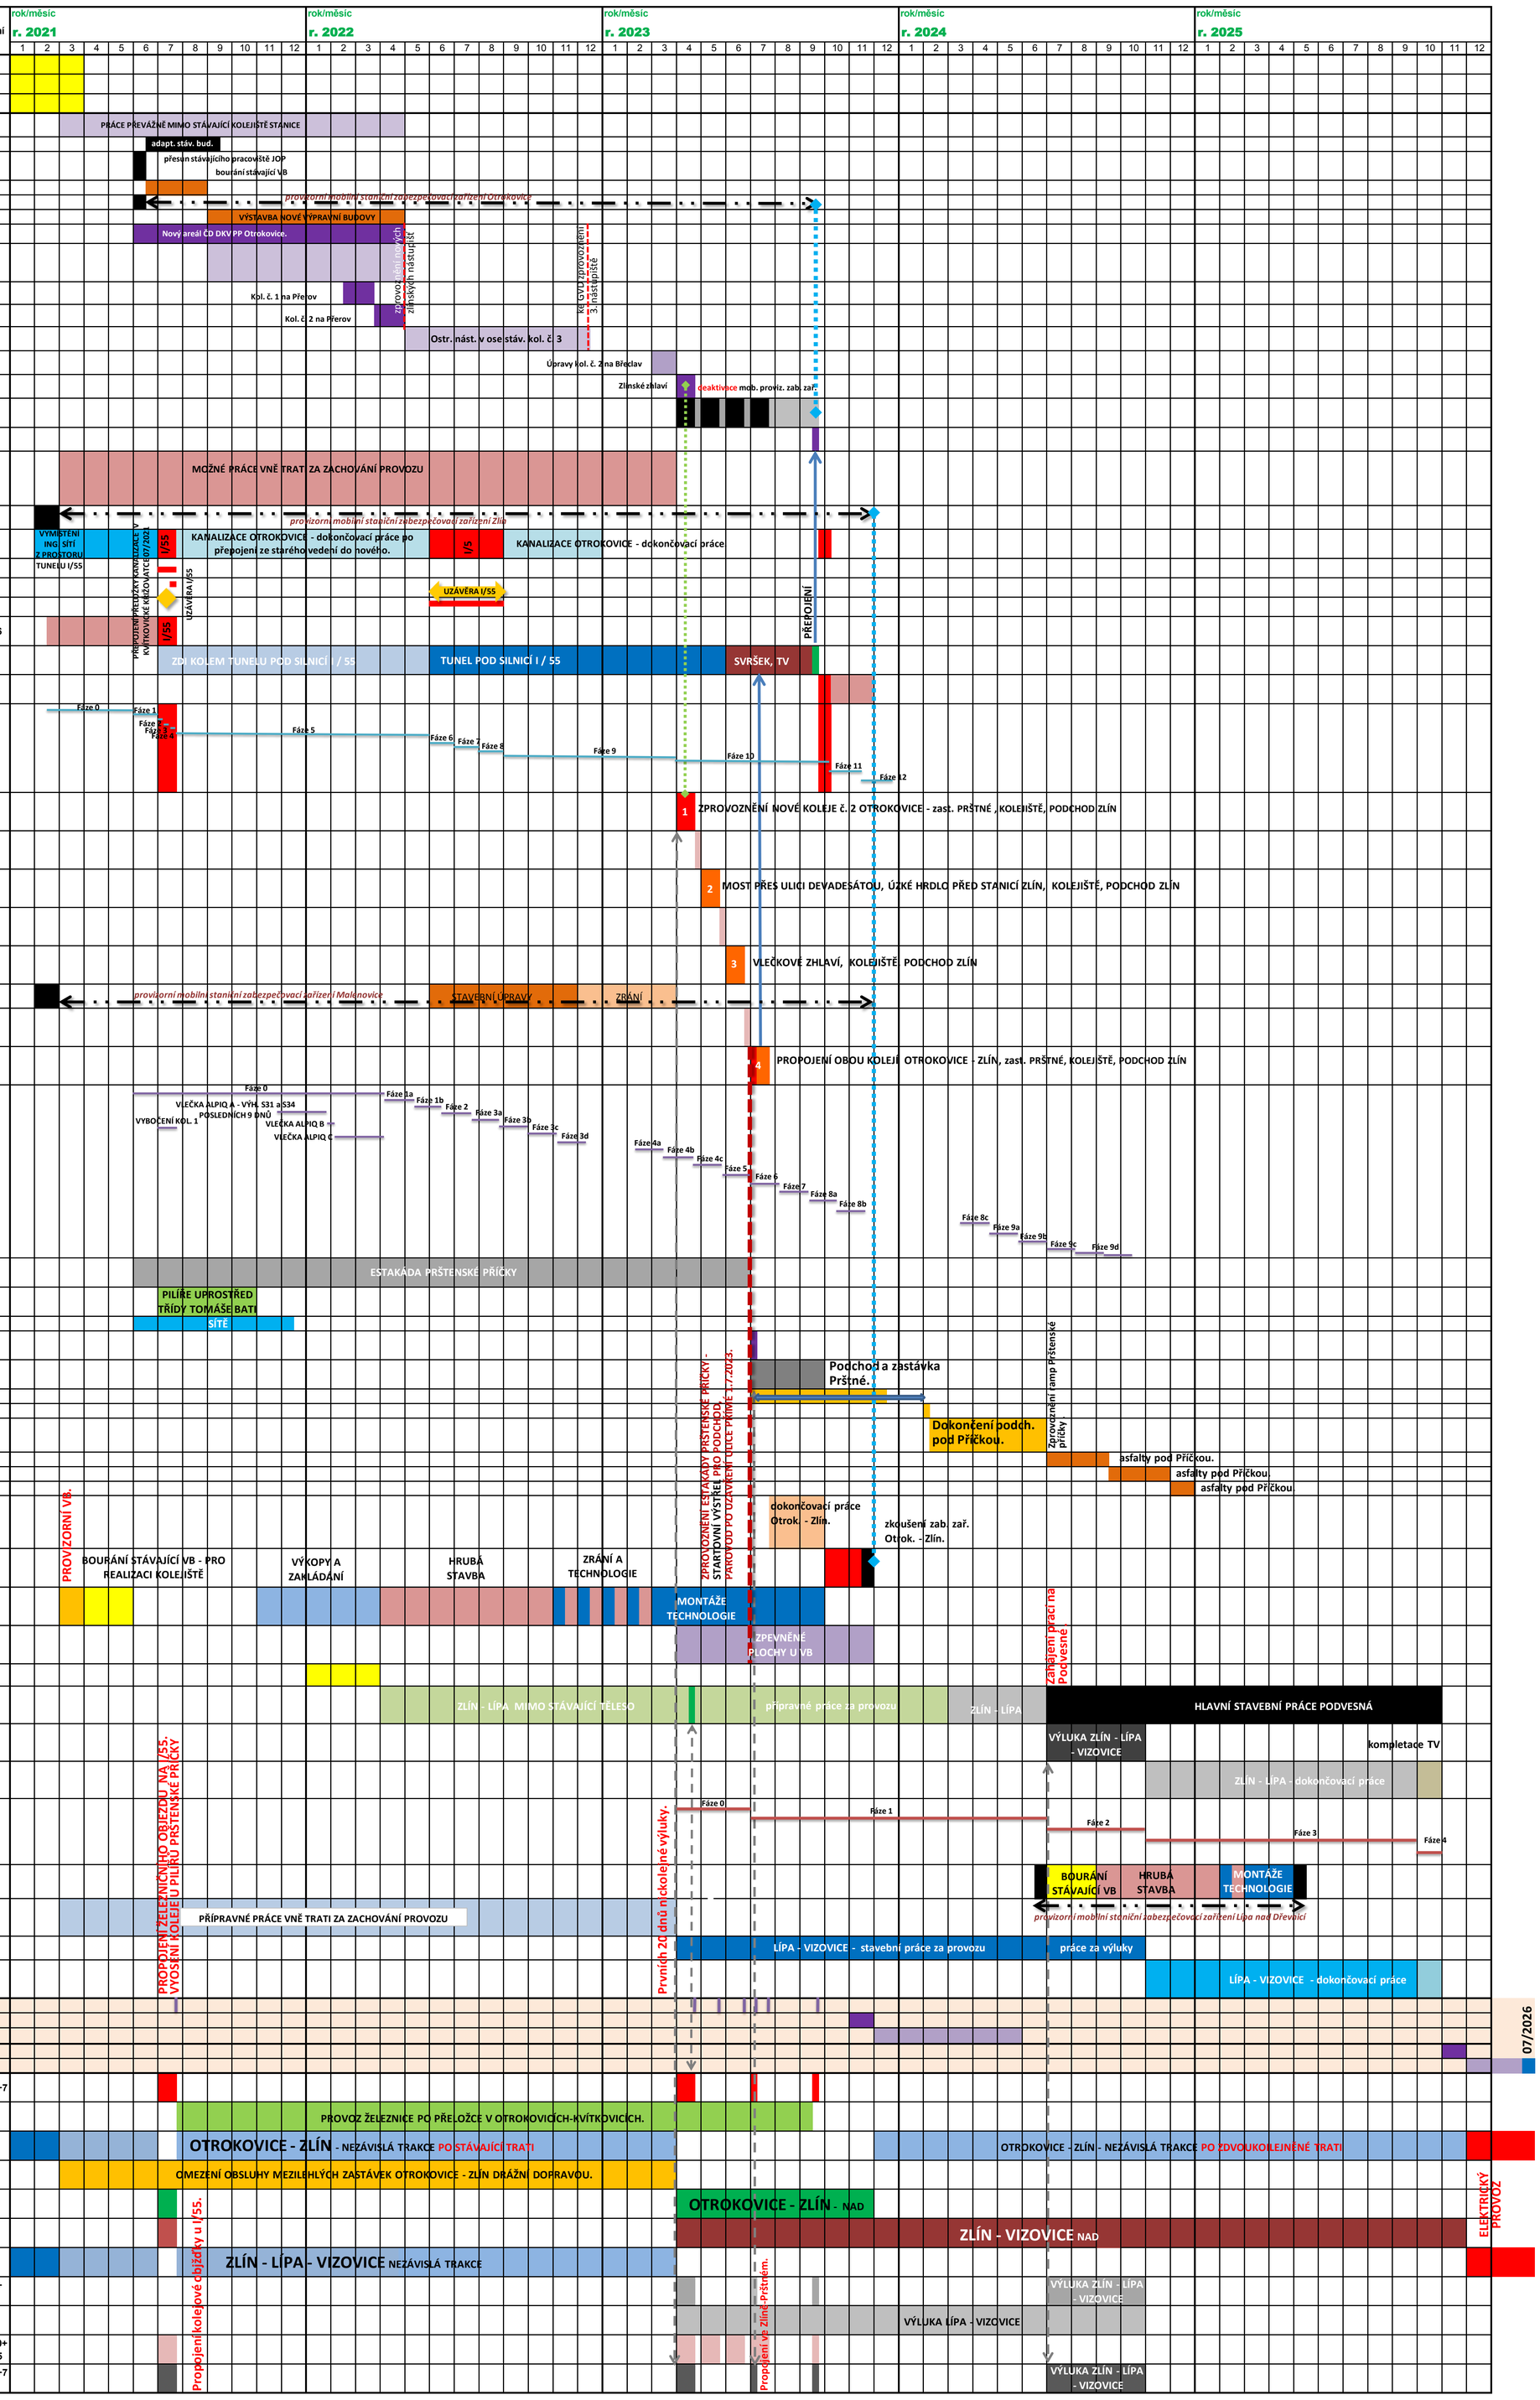
popis	počet dní
SP100 Otrokovice - ZS, zeleň.	90
SP200 Otrokovice - Zlín - ZS, zeleň.	90
SP400 Lípa - Vizovice - ZS, zeleň.	90
SP101 Otrokovice - nové koleje, most přes Dřevnici.	428
Adaptace stávají technologické budovy v žst. Otrokovice	92
Přesun stávajícího pracoviště JOP do nově adaptované DK v technologické budově.	14
Bourání Stávající výpravní budovy v žst. Otrokovice	78
Aktivace mobilního provizorního zab. zař.	586
Výtavba nové výpravní budovy v žst. Otrokovice	242
Nový areál ČD DKV PP Otrokovice.	334
SP102 - Kol. stáv. č. 5, prodloužení podchodu, nová nástupiště, úpravy V.B., skladu.	242
SP103 - Kol. č. 1 na Přerov trati Břeclav - Přerov.	34
SP104 - Kol. č. 2 na Přerov trati Břeclav - Přerov.	40
SP105 - Ostr. nást. v ose stáv. kol. č. 3.	224
SP106 - Úpravy v koleji č. 2.	31
SP107 - Zlínské zhlaví v první nickolejné výluce.	20
Aktivace def. zab. zař. a deaktivace mob. prov. zab. zař. Otrokovice.	37
SP108 - Propojení nové dvoukolejné trati.	7
SP201 - Otrokovice - Zlín - MOŽNÉ PRÁCE VNĚ TRATI ZA ZACHOVÁNÍ PROVOZU. Bude vybudována provizorní kabelová trasa v t.ú. Otrokovice – Zlín střed.	761
Aktivace mob. prov. zab. zař. v žst. Zlín střed	1033
Kanalizace Otrokovice - PRVNÍCH 6 MĚSÍCŮ DO PŘEPOJENÍ DO PŘELOŽKY	699+14
Úplná uzávěra I/55 na zřízení přejezdu.	21
Úplná uzávěra I/55 na propojení žel. proviz. objezdu.	7
Úplná uzávěra I/55 na zřízení tunelu.	92
Zřízení žel. proviz. objezdu pro výstavbu tunelu, výluka silnice I/55 na zřízení přejezdu 21 dní.	120+106
Výstavba tunelu pod silnicí I/55.	845
Zrušení přejezdu na provizoriu 14 dní výluka I/55, rušení kolejové objížďky.	68
Fáze Kvítkovické křižovatky	
SP202 - Výluka trati Otrokovice - Zlín a první výluka ŽST Zlín 20 dní 1. 4. 2023 - 20. 4. 2023.	20
SP203 - Zpovoznění trati Otrokovice - Zlín (2. TK) a první proviz. zprovoznění ŽST Zlín 10 dní 21. 4. 2023 - 30. 4. 2023.	10
SP204 - Provoz trati Otrokovice - Zlín (2. TK) a druhá výluka ŽST Zlín 20 dní 1. 5. 2023 - 20. 5. 2023.	20
SP205 - Provoz trati Otrokovice - Zlín (2. TK) a druhé proviz. zprovoznění ŽST Zlín 10 dní 21. 5. 2023 - 30. 5. 2023.	10
SP206 - Provoz trati Otrokovice - Zlín (2. TK) a třetí výluka ŽST Zlín 20 dní 31. 5. 2023 - 19. 6. 2023.	20
Malenovice – stavební úpravy VB	
SP207 - Provoz trati Otrokovice - Zlín (2. TK) a třetí proviz. zprovoznění ŽST Zlín 10 dní 20. 6. 2023 - 29. 6. 2023.	10
SP208 - 7 dní výluka, provoz trati Otrokovice - Zlín (2. TK) a čtvrtá výluka ŽST Zlín 20 dní 30. 6. 2023 - 19. 7. 2023.	20
Fáze prštenské příčky	
Budování estakády Prštenské příčky bez ramp na závěr s propojením do ul. L. Váchy 30. 6. 2023.	760
Proviz. rozšíření Tř. Tomáše Bati, proviz. Vodorov. znač. míjející staveb. jámu a pilíře, úprava TV trolejbusů.	123
Přeložky vodovodů, kanalizace, dalších sítí.	197
Nickolejná výluka týden - propoj. Kol. č. 2 v zast. Prštné přes ul. Přímou s kol. proviz. nad podchodem, larseny.	7
Propojení nové kol. č. 1 od zast. Prštné po hotovou část před žst. Zlín - střed vč. drážního podchodu.	92
Městský podchod pod silnicí po příčku, parovod.	168
Provizorium pod silnicí pro městský podchod.	7
Zbytek podchodu se schodištěm ze strany města a úpravy silnic ze strany města.	144
Komunikace na straně města.	76
Komunikace na straně železnice.	76
Dokončení komunikací před rampami.	31
SP209 - Dokončovací práce na úseku Otrokovice - Zlín za provizorního provozu - zahájení PROVIZORNÍHO provozu do žst. Zlín střed 20. 7. 2023	73
SP210 - Dokončovací práce, zkoušení ZAB. ZAŘ. Otrokovice - Zlín. Deaktivace mob. prov. zab. zař. Zlín.	61
VB Zlín - střed	
zpevněné komunikace u VB Zlín - střed	
SP300 - Zlín - Lípa. Zejm. Podvesná - ZS, zeleň.	90
SP301 - Práce za provozu Zlín - Lípa. Vybočení trati, výhybna, rozšíření budovy, kabelovody, nástupiště Lípa.	1340
SP302 - Práce v trvalé výluce Zlín - Lípa - zahloubení trati, výluka Metransu.	123
SP303 - Dokonč. práce Zlín - Lípa, Podvesné, zkouš. ZAB. ZAŘ. Od 1. 5. 2024 kompletace TV.	395
Fáze Podvesné XVII	
VB Lípa nad Dřevnicí	
SP401 - Lípa - Vizovice - MOŽNÉ PRÁCE VNĚ TRATI ZA ZACHOVÁNÍ PROVOZU.	761
SP402 - Práce v dlouhodobé výluce Lípa - Vizovice.	579
SP403 - Dokončovací práce, zkoušení ZAB. ZAŘ. Lípa - Vizovice.	395
Komplex. bezp. zkoušky (KBZ) po výlukách v t.ú. Otr. -	
Komplexní vyzkoušení úseku Otrokovice - Zlín	
Zkušební provoz úseku Otrokovice - Zlín	
Komplexní vyzkoušení.	31
Zkušební provoz 1.12.2025 - 31.5.2026 koaudace 06/2026.	-
NEPŘETRŽITÁ VÝLUKA OTROKOVICE - ZLÍN (NICKOLEJNÝ PROVOZ).	21+20+7+7
PROVOZ VEŠKERÉ DOPRAVY PO ŽELEZNIČNÍ PŘELOŽCE V OTROKOVICÍCH-KVÍTKOVICÍCH.	815
OSOBNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVA OTROKOVICE - ZLÍN (NEZÁVISLÁ TRAKCE SVĚTLE MODRÁ, ELEKTRICKÁ ČERVENÁ).	1457
OMEZENÍ OBSLUHY MEZILEHLÝCH ZASTÁVEK OTROKOVICE - ZLÍN DRÁŽNÍ DOPRAVOU.	581
NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA OTROKOVICE - ZLÍN.	21+244
NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA ZLÍN - VIZOVICE.	975
OSOBNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVA ZLÍN - LÍPA - VIZOVICE (NEZÁVISLÁ TRAKCE SVĚTLE MODRÁ, ELEKTRICKÁ ČERVENÁ).	733
NEPŘETRŽITÁ VÝLUKA ZLÍN - LÍPA (NICKOLEJNÝ PROVOZ).	20+7+7+123
NEPŘETRŽITÁ VÝLUKA LÍPA - VIZOVICE (NICKOLEJNÝ PROVOZ).	579
ODSTÁVKA DODÁVEK UHLÍ PRO TEPLÁRNU ZLÍN.	21+20+20+20+20+5
ODSTÁVKA TERMINÁLU METRANS.	21+20+7+7+123
