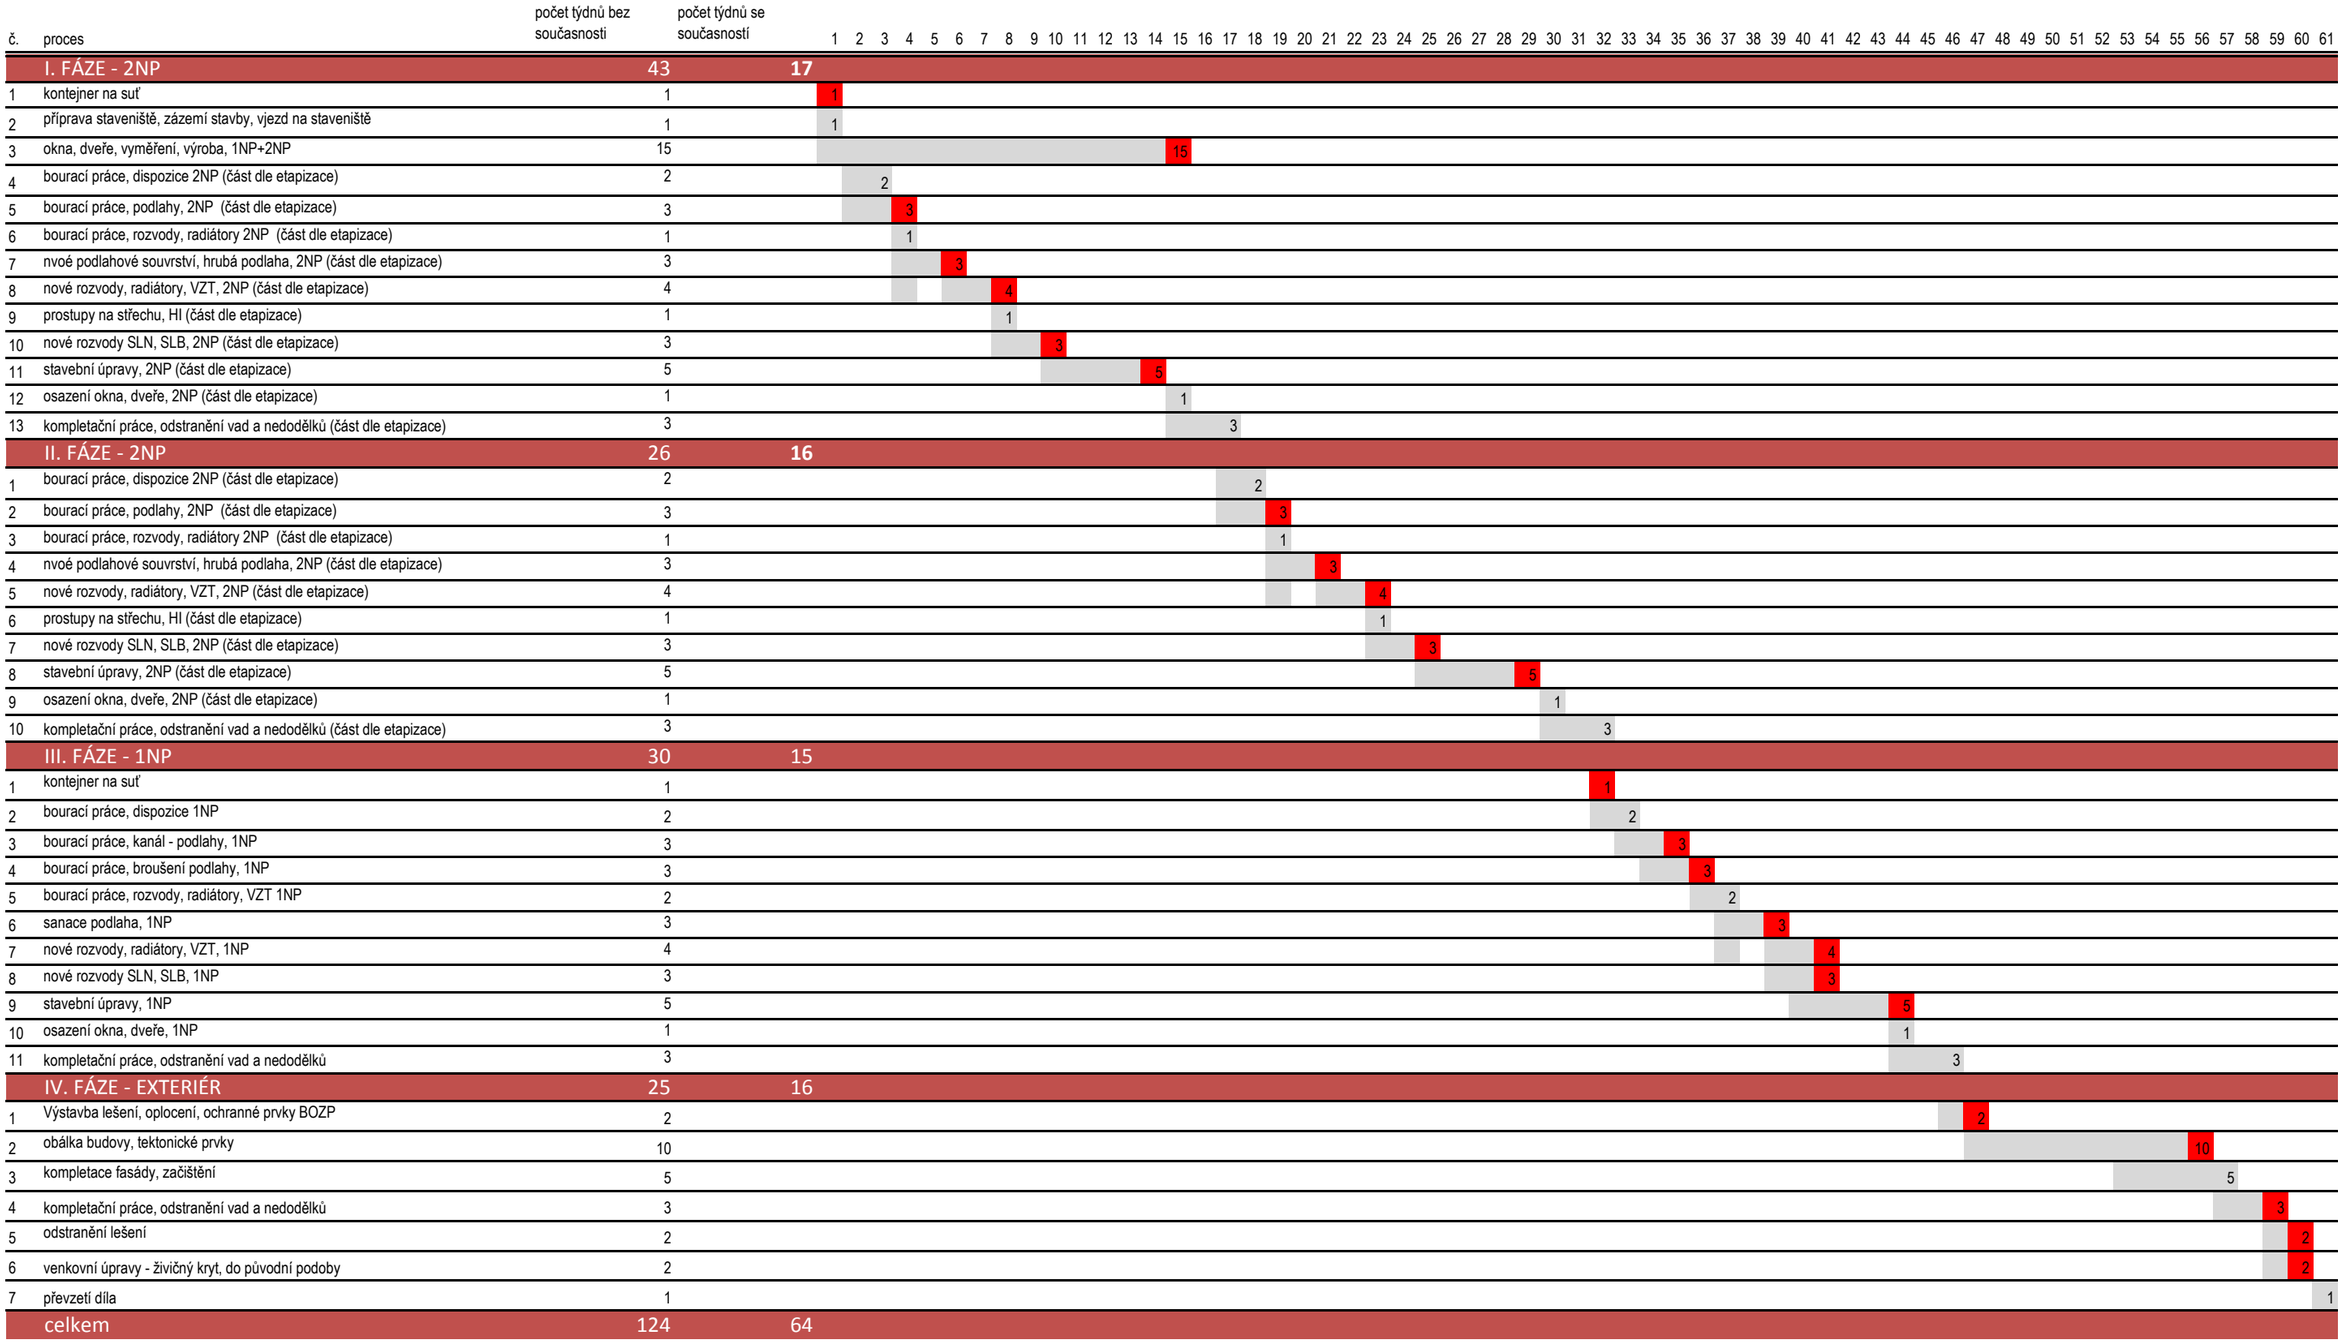č.	proces	počet týdnů bez současnosti	počet týdnů se současností
	I. FÁZE - 2NP	**43**	**17**
1	kontejner na suť	1	
2	příprava staveniště, zázemí stavby, vjezd na staveniště	1	
3	okna, dveře, vyměření, výroba, 1NP+2NP	15	
4	bourací práce, dispozice 2NP (část dle etapizace)	2	
5	bourací práce, podlahy, 2NP (část dle etapizace)	3	
6	bourací práce, rozvody, radiátory 2NP (část dle etapizace)	1	
7	nvoé podlahové souvrství, hrubá podlaha, 2NP (část dle etapizace)	3	
8	nové rozvody, radiátory, VZT, 2NP (část dle etapizace)	4	
9	prostupy na střechu, HI (část dle etapizace)	1	
10	nové rozvody SLN, SLB, 2NP (část dle etapizace)	3	
11	stavební úpravy, 2NP (část dle etapizace)	5	
12	osazení okna, dveře, 2NP (část dle etapizace)	1	
13	kompletační práce, odstranění vad a nedodělků (část dle etapizace)	3	
	II. FÁZE - 2NP	**26**	**16**
1	bourací práce, dispozice 2NP (část dle etapizace)	2	
2	bourací práce, podlahy, 2NP (část dle etapizace)	3	
3	bourací práce, rozvody, radiátory 2NP (část dle etapizace)	1	
4	nvoé podlahové souvrství, hrubá podlaha, 2NP (část dle etapizace)	3	
5	nové rozvody, radiátory, VZT, 2NP (část dle etapizace)	4	
6	prostupy na střechu, HI (část dle etapizace)	1	
7	nové rozvody SLN, SLB, 2NP (část dle etapizace)	3	
8	stavební úpravy, 2NP (část dle etapizace)	5	
9	osazení okna, dveře, 2NP (část dle etapizace)	1	
10	kompletační práce, odstranění vad a nedodělků (část dle etapizace)	3	
	III. FÁZE - 1NP	**30**	**15**
1	kontejner na suť	1	
2	bourací práce, dispozice 1NP	2	
3	bourací práce, kanál - podlahy, 1NP	3	
4	bourací práce, broušení podlahy, 1NP	3	
5	bourací práce, rozvody, radiátory, VZT 1NP	2	
6	sanace podlaha, 1NP	3	
7	nové rozvody, radiátory, VZT, 1NP	4	
8	nové rozvody SLN, SLB, 1NP	3	
9	stavební úpravy, 1NP	5	
10	osazení okna, dveře, 1NP	1	
11	kompletační práce, odstranění vad a nedodělků	3	
	IV. FÁZE - EXTERIÉR	**25**	**16**
1	Výstavba lešení, oplocení, ochranné prvky BOZP	2	
2	obálka budovy, tektonické prvky	10	
3	kompletace fasády, začištění	5	
4	kompletační práce, odstranění vad a nedodělků	3	
5	odstranění lešení	2	
6	venkovní úpravy - živičný kryt, do původní podoby	2	
7	převzetí díla	1	
	celkem	**124**	**64**
