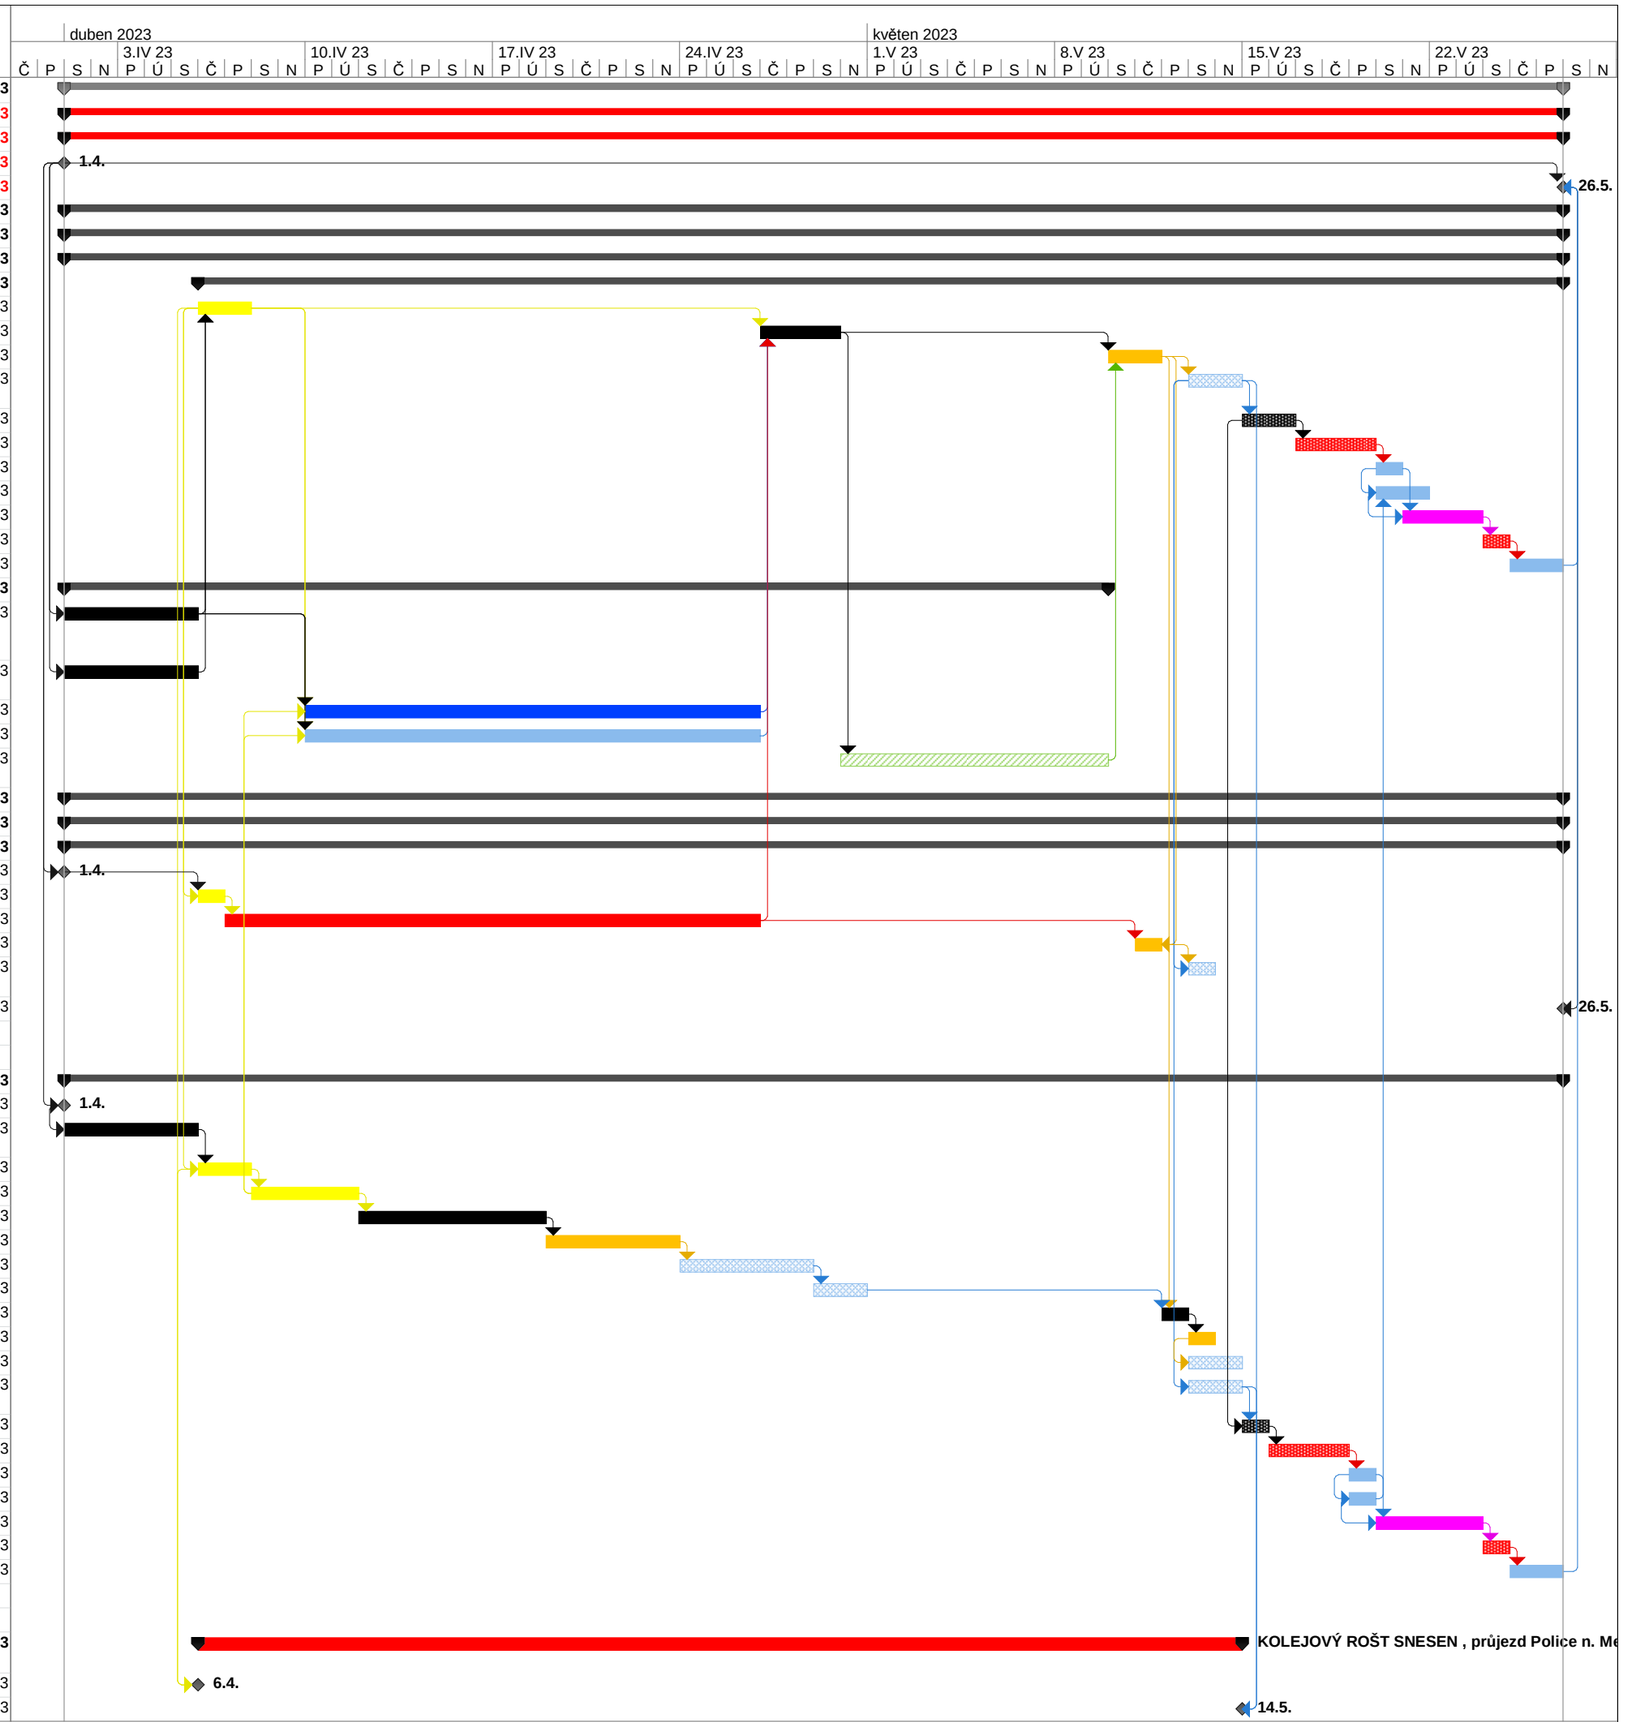ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
0	**HMG Police n. Met. - Teplice n. Met.**	**56 dny**	**1.4. 23**	**26.5. 23**
1	**Výluky kolejí**	**56 dny**	**1.4. 23**	**26.5. 23**
2	**Police n. Met. - Teplice n. Met. NEPŘETRŽITĚ**	**56 dny**	**1.4. 23**	**26.5. 23**
3	**zahájení**	**0 dny**	**1.4. 23**	**1.4. 23**
4	**ukončení**	**0 dny**	**26.5. 23**	**26.5. 23**
5	**Oprava trati v úseku Police n. Met. - Teplice n. Met.**	**56 dny**	**1.4. 23**	**26.5. 23**
6	**D.2.1 Inženýrské objekty**	**56 dny**	**1.4. 23**	**26.5. 23**
7	**D.2.1.1 Železniční svršek a spodek**	**56 dny**	**1.4. 23**	**26.5. 23**
8	**SO 10-01 Železniční svršek, km 73,079 - km 81,580**	**51 dny**	**6.4. 23**	**26.5. 23**
9	vyjmutí kolejového roštu kontinuálně km 81,582-80,645	2 dny	6.4. 23	7.4. 23
10	odtěžení kolejového lože km 80,650-81,125	3 dny	27.4. 23	29.4. 23
11	zřízení štěrkové vrstvy ze Š 32/63 km 81,125-80,650	2 dny	10.5. 23	11.5. 23
12	zřízení kolejového roštu kontinuálně (nové pražce, původní kolejnice) km 80,650-81,582	2 dny	13.5. 23	14.5. 23
13	strojní čištění kolejového lože km 81,582-81,125	2 dny	15.5. 23	16.5. 23
14	směrová a výšková úprava PPK km 80,450-81,582	3 dny	17.5. 23	19.5. 23
15	kontrola PPK	1 den	20.5. 23	20.5. 23
16	souvislá výměna kolejnic 49E1 R350HT km 80,650-81,582	2 dny	20.5. 23	21.5. 23
17	zřízení BK km 80,650-81,582	3 dny	21.5. 23	23.5. 23
18	směrová a výšková úprava PPK	1 den	24.5. 23	24.5. 23
19	dokončovací práce	2 dny	25.5. 23	26.5. 23
20	**SO 11-01 Železniční spodek, km 73,079 - km 81,580**	**39 dny**	**1.4. 23**	**9.5. 23**
21	odtěžení přebytečného materiálu ze svahů, stezek a nezpevněných příkopů v rozsahu dle Projektu; podélný přesun na železničních vozech	5 dny	1.4. 23	5.4. 23
22	odtěžení materiálu v trase zpevněných příkopů v rozsahu dle Projektu; podélný přesun na železničních vozech	5 dny	1.4. 23	5.4. 23
23	trativod km 80,650-81,125	17 dny	10.4. 23	26.4. 23
24	gabion km 80,835-81,155	17 dny	10.4. 23	26.4. 23
25	zvýšení únosnosti žel. spodku km 80,650-81,125 (se snesením kolejového roštu)	10 dny	30.4. 23	9.5. 23
26	**D.2.1.4 Mosty, propustky, zdi**	**56 dny**	**1.4. 23**	**26.5. 23**
27	**D.2.1.4.1 Propustky**	**56 dny**	**1.4. 23**	**26.5. 23**
28	**SO 21-06 Propustek v ev. km 80,833**	**56 dny**	**1.4. 23**	**26.5. 23**
29	zahájení prací na SO	0 dny	1.4. 23	1.4. 23
30	*vyjmutí kolejového roštu*	1 den	6.4. 23	6.4. 23
31	práce při snesené koleji v rozsahu dle dokumentace	20 dny	7.4. 23	26.4. 23
32	*předštěrkování*	1 den	11.5. 23	11.5. 23
33	*zřízení kolejového roštu kontinuálně (nové pražce, původní kolejnice)*	1 den	13.5. 23	13.5. 23
34	ukončení prací na SO	0 dny	26.5. 23	26.5. 23
35				
36				
37	**Oprava kolejí a výhybek v žst. Teplice n. Met. (související stavba)**	**56 dny**	**1.4. 23**	**26.5. 23**
38	zahájení	0 dny	1.4. 23	1.4. 23
39	zemní práce; odtěžení přebytečného materiálu ze svahů a stezek v rozsahu dle Projektu; podélný přesun	5 dny	1.4. 23	5.4. 23
40	vyjmutí kolejového roštu kontinuálně km 81,925-81,575	2 dny	6.4. 23	7.4. 23
41	vyjmutí výhybek a přípojů	4 dny	8.4. 23	11.4. 23
42	odtěžení kolejového lože v rozsahu dle Projektu s výjimkou výh. č.1 a č.2	7 dny	12.4. 23	18.4. 23
43	zřízení štěrkové vrstvy ze Š 32/63 s výjimkou výh. č.1 a č.2	5 dny	19.4. 23	23.4. 23
44	pokládka výhybek č.3, 4 a přípojných polí do kolejí č.4, 6 a 8	5 dny	24.4. 23	28.4. 23
45	pokládka výhybky č.5 a přípojných polí	2 dny	29.4. 23	30.4. 23
46	odtěžení kolejového lože v rozsahu dle Projektu pod výh. č.1 a č.2	1 den	12.5. 23	12.5. 23
47	zřízení štěrkové vrstvy ze Š 32/63 pod výh. č.1 a č.2	1 den	13.5. 23	13.5. 23
48	pokládka výhybek č.1, 2 a přípojných polí do kolejí č.1, 2 a 4	2 dny	13.5. 23	14.5. 23
49	zřízení kolejového roštu kontinuálně (nové pražce, původní kolejnice) km 81,575-81,925 a km 81,979-82,155	2 dny	13.5. 23	14.5. 23
50	strojní čištění kolejového lože km 82,145-82,000 a km 81,920-81,575	1 den	15.5. 23	15.5. 23
51	směrová a výšková úprava PPK	3 dny	16.5. 23	18.5. 23
52	kontrola PPK	1 den	19.5. 23	19.5. 23
53	souvislá výměna kolejnic 49E1 R350HT km 81,575-81,927	1 den	19.5. 23	19.5. 23
54	zřízení BK	4 dny	20.5. 23	23.5. 23
55	směrová a výšková úprava PPK	1 den	24.5. 23	24.5. 23
56	dokončovací práce	2 dny	25.5. 23	26.5. 23
57				
58				
59	**KOLEJOVÝ ROŠT SNESEN , průjezd Police n. Met. - Teplice n. Met. není možný**	**39 dny**	**6.4. 23**	**14.5. 23**
60	zahájení	0 dny	6.4. 23	6.4. 23
61	ukončení	0 dny	14.5. 23	14.5. 23
