Rok 2025-2027, stav.postupy/*výluky*/ vybrané SO	od	dny	do
Stavební postup č.1, přípravné práce, **práce mimo kol.**	**01.01.25**	**811**	**22.03.27**
Přípravné práce, příjezdové komunikace, pomocné vozovky	01.01.25	81	22.03.25
Přeložka plynovodu	08.01.25	28	04.02.25
Přeložka vodovodu	08.01.25	28	04.02.25
Přeložka III/4335	08.01.25	180	06.07.25
Němčický tunel; výstavba od obou portálů	31.01.25	781	22.03.27
Násep nové tratě, vč.konsolidačního, konsolidace, zemní práce	29.01.25	320	14.12.25
Železniční spodek, část štěrkového lože	21.03.26	91	19.06.26
Podpěry TV, bez nároku na výluky	05.06.26	49	23.07.26
Technolog.objekt Němčického tunelu	15.04.26	210	10.11.26
Technolog.objekt odb.Hruška	15.03.25	270	09.12.25
Most v km 62,662 (silnice III/4335)	15.03.26	396	14.04.27
Most v km 64,400 (silnice II/433)	15.03.26	396	14.04.27
Most v km 64,642 (silnice III/43321)	15.03.26	396	14.04.27
Most v km 67,982 (silnice III/4335)	13.02.27	261	31.10.27
Zast. Němčice nad Hanou, nástupiště	01.03.27	28	28.03.27
Zast. Měrovice nad Hanou, nástupiště	01.03.27	28	28.03.27
TK+TV Nezamyslice-Kojetín na 10x5 hod	*15.01.25*	*10*	*24.01.25*
Rok 2028, stavební postupy / *výluky*	od	dny	do
Stavební postup č.2, práce v koleji č.2	**01.04.28**	**126**	**04.08.28**
Zast. Němčice nad Hanou, nástupiště; dokončení	30.06.28	21	20.07.28
Zast. Měrovice nad Hanou, nástupiště	26.05.28	56	20.07.28
TK+TV Nezamyslice-Kojetín nepřetržitě, ZP	***01.04.28***	***126***	***04.08.28***
ŽST Kojetín, vlečka Tereos TTD a.s. za výhybkou č.L10 od km 72,4 nepřetržitě	*18.05.28*	*2*	*19.05.28*
ŽST Nezamyslice, vypnutí TV liché KS na 3x6 hod	*26.06.28*	*3*	*28.06.28*
ŽST Kojetín, vypnutí TV liché KS na 3x6 hod	*29.06.28*	*3*	*01.07.28*
Aktivace zab.zař.	*08.07.28*	*28*	*04.08.28*
Zprovoznění TK2 Nezamyslice-Kojetín	**-**	**-**	***04.08.28***
Stavební postup č.3, práce v koleji č.1	**05.08.28**	**138**	**20.12.28**
Zprovoznění TK1 Nezamyslice-Kojetín	**-**	**-**	***18.09.27***
Most v km 63,501-zrušení	01.08.27	14	14.08.27
Most v km 65,579-zrušení	15.08.27	14	28.08.27
Most v km 67,982-zrušení	15.08.27	14	28.08.27
Nový stav komunikací	29.08.27	91	27.11.27
Ostatní dokončovací práce	28.10.27	56	22.12.27
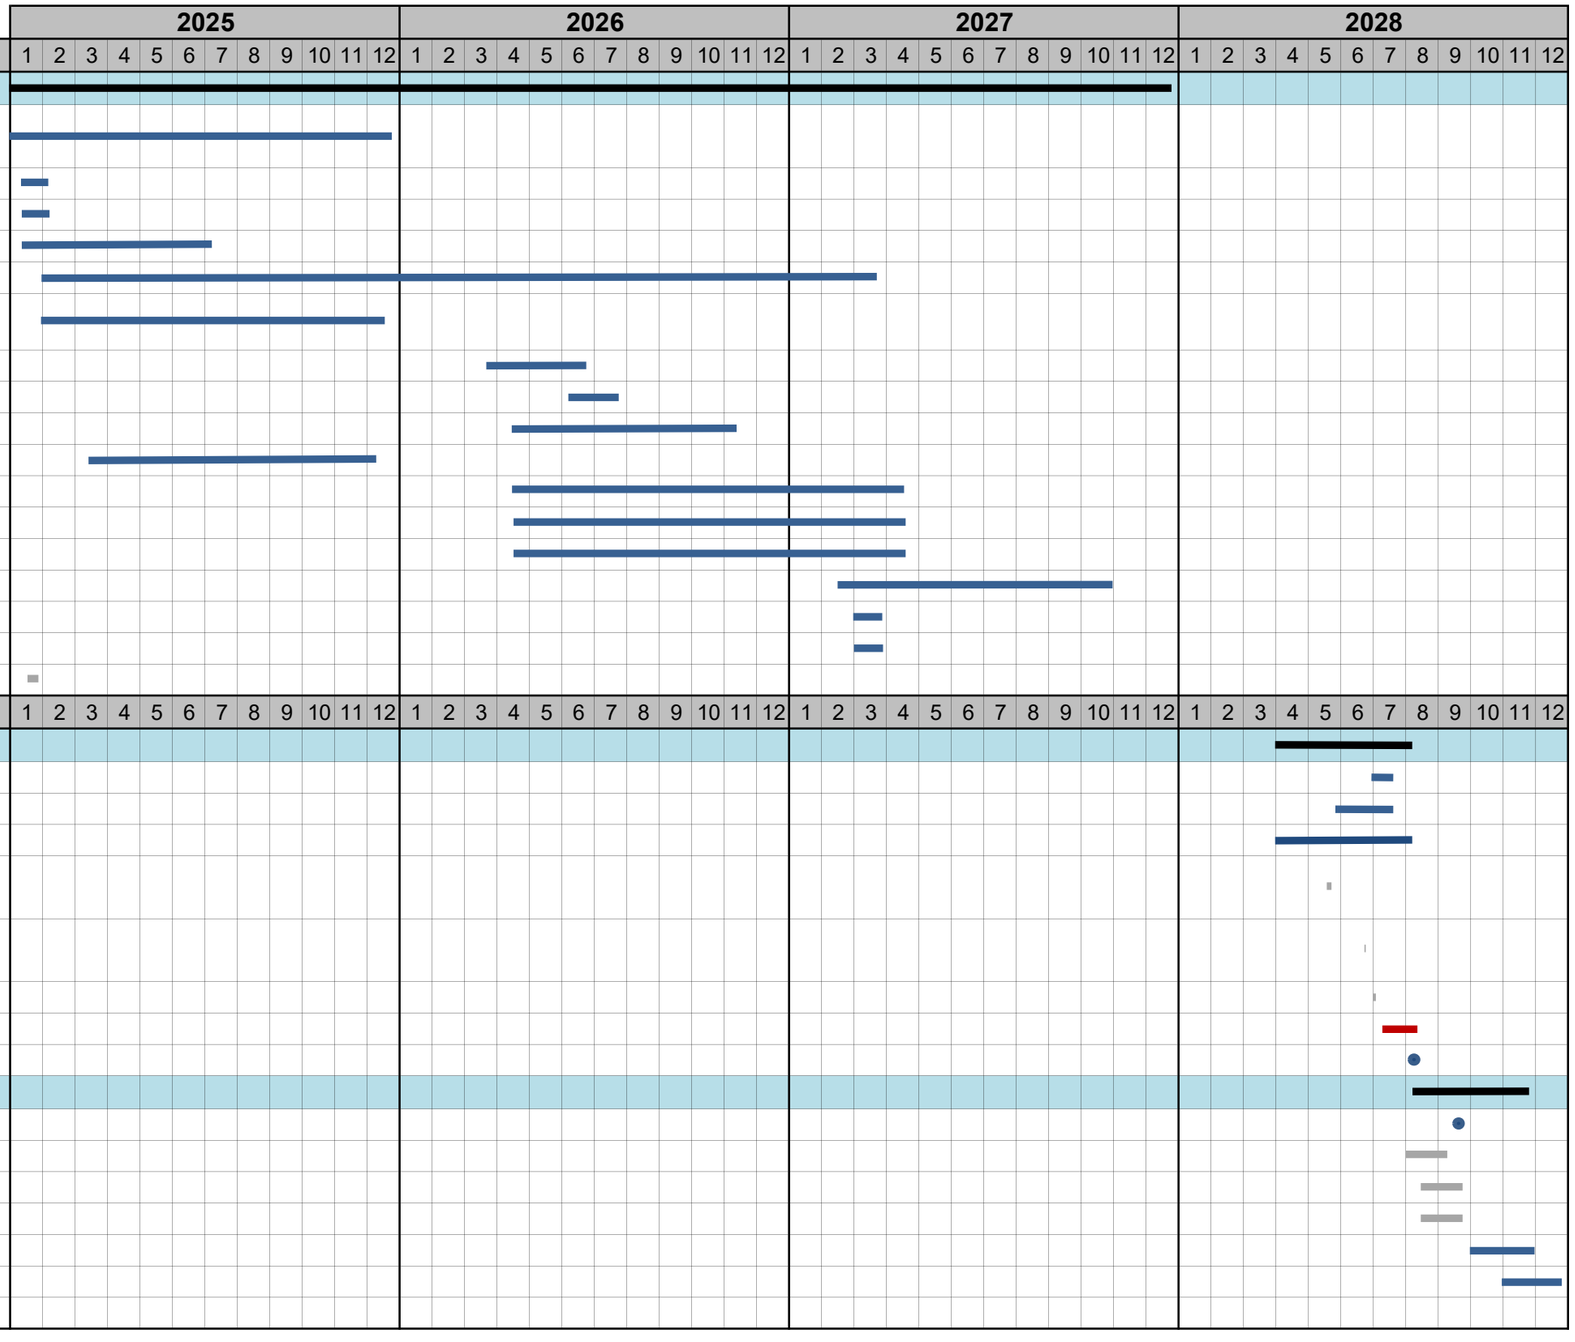
Stavba celkem	**01.01.25**	**1450**	**20.12.28**
