B.8.3 Harmonogram

	Vybrané SO	od	dny	do
1	**B.8.3.1 Harmonogram výstavby**			
2	Přípravné práce	01.08.25	56	25.09.25
3	Skrývka ornice, zemní práce v místě TK2, konsolidace	01.08.25	724	25.07.27
4	TK2 Kojetín-Chropyně	15.02.27	161	25.07.27
5	TK2 Chropyně-Přerov	26.07.27	148	20.12.27
6	TK1 Kojetín-Chropyně	01.04.28	154	01.09.28
7	TK1 Chropyně-Přerov	01.04.28	154	01.09.28
8	Obchvat Kojetína, mostní objekty	01.08.25	145	23.12.25
9	Obchvat Kojetína včetně nadjezdu km 71,178; výstavba, konsolidace, zprovoznění	01.08.25	441	15.10.26
10	ŽST Kojetín, kolejiště v nové konfiguraci	01.08.25	724	25.07.27
11	ŽST Kojetín, provizorní zázemí stanice	25.10.26	660	14.08.28
12	ŽST Kojetín, demolice stávající VB	15.11.26	28	12.12.26
13	ŽST Kojetín, technologická budova; stavební a technologická část	15.08.25	458	15.11.26
14	ŽST Kojetín, VB	13.12.26	595	29.07.28
15	ŽST Kojetín, podchod v km 72,250	15.02.27	124	18.06.27
16	ŽST Kojetín, provizorní přechod	19.04.27	69	26.06.27
17	ŽST Kojetín, snesení lávky v km 73,673	22.04.27	7	28.04.27
18	ŽST Kojetín, silniční podjezd v km 72,553	01.03.27	120	28.06.27
19	ŽST Chropyně, kolejiště v nové konfiguraci	01.08.25	1128	01.09.28
20	ŽST Chropyně, VB	15.08.25	574	11.03.27
21	ŽST Chropyně, demolice stávající VB	01.04.28	21	21.04.28
22	ŽST Chropyně, technologická budova; stavební a technologická část	01.08.25	427	01.10.26
23	ŽST Chropyně, podchod v km 77,115	15.08.25	1099	17.08.28
24	ŽST Chropyně, provizorní přechod	01.04.28	163	10.09.28
25	Odb. Bochoř, technologická budova; stavební a technologická část	01.08.25	427	01.10.26
26	Obchvat Chropyně včetně nadjezdu km 77,705; výstavba, konsolidace, zprovoznění	12.09.25	756	07.10.27
27	Silniční nadjezd v km 73,903; konsolidace náspu, zprovoznění	15.08.25	420	08.10.26
28	Silniční nadjezd v km 81,408; konsolidace náspu, zprovoznění	15.08.25	700	15.07.27
29	Silniční nadjezd v km 83,146; konsolidace náspu, zprovoznění	15.08.25	735	19.08.27
30	Most v km 73,610 v TK2 Kojetín-Chropyně (Morava)	08.08.25	224	19.03.26
31	Most v km 73,610 v TK1 Kojetín-Chropyně (Morava)	30.08.27	210	26.03.28
32	ŽST Přerov, Lověšický podjezd	27.03.26	827	30.06.28
33	**B.8.3.2 Harmonogram výluk**			
34	**Rok 2025-2026, stavební postupy** / *výluky*	od	dny	do
35	**Stavební postup č.0,** připravné práce, nezamyslické zhl. ŽST Kojetín, TK2 Kojetín-Přerov, sudá KS ŽST Chropyně, kolej č.101, 91 a Lověšický podjezd v ŽST Přerov	**01.08.25**	**510**	**23.12.26**
36	***TK+TV Němčice nad Hanou-Kojetín*** *na 91 dnů nepřetržitě vč. TV*	***26.08.25***	***91***	***24.11.25***
37	*TK+TV Kojetín-Přerov na 35x8 hod, pažení u mostů a prop.*	*26.08.25*	*35*	*29.09.25*
38	*ŽST Kojetín, SK3-SK9 na přerovském zhlaví včetně TV*	*26.08.25*	*91*	*24.11.25*
39	*ŽST Kojetín, vlečka od výhybky č.L9 Tereos TTD a.s. Závod lihovar Kojetín nepřetržitě na 91 dnů, obsluha přes výh.č.L1, platí i pro vlečku SOUFFLET AGRO, a.s. vlečka Kojetín a vlečka Chemagra, s.r.o.*	*26.08.25*	*91*	*24.11.25*
40	*ŽST Chropyně, SK2, SK4 nepřetržitě s následným zrušením včetně TV*	*26.08.25*	*-*	*-*
41	***TK+TV Kojetín-Přerov*** *na 2 dny (víkend, odstranění bednění nadjezdu v km 73,903)*	*11.07.26*	*2*	*12.07.26*
42	***TK+TV Kojetín-Přerov*** *na 2 dny (víkend, dokončení nadjezdu v km 73,903)*	*22.08.26*	*2*	*23.08.26*
43	***TK+TV Kojetín-Přerov*** *na 2 dny (víkend, dokončení nadjezdu v km 73,903)*	*29.08.26*	*2*	*30.08.26*
44	*ŽST Přerov, SK101 mezi výhybkami č.104 (mimo) a 122 (mimo) nepřetržitě na 105 dnů včetně vypnutí TV*	*17.07.26*	*105*	*29.10.26*
45	*ŽST Přerov, kolej č.91 nepřetržitě na 105 dnů včetně vypnutí TV*	*17.07.26*	*105*	*29.10.26*
46	**Technologická přestávka zimního období** (předpoklad)	**24.12.26**	**53**	**14.02.27**
47	**Rok 2027, stavební postupy** / *výluky*	od	dny	do
48	**Stavební postup č.1,** ŽST Kojetín, TK2 Kojetín-Chropyně, sudá KS ŽST Chropyně, TK2 Chropyně-Přerov	**15.02.27**	**161**	**25.07.27**
49	***TK Kojetín-Chropyně*** *nepřetržitě včetně vypnutí TV*	***15.02.27***	***161***	***25.07.27***
50	*ŽST Kojetín,* ***celá stanice****, jízda vlaků umožněna novými výhybkami č.34, 33, 32, 31, 28, 25XN, 24XN, 23 na vlečku Tereos TTD a.s. Závod lihovar Kojetín přes výhybku č.L9.*	*15.02.27*	*105*	*30.05.27*
51	*ŽST Kojetín, vlečka od výhybky č.L1 Tereos TTD a.s. Závod lihovar Kojetín nepřetržitě na 161 dnů, obsluha přes výh.č.L9, platí i pro vlečku SOUFFLET AGRO, a.s. vlečka Kojetín a vlečka Chemagra, s.r.o.*	*15.02.27*	*161*	*25.07.27*
52	*ŽST Kojetín, přednostní zprovoznění nových SK4a, SK4, SK4c, SK6 společně s TK Kojetín-Tovačov*	*-*	*-*	*30.05.27*
53	***TK Kojetín-Tovačov*** *nepřetržitě včetně vypnutí TV*	***15.02.27***	***105***	***30.05.27***
54	*ŽST Kojetín, lichá KS, kusé koleje za výh.č.16*	*31.05.27*	*70*	*08.08.27*
55	*Kojetín-Tovačov, vlečka Českomoravský štěrk, a.s., vlečka štěrkopískovna Tovačov, vlečka TOPOS PREFA Tovačov, vlečka KŠ PREFA*	*15.02.27*	*105*	*30.05.27*
56	***TK Kojetín-Kroměříž*** *nepřetržitě*	***15.02.27***	***161***	***25.07.27***
57	*ŽST Chropyně, SK7+TV nepřetržitě s následným zrušením v úseku výh.č.9-km 77,15*	*15.02.27*	*-*	*-*
58	**Stavební postup č.2,** sudá KS ŽST Kojetín, TK1, TK2 Chropyně-Přerov, koleje č.104, 106, 108 a Lověšický podjezd v ŽST Přerov	**26.07.27**	**148**	**20.12.27**
59	***TK Chropyně-Přerov*** *nepřetržitě včetně vypnutí TV; původní kolej*	***26.07.27***	***148***	***20.12.27***
60	*Jízda nákl. vlaků po nové TK2 Kojetín-Přerov s jejím provizor. propojením se stávající lichou KS ŽST Chropyně pro obsluhu tamějších vleček*	*26.07.27*	*148*	*20.12.27*
61	*ŽST Přerov, fáze A1, jízda z traťových kolejí č.401, 402 do svazku kolejí č.200-230 neumožněna (zřízení provizorní propojky výhybek č.128 a 111)*	*26.07.27*	*10*	*04.08.27*
62	*ŽST Přerov, fáze A2, SK102 mezi výhybkami č.92 (mimo) a 128 (mimo) nepřetržitě na 105 dnů včetně vypnutí TV*	*05.08.27*	*119*	*01.12.27*
63	*ŽST Přerov, fáze A2, SK104 mezi výhybkami č.85 (mimo) a 121 (mimo) nepřetržitě na 105 dnů včetně vypnutí TV*	*05.08.27*	*119*	*01.12.27*
64	*ŽST Přerov, fáze A2, SK106, SK108 mezi výhybkami č.78 (mimo) a 111 (mimo) 35 dnů včetně vypnutí TV*	*05.08.27*	*35*	*08.09.27*
65	*ŽST Přerov, fáze B, jízda z traťových kolejí č.401, 402 do svazku kolejí č.200-230 neumožněna (odstranění provizorní propojky výhybek č.128 a 111, pokládka výh.č.111, 112 a SVÚ výhybek č.306, 309, 311, 312)*	*09.09.27*	*10*	*18.09.27*
65	**Technologická přestávka zimního období** (předpoklad)	**21.12.27**	**100**	**29.03.28**
66	**Rok 2028, stavební postupy** / *výluky*	od	dny	do
67	**Stavební postup č.3,** TK1 Kojetín-Přerov, lichá KS ŽST Chropyně	**01.04.28**	**154**	**01.09.28**
68	***TK1 Kojetín-Přerov*** *nepřetržitě včetně vypnutí TV*	*01.04.28*	*154*	*01.09.28*
69	*ŽST Chropyně, lichá kolejová skupina*	*01.04.28*	*154*	*01.09.28*
70	*ŽST Chropyně, žel.vlečka FATRA, a.s. provoz Chropyně*	*01.04.28*	*35*	*05.05.28*
71	*ŽST Chropyně, žel.vlečka Skladový areál MR Chropyně Rasina*	*01.04.28*	*35*	*05.05.28*
72	*ŽST Přerov, fáze B, výtažná kolej č.240c (v novém značení č.200a) od výhybky č.318 nepřetržitě na 127 dnů*	*01.04.28*	*127*	*05.08.28*
73	**Stavební postup č.4,** aktivace zabezpečovacího zařízení	**02.09.28**	**110**	**20.12.28**
74	***TK1 Kojetín-Přerov*** *nepřetržitě včetně vypnutí TV*	*02.09.28*	*21*	*22.09.28*
75	*ŽST Chropyně, lichá KS*	*02.09.28*	*21*	*22.09.28*
76	Dokončovací práce, vyklizení staveniště, úklid, DSPS.	02.09.28	110	20.12.28
	Stavba celkem	**01.08.25**	**1238**	**20.12.28**

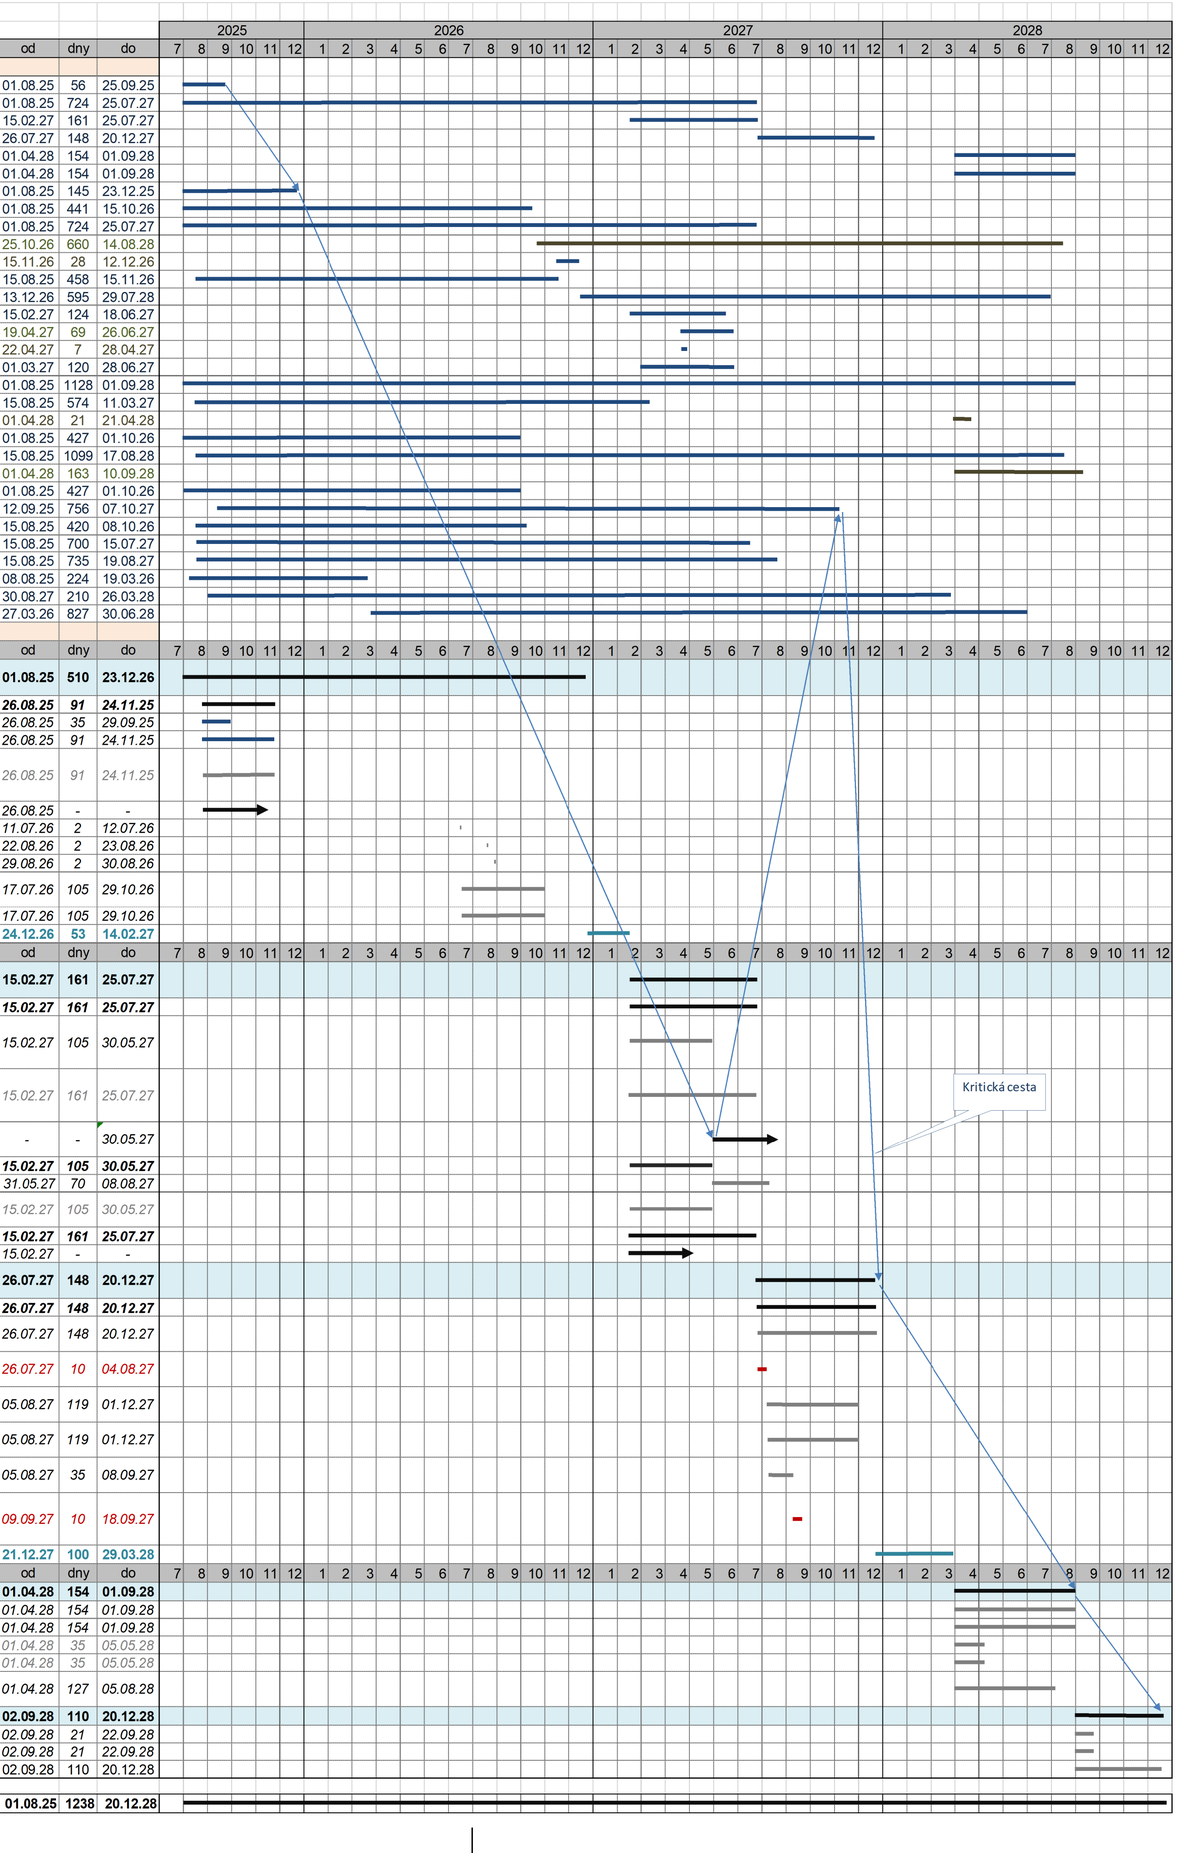

Spolufinancováno Evropskou unií

sfdi STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	27.09.2024	Dokumentace PDPS	Ing. Jiří Malina

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	**Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1**
Zástupce investora:	**Stavební správa východ**
Adresa:	**Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc**

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel díla:	**Společnost Koj-Pře**
Adresa:	**MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.** Legionářská 1085/8 779 00 Olomouc T: +420 585570444 E: moravia@moravia.cz
Kontakt:	**SAGASTA s.r.o.** Novodvorská 1010/14 142 00 Praha 4-Lhotka T: +420 261344100 E: info@sagasta.cz
	EXprojekt s.r.o. Heršpická 758/13 Štýřice, 619 00 Brno T: +420 533312000 E: info@exprojekt.cz
Zhotovitel části/objektu:	**MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**
Adresa:	**Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc**
Kontakt:	T: +420 585 570 444 E: moravia@moravia.cz
Hlavní projektant (HIP):	**Ing. J. Malina**
Specialista:	

Název stavby/akce:	**Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín Přerov**		Označení investora: **S621500937** Zakázka: **23-020-232-SR**
Název části:	Souhrnná část		Označení části: **B**
Název objektu/dílčí části:	**Zásady organizace výstavby**		Označení objektu/komplexu: **B.8**
Název přílohy:	Harmonogram		Číslo přílohy (typ/pořadí): **3. 001**
Název dílčí části přílohy:	-		
Odpovědný projektant: Ing. Petr Čech	Zpracovatel přílohy: Ing. Petr Čech	Měřítko: - Formáty: 8xA4	Stupeň dokumentace: **PDPS**
Kraj: Olomoucký	Katastrální území: dle přílohy	TUDU: 2101 Brno-hl.n. – Přerov	Smluvní datum zpracování: **27.9.2024**

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 2 1 5 0 0 9 3 7	P D P S	B X X X	B 8	X X X X X	3	0 0 0

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O D.Í.O. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINAK ROZŠÍŘOVÁNA BEZ SOUHLASU MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ. VYJÁDŘENÉ NÁZORY A STANOVISKA JSOU VŠAK POUZE NÁZORY A STANOVISKY AUTORA/AUTORŮ A NEMUSÍ NUTNĚ ODRÁŽET NÁZORY A STANOVISKA EVROPSKÉ UNIE NEBO CINEA. EVROPSKÁ UNIE ANI CINEA ZA NĚ NEMOHOU NÉST ODPOVĚDNOST.
