Modernizace traťového úseku odb. Kanín – Chlumec nad Cidlinou (včetně) **Příloha č. 004**
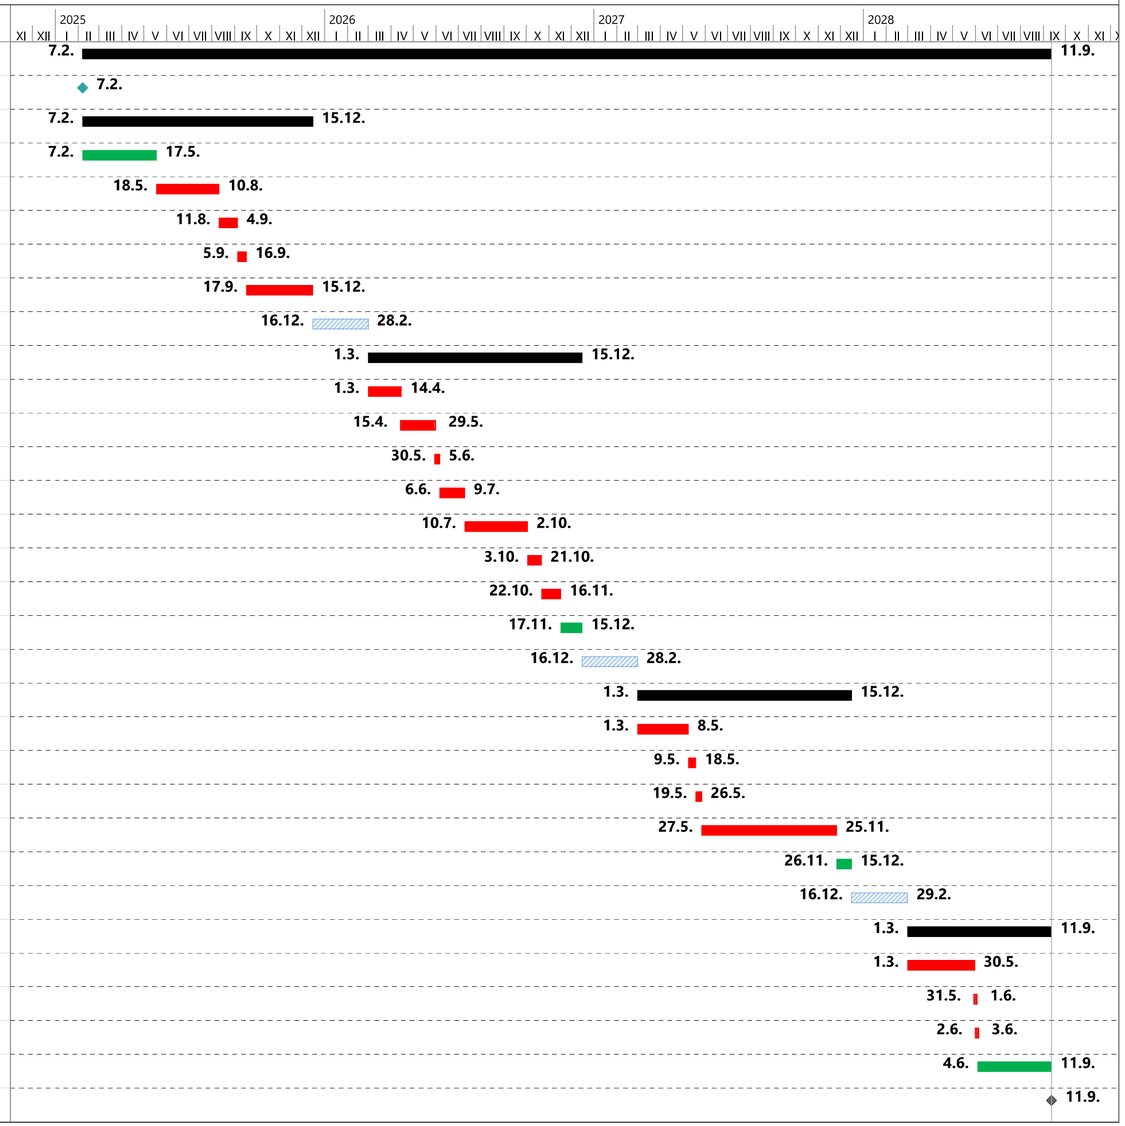
ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	**Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)**	**1313 dny**	**7.2. 25**	**11.9. 28**
2	Zahájení stavby	0 dny	7.2. 25	7.2. 25
3	**1. stavební sezóna**	**312 dny**	**7.2. 25**	**15.12. 25**
4	Přípravné práce	100 dny	7.2. 25	17.5. 25
5	Stavební postup č. 1A (úsek Kanín - Zapeč, výstavba základů TV)	85 dny	18.5. 25	10.8. 25
6	Stavební postup č. 1B (úsek Kanín - Chlumec, přeložka TV)	25 dny	11.8. 25	4.9. 25
7	Stavební postup č. 1C (úsek Chlumec - Zapeč, přeložka TV)	12 dny	5.9. 25	16.9. 25
8	Stavební postup č. 2A (úsek Kanín -Zapeč, budování násypů)	90 dny	17.9. 25	15.12. 25
9	***Technologická přestávka + přípravné práce***	***75 dny***	***16.12. 25***	***28.2. 26***
10	**2. stavební sezóna**	**290 dny**	**1.3. 26**	**15.12. 26**
11	Stavební postup č. 2B (úsek Kanín - Zapeč, budování násypů) (Chlumec 8., 10., 12., 14. SK)	45 dny	1.3. 26	14.4. 26
12	Stavební postup č. 2C (úsek Kanín - Zapeč, budování násypů) (Chlumec 4., 6. SK)	45 dny	15.4. 26	29.5. 26
13	Stavební postup č. 3A (Chlumec, hradecké zhlaví, sudá skupina kolejí) (Chlumec - Zapeč 2. TK)	7 dny	30.5. 26	5.6. 26
14	Stavební postup č. 3B (Chlumec, hradecké zhlaví, sudá skupina kolejí) (Chlumec - Zapeč 2. TK)	34 dny	6.6. 26	9.7. 26
15	Stavební postup č. 4A (Chlumec, hradecké zhlaví, lichá skupina kolejí) (Chlumec - Zapeč 1. TK)	85 dny	10.7. 26	2.10. 26
16	Stavební postup č. 4B (Chlumec, hradecké zhlaví, lichá skupina kolejí - dostavba) (Chlumec - Zapeč 1. TK)	19 dny	3.10. 26	21.10. 26
17	Stavební postup č. 5 (Chlumec, hradecké zhlaví,sudá skupina kolejí - dostavba)	26 dny	22.10. 26	16.11. 26
18	Rezerva	29 dny	17.11. 26	15.12. 26
19	***Technologická přestávka + přípravné práce***	***75 dny***	***16.12. 26***	***28.2. 27***
20	**3. stavební sezóna**	**290 dny**	**1.3. 27**	**15.12. 27**
21	Stavební postup č. 6A (Chlumec, osecké zhlaví, lichá a sudá skupina kolejí) (úsek Kanín - Chlumec)	69 dny	1.3. 27	8.5. 27
22	Stavební postup č. 6B (Chlumec, osecké zhlaví, sudá skupina kolejí) (úsek Kanín - Chlumec)	10 dny	9.5. 27	18.5. 27
23	Stavební postup č. 6C (Chlumec, osecké zhlaví, sudá skupina kolejí - dostavba) (úsek Kanín - Chlumec)	8 dny	19.5. 27	26.5. 27
24	Stavební postup č. 6D (úsek Kanín - Chlumec)	183 dny	27.5. 27	25.11. 27
25	Rezerva	20 dny	26.11. 27	15.12. 27
26	***Technologická přestávka + přípravné práce***	***76 dny***	***16.12. 27***	***29.2. 28***
27	**4. stavební sezóna**	**195 dny**	**1.3. 28**	**11.9. 28**
28	Stavební postup č. 7A (dostavba úseku Kanín - Chlumec, část Choťovice - Převýšov-Les, 2. TK)	91 dny	1.3. 28	30.5. 28
29	Stavební postup č. 7B (demontáž proviz. zařízení v úseku Dobšice-L. - Choťovice, 2. TK + Převýšov-L. - Chlumec, 1. TK)	2 dny	31.5. 28	1.6. 28
30	Stavební postup č. 7C (demontáž proviz. zařízení v úseku Dobšice-L. - Choťovice, 1. TK + Převýšov-L. - Chlumec, 2. TK)	2 dny	2.6. 28	3.6. 28
31	Dokončovací práce	100 dny	4.6. 28	11.9. 28
32	Ukončení výstavby	0 dny	11.9. 28	11.9. 28
