MODERNIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU HRADEC KRÁLOVÉ (MIMO) - TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ (MIMO)

Příloha č. 4
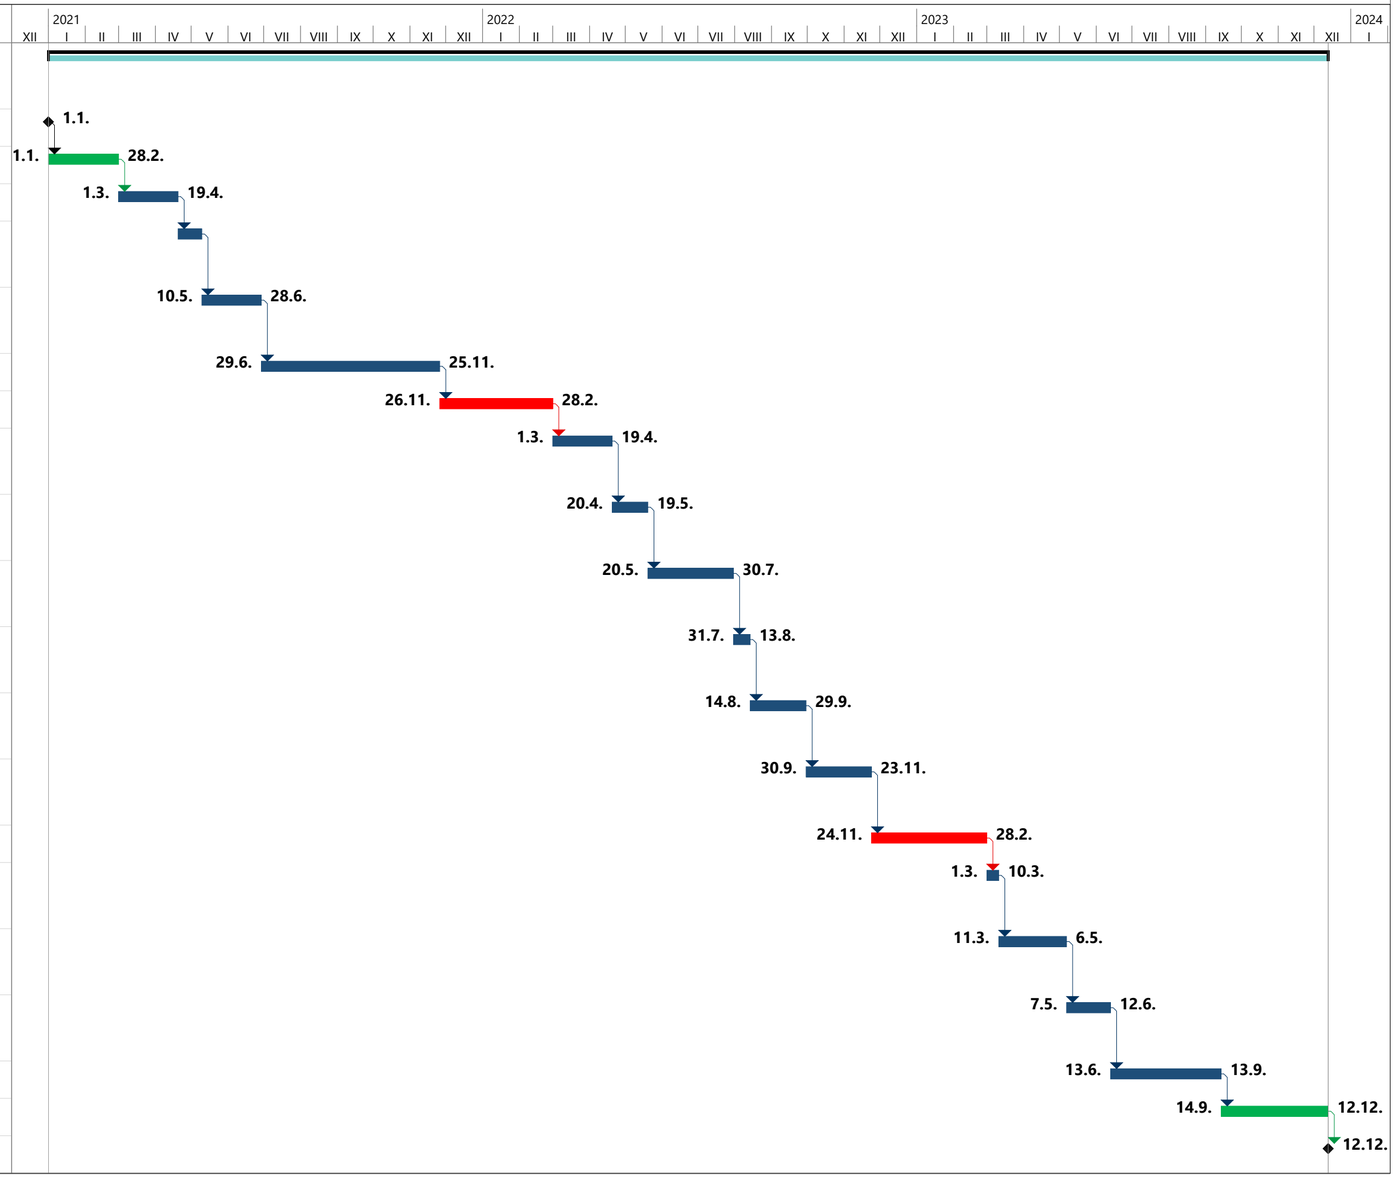
ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	**MODERNIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKUHRADEC KRÁLOVÉ (MIMO) - TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ (MIMO)**	**1076 dny**	**1.1. 21**	**12.12. 23**
2	Zahájení stavby	0 dny	1.1. 21	1.1. 21
3	Přípravné práce	59 dny	1.1. 21	28.2. 21
4	1A. stavební postup (odstranění TV a předpříprava)	50 dny	1.3. 21	19.4. 21
5	1B. stavební postup (odstranění TV, budování násypů a prvků v příkládané koleji a předpříprava)	20 dny	20.4. 21	9.5. 21
6	1C. stavební postup (odstranění TV, budování násypů a prvků v příkládané koleji a předpříprava)	50 dny	10.5. 21	28.6. 21
7	2. stavební postup (budování násypů a prvků v příkládané koleji)	150 dny	29.6. 21	25.11. 21
8	Technologická přestávka	95 dny	26.11. 21	28.2. 22
9	3A. stavební postup (úsek HK-Slez. Předměstí - Třebechovice pod Orebem + zhlaví v ŽST HK-Slez. Předměstí a Třebechovice pod Orebem)	50 dny	1.3. 22	19.4. 22
10	3B. stavební postup (úsek HK-Slez. Předměstí - Třebechovice pod Orebem + zhlaví v ŽST HK-Slez. Předměstí a Třebechovice pod Orebem)	30 dny	20.4. 22	19.5. 22
11	3C. stavební postup (úsek HK-Slez. Předměstí - Třebechovice pod Orebem + zhlaví v ŽST HK-Slez. Předměstí a Třebechovice pod Orebem)	72 dny	20.5. 22	30.7. 22
12	4A. stavební postup (úsek Třebechovice pod Orebem - Týniště nad Orlicí + zhlaví v ŽST Třebechovice pod Orebem)	14 dny	31.7. 22	13.8. 22
13	4B. stavební postup (úsek Třebechovice pod Orebem - Týniště nad Orlicí + zhlaví v ŽST Třebechovice pod Orebem)	47 dny	14.8. 22	29.9. 22
14	4C. stavební postup (úsek Třebechovice pod Orebem - Týniště nad Orlicí + zhlaví v ŽST Třebechovice pod Orebem)	55 dny	30.9. 22	23.11. 22
15	Technologická přestávka	97 dny	24.11. 22	28.2. 23
16	5A. stavební postup (úsek Hradec Králové hl. n. - HK-Slez. Předměstí + ŽST HK-Slez. Předměstí + ŽST Třebechovice pod Orebem)	10 dny	1.3. 23	10.3. 23
17	5B. stavební postup (úsek Hradec Králové hl. n. - HK-Slez. Předměstí + ŽST HK-Slez. Předměstí + ŽST Třebechovice pod Orebem)	57 dny	11.3. 23	6.5. 23
18	5C. stavební postup (úsek Hradec Králové hl. n. - HK-Slez. Předměstí + ŽST HK-Slez. Předměstí + ŽST Třebechovice pod Orebem)	37 dny	7.5. 23	12.6. 23
19	6. stavební postup (ŽST Třebechovice pod Orebem)	93 dny	13.6. 23	13.9. 23
20	Dokončovací práce	90 dny	14.9. 23	12.12. 23
21	Konec projektu	0 dny	12.12. 23	12.12. 23
