Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	19.06.2022	PDPS k připomínkovému řízení	Ing. Přemysl Zeman
001	19.06.2023	PDPS čistopis	Ing. Přemysl Zeman

Stavebník/investor:	**Správa železnic, státní organizace**	SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	

Zhotovitel stavby:	**Společnost AFRY Klatovy**	AFRY	projektil architekti 4,5 mm
Adresa:	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4		
Kontakt:	T: +420 277 005 500 E: afrycz@afry.com		
Zhotovitel objektu:	**AFRY CZ s.r.o**	AFRY	
Adresa:	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4		
Kontakt:	T: +420 723 213 271 E: petr.adam@afry.com		

Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:
Ing. Petr Adam	Ing.Petr Adam	Ing.Petr Adam	Ing.Petr Adam

Název stavby/akce:	**Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Klatovy**		S-kód: **S631700309**
			Zakázka: **2021/0005**
Název části:	Souhrnná technická zpráva - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY		Označení části: **B.8**
Název objektu:			Číslo objektu/komplexu:
Název přílohy:	Harmonogram - Fáze 1a		Číslo přílohy: **3** **002**
Název dílčí části přílohy:			Paré:
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	
Plzeňský	Klatovy (665 797)	0361-H1	
Dokumentace:			
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
PDPS	19.06.2023		

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:
S 6 3 1 7 0 0 3 0 9	_ P D P S	_ B 8 _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _	_ 3 _ 0 0 2 _ 0 0 1

Prostor pro další informace

Ozn.	Fáze 1a - Vestavba výtahu V4 na 2.nástupiště - Stavební činnost	Doba trvání (dni)
1	**Demontáž zastřešení - z koleje odřezáváním po menších kusech s použitím jeřábu**	4
	PROVOZ - Koleje č.3 - VYLOUČENÁ - pohyb kolejového jeřábu	
	PROVOZ - Koleje č.1 - VYLOUČENÁ - pohyb kolejového jeřábu	
	TRAKCE - Kolej č.3 - VÝLUKA TV + její odsun od osy koleje + současně výluka trakce kolejí č. 5, 7a	
	TRAKCE - Kolej č.1 - VÝLUKA TV + její odsun od osy koleje + současně výluka trakce koleje č. 2	
2	**Demontáž části hrany nástupiště + demontáž koleje č.3.**	4
	PROVOZ - Koleje č.3 - VYLOUČENÁ pohyb jeřábu / bagru; V PROVOZU ze směr od Železné Rudy	
	PROVOZ - Koleje č.1 - VYLOUČENÁ - pohyb stavební techniky pro demontáž "L"profilů nástup. hrany	
	TRAKCE - Kolej č.3 - VÝLUKA TV + její odsun od osy koleje + současně výluka trakce kolejí č. 5, 7a	
	TRAKCE - Kolej č.1 - VÝLUKA TV + její odsun od osy koleje + současně výluka trakce koleje č. 2	
3	**Beranění štětovnic - z koleje**	2
	PROVOZ - Koleje č.3 - V PROVOZU ze směr od Železné Rudy; VYLOUČENÁ ze směru od Plzně	
	PROVOZ - Koleje č.1 - VYLOUČENÁ - pohyb jeřábu s beranidlem	
	TRAKCE - Kolej č.3 - VÝLUKA TV + její odsun od osy koleje + současně výluka trakce kolejí č. 5, 7a	
	TRAKCE - Kolej č.1 - VÝLUKA TV + její odsun od osy koleje + současně výluka trakce koleje č. 2	
4	**Výkopové práce**	3
	PROVOZ - Koleje č.3 - V PROVOZU ze směr od Železné Rudy; VYLOUČENÁ ze směru od Plzně	
	PROVOZ - Koleje č.1 - VYLOUČENÁ - pohyb stavební techniky (bagr + kontejner)	
	TRAKCE - Kolej č.3 - VÝLUKA TV + současně výluka trakce kolejí č. 5, 7a	
	TRAKCE - Kolej č.1 - VÝLUKA TV + její odsun od osy koleje + současně výluka trakce koleje č. 2	
5	**Armování a betonáž základové desky**	2
	PROVOZ - Koleje č.3 - V PROVOZU ze směr od Železné Rudy; VYLOUČENÁ ze směru od Plzně	
	PROVOZ - Koleje č.1 - V PROVOZU ze směr od Železné Rudy; VYLOUČENÁ v době betonáže	
	TRAKCE - Kolej č.3 - VÝLUKA TV + současně výluka trakce kolejí č. 5, 7a	
	TRAKCE - Kolej č.1 - VÝLUKA TV + její odsun od osy koleje + současně výluka trakce koleje č. 2	
6	**Armování a betonáž nosné konstrukce**	6
	PROVOZ - Koleje č.3 - V PROVOZU ze směr od Železné Rudy; VYLOUČENÁ ze směru od Plzně	
	PROVOZ - Koleje č.1 - V PROVOZU ze směr od Železné Rudy; VYLOUČENÁ v době instalace velkých kusů bednění a betonáže	
	TRAKCE - Kolej č.3 - VÝLUKA TV + současně výluka trakce kolejí č. 5, 7a	
	TRAKCE - Kolej č.1 - VÝLUKA TV + její odsun od osy koleje + současně výluka trakce koleje č. 2	
7	**Izolace nosné konstrukce**	4
	PROVOZ - Koleje č.3 - V PROVOZU ze směr od Železné Rudy; VYLOUČENÁ ze směru od Plzně	
	PROVOZ - Koleje č.1 - V PROVOZU ze směr od Železné Rudy; VYLOUČENÁ ze směru od Plzně	
	TRAKCE - Kolej č.3 - VÝLUKA TV + současně výluka trakce kolejí č. 5, 7a	
	TRAKCE - Kolej č.1 - VÝLUKA TV + současně výluka trakce koleje č. 2	
8	**Zpětné zásypy**	3
	PROVOZ - Koleje č.3 - V PROVOZU ze směr od Železné Rudy; VYLOUČENÁ ze směru od Plzně	
	PROVOZ - Koleje č.1 - VYLOUČENÁ - pohyb stavební techniky (bagr + kontejner)	
	TRAKCE - Kolej č.3 - VÝLUKA TV + současně výluka trakce kolejí č. 5, 7a	
	TRAKCE - Kolej č.1 - VÝLUKA TV + současně výluka trakce koleje č. 2	
9	**Odstranění štětovnic**	1
	PROVOZ - Koleje č.3 - V PROVOZU ze směr od Železné Rudy; VYLOUČENÁ ze směru od Plzně	
	PROVOZ - Koleje č.1 - V PROVOZU ze směr od Železné Rudy; VYLOUČENÁ v době nakládky a odvozu odřezků štětovnic	
	TRAKCE - Kolej č.3 - VÝLUKA TV + současně výluka trakce kolejí č. 5, 7a	
	TRAKCE - Kolej č.1 - VÝLUKA TV + současně výluka trakce koleje č. 2	
10	**Zpětná montáž části hrany nástupiště**	10
	PROVOZ - Koleje č.3 - V PROVOZU ze směr od Železné Rudy; VYLOUČENÁ ze směru od Plzně	
	PROVOZ - Koleje č.1 - V PROVOZU ze směr od Železné Rudy; VYLOUČENÁ - při osazování L-profilů a návozu zásypového mat.	
	TRAKCE - Kolej č.3 - VÝLUKA TV + její odsun od osy koleje + současně výluka trakce kolejí č. 5, 7a	
	TRAKCE - Kolej č.1 - VÝLUKA TV + její odsun od osy koleje + současně výluka trakce koleje č. 2	
11	**Podbíjení koleje č. 1**	1
	PROVOZ - Koleje č.3 - V PROVOZU ze směr od Železné Rudy; VYLOUČENÁ ze směru od Plzně	
	PROVOZ - Koleje č.1 - VYLOUČENÁ - podbíjení koleje	
	TRAKCE - Kolej č.3 - VÝLUKA TV + její odsun od osy koleje + současně výluka trakce kolejí č. 5, 7a	
	TRAKCE - Kolej č.1 - VÝLUKA TV + její odsun od osy koleje + současně výluka trakce koleje č. 2	
12	**Zpětná montáž koleje č. 3, včetně podbíjení**	3
	PROVOZ - Koleje č.3 - VYLOUČENÁ - pokládka koleje + podbíjení	
	PROVOZ - Koleje č.5 - VYLOUČENÁ - pohyb jeřábu pro osazení nové koleje	
	TRAKCE - Kolej č.3 - VÝLUKA TV + její odsun od osy koleje + současně výluka trakce kolejí č. 5, 7a	
	TRAKCE - Kolej č.1 - VÝLUKA TV + její odsun od osy koleje + současně výluka trakce koleje č. 2	
13	**Výškový úprava schodišťových stupňů stávajícího schodiště (Fáze 1a-2)**	5
	PROVOZ - Koleje č.3 - V PROVOZU	
	PROVOZ - Koleje č.1 - V PROVOZU	
	TRAKCE - Kolej č.3 - VÝLUKA TV + současně výluka trakce kolejí č. 5, 7a	
	TRAKCE - Kolej č.1 - VÝLUKA TV + současně výluka trakce koleje č. 2	
14	**Zpětná montáž zastřešení**	4
	PROVOZ - Koleje č.3 - V PROVOZU	
	PROVOZ - Koleje č.1 - VYLOUČENÁ - pohyb kolejového jeřábu	
	TRAKCE - Kolej č.3 - VÝLUKA TV + její odsun od osy koleje + současně výluka trakce kolejí č. 5, 7a	
	TRAKCE - Kolej č.1 - VÝLUKA TV + její odsun od osy koleje + současně výluka trakce koleje č. 2	
15	**Kompletační práce**	3

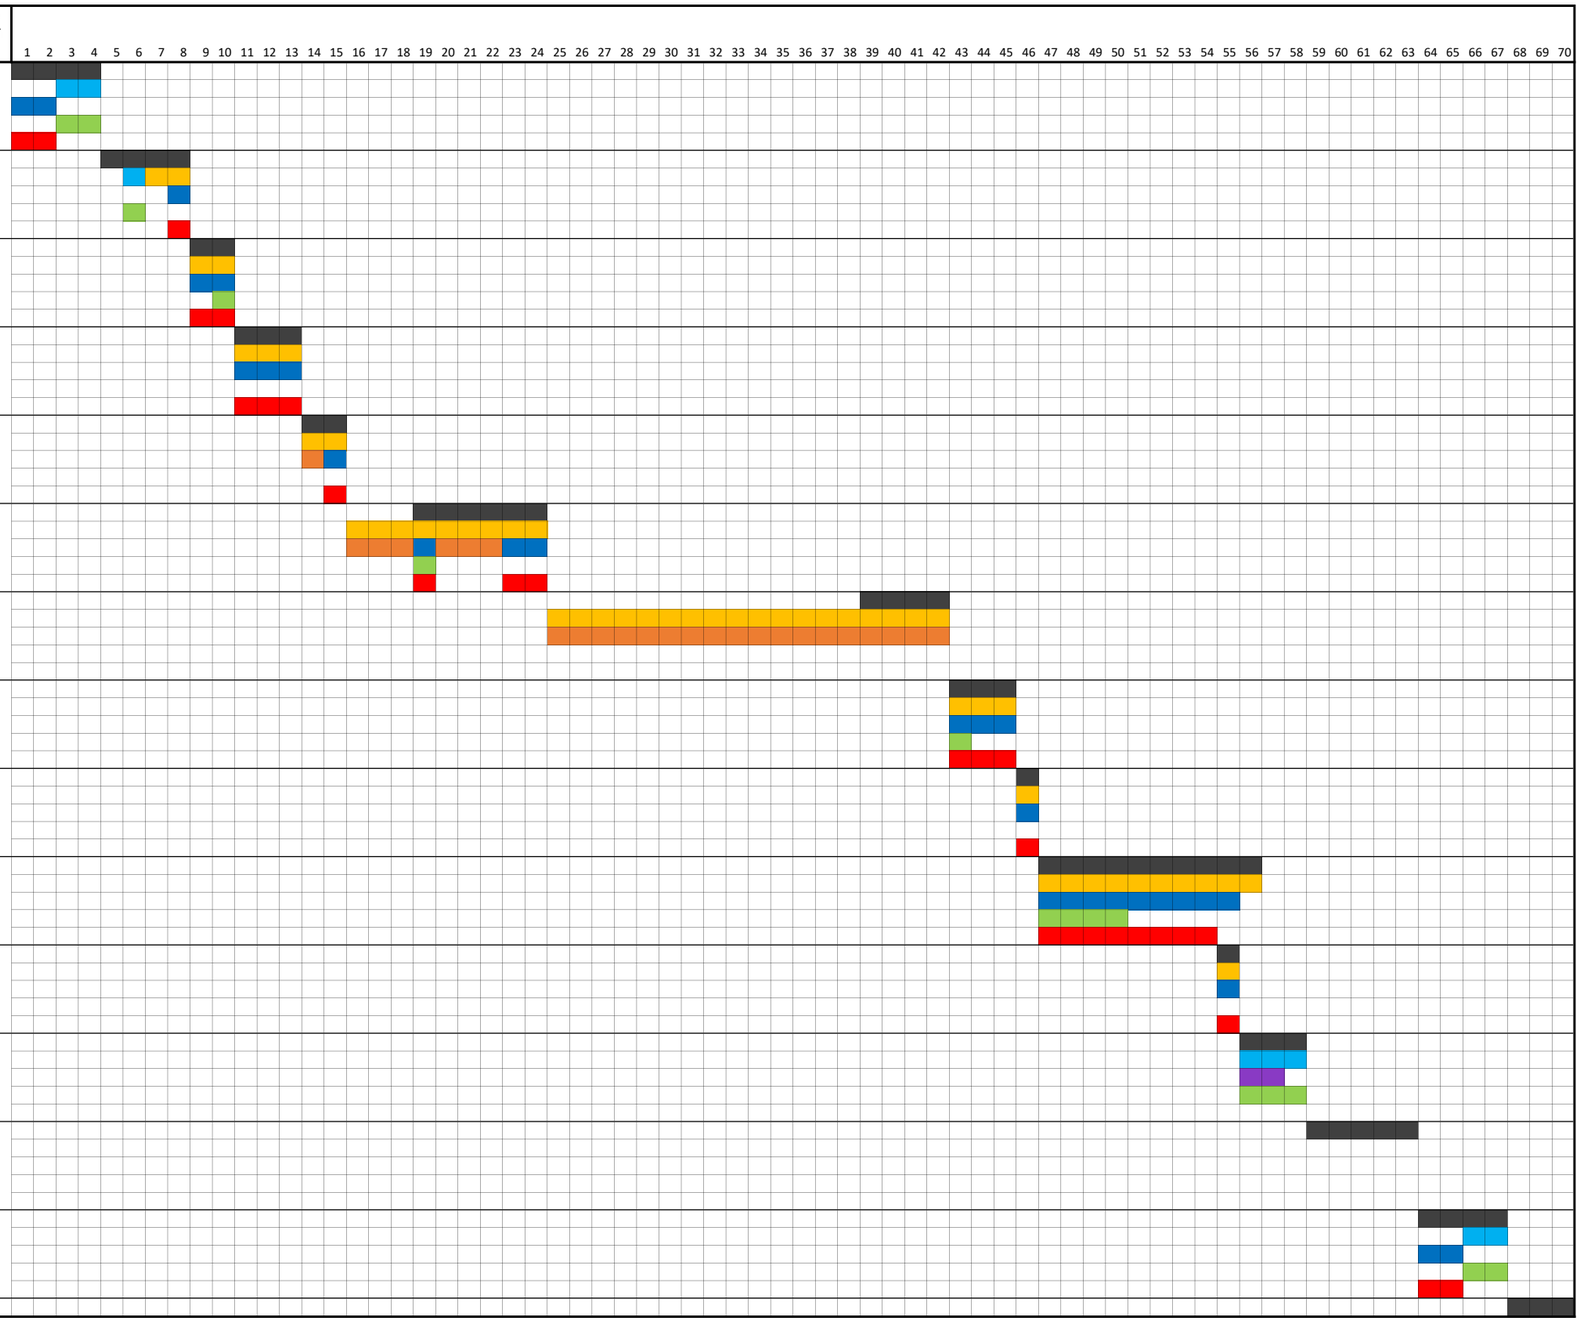

VÝLUKY CELKEM - FÁZE 1a:

Fáze 1a	70
PROVOZ - Koleje č.3 - VYLOUČENÁ - pohyb stavební techniky	9
PROVOZ - Koleje č.1 - VYLOUČENÁ - pohyb stavební techniky	27
PROVOZ - Koleje č.3 - V PROVOZU ze směr od Železné Rudy; VYLOUČENÁ ze směru od Plzně (NENÍ UVAŽOVÁNO S PRŮJEZDEM VLAKU OKOLO STAVEBNÍ JÁMY)	49
PROVOZ - Koleje č.1 - V PROVOZU ze směr od Železné Rudy; VYLOUČENÁ ze směru od Plzně (NENÍ UVAŽOVÁNO S PRŮJEZDEM VLAKU OKOLO STAVEBNÍ JÁMY)	42
PROVOZ - Koleje č.5 - VYLOUČENÁ	2
TRAKCE - Kolej č.3 - VÝLUKA TV + současně výluka trakce kolejí č. 5, 7a	16
TRAKCE - Kolej č.1 - VÝLUKA TV + současně výluka trakce koleje č. 2	27
