
Harmonogram výstavby

ID	Stavební postup	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Doba trvání
1		**„Revitalizace Kostelec-Telč-Slavonice"**	**17.10. 27**	**31.08. 29**		**685 dny**
2		**Přípravné práce, PDPS**	**17.10. 27**	**13.02. 28**		**120 dny**
3		přeložky	17.10. 27	13.02. 28		120 dny
4		zařízení staveniště	17.10. 27	14.12. 27		59 dny
5		oplocení provizorní	17.10. 27	14.11. 27		29 dny
6		přístupové cesty	17.10. 27	13.02. 28		120 dny
7						
8		**ÚSEK 12, Třešť (mimo) – Kostelec u Jihlavy (mimo)**	**14.02. 28**	**29.08. 28**	**2**	**198 dny**
9		železniční svršek dmtz 4249m koleje	14.02. 28	27.02. 28		14 dny
10		železniční spodek	20.02. 28	28.07. 28		160 dny
11		železniční svršek mtz	14.07. 28	12.08. 28		30 dny
12		mosty, propustky, zdi	20.02. 28	28.07. 28		160 dny
13		přejezdy	16.07. 28	29.07. 28		14 dny
14		nástupiště	15.06. 28	14.07. 28		30 dny
15		pozemní komunikace	17.12. 28	14.02. 29		60 dny
16		opravy objízdných komunikací	17.12. 28	14.02. 29		60 dny
17		pozemní objekty	17.10. 27	29.08. 28		318 dny
18		trakční a energetická zařízení	14.02. 28	29.08. 28		198 dny
19						
20		**ÚSEK 10, Sedlejov (mimo) – Třešť (mimo)**	**14.02. 28**	**15.03. 29**	**2**	**396 dny**
21		železniční svršek dmtz 3980m koleje	28.02. 28	19.03. 28	9	21 dny
22		železniční spodek	07.03. 28	09.12. 28		278 dny
23		železniční svršek mtz	10.12. 28	30.12. 28		21 dny
24		mosty, propustky, zdi	07.03. 28	10.12. 28		279 dny
25		přejezdy	10.12. 28	23.12. 28		14 dny
26		nástupiště	03.09. 28	02.10. 28		30 dny
27		pozemní komunikace	31.12. 28	05.03. 29		65 dny
28		opravy objízdných komunikací	31.12. 28	05.03. 29		65 dny
29		pozemní objekty	17.10. 27	30.09. 28		350 dny
30		trakční a energetická zařízení	14.02. 28	07.01. 29		329 dny
31						
32		**ÚSEK 08, Telč (mimo) - Sedlejov (mimo)**	**14.02. 28**	**15.03. 29**	**2**	**396 dny**
33		železniční svršek dmtz 3405m koleje	20.03. 28	02.04. 28	21	14 dny
34		železniční spodek	03.04. 28	05.01. 29	33	278 dny
35		železniční svršek mtz	31.12. 28	20.01. 29	23	21 dny
36		mosty, propustky, zdi	03.04. 28	05.01. 29		278 dny
37		přejezdy	31.12. 28	13.01. 29		14 dny
38		nástupiště	03.10. 28	01.11. 28	26	30 dny
39		pozemní komunikace	31.12. 28	05.03. 29		65 dny
40		opravy objízdných komunikací	31.12. 28	05.03. 29		65 dny
41		pozemní objekty	17.10. 27	30.09. 28		350 dny
42		trakční a energetická zařízení	14.02. 28	07.01. 29		329 dny
43						
44		**ÚSEK 06, Slaviboř (mimo) - Telč (mimo)**	**14.02. 28**	**31.08. 29**	**2**	**565 dny**
45		železniční svršek dmtz 6153m koleje	03.04. 28	02.05. 28	33	30 dny
46		železniční spodek	03.05. 28	17.04. 29	45	350 dny
47		železniční svršek mtz	04.03. 29	02.05. 29	35	60 dny
48		mosty, propustky, zdi	03.05. 28	17.04. 29		350 dny
49		přejezdy	15.04. 29	14.05. 29		30 dny
50		nástupiště	02.11. 28	01.12. 28	38	30 dny
51		pozemní komunikace	25.03. 29	28.05. 29	39	65 dny
52		opravy objízdných komunikací	25.03. 29	28.05. 29	39	65 dny
53		pozemní objekty	17.10. 27	30.09. 28		350 dny
54		trakční a energetická zařízení	14.02. 28	28.01. 29		350 dny
55						
56		**ÚSEK 04, Dačice (mimo) - Slaviboř (mimo)**	**14.02. 28**	**31.08. 29**	**2**	**565 dny**
57		železniční svršek dmtz 5581m koleje	03.05. 28	19.05. 28	45	17 dny
58		železniční spodek	19.05. 28	03.05. 29		350 dny
59		železniční svršek mtz	03.05. 29	01.07. 29	47	60 dny
60		mosty, propustky, zdi	19.05. 28	03.05. 29		350 dny
61		přejezdy	15.05. 29	13.06. 29	49	30 dny
62		nástupiště	02.12. 28	31.12. 28	50	30 dny
63		pozemní komunikace	10.06. 29	13.08. 29	51	65 dny
64		opravy objízdných komunikací	10.06. 29	13.08. 29	51	65 dny
65		pozemní objekty	17.10. 27	30.09. 28		350 dny
66		trakční a energetická zařízení	14.02. 28	28.01. 29		350 dny
67						
68		**ÚSEK 02, Slavonice (mimo) - Dačice (mimo)**	**14.02. 28**	**31.08. 29**	**2**	**565 dny**
69		železniční svršek dmtz 7570m koleje	20.05. 28	03.07. 28	57	45 dny
70		železniční spodek	26.06. 28	10.06. 29		350 dny
71		železniční svršek mtz	02.07. 29	31.08. 29	59	61 dny
72		mosty, propustky, zdi	26.06. 28	10.06. 29		350 dny
73		přejezdy	05.08. 29	18.08. 29	61	14 dny
74		nástupiště	01.01. 29	30.01. 29	62	30 dny
75		pozemní komunikace	10.06. 29	13.08. 29		65 dny
76		opravy objízdných komunikací	10.06. 29	13.08. 29		65 dny
77		pozemní objekty	17.10. 27	30.09. 28		350 dny
78		trakční a energetická zařízení	14.02. 28	28.01. 29		350 dny

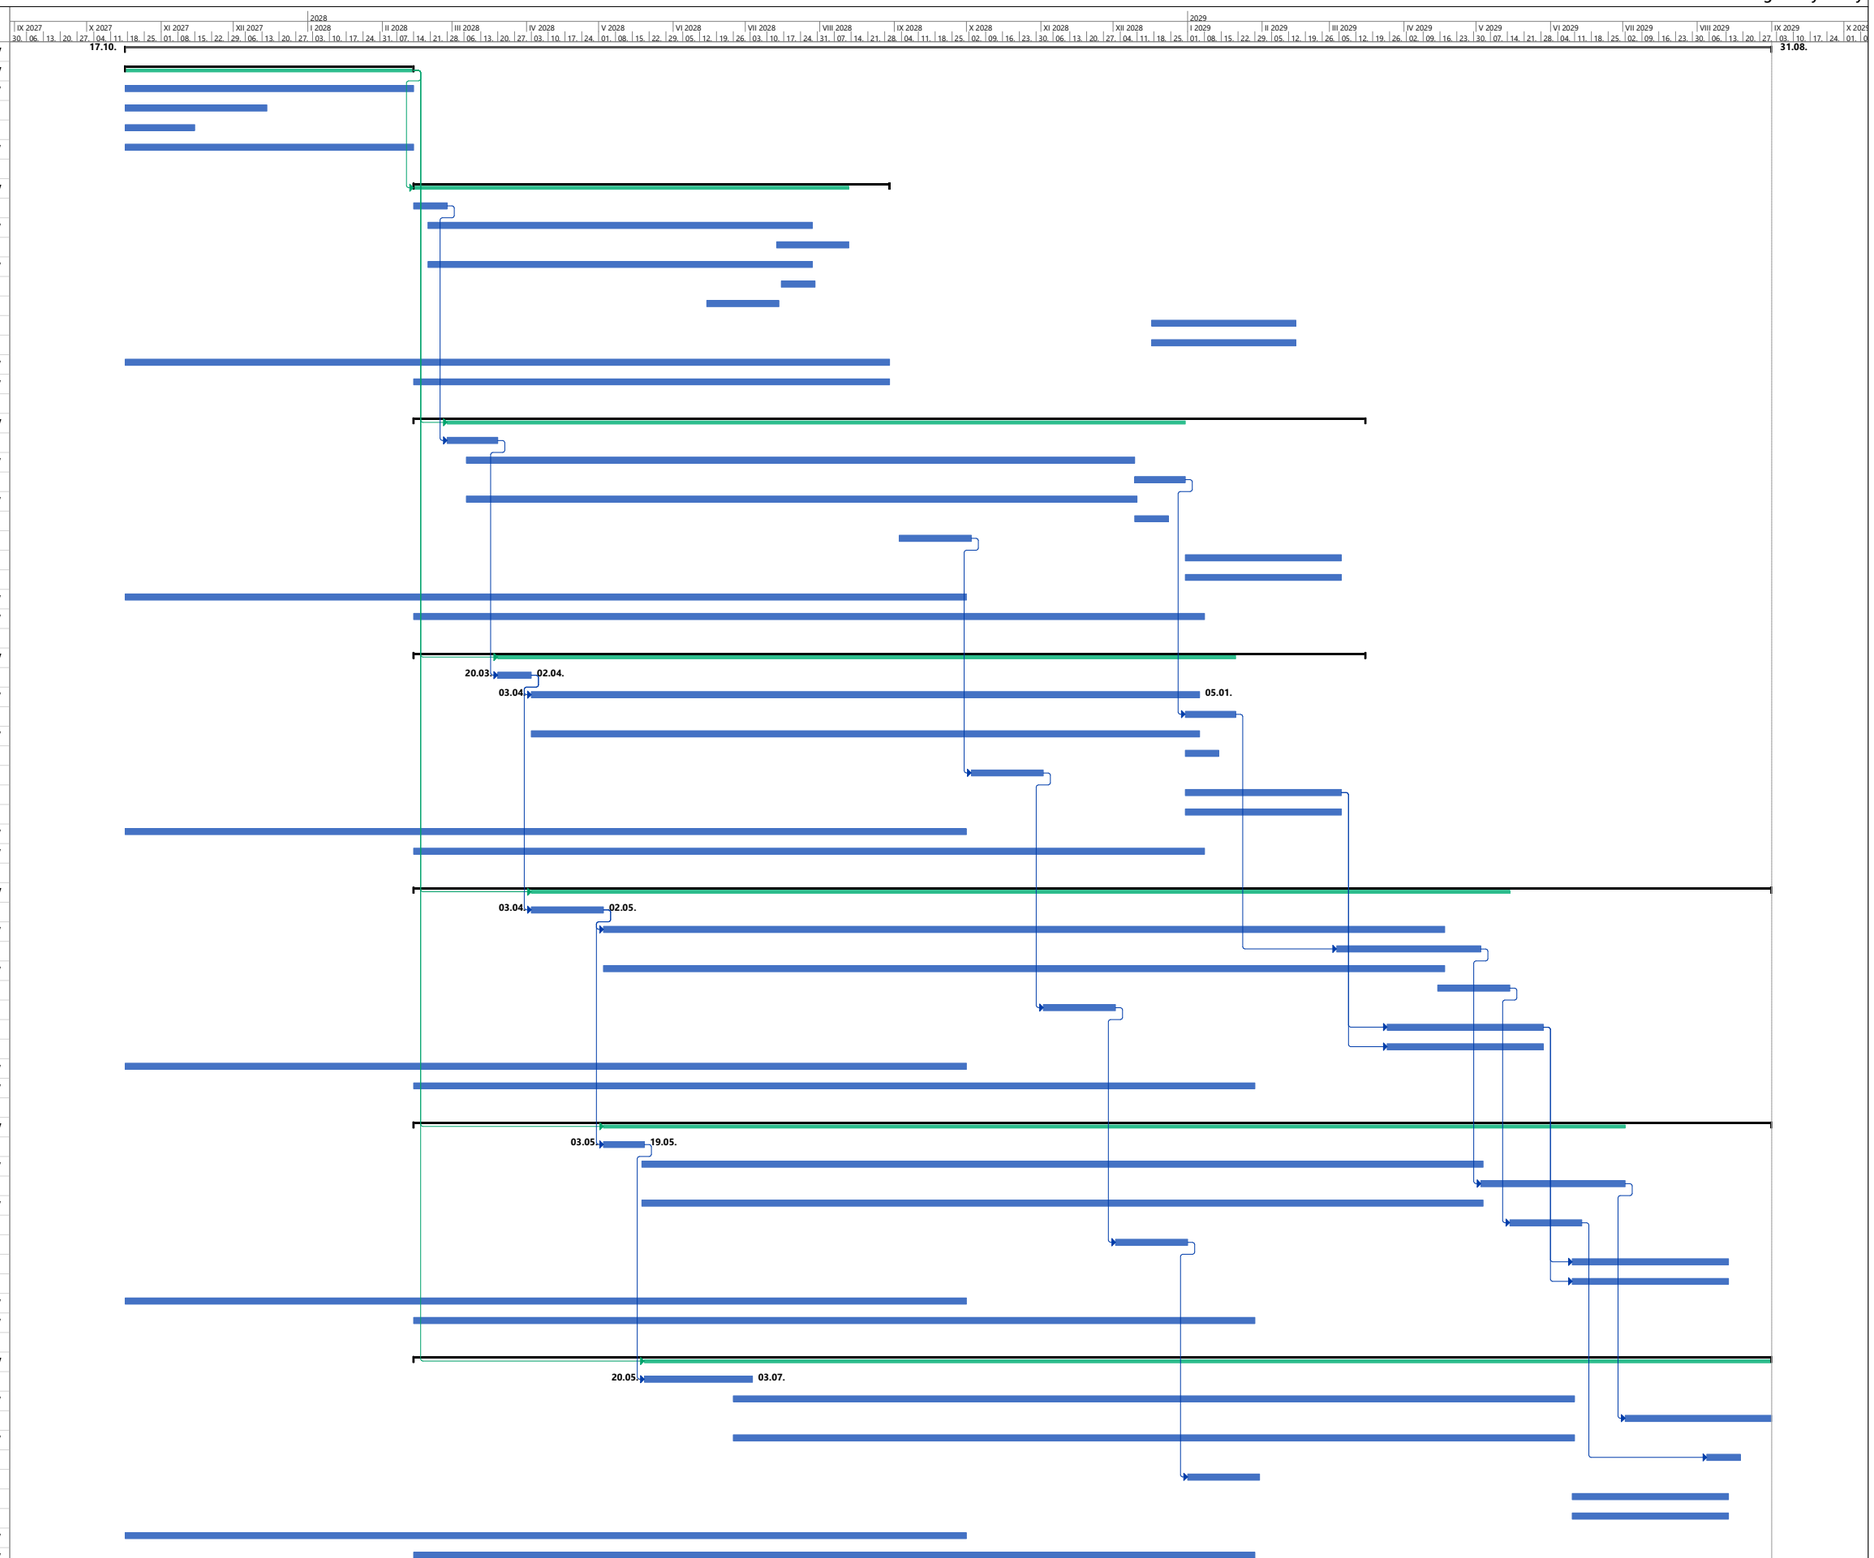

Projekt: B.8.5.1
Vypracoval: Ing. Adam Rusý

Úkol, Souhrnný, Neaktivní milník, Pouze s dobou trvání, Pouze zahájení, Vnější milník, Průběh ručně zadaného úkolu
Rozdělení, Souhrn projektu, Neaktivní souhrn, Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu, Pouze s datem dokončení, Konečný termín
Milník, Neaktivní úkol, Ruční úkol, Ruční souhrn, Vnější úkoly, Průběh
