



Operační program
Doprava



Evropská unie

Investice do vaší budoucnosti

Fond soudržnosti

Čistopis dokumentace se zpracovanými připomínkami

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1**

kontaktní adresa:

**Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9**

METROPROJEKT Praha a.s.
nám. I. P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2

generální ředitel: Ing. David Krása
tel.: +420 296 154 105
www.metroprojekt.cz
info@metroprojekt.cz



METROPROJEKT

Souprava číslo:

HIP:	Podpis:	Název a účel díla:
Ing. Jan Nosek tel.: +420 296 154 221		Revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice
Stupeň: dokumentace pro stavební povolení projekt stavby		

Zpracovatelský útvar:	Název části díla:	F.
S51 stavební tel.: +420 296 154 202	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY	
Vedoucí útvaru:	Podpis:	
Ing. Jaroslav Kácovský		

Odpovědný projektant:	Podpis:	Název přílohy:	Změna:
Ing. Stanislav Šrytr		SCHEMA STAVEBNÍCH POSTUPU	-
Vypracoval:	Podpis:		Číslo příl.:
Ing. Stanislav Šrytr			002
Skart. znak: V20/2035	Datum: 10/2014	IČD:	
Počet formátů: 48 x A4	Měřítko:	14	6444
		06	00
		00	00

REVITALIZACE TRATI ROKYCANY – NEZVĚSTICE

PŘEHLEDNÉ SCHÉMA STAVEBNÍCH POSTUPŮ

SP 1a

z. ROKYCAN
PŘEDMĚSTÍ

vlečka 2056 vlečka 2083

U ROKYCAN

z. NOVÁ HUŤ

z. HRÁDEK
II. POKYCAN

žst. MIROŠOV


— původní stav
— demolice

— stavba v aktuálním SP
— stavba v předchozích SP

dD3 PŘÍKOSICE

SP 1a

10.7. – 23.7.
(14 dní)

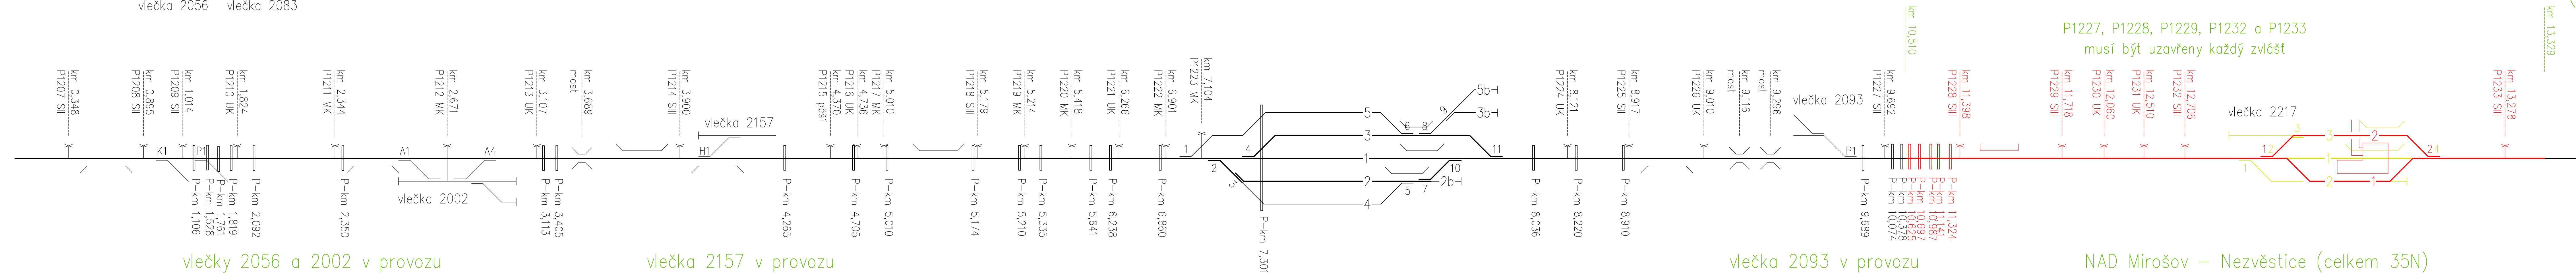

z. ROKYCAN
PŘEDMĚSTÍ


U ROKYCAN

z. HRÁDEK
U ROKYCAN

z. MIROŠOV
MĚSTO

z .PŘÍKOSICE
ZASTÁVKA

SP 1b
24.7. – 13.8.
(21 dní)



SP 2a

z. ROKYCANY
PŘEDMĚSTÍ

z. KAMENNÝ ÚJEZD
U ROKYCAN

z. NOVÁ HUŤ

z. HRÁDEK
U ROKYCAN

žst. MIROŠOV

z. MIROŠOV
MĚSTO

z. PŘÍKOSICE
ZASTÁVKA


dD3 PŘÍKOSICE

SP 2a
14.8. – 22.10.
(70 dní)

P1227, P1228, P1229 a P1232
musí být uzavřeny každý zvlášť

P1217 a P1218 nesmí
být uzavřeny společně

P1225 a most ev. km 9,296
nesmí být uzavřeny společně



SP 2b

z. ROKYCANY
PŘEDMĚSTÍ

z. KAMENNÝ ÚJEZD
U ROKYCAN

z. NOVÁ HUŤ

z. HRÁDEK
U ROKYCAN


žst. MIROŠOV

z. MIROŠOV
MĚSTO

z. PŘÍKOSICE
ZASTÁVKA

dD3 PŘÍKOSICE

SP 2b
23.10. – 19.11.
(28 dní)



SP 2c

z. ROKYCANY
PŘEDMĚSTÍ

z. KAMENNÝ ÚJEZD
U ROKYCAN

z. NOVÁ HUŤ


z. HRÁDEK
U ROKYCAN

žst. MIROŠOV

z. MIROŠOV
MĚSTO

dD3 PŘÍKOSICE

SP 2c
20.11. – 22.12.
(33 dní)



SP 3a

z. ROKYCANY
PŘEDMĚSTÍ

z. KAMENNÝ ÚJEZD
U ROKYCAN

z. NOVÁ HUŤ

z. HRÁDEK
U ROKYCAN


žst. MIROŠOV

z. MIROŠOV
MĚSTO

z. PŘÍKOSICE
ZASTÁVKA

dD3 PŘÍKOSICE

SP 3a
1.3. – 14.4.
(45 dní)



SP 3b

z. ROKYCANY
PŘEDMĚSTÍ

z. KAMENNÝ ÚJEZD
U ROKYCAN

z. NOVÁ HUŤ

z. HRÁDEK
U ROKYCAN

žst. MIROŠOV


z. MIROŠOV
MĚSTO

z. PŘÍKOSICE
ZASTÁVKA

dD3 PŘÍKOSICE

SP 3b

15.4. – 19.5.
(35 dní)



z. ROKYCANY
PŘEDMĚSTÍ

z. KAMENNÝ ÚJEZD
U ROKYCAN

z. NOVÁ HUŤ

z. HRÁDEK
U ROKYCAN

žst. MIROŠOV

z. MIROŠOV
MĚSTO

z .PŘÍKOSICE
ZASTÁVKA

SP 4, aktivace zab. zař.
dD3 PŘÍKOSICE 20.5. – 31.5.
(12 dní)

