B.8.3 Harmonogram

Příloha č.2

	Stavební postup/Vybrané SO	od	dny	do
1	**Stavební postup č.1**	**01.04.24**	**518**	**31.08.25**
2	Přípravné práce, zajištění ZS	01.04.24	56	26.05.24
3	Přeložky inženýrských sítí, provizorní přípojky	01.04.24	56	26.05.24
4	HTÚ	15.04.24	63	16.06.24
5	SO 05 Stavební úpravy stávajícího objektu CDP	15.04.24	14	28.04.24
6	Zřízení provizorního únikového schodiště	28.04.24	42	08.06.24
7	SO 07 Demolice	29.04.24	35	02.06.24
8	Zřízení náhradních parkovacích míst	02.06.24	14	15.06.24
9	Základové konstrukce, hlubinné; SO 01	16.06.24	28	13.07.24
10	Základové konstrukce plošné; SO 01	06.07.24	35	09.08.24
11	Kabelovod, kanalizace u východní fasády CDP	15.06.24	35	19.07.24
12	Čerpací jímka kanalizace	15.06.24	35	19.07.24
13	Stavební úpravy CDP, provizorní schodiště	15.06.24	42	26.07.24
14	SO 01 Nová budova CDP stavební část, HSV	19.07.24	280	24.04.25
15	SO 22 Venkovní kanalizace	18.03.25	77	02.06.25
16	SO 01 Nová budova CDP stavební část, PSV	10.04.25	144	31.08.25
17	SO 02 Energocentrum, stavební část	29.04.24	280	02.02.25
18	SO 04 Novostavba garáží	29.04.24	231	15.12.24
19	SO 02 Energocentrum, technologická část	19.01.25	126	24.05.25
20	SO 06 Stavební úpravy transformovny TS8	29.04.24	10	08.05.24
21	SO 02 Energocentrum, zkoušky, zprovoznění	25.05.25	60	23.07.25
22	**Stavební postup č.2**	**01.09.25**	**577**	**31.03.27**
23	SO 01 Nová budova CDP, technologie	01.09.25	350	16.08.26
24	SO 01 Nová budova CDP, zkoušení, zprovoznění	16.08.26	186	17.02.27
25	Odstranění provizorního schodiště	15.09.26	21	05.10.26
26	Obnova stávající budovy CDP	06.10.26	35	09.11.26
27	Úprava plochy v místě provizorního schodiště	06.10.26	14	19.10.26
28	SO 31 Komunikace a zp.plochy - areál CDP	15.07.26	154	15.12.26
29	SO 32 Komunikace a zp.plochy - areál OŘ	15.07.26	140	01.12.26
30	SO 08 Oplocení areálu CDP	01.10.26	76	15.12.26
31	SO 09 Sadové úpravy, venkovní relaxační …..	15.08.26	120	12.12.26
32	Dokončovací práce	31.01.27	60	31.03.27
33	Vyklizení staveniště	25.02.27	35	31.03.27
34	DSPS	15.12.26	107	31.03.27
	Stavba celkem	**01.04.24**	**1 095**	**31.03.27**

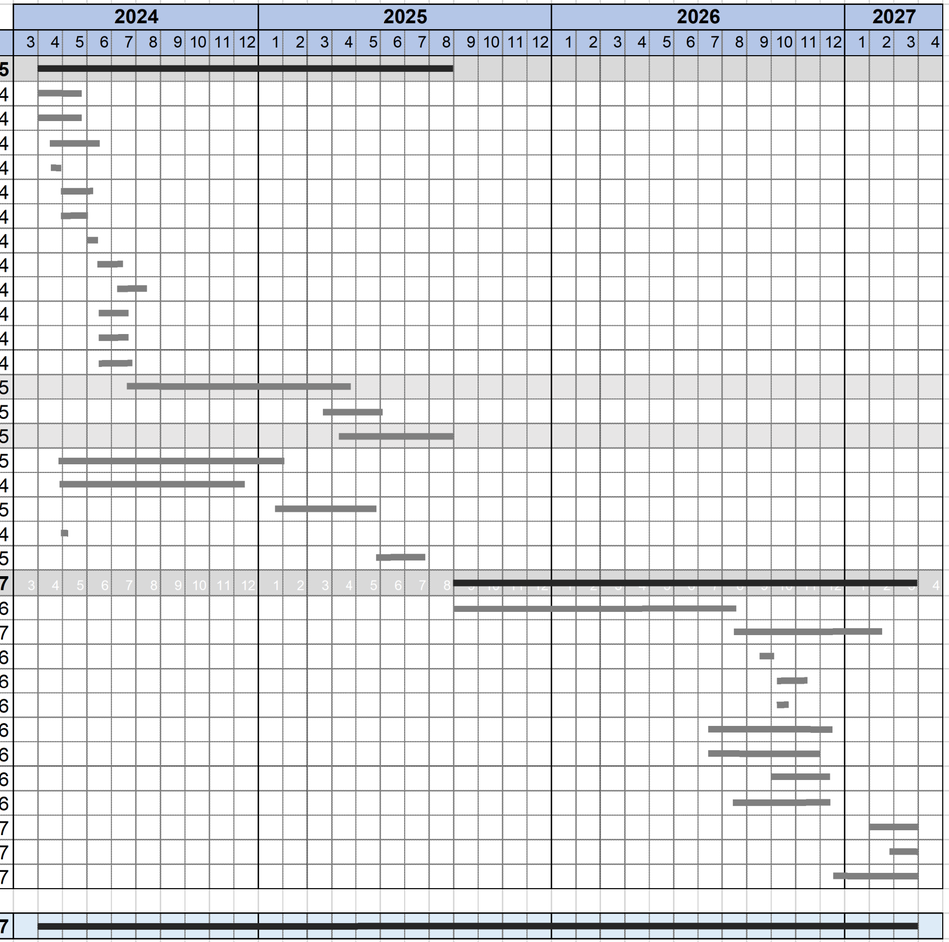

sfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	27.10.2023	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Josef Bohuslav

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	**Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1**
Zástupce investora:	**Stavební správa východ**
Adresa:	**Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc**

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel díla:	**Společnost pro rozšíření CDP Přerov - nová budova**
Adresa:	**MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.** Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc
Kontakt:	T: +420 585 570 444 E: moravia@moravia.cz
Zhotovitel části/objektu:	**MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**
Adresa:	**Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc**
Kontakt:	T: +420 585 570 444 E: moravia@moravia.cz
Hlavní projektant (HIP):	**Ing. Pavel Kučera**
Specialista:	**-**

SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 00 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Název stavby/akce:	**Rozšíření CDP Přerov - nová budova**		Označení investora: **S621900065** Zakázka: **22-049-234-SR**
Název části:	Souhrnná technická zpráva		Označení části: **B**
Název objektu/dílčí části:	**Zásady organizace výstavby**		Označení objektu/komplexu: **B.8**
Název přílohy: Název dílčí části přílohy:	Harmonogram Příloha 2, harmonogram		Číslo přílohy (typ/pořadí): **3**
Odpovědný projektant: Ing. Petr Čech	Zpracovatel přílohy: Ing. Petr Čech	Měřítko: - Formáty: 3 A4	Stupeň dokumentace: **DSP+PDPS**
Kraj: Olomoucký	Katastrální území: - viz seznam	TUDU:	Smluvní datum zpracování: **30.11.2023**

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S621900065	– PDPS	– B8	– XXXXXXXXX	– XX	– 3	– 000

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINAK ROZŠIŘOVÁNA BEZ SOUHLASU MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
