sfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

B.8

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	Doplnění zpevnění mostu v ulici V Lukách	25. 3. 2020
02	Úprava svahu tělesa trati z důvodu zvýšení stability v Brandýse n. O.	25. 3. 2020
03	Změna termínu zahájení stavby na 05/2021	5. 10. 2020

Investor:
SŽDC

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

Generální projektant:
SUDOP PRAHA

SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:
ING. MIROSLAV KRSEK

Garant profese:
-

Zpracovatel části:
SUDOP EU

SUDOP EU a. s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudopeu.cz

Vedoucí střediska:	*Odpovědný projektant SO, IO, PS:*	*Vypracoval:*	*Kontroloval:*
ING. MIROSLAV VÁŇA	ING. IVAN GRISA	ING. IVAN GRISA	ING. MIROSLAV KRSEK

Název akce:
Ústí n. O. - Brandýs n. O. - původní stopa, BC

Číslo smlouvy: 18-264.250

Projektový stupeň: DSP

Část:
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Datum: 08/2019

Číslo části: B.8

Název přílohy:
HARMONOGRAM

Měřítko:

Počet formátů:

Číslo přílohy: 3

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.

Rádkový harmonogram výstavby

Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC

Délka stavby (dny), bez následné úpravy kolejí:
790

Legenda:

výluka
uzavírka/omezení PK

zabezpečovací a sdělovací zařízení
kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž)
mostní objekty (podchody vč.zastřešení)
objekty elektro
pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice
potrubní sítě
hlavní milníky přípravy a výstavby
měsíce zimního období
délka dílčího technologického postupu
přípravné a dokončovací práce
zkušební provoz
omezení silničního provozu

Stavební úsek	Postupy/etapy	Popis činnosti – Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)		doba trvání od	(milníky) do	měs.	týdny	dny
Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC		DPSŘ (dopracování projektu souhmnného řešení) SZZ pro odbočku Bezpráví		2. leden 2021	7. duben 2021	3,0	13,6	95
		výroba SZZ pro odbočku Bezpráví		8. duben 2021	7. červenec 2021	3,0	12,9	90
		instalace a zkoušení SZZ v odbočce Bezpráví		8. červenec 2021	15. říjen 2021	3,3	14,1	99
		DPSŘ (dopracování projektu souhmnného řešení) SZZ pro žst. Brandýs nad Orlicí		2. leden 2021	27. květen 2021	3,0	20,7	145
		výroba SZZ pro žst. Brandýs nad Orlicí		28. květen 2021	20. říjen 2021	4,8	20,7	145
		instalace a zkoušení SZZ v žst. Brandýs nad Orlicí		21. říjen 2021	18. únor 2022	1,0	17,1	120
		zapnutí SZZ v odbočce Bezpráví		18. září 2021				
		zapnutí SZZ v žst. Brandýs nad Orlicí		1. červenec 2022				
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		1. květen 2021				
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		20. červen 2023				
		konec dokončovacích prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		30. červen 2023				
		zahájení stavby - přípravné práce v odbočce Bezpráví		21. květen 2021				
		ukončení hlavních stavebních prací v odbočce Bezpráví		18. prosinec 2022				
		konec dokončovacích prací v odbočce Bezpráví		28. prosinec 2022				
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		21. květen 2021				
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		18. prosinec 2022				
		konec dokončovacích prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		28. prosinec 2022				
		zahájení přípravných a stavebních prací v žst. Brandýs nad Orlicí		21. květen 2021				
		ukončení hlavních stavebních prací v žst. Brandýs nad Orlicí		18. prosinec 2022				
		konec dokončovacích prací v žst. Brandýs nad Orlicí		28. prosinec 2022				
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		16. říjen 2021				
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		10. srpen 2022				
		konec dokončovacích prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		20. srpen 2022				
	PS/SO nutné zahájit před začátkem stavby	PS 02-01-21 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, traťové zabezpečovací zařízení	DPSŘ + zahájení výroby	2. leden 2021	30. duben 2021	4,0	17,0	119
		PS 03-01-11 Odbočka Bezpráví, staniční zabezpečovací zařízení	DPSŘ + zahájení výroby	2. leden 2021	30. duben 2021	4,0	17,0	119
		PS 04-01-21 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, traťové zabezpečovací zařízení	DPSŘ + zahájení výroby	2. leden 2021	30. duben 2021	4,0	17,0	119
		SO 10-22-02 Brandýs nad Orlicí, most přes Tichou Orlici ev. č. 3155-2, mostní provizorium	provedení	1. listopad 2020	20. prosinec 2020	1,7	7,1	50
		SO 00-83-01 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, kácení mimolesní zeleně	provedení	2. leden 2021	22. březen 2021	2,7	11,4	80
	0	**přípravné práce, rekonstrukce umělých staveb**		1. květen 2021	20. květen 2021	**0,7**	2,9	**20**
		traťové koleje 1 + 2 (zabezpečení stability štěrkového lože na mostě v km 258,596): 6 hodin v noci		13. květen 2021	14. květen 2021	0,0	0,1	1
				14. květen 2021	15. květen 2021	0,0	0,1	1
				15. květen 2021	16. květen 2021	0,0	0,1	1
				16. květen 2021	17. květen 2021	0,0	0,1	1
				18. květen 2021	19. květen 2021	0,0	0,1	1
				19. květen 2021	20. květen 2021	0,0	0,1	1
		přístupy, plochy ZS, vytýčení IS		1. květen 2021	20. květen 2021	0,7	2,9	20
		PS 02-01-21 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, traťové zabezpečovací zařízení	výroba, instalace, zkoušky	1. květen 2021	20. květen 2021	0,7	2,9	20
		PS 00-02-51 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, úprava DOK ČD-Telematika a.s.	dočasná trasa podél koleje 2: zřízení	1. květen 2021	20. květen 2021	0,7	2,9	20
		PS 00-02-52 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, úprava TK		1. květen 2021	20. květen 2021	0,7	2,9	20
		PS 00-02-53 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, DOK a TK		1. květen 2021	20. květen 2021	0,7	2,9	20
		PS 00-02-81 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, úprava GSM-R	zahájení	1. květen 2021	20. květen 2021	0,7	2,9	20
		PS 00-02-91 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, přenosový systém	zahájení	1. květen 2021	20. květen 2021	0,7	2,9	20
		SO 02-10-01 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, železniční svršek	kolej 1: demontáž na mostě v km 258,596	13. květen 2021	13. květen 2021	0,0	0,1	1
		SO 02-20-01.1 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, železniční most v ev. km 258,596, provizorní komunikace	zřízení	1. květen 2021	5. květen 2021	0,2	0,7	5
		SO 02-20-01 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, železniční most v ev. km 258,596	zabezpečení stability štěrkového lože koleje 2 (6 x 6 hodin v noci, jedna noc bez činnosti)	13. květen 2021	20. květen 2021	0,2	1,0	7
		SO 02-21-01.1 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, železniční propustek v ev. km 260,545, provizorní komunikace	zřízení: zahájení	1. květen 2021	20. květen 2021	0,7	2,9	20
		SO 02-54-01 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, úprava a ochrana NN přípojky k domku v km 258,676	provedení	1. květen 2021	20. květen 2021	0,7	2,9	20
		SO 02-63-01 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, ochrana objektu proti hluku, Gerhartice č.p. 115	provedení	1. květen 2021	10. květen 2021	0,3	1,4	10
		SO 01-76-31 ŽST Ústí nad Orlicí, dálkové ovládání odpojovačů, úprava kabelu	provedení	1. květen 2021	20. květen 2021	0,7	2,9	20
		SO 02-76-21 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, úprava rozvodu VN 6kV	příprava přeložek	1. květen 2021	20. květen 2021	0,7	2,9	20
		SO 02-71-01 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, trakční vedení	podpěry u TK 2: zahájení	13. květen 2021	18. květen 2021	0,2	0,9	6
	1/1a	**přípravné práce, rekonstrukce umělých staveb**		21. květen 2021	27. září 2021	**4,3**	18,6	**130**
		traťová kolej 1		21. květen 2021	27. září 2021	4,3	18,6	130
		traťová kolej 2 (zabezpečení stability štěrkového lože na mostě v km 259,445): 6 hodin v noci		23. květen 2021	24. květen 2021	0,0	0,1	1
				24. květen 2021	25. květen 2021	0,0	0,1	1
				26. květen 2021	27. květen 2021	0,0	0,1	1
				27. květen 2021	28. květen 2021	0,0	0,1	1
				29. květen 2021	30. květen 2021	0,0	0,1	1
		traťová kolej 2 (zabezpečení stability štěrkového lože na propustku v km 260,545): 6 hodin v noci		30. květen 2021	31. květen 2021	0,0	0,1	1
				31. květen 2021	1. červen 2021	0,0	0,1	1
		PS 02-01-21 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, traťové zabezpečovací zařízení	výroba, instalace, zkoušky	21. květen 2021	27. září 2021	4,3	18,6	130
		PS 02-01-21 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, traťové zabezpečovací zařízení	zavázání odbočky Bezpráví/aktivace	18. září 2021	27. září 2021	0,3	1,4	10
		PS 00-01-52 Ústí nad Orlicí - Choceň, úprava ETCS	vypnutí	21. květen 2021				
		PS 00-02-51 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, úprava DOK ČD-Telematika a.s.	definitivní trasa podél koleje 1: zřízení	9. srpen 2021	27. září 2021	1,7	7,1	50
		PS 00-02-52 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, úprava TK	definitivní trasa podél koleje 1: zřízení	9. srpen 2021	27. září 2021	1,7	7,1	50
		PS 00-02-53 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, DOK a TK	dokončení	9. srpen 2021	27. září 2021	1,7	7,1	50
		PS 00-02-81 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, úprava GSM-R	dokončení	9. srpen 2021	27. září 2021	1,7	7,1	50
		PS 00-02-91 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, přenosový systém	dokončení	9. srpen 2021	27. září 2021	1,7	7,1	50
		SO 02-10-01 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, železniční svršek	kolej 1: demontáž na mostech v km 258,596 + 259,446 a propustku v km 260,545	21. květen 2021	22. květen 2021	0,1	0,3	2
		SO 02-20-01 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, železniční most v ev. km 258,596	v koleji 1	23. květen 2021	2. červenec 2021	1,4	5,9	41
		SO 02-20-02 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, železniční most v ev. km 259,445	zabezpečení stability štěrkového lože koleje 2 (4 x 6 hodin v noci, jedna noc bez činnosti)	23. květen 2021	28. květen 2021	0,2	0,7	5
		SO 02-20-02 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, železniční most v ev. km 259,445	v koleji 1	3. červenec 2021	12. srpen 2021	1,4	5,9	41
		SO 02-21-01.1 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, železniční propustek v ev. km 260,545, provizorní komunikace	zřízení: dokončení	21. květen 2021	30. květen 2021	0,3	1,4	10
		SO 02-21-01 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, železniční propustek v ev. km 260,545	zabezpečení stability štěrkového lože koleje 2 (3 x 6 hodin v noci)	29. květen 2021	1. červen 2021	0,1	0,4	3
		SO 02-21-01 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, železniční propustek v ev. km 260,545	v koleji 1	13. srpen 2021	1. září 2021	0,7	2,9	20
		SO 02-10-01 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, železniční svršek	kolej 1: montáž na mostech v km 258,596 + 259,446 a propustku v km 260,545	2. září 2021	11. září 2021	0,3	1,4	10
		SO 02-27-01 Prodloužení protihlukové stěny Kerhartice, ulice Pražská	provedení	21. květen 2021	19. červen 2021	1,0	4,3	30
		SO 02-76-21 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, úprava rozvodu VN 6kV	příprava přeložek	21. květen 2021	19. červen 2021	1,0	4,3	30
		SO 00-83-02 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, náhradní výsadba	provedení	21. květen 2021	19. červen 2021	1,0	4,3	30
		SO 02-71-01 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, trakční vedení	podpěry u TK 1	12. červenec 2021	30. srpen 2021	1,7	7,1	50
		SO 02-71-01 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, trakční vedení	rekonstrukce TV v koleji 1	2. září 2021	27. září 2021	0,9	3,7	26
	1/1b	**přípravné práce, rekonstrukce umělých staveb**		28. září 2021	15. říjen 2021	**0,6**	2,6	**18**
		traťová kolej 2		28. září 2021	15. říjen 2021	0,6	2,6	18
		SO 02-71-01 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, trakční vedení	podpěry u TK 2: pokračování	28. září 2021	15. říjen 2021	0,6	2,6	18
		přípravné práce, rekonstrukce umělých staveb		16. říjen 2021	4. prosinec 2021	**1,7**	7,1	**50**
		traťová kolej 2		16. říjen 2021	4. prosinec 2021	1,7	7,1	50
		SO 02-10-01 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, žel. svršek	kolej 2: demontáž na mostech v km 258,596 + 259,446 a propustku v km 260,545	16. říjen 2021	18. říjen 2021	0,1	0,4	3

Ústí nad Orlicí mimo - odbočka Bezpráví mimo

Řádkový harmonogram výstavby

Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC

Délka stavby (dny), bez následné úpravy kolejí:
790

Legenda:

- výluka
- uzavírka/omezení PK
- zabezpečovací a sdělovací zařízení
- kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž)
- mostní objekty (podchody vč.zastřešení)
- objekty elektro
- pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice
- potrubní sítě
- hlavní milníky přípravy a výstavby
- měsíce zimního období
- délka dílčího stavebního postupu
- přípravné a dokončovací práce
- zkušební provoz
- omezení silničního provozu

Stavební úsek	Postupy/etapy	Popis činnosti: Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)		doba trvání od		(milníky) do	měs.	týdny	dny
Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC		DPSŘ (dopracování projektu souhmnného řešení) SZZ pro odbočku Bezpráví		2. leden 2021	-	7. duben 2021	3,0	13,6	95
		výroba SZZ pro odbočku Bezpráví		8. duben 2021	-	7. červenec 2021	3,0	12,9	90
		instalace a zkoušení SZZ v odbočce Bezpráví		8. červenec 2021	-	15. říjen 2021	3,3	14,1	99
		DPSŘ (dopracování projektu souhmnného řešení) SZZ pro žst. Brandýs nad Orlicí		2. leden 2021	-	27. květen 2021	3,0	20,7	145
		výroba SZZ pro žst. Brandýs nad Orlicí		28. květen 2021	-	20. říjen 2021	4,8	20,7	145
		instalace a zkoušení SZZ v žst. Brandýs nad Orlicí		21. říjen 2021	-	18. únor 2022	1,0	17,1	120
		zapnutí SZZ v odbočce Bezpráví		18. září 2021					
		zapnutí SZZ v žst. Brandýs nad Orlicí		1. červenec 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		1. květen 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		20. červen 2023					
		konec dokončovacích prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		30. červen 2023					
		zahájení stavby - přípravné práce v odbočce Bezpráví		21. květen 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v odbočce Bezpráví		18. prosinec 2022					
		konec dokončovacích prací v odbočce Bezpráví		28. prosinec 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		21. květen 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		18. prosinec 2022					
		konec dokončovacích prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		28. prosinec 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v žst. Brandýs nad Orlicí		21. květen 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v žst. Brandýs nad Orlicí		18. prosinec 2022					
		konec dokončovacích prací v žst. Brandýs nad Orlicí		28. prosinec 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		16. říjen 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		10. srpen 2022					
		konec dokončovacích prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		20. srpen 2022					
	1/1c	SO 02-11-02 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, sanace svahu km 259,58 - 259,88 vpravo	provedení	16. říjen 2021	-	4. prosinec 2021	1,7	7,1	50
		SO 02-20-01 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, železniční most v ev. km 258,596	v koleji 2	19. říjen 2021	-	28. listopad 2021	1,4	5,9	41
		SO 02-20-01.1 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, železniční most v ev. km 258,596, provizorní komunikace	odstranění	29. listopad 2021	-	3. prosinec 2021	0,2	0,7	5
		SO 02-20-02 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, železniční most v ev. km 259,445	v koleji 2	19. říjen 2021	-	28. listopad 2021	1,4	5,9	41
		SO 02-21-01 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, železniční propustek v ev. km 260,545	v koleji 2	19. říjen 2021	-	7. listopad 2021	0,7	2,9	20
		SO 02-76-21 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, úprava rozvodu VN 6kV	přeložky podle úprav spodku	16. říjen 2021	-	24. listopad 2021	1,3	5,7	40
		technologická a zimní přestávka		5. prosinec 2021	-	31. leden 2023	**14,1**	60,4	**423**
	ZP1 + 2 + ZP2	PS 00-01-52 Ústí nad Orlicí - Choceň, úprava ETCS	úprava podle nového stavu + zapnutí	5. prosinec 2021	-	2. červen 2022	6,0	25,7	180
		SO 02-21-01.1 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, železniční propustek v ev. km 260,545, provizorní komunikace	odstranění	2. prosinec 2022	-	21. prosinec 2022	0,7	2,9	20
		rekonstrukce traťové koleje 1		1. únor 2023	-	11. duben 2023	**2,3**	10,0	**70**
		traťová kolej 2 (4 hodiny v noci)		31. leden 2023	-	1. únor 2023	0,0	0,1	1
		traťová kolej 1		1. únor 2023	-	7. březen 2023	1,2	5,0	35
		traťová kolej 2 (4 hodiny v noci)		7. březen 2023	-	8. březen 2023	0,0	0,1	1
	3/3a	SO 02-10-01 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, železniční svršek	kolej 2: úprava převýšení před zahájením prací v koleji 1	31. leden 2023	-	31. leden 2023	0,0	0,1	1
		SO 02-10-01 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, železniční svršek + SO 02-11-01 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, železniční spodek	kolej 1: průjezd sanační linky	1. únor 2023	-	7. březen 2023	1,2	5,0	35
		SO 02-10-01 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, železniční svršek	kolej 2: úprava převýšení po ukončení prací v koleji 1	7. březen 2023	-	7. březen 2023	0,0	0,1	1
		SO 00-14-01 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, výstroj trati	kolej 1 Ústí nad Orlicí - Bezpráví	26. únor 2023	-	2. březen 2023	0,2	0,7	5
		SO 02-71-01 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, trakční vedení	regulace nad TK 2	31. leden 2023	-	31. leden 2023	0,0	0,1	1
		SO 02-71-01 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, trakční vedení	regulace nad TK 1	4. březen 2023	-	7. březen 2023	0,1	0,6	4
		SO 02-71-01 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, trakční vedení	regulace nad TK 2	7. březen 2023	-	7. březen 2023	0,0	0,1	1
		SO 02-77-01 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, ukolejnění	kolej 1	4. březen 2023	-	7. březen 2023	0,1	0,6	4
		rekonstrukce traťové koleje 2		12. duben 2023	-	20. červen 2023	**2,3**	10,0	**70**
		traťová kolej 1 (4 hodiny v noci)		11. duben 2023	-	12. duben 2023	0,0	0,1	1
		traťová kolej 2		12. duben 2023	-	16. květen 2023	1,2	5,0	35
		traťová kolej 1 (4 hodiny v noci)		16. květen 2023	-	17. květen 2023	0,0	0,1	1
	3/3b	SO 02-10-01 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, železniční svršek	kolej 1: úprava převýšení před zahájením prací v koleji 2	11. duben 2023	-	11. duben 2023	0,0	0,1	1
		SO 02-10-01 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, železniční svršek + SO 02-11-01 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, železniční spodek	kolej 2: průjezd sanační linky	12. duben 2023	-	16. květen 2023	1,2	5,0	35
		SO 02-10-01 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, železniční svršek	kolej 1: úprava převýšení po ukončení prací v koleji 2	16. květen 2023	-	16. květen 2023	0,0	0,1	1
		SO 00-14-01 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, výstroj trati	kolej 2 Ústí nad Orlicí - Bezpráví	7. květen 2023	-	11. květen 2023	0,2	0,7	5
		SO 02-71-01 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, trakční vedení	regulace nad TK 1	11. duben 2023	-	11. duben 2023	0,0	0,1	1
		SO 02-71-01 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, trakční vedení	regulace nad TK 2	13. květen 2023	-	16. květen 2023	0,1	0,6	4
		SO 02-71-01 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, trakční vedení	regulace nad TK 1	16. květen 2023	-	16. květen 2023	0,0	0,1	1
		SO 02-77-01 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, ukolejnění	kolej 2	13. květen 2023	-	16. květen 2023	0,1	0,6	4
		SO 00-83-03 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, rekultivace	úsek Ústí n. O. - odbočka Bezpráví	12. duben 2023	-	16. květen 2023	1,2	5,0	35
		následná úprava koleje 1		9. září 2023	-	9. září 2023	**0,0**	0,1	**1**
	NÚK	traťová kolej 1 (10ti hodinové výluky)		9. září 2023	-	9. září 2023	0,0	0,1	1
		SO 02-10-01.1 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, následná úprava koleje	kolej 1	9. září 2023	-	9. září 2023	0,0	0,1	1
		následná úprava koleje 2		18. září 2023	-	18. září 2023	**0,0**	0,1	**1**
		traťová kolej 2 (10ti hodinové výluky)		18. září 2023	-	18. září 2023	0,0	0,1	1
		SO 02-10-01.1 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, následná úprava koleje	kolej 2	18. září 2023	-	18. září 2023	0,0	0,1	1

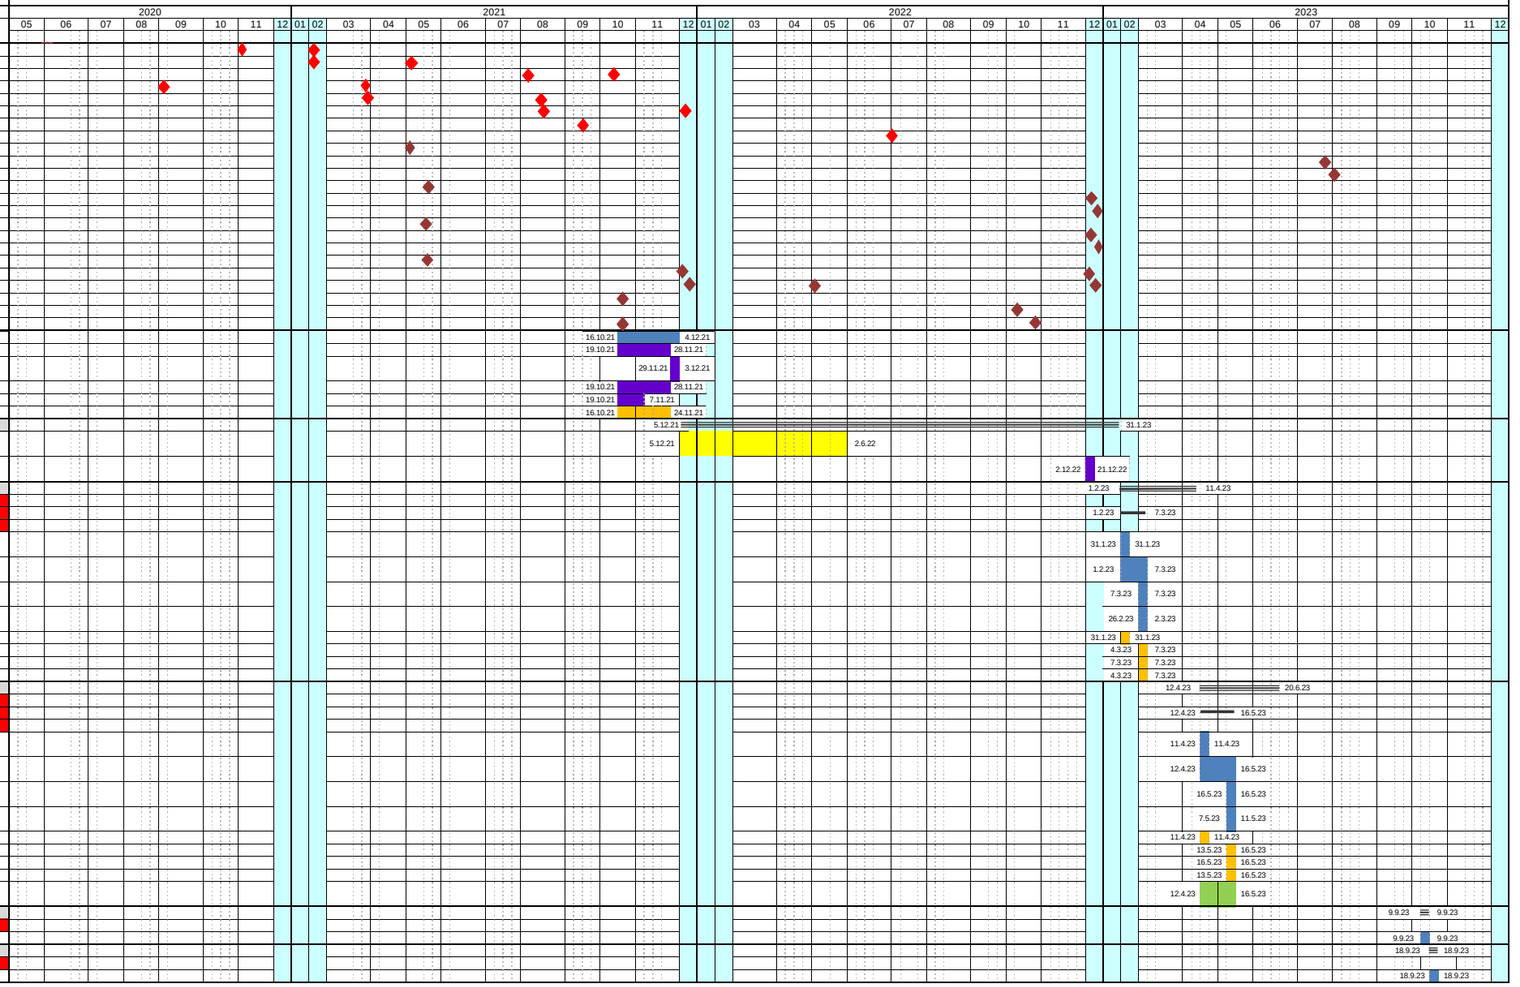

Rádkový harmonogram výstavby

Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC

Délka stavby (dny), bez následné úpravy kolejí:
790

Legenda:

- výluka
- uzavírka/omezení PK
- zabezpečovací a sdělovací zařízení
- kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž)
- mostní objekty (podchody vč.zastřešení)
- objekty elektro
- pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice
- potrubní sítě
- hlavní milníky přípravy a výstavby
- měsíce zimního období
- délka dílčího stavebního postupu
- přípravné a dokončovací práce
- zkušební provoz
- omezení silničního provozu

Stavební úsek	Postupy/etapy	Popis činností: Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)		doba trvání od	-	(milníky) do	měs.	týdny	dny
Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC		DPSŘ (dopracování projektu souhmnného řešení) SZZ pro odbočku Bezpráví		2. leden 2021	-	7. duben 2021	3,0	13,6	95
		výroba SZZ pro odbočku Bezpráví		8. duben 2021	-	7. červenec 2021	3,0	12,9	90
		instalace a zkoušení SZZ v odbočce Bezpráví		8. červenec 2021	-	15. říjen 2021	3,3	14,1	99
		DPSŘ (dopracování projektu souhmnného řešení) SZZ pro žst. Brandýs nad Orlicí		2. leden 2021	-	27. květen 2021	3,0	20,7	145
		výroba SZZ pro žst. Brandýs nad Orlicí		28. květen 2021	-	20. říjen 2021	4,8	20,7	145
		instalace a zkoušení SZZ v žst. Brandýs nad Orlicí		21. říjen 2021	-	18. únor 2022	1,0	17,1	120
		zapnutí SZZ v odbočce Bezpráví		18. září 2021					
		zapnutí SZZ v žst. Brandýs nad Orlicí		1. červenec 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		1. květen 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		20. červen 2023					
		konec dokončovacích prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		30. červen 2023					
		zahájení stavby - přípravné práce v odbočce Bezpráví		21. květen 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v odbočce Bezpráví		18. prosinec 2022					
		konec dokončovacích prací v odbočce Bezpráví		28. prosinec 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		21. květen 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		18. prosinec 2022					
		konec dokončovacích prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		28. prosinec 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v žst. Brandýs nad Orlicí		21. květen 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v žst. Brandýs nad Orlicí		18. prosinec 2022					
		konec dokončovacích prací v žst. Brandýs nad Orlicí		28. prosinec 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		16. říjen 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		10. srpen 2022					
		konec dokončovacích prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		20. srpen 2022					
odbočka Bezpráví	0	**přípravné práce**		1. květen 2021	-	20. květen 2021	**0,7**	2,9	**20**
		traťová kolej 1		4. květen 2021	-	20. květen 2021	0,6	2,4	17
		traťová kolej 2 (pažení mostu v km 260,986, základy podpěr TV u koleje 2): 6 hodin v noci		4. květen 2021	-	5. květen 2021	0,0	0,1	1
				5. květen 2021	-	6. květen 2021	0,0	0,1	1
				6. květen 2021	-	7. květen 2021	0,0	0,1	1
				7. květen 2021	-	8. květen 2021	0,0	0,1	1
				9. květen 2021	-	10. květen 2021	0,0	0,1	1
				10. květen 2021	-	11. květen 2021	0,0	0,1	1
		MK (cyklostezka 18) přes přejezd v km 261,275		1. květen 2021	-	20. květen 2021	0,7	2,9	20
		přístupy, plochy ZS, vytýčení IS		1. květen 2021	-	20. květen 2021	0,7	2,9	20
		PS 03-01-11 Odbočka Bezpráví, staniční zabezpečovací zařízení	výroba, zkoušení, instalace	1. květen 2021	-	20. květen 2021	0,7	2,9	20
		PS 00-02-51 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, úprava DOK ČD-Telematika a.s.	dočasná trasa podél koleje 2: zřízení	1. květen 2021	-	20. květen 2021	0,7	2,9	20
		PS 00-02-52 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, úprava TK	dočasná trasa podél koleje 2: zřízení	1. květen 2021	-	20. květen 2021	0,7	2,9	20
		SO 03-10-01 Odbočka Odb Bezpráví, železniční svršek	snesení stávající koleje 1 v km 260,9 - 261,3	4. květen 2021	-	4. květen 2021	0,0	0,1	1
		SO 03-10-01 Odbočka Odb Bezpráví, železniční svršek	snesení stávající koleje 1, dokončení	5. květen 2021	-	8. květen 2021	0,1	0,6	4
		SO 03-13-11 Odbočka Odb Bezpráví, odstranění přejezdů	kolej 1	4. květen 2021	-	4. květen 2021	0,0	0,1	1
		SO 03-20-01 Odbočka Odb Bezpráví, železniční most v ev. km 260,986	pažení (6 x 6 hodin v noci, jedna noc bez činnosti)	4. květen 2021	-	11. květen 2021	0,2	1,0	7
		SO 03-20-01 Odbočka Odb Bezpráví, železniční most v ev. km 260,986	demolice v koleji 1, zahájení	12. květen 2021	-	20. květen 2021	0,3	1,1	8
		SO 03-13-02 Odbočka Odb Bezpráví, úprava místní komunikace u železničního přejezdu P4886 ev. km 261,275	u koleje 1	5. květen 2021	-	20. květen 2021	0,5	2,3	16
		SO 03-22-01 Odbočka Odb Bezpráví, silniční propustek v ev. km 261,280	provedení	1. květen 2021	-	20. květen 2021	0,7	2,9	20
		SO 03-54-01 Odbočka Odb Bezpráví, úprava a ochrana NN přípojky k domku v km 261,139	provedení	1. květen 2021	-	20. květen 2021	0,7	2,9	20
		SO 03-31-01 Odbočka Odb Bezpráví, přístupová komunikace k technologickým objektům	provedení	1. květen 2021	-	20. květen 2021	0,7	2,9	20
		SO 03-63-01 Odbočka Odb Bezpráví, ochrana objektu proti hluku, Dobrá Voda č.p. 33	provedení	1. květen 2021	-	20. květen 2021	0,7	2,9	20
		SO 03-71-01 Odbočka Odb Bezpráví, trakční vedení	základy podpěr u TK 2	4. květen 2021	-	11. květen 2021	0,3	1,1	8
	1/1a	**přípravné práce, zřízení liché části odbočky**		21. květen 2021	-	27. září 2021	**4,3**	18,6	**130**
		traťová kolej 1		21. květen 2021	-	27. září 2021	4,3	18,6	130
		traťová kolej 2 (základy podpěr TV + podpěry TV): vždy 6 hodin v noci v zákrytu s výlukami v úseku Ústí nad Orlicí - odb. Bezpráví		23. květen 2021	-	1. červen 2021	0,3	1,4	10
		MK (cyklostezka 18) přes přejezd v km 261,275		1. září 2021	-	5. září 2021	0,2	0,7	5
		PS 03-01-11 Odbočka Bezpráví, staniční zabezpečovací zařízení	výroba, zkoušení, instalace	21. květen 2021	-	27. září 2021	4,3	18,6	130
		PS 03-01-11 Odbočka Bezpráví, staniční zabezpečovací zařízení	aktivace liché skupiny	18. září 2021	-	27. září 2021	0,3	1,4	10
		PS 00-01-51 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení	odbočka Bezpráví	18. září 2021	-	27. září 2021	0,3	1,4	10
		PS 00-01-52 Ústí nad Orlicí - Choceň, úprava ETCS	vypnutí	21. květen 2021					
		PS 03-02-11 Odbočka Odb Bezpráví, místní kabelizace	provedení	21. květen 2021	-	27. září 2021	4,3	18,6	130
		PS 00-02-51 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, úprava DOK ČD-Telematika a.s.	definitivní trasa podél koleje 1: zřízení	9. srpen 2021	-	27. září 2021	1,7	7,1	50
		PS 00-02-52 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, úprava TK	definitivní trasa podél koleje 1: zřízení	9. srpen 2021	-	27. září 2021	1,7	7,1	50
		PS 00-02-53 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, DOK a TK	provedení	9. srpen 2021	-	27. září 2021	1,7	7,1	50
		PS 00-02-81 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, úprava GSM-R	provedení	9. srpen 2021	-	27. září 2021	1,7	7,1	50
		PS 00-02-91 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, přenosový systém	provedení	9. srpen 2021	-	27. září 2021	1,7	7,1	50
		PS 03-02-41 Odbočka Odb Bezpráví, elektrická zabezpečovací signalizace	zahájení	9. srpen 2021	-	27. září 2021	1,7	7,1	50
		PS 03-02-91 Odbočka Odb Bezpráví, sdělovací zařízení	zahájení	9. srpen 2021	-	27. září 2021	1,7	7,1	50
		PS 91-02-91 CDP Praha, doplnění dálkové diagnostiky technologických systémů	odbočka Bezpráví	9. srpen 2021	-	27. září 2021	1,7	7,1	50
		PS 91-02-92 ED Pardubice, doplnění dálkové diagnostiky technologických systémů	odbočka Bezpráví	9. srpen 2021	-	27. září 2021	1,7	7,1	50
		PS 91-03-11 ED Pardubice, doplnění DŘT	odbočka Bezpráví	9. srpen 2021	-	27. září 2021	1,7	7,1	50
		PS 03-03-11 Odbočka Odb Bezpráví, DŘT	zahájení	9. srpen 2021	-	27. září 2021	1,7	7,1	50
		PS 03-03-61 Odbočka Odb Bezpráví, technologie TTS 3030	provedení	30. červen 2021	-	7. září 2021	2,3	10,0	70
		SO 03-20-01 Odbočka Odb Bezpráví, železniční most v ev. km 260,986	v koleji 1	21. květen 2021	-	7. září 2021	3,7	15,7	110
		SO 03-10-01 Odbočka Odb Bezpráví, železniční svršek	kolej 1 mimo most v km 260,986, výhybky 2 + 3	19. srpen 2021	-	7. září 2021	0,7	2,9	20
		SO 03-10-01 Odbočka Odb Bezpráví, železniční svršek	kolej 1 na mostě v km 260,986	13. září 2021	-	17. září 2021	0,2	0,7	5
		SO 03-11-01 Odbočka Odb Bezpráví, železniční spodek	kolej 1 mimo most v km 260,986, výhybky 2 + 3	30. červenec 2021	-	18. srpen 2021	0,7	2,9	20
		SO 03-11-01 Odbočka Odb Bezpráví, železniční spodek	kolej 1 na mostě v km 260,986	8. září 2021	-	12. září 2021	0,2	0,7	5
		SO 00-14-01 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, výstroj trati	lichá část	18. září 2021	-	22. září 2021	0,2	0,7	5
		SO 03-13-01 Odbočka Odb Bezpráví, železniční přejezd P4886 ev. km 261,275	osazení nové konstrukce v koleji 1	1. září 2021	-	5. září 2021	0,2	0,7	5
		SO 03-61-01 Odbočka Odb Bezpráví, technologický objekt	provedení	21. květen 2021	-	18. srpen 2021	3,0	12,9	90
		SO 03-71-01 Odbočka Odb Bezpráví, trakční vedení	podpěry u TK 2	23. květen 2021	-	3. červen 2021	0,4	1,7	12
		SO 03-71-01 Odbočka Odb Bezpráví, trakční vedení	podpěry u TK 1	31. květen 2021	-	9. červenec 2021	1,3	5,7	40
		SO 03-71-01 Odbočka Odb Bezpráví, trakční vedení	rekonstrukce v koleji 1	19. srpen 2021	-	7. září 2021	0,7	2,9	20
		SO 03-74-01 Odbočka Odb Bezpráví, elektrický ohřev výměn	výhybky 2, 3	19. srpen 2021	-	23. srpen 2021	0,2	0,7	5
		SO 03-76-11 Odbočka Odb Bezpráví, rozvod NN	zahájení	10. červenec 2021	-	17. září 2021	2,3	10,0	70
		SO 03-76-12 Odbočka Odb Bezpráví, venkovní osvětlení	provedení	10. červenec 2021	-	17. září 2021	2,3	10,0	70
		SO 03-76-21 Odbočka Odb Bezpráví, úprava rozvodu VN 6kV	přeložky podle úprav spodku	10. červenec 2021	-	17. září 2021	2,3	10,0	70
		SO 03-76-31 Odbočka Odb Bezpráví, dálkové ovládání odpojovačů	v koleji 1	19. srpen 2021	-	28. srpen 2021	0,3	1,4	10
		SO 03-77-01 Odbočka Odb Bezpráví, ukolejnění	v koleji 1	13. září 2021	-	17. září 2021	0,2	0,7	5
		SO 03-78-02 Odbočka Odb Bezpráví, uzemnění technologického objektu	provedení	10. červenec 2021	-	17. září 2021	2,3	10,0	70
		SO 00-83-02 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, náhradní výsadba	provedení	19. srpen 2021	-	28. srpen 2021	0,3	1,4	10

Řádkový harmonogram výstavby

Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC

Délka stavby (dny), bez následné úpravy kolejí:
790

Legenda:

výluka
uzavírka/omezení PK

zabezpečovací a sdělovací zařízení
kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž)
mostní objekty (podchody vč.zastřešení)
objekty elektro
pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice
potrubní sítě
hlavní milníky přípravy a výstavby
měsíce zimního období
délka dílčího stavebního postupu
přípravné a dokončovací práce
zkušební provoz
omezení silničního provozu

Stavební úsek	Postupy/etapy	Popis činností Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)		doba trvání od	-	(milníky) do	měs.	týdny	dny
Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC		DPSŘ (dopracování projektu souhmnného řešení) SZZ pro odbočku Bezpráví		2. leden 2021	-	7. duben 2021	3,0	13,6	95
		výroba SZZ pro odbočku Bezpráví		8. duben 2021	-	7. červenec 2021	3,0	12,9	90
		instalace a zkoušení SZZ v odbočce Bezpráví		8. červenec 2021	-	15. říjen 2021	3,3	14,1	99
		DPSŘ (dopracování projektu souhmnného řešení) SZZ pro žst. Brandýs nad Orlicí		2. leden 2021	-	27. květen 2021	3,0	20,7	145
		výroba SZZ pro žst. Brandýs nad Orlicí		28. květen 2021	-	20. říjen 2021	4,8	20,7	145
		instalace a zkoušení SZZ v žst. Brandýs nad Orlicí		21. říjen 2021	-	18. únor 2022	1,0	17,1	120
		zapnutí SZZ v odbočce Bezpráví		18. září 2021					
		zapnutí SZZ v žst. Brandýs nad Orlicí		1. červenec 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		1. květen 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		20. červen 2023					
		konec dokončovacích prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		30. červen 2023					
		zahájení stavby - přípravné práce v odbočce Bezpráví		21. květen 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v odbočce Bezpráví		18. prosinec 2022					
		konec dokončovacích prací v odbočce Bezpráví		28. prosinec 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		21. květen 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		18. prosinec 2022					
		konec dokončovacích prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		28. prosinec 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v žst. Brandýs nad Orlicí		21. květen 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v žst. Brandýs nad Orlicí		18. prosinec 2022					
		konec dokončovacích prací v žst. Brandýs nad Orlicí		28. prosinec 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		16. říjen 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		10. srpen 2022					
		konec dokončovacích prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		20. srpen 2022					
	1/1b	**zřízení sudé části odbočky: výhybky 1, 4**		28. září 2021	-	15. říjen 2021	**0,6**	2,6	**18**
		traťová kolej 2		28. září 2021	-	15. říjen 2021	0,6	2,6	18
		traťová kolej 1 (2 x 6 hodin v noci)		6. říjen 2021	-	7. říjen 2021	0,1	0,3	2
		PS 03-01-11 Odbočka Bezpráví, staniční zabezpečovací zařízení	aktivace sudé skupiny	6. říjen 2021	-	15. říjen 2021	0,3	1,4	10
		PS 03-02-41 Odbočka Odb Bezpráví, elektrická zabezpečovací signalizace	dokončení	28. září 2021	-	15. říjen 2021	0,6	2,6	18
		PS 03-02-91 Odbočka Odb Bezpráví, sdělovací zařízení	dokončení	28. září 2021	-	15. říjen 2021	0,6	2,6	18
		PS 03-03-11 Odbočka Odb Bezpráví, DRT	dokončení	28. září 2021	-	15. říjen 2021	0,6	2,6	18
		SO 03-10-01 Odbočka Odb Bezpráví, železniční svršek	výhybky 1 + 4	28. září 2021	-	9. říjen 2021	0,4	1,7	12
		SO 03-11-01 Odbočka Odb Bezpráví, železniční spodek	výhybky 1 + 4	28. září 2021	-	7. říjen 2021	0,3	1,4	10
		SO 00-14-01 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, výstroj trati	sudá část	11. říjen 2021	-	15. říjen 2021	0,2	0,7	5
		SO 03-71-01 Odbočka Odb Bezpráví, trakční vedení	dokončení	6. říjen 2021	-	15. říjen 2021	0,3	1,4	10
		SO 03-74-01 Odbočka Odb Bezpráví, elektrický ohřev výměn	výhybky 1, 4	6. říjen 2021	-	15. říjen 2021	0,3	1,4	10
		SO 03-76-11 Odbočka Odb Bezpráví, rozvod NN	dokončení	28. září 2021	-	15. říjen 2021	0,6	2,6	18
		SO 03-76-31 Odbočka Odb Bezpráví, dálkové ovládání odpojovačů	v koleji 2	6. říjen 2021	-	15. říjen 2021	0,3	1,4	10
		SO 03-77-01 Odbočka Odb Bezpráví, ukolejnění	v koleji 2 výhybky	6. říjen 2021	-	15. říjen 2021	0,3	1,4	10
	1/1c + ZP 1 + 2/2a + 2/2b	**technologická a zimní přestávka**		16. říjen 2021	-	21. červenec 2022	**1,0**	39,9	**279**
		PS 00-01-52 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, úprava ETCS	zahájení	5. prosinec 2021	-	21. červenec 2022	7,6	32,7	229
	2/2c + 2/2d	**dokončení sudé části odbočky**		22. červenec 2022	-	18. prosinec 2022	**1,0**	21,4	**150**
		kolej 2		22. červenec 2022	-	22. listopad 2022	4,1	17,7	124
		kolej 1 (noc, čtyři hodiny)		23. červenec 2022	-	24. červenec 2022	0,0	0,1	1
		MK (cyklostezka 18) přes přejezd v km 261,275		22. červenec 2022	-	22. červenec 2022	0,0	0,1	1
				18. listopad 2022	-	22. listopad 2022	0,2	0,7	5
		PS 00-01-52 Ústí nad Orlicí - Choceň, úprava ETCS	úprava podle nového stavu + zapnutí	22. červenec 2022	-	18. prosinec 2022	5,0	21,4	150
		SO 03-10-01 Odbočka Odb Bezpráví, železniční svršek	kolej 2 mimo výhybky: demontáž stávajícího svršku	22. červenec 2022	-	26. červenec 2022	0,2	0,7	5
		SO 03-11-01 Odbočka Odb Bezpráví, železniční spodek	kolej 2 mimo výhybky	27. červenec 2022	-	3. říjen 2022	2,3	9,9	69
		SO 03-10-01 Odbočka Odb Bezpráví, železniční svršek	kolej 2 mimo výhybky: montáž nového svršku	18. listopad 2022	-	22. listopad 2022	0,2	0,7	5
		SO 03-11-02 Odbočka Odb Bezpráví, sanace svahu km 261,05 - 261,26 vpravo	provedení	22. červenec 2022	-	9. říjen 2022	2,7	11,4	80
		SO 03-13-01 Odbočka Odb Bezpráví, železniční přejezd P4886 ev. km 261,275	kolej 2	18. listopad 2022	-	22. listopad 2022	0,2	0,7	5
		SO 03-13-02 Odbočka Odb Bezpráví, úprava místní komunikace u železničního přejezdu P4886 ev. km 261,275	u koleje 2	18. listopad 2022	-	22. listopad 2022	0,2	0,7	5
		SO 03-13-11 Odbočka Odb Bezpráví, odstranění přejezdů	kolej 2	22. červenec 2022	-	22. červenec 2022	0,0	0,1	1
		SO 03-20-01 Odbočka Odb Bezpráví, železniční most v ev. km 260,986	v koleji 2	23. červenec 2022	-	17. listopad 2022	3,9	16,9	118
		SO 03-24-01 Odbočka Odb Bezpráví, zárubní zeď km 261,07 - 261,24 vpravo	provedení	27. červenec 2022	-	14. říjen 2022	2,7	11,4	80
		SO 03-76-21 Odbočka Odb Bezpráví, úprava rozvodu VN 6kV	přeložky podle úprav spodku	27. červenec 2022	-	3. říjen 2022	2,3	9,9	69
		SO 03-77-01 Odbočka Odb Bezpráví, ukolejnění	v koleji 2 mimo výhybky 1, 4	18. listopad 2022	-	22. listopad 2022	0,2	0,7	5
	NÚK	**následná úprava koleje 1**		10. září 2023	-	10. září 2023	**0,0**	0,1	**1**
		traťová kolej 1 (noční čtyřhodinová výluka)		10. září 2023	-	10. září 2023	0,0	0,1	1
		SO 03-10-01.1 Odbočka Odb Bezpráví, následná úprava koleje	kolej 1	10. září 2023	-	10. září 2023	0,0	0,1	1
		následná úprava koleje 2		17. září 2023	-	17. září 2023	**0,0**	0,1	**1**
		traťová kolej 2 (noční čtyřhodinová výluka)		17. září 2023	-	17. září 2023	0,0	0,1	1
		SO 03-10-01.1 Odbočka Odb Bezpráví, následná úprava koleje	kolej 2	17. září 2023	-	17. září 2023	0,0	0,1	1

Řádkový harmonogram výstavby

Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC

Délka stavby (dny), bez následné úpravy kolejí:
790

Legenda:

výluka
uzavírka/omezení PK

zabezpečovací a sdělovací zařízení
kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž)
mostní objekty (podchody vč.zastřešení)
objekty elektro
pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice
potrubní sítě
hlavní milníky přípravy a výstavby
měsíce zimního období
délka dílčího stavebního postupu
přípravné a dokončovací práce
zkušební provoz
omezení silničního provozu

Stavební úsek	Postupy/etapy	Popis činnosti: Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)		doba trvání od	-	do	měs.	týdny	dny
Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC		DPSŘ (dopracování projektu souhmnného řešení) SZZ pro odbočku Bezpráví		2. leden 2021	-	7. duben 2021	3,0	13,6	95
		výroba SZZ pro odbočku Bezpráví		8. duben 2021	-	7. červenec 2021	3,0	12,9	90
		instalace a zkoušení SZZ v odbočce Bezpráví		8. červenec 2021	-	15. říjen 2021	3,3	14,1	99
		DPSŘ (dopracování projektu souhmnného řešení) SZZ pro žst. Brandýs nad Orlicí		2. leden 2021	-	27. květen 2021	3,0	20,7	145
		výroba SZZ pro žst. Brandýs nad Orlicí		28. květen 2021	-	20. říjen 2021	4,8	20,7	145
		instalace a zkoušení SZZ v žst. Brandýs nad Orlicí		21. říjen 2021	-	18. únor 2022	1,0	17,1	120
		zapnutí SZZ v odbočce Bezpráví		18. září 2021					
		zapnutí SZZ v žst. Brandýs nad Orlicí		1. červenec 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		1. květen 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		20. červen 2023					
		konec dokončovacích prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		30. červen 2023					
		zahájení stavby - přípravné práce v odbočce Bezpráví		21. květen 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v odbočce Bezpráví		18. prosinec 2022					
		konec dokončovacích prací v odbočce Bezpráví		28. prosinec 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		21. květen 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		18. prosinec 2022					
		konec dokončovacích prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		28. prosinec 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v žst. Brandýs nad Orlicí		21. květen 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v žst. Brandýs nad Orlicí		18. prosinec 2022					
		konec dokončovacích prací v žst. Brandýs nad Orlicí		28. prosinec 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		16. říjen 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		10. srpen 2022					
		konec dokončovacích prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		20. srpen 2022					
	0	**přípravné práce**		1. květen 2021	-	20. květen 2021	**1,0**	2,9	**20**
		přístupy, plochy ZS, vytýčení IS		1. květen 2021	-	20. květen 2021	0,7	2,9	20
		PS 04-01-21 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, traťové zabezpečovací zařízení	výroba, zkoušení, instalace	1. květen 2021	-	20. květen 2021	0,7	2,9	20
		PS 00-02-51 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, úprava DOK ČD-Telematika a.s.	dočasná trasa podél koleje 2: zřízení	1. květen 2021	-	20. květen 2021	0,7	2,9	20
		PS 00-02-52 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, úprava TK	dočasná trasa podél koleje 2: zřízení	1. květen 2021	-	20. květen 2021	0,7	2,9	20
		SO 04-31-01 Orlické Podhůří, výhybny na místní komunikace v Klopotech	provedení	1. květen 2021	-	20. květen 2021	0,7	2,9	20
	1/1a	**přípravné práce**		21. květen 2021	-	27. září 2021	**1,0**	18,6	**130**
		traťová kolej 1 (práce v odbočce Bezpráví + podpěry TV)		21. květen 2021	-	27. září 2021	4,3	18,6	130
		traťová kolej 2 (základy podpěr TV + podpěry TV): vždy 6 hodin v noci v zákrytu s výlukami v úseku Ústí nad Orlicí - odb. Bezpráví		23. květen 2021	-	1. červen 2021	0,3	1,4	10
		PS 04-01-21 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, traťové zabezpečovací zařízení	výroba, zkoušení, instalace	21. květen 2021	-	27. září 2021	4,3	18,6	130
		PS 00-01-52 Ústí nad Orlicí - Choceň, úprava ETCS	vypnutí	21. květen 2021					
		PS 00-02-51 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, úprava DOK ČD-Telematika a.s.	definitivní trasa podél koleje 1: zřízení	9. srpen 2021	-	27. září 2021	1,7	7,1	50
		PS 00-02-52 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, úprava TK	definitivní trasa podél koleje 1: zřízení	9. srpen 2021	-	27. září 2021	1,7	7,1	50
		PS 00-02-53 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, DOK a TK	provedení	9. srpen 2021	-	27. září 2021	1,7	7,1	50
		PS 00-02-81 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, úprava GSM-R	provedení	21. květen 2021	-	18. srpen 2021	3,0	12,9	90
		PS 00-02-91 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, přenosový systém	provedení	21. květen 2021	-	18. srpen 2021	3,0	12,9	90
		SO 04-54-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, úprava a ochrana NN přípojky SŽDC	provedení	31. květen 2021	-	19. červen 2021	0,7	2,9	20
		SO 04-63-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, ochrana objektu proti hluku, Dobrá Voda č.p. 34	provedení	31. květen 2021	-	9. červen 2021	0,3	1,4	10
		SO 04-63-03 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, ochrana objektu proti hluku, Sudislav nad Orlicí č.p. 52	provedení	10. červen 2021	-	19. červen 2021	0,3	1,4	10
		SO 04-63-04 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, ochrana objektu proti hluku, Sudislav nad Orlicí č.p. 51	provedení	20. červen 2021	-	29. červen 2021	0,3	1,4	10
		SO 04-71-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, trakční vedení	podpěry u TK 1	21. květen 2021	-	19. červenec 2021	2,0	8,6	60
		SO 04-76-21 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, úprava rozvodu VN 6kV	příprava přeložek	21. květen 2021	-	27. září 2021	4,3	18,6	130
		SO 00-83-02 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, náhradní výsadba	provedení	29. srpen 2021	-	17. září 2021	0,7	2,9	20
	1/1b	**přípravné práce**		28. září 2021	-	15. říjen 2021	**0,6**	2,6	**18**
		traťová kolej 2 (práce v odbočce Bezpráví + podpěry TV)		28. září 2021	-	15. říjen 2021	0,6	2,6	18
		traťová kolej 1 (zabezpečení stability štěrkového lože na mostě v km 261,607): 6 hodin v noci		28. září 2021	-	29. září 2021	0,0	0,1	1
				29. září 2021	-	30. září 2021	0,0	0,1	1
		traťová kolej 1 (pažení mostu v km 261,828): 6 hodin v noci		3. říjen 2021	-	4. říjen 2021	0,0	0,1	1
				4. říjen 2021	-	5. říjen 2021	0,0	0,1	1
				5. říjen 2021	-	6. říjen 2021	0,0	0,1	1
				6. říjen 2021	-	7. říjen 2021	0,0	0,1	1
		PS 04-01-21 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, traťové zabezpečovací zařízení	výroba, zkoušení, instalace	28. září 2021	-	15. říjen 2021	0,6	2,6	18
		SO 04-20-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 261,607	zabezpečení stability štěrkového lože v koleji 1 (2 x 6 hodin v noci)	28. září 2021	-	30. září 2021	0,1	0,3	2
		SO 04-20-02 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 261,828	pažení (4 x 6 hodin v noci)	3. říjen 2021	-	7. říjen 2021	0,1	0,6	4
		SO 04-71-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, trakční vedení	podpěry u TK 2	28. září 2021	-	15. říjen 2021	0,6	2,6	18
	1/1c	**přípravné práce**		16. říjen 2021	-	4. prosinec 2021	**1,7**	7,1	**50**
		traťové koleje 1 + 2 (zabezpečení stability štěrkového lože na mostě v km 263,032): 6 hodin v noci		16. říjen 2021	-	17. říjen 2021	0,0	0,1	1
		traťové koleje 1 + 2 (zabezpečení stability štěrkového lože na mostě v km 263,057): 6 hodin v noci		17. říjen 2021	-	18. říjen 2021	0,0	0,1	1
				19. říjen 2021	-	20. říjen 2021	0,0	0,1	1
				20. říjen 2021	-	21. říjen 2021	0,0	0,1	1
		traťové koleje 1 + 2 (pažení mostu v km 263,594): 6 hodin v noci		22. říjen 2021	-	23. říjen 2021	0,0	0,1	1
				23. říjen 2021	-	24. říjen 2021	0,0	0,1	1
				24. říjen 2021	-	25. říjen 2021	0,0	0,1	1
				25. říjen 2021	-	26. říjen 2021	0,0	0,1	1
				27. říjen 2021	-	28. říjen 2021	0,0	0,1	1
				28. říjen 2021	-	29. říjen 2021	0,0	0,1	1
				29. říjen 2021	-	30. říjen 2021	0,0	0,1	1
		traťové koleje 1 + 2 (zabezpečení stability štěrkového lože na mostě v km 264,303): 6 hodin v noci		31. říjen 2021	-	1. listopad 2021	0,0	0,1	1
				1. listopad 2021	-	2. listopad 2021	0,0	0,1	1
		traťové koleje 1 + 2 (pažení na propustku v km 264,840): 6 hodin v noci		3. listopad 2021	-	4. listopad 2021	0,0	0,1	1
				4. listopad 2021	-	5. listopad 2021	0,0	0,1	1
				5. listopad 2021	-	6. listopad 2021	0,0	0,1	1
				7. listopad 2021	-	8. listopad 2021	0,0	0,1	1
				8. listopad 2021	-	9. listopad 2021	0,0	0,1	1
		PS 04-01-21 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, traťové zabezpečovací zařízení	výroba, zkoušení, instalace	16. říjen 2021	-	4. prosinec 2021	1,7	7,1	50
		SO 04-20-03 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 263,032	zabezpečení stability štěrkového lože v koleji 1 (2 x 6 hodin v noci)	16. říjen 2021	-	18. říjen 2021	0,1	0,3	2
		SO 04-20-04 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 263,057		19. říjen 2021	-	21. říjen 2021	0,1	0,3	2
		SO 04-20-05 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 263,594	pažení (7 x 6 hodin v noci, jedna noc bez činnosti)	22. říjen 2021	-	30. říjen 2021	0,3	1,1	8
		SO 04-20-06 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 264,303	zabezpečení stability štěrkového lože v koleji 1 (2 x 6 hodin v noci)	31. říjen 2021	-	2. listopad 2021	0,1	0,3	2
		SO 04-21-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční propustek v ev. km 264,840	pažení (5 x 6 hodin v noci, jedna noc bez činnosti)	3. listopad 2021	-	9. listopad 2021	0,2	0,9	6
		SO 04-71-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, trakční vedení	podpěry u TK 2 (18 x 6 hodin v noci v zákrytu s výlukami pro pažení/zabezpečení stability ŠL, 7 nocí bez činnosti)	16. říjen 2021	-	9. listopad 2021	0,8	3,6	25
	ZP1	**zimní přestávka 1**		5. prosinec 2021	-	31. leden 2022	**1,9**	8,3	**58**
		SO 04-20-05.1 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 263,594, provizorní úpravy komunikace	zřízení	6. leden 2022	-	31. leden 2022	0,8	3,6	25
		rekonstrukce koleje 1		1. únor 2022	-	30. červen 2022	**5,0**	21,4	**150**
		traťová kolej 1		1. únor 2022	-	30. červen 2022	5,0	21,4	150
		MK přes přejezd v km 262,325		1. únor 2022	-	5. únor 2022	0,2	0,7	5
				1. červen 2022	-	5. červen 2022	0,2	0,7	5
		Cyklostezka 18 pod mostem v km 263,594		6. únor 2022	-	3. červen 2022	3,9	16,9	118
		PS 04-01-21 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, traťové zabezpečovací zařízení	instalace, zkoušky	1. únor 2022	-	26. květen 2022	3,8	16,4	115

Řádkový harmonogram výstavby

Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC

Délka stavby (dny), bez následné úpravy kolejí:
790

Legenda:

- výluka
- uzavírka/omezení PK
- zabezpečovací a sdělovací zařízení
- kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž)
- mostní objekty (podchody vč.zastřešení)
- objekty elektro
- pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice
- potrubní sítě
- hlavní milníky přípravy a výstavby
- měsíce zimního období
- délka dílčího stavebního postupu
- přípravné a dokončovací práce
- zkušební provoz
- omezení silničního provozu

Stavební úsek	Postupy/etapy	Popis činnosti		doba trvání od	-	(milníky) do	měs.	týdny	dny
Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC		DPSŘ (dopracování projektu souhmnného řešení) SZZ pro odbočku Bezpráví		2. leden 2021	-	7. duben 2021	3,0	13,6	95
		výroba SZZ pro odbočku Bezpráví		8. duben 2021	-	7. červenec 2021	3,0	12,9	90
		instalace a zkoušení SZZ v odbočce Bezpráví		8. červenec 2021	-	15. říjen 2021	3,3	14,1	99
		DPSŘ (dopracování projektu souhmnného řešení) SZZ pro žst. Brandýs nad Orlicí		2. leden 2021	-	27. květen 2021	3,0	20,7	145
		výroba SZZ pro žst. Brandýs nad Orlicí		28. květen 2021	-	20. říjen 2021	4,8	20,7	145
		instalace a zkoušení SZZ v žst. Brandýs nad Orlicí		21. říjen 2021	-	18. únor 2022	1,0	17,1	120
		zapnutí SZZ v odbočce Bezpráví		18. září 2021					
		zapnutí SZZ v žst. Brandýs nad Orlicí		1. červenec 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		1. květen 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		20. červen 2023					
		konec dokončovacích prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		30. červen 2023					
		zahájení stavby - přípravné práce v odbočce Bezpráví		21. květen 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v odbočce Bezpráví		18. prosinec 2022					
		konec dokončovacích prací v odbočce Bezpráví		28. prosinec 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		21. květen 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		18. prosinec 2022					
		konec dokončovacích prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		28. prosinec 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v žst. Brandýs nad Orlicí		21. květen 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v žst. Brandýs nad Orlicí		18. prosinec 2022					
		konec dokončovacích prací v žst. Brandýs nad Orlicí		28. prosinec 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		16. říjen 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		10. srpen 2022					
		konec dokončovacích prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		20. srpen 2022					
odbočka Bezpráví mimo - Brandýs nad Orlicí mimo	2/2a	SO 04-10-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční svršek	kolej 1, snesení na rekonstruovaných umělých stavbách a v prostoru štěrkových pilířů	1. únor 2022	-	5. únor 2022	0,2	0,7	5
		SO 04-10-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční svršek	kolej 1, obnova na rekonstruovaných umělých stavbách a v prostoru štěrkových pilířů	1. červen 2022	-	25. červen 2022	0,8	3,6	25
		SO 04-11-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční spodek	kolej 1, štěrkové pilíře, prostor rekonstruovaných umělých staveb	6. únor 2022	-	10. květen 2022	3,1	13,4	94
		SO 00-14-01 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, výstroj trati	kolej 1 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí	1. červen 2022	-	10. červen 2022	0,3	1,4	10
		SO 04-12-01 Odstranění zastávky Bezpráví	nástupiště u koleje 1	1. únor 2022	-	15. únor 2022	0,5	2,1	15
		SO 04-13-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční přejezd P4887 ev. km 262,325	kolej 1	1. červen 2022	-	5. červen 2022	0,2	0,7	5
		SO 04-13-02 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, úprava místní komunikace u železničního přejezdu P4887 ev. km 262,325	u koleje 1	1. červen 2022	-	5. červen 2022	0,2	0,7	5
		SO 04-13-11 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, odstranění přejezdů	kolej 1	1. únor 2022	-	5. únor 2022	0,2	0,7	5
		SO 04-20-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 261,607	v koleji 1	6. únor 2022	-	30. březen 2022	1,8	7,6	53
		SO 04-20-01.1 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 261,607, provizorní komunikace	zřízení	1. únor 2022	-	5. únor 2022	0,2	0,7	5
		SO 04-20-02 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 261,828	v koleji 1	16. únor 2022	-	17. červen 2022	4,1	17,4	122
		SO 04-20-02.1 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 261,828, provizorní komunikace	zřízení	1. únor 2022	-	15. únor 2022	0,5	2,1	15
		SO 04-20-02.2 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 261,828, provizorní most přes Tichou Orlici	zřízení	1. únor 2022	-	15. únor 2022	0,5	2,1	15
		SO 04-20-03 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 263,032	v koleji 1	31. březen 2022	-	22. květen 2022	1,8	7,6	53
		SO 04-20-04 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 263,057	v koleji 1	23. květen 2022	-	29. květen 2022	0,2	1,0	7
		SO 04-20-05 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 263,594	v koleji 1	6. únor 2022	-	3. červen 2022	3,9	16,9	118
		SO 04-20-06 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 264,303	v koleji 1	6. únor 2022	-	30. březen 2022	1,8	7,6	53
		SO 04-21-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční propustek v ev. km 264,840	v koleji 1	31. březen 2022	-	31. květen 2022	2,1	8,9	62
		SO 04-76-21 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, úprava rozvodu VN 6kV	přeložky podle úprav spodku	6. únor 2022	-	6. květen 2022	3,0	12,9	90
		SO 04-71-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, trakční vedení	rekonstrukce nad TK 1	6. červen 2022	-	30. červen 2022	0,8	3,6	25
		SO 04-77-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, ukolejnění	v koleji 1	26. červen 2022	-	30. červen 2022	0,2	0,7	5
	2/2b	**technologická přestávka**		1. červenec 2022	-	21. červenec 2022	**0,7**	3,0	**21**
		traťová kolej 1		1. červenec 2022	-	21. červenec 2022	0,7	3,0	21
		PS 04-01-21 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, traťové zabezpečovací zařízení	aktivace koleje 1	1. červenec 2022	-	21. červenec 2022	0,7	3,0	21
	2/2c	**rekonstrukce koleje 2: zahájení**		22. červenec 2022	-	10. srpen 2022	**0,7**	2,9	**20**
		traťová kolej 2		22. červenec 2022	-	10. srpen 2022	0,7	2,9	20
		MK přes přejezd v km 262,325		22. červenec 2022	-	26. červenec 2022	0,2	0,7	5
		Cyklostezka 18 pod mostem v km 263,594		27. červenec 2022	-	10. srpen 2022	0,5	2,1	15
		SO 04-10-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční svršek	kolej 2: snesení na umělých stavbách a v místě štěrkových pilířů	22. červenec 2022	-	26. červenec 2022	0,2	0,7	5
		SO 04-11-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční spodek	kolej 2, štěrkové pilíře, prostor rekonstruovaných umělých staveb	27. červenec 2022	-	10. srpen 2022	0,5	2,1	15
		SO 04-12-01 Odstranění zastávky Bezpráví	nástupiště u koleje 2	22. červenec 2022	-	5. srpen 2022	0,5	2,1	15
		SO 04-13-11 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, odstranění přejezdů	kolej 2	22. červenec 2022	-	26. červenec 2022	0,2	0,7	5
		SO 04-20-02 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 261,828	v koleji 2: zahájení	27. červenec 2022	-	10. srpen 2022	0,5	2,1	15
		SO 04-20-05 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 263,594	v koleji 2: zahájení	27. červenec 2022	-	10. srpen 2022	0,5	2,1	15
		SO 04-76-21 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, úprava rozvodu VN 6kV	přeložky podle úprav spodku	27. červenec 2022	-	10. srpen 2022	0,5	2,1	15
	2/2d	**rekonstrukce koleje 2: dokončení**		11. srpen 2022	-	18. prosinec 2022	**4,3**	18,6	**130**
		traťová kolej 2		11. srpen 2022	-	18. prosinec 2022	4,3	18,6	130
		MK přes přejezd v km 262,325		13. prosinec 2022	-	17. prosinec 2022	0,2	0,7	5
		Cyklostezka 18 pod mostem v km 263,594		11. srpen 2022	-	21. listopad 2022	3,4	14,7	103
		PS 04-01-21 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, traťové zabezpečovací zařízení	aktivace koleje 2	11. srpen 2022	-	18. prosinec 2022	4,3	18,6	130
		PS 00-01-52 Ústí nad Orlicí - Choceň, úprava ETCS	úprava podle nového stavu + zapnutí	11. srpen 2022	-	18. prosinec 2022	4,3	18,6	130
		SO 04-11-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční spodek	kolej 2, štěrkové pilíře, prostor rekonstruovaných umělých staveb	11. srpen 2022	-	8. listopad 2022	3,0	12,9	90
		SO 04-10-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční svršek	kolej 2: montáž na umělých stavbách a v místě štěrkových pilířů	4. prosinec 2022	-	13. prosinec 2022	0,3	1,4	10
		SO 04-11-02 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, sanace svahu km 263,12 - 263,49 vpravo	provedení	11. srpen 2022	-	8. listopad 2022	3,0	12,9	90
		SO 00-14-01 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, výstroj trati	kolej 2 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí	4. prosinec 2022	-	13. prosinec 2022	0,3	1,4	10
		SO 04-13-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční přejezd P4887 ev. km 262,325	kolej 2	4. prosinec 2022	-	8. prosinec 2022	0,2	0,7	5
		SO 04-13-02 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, úprava místní komunikace u železničního přejezdu P4887 ev. km 262,325	u koleje 2	4. prosinec 2022	-	8. prosinec 2022	0,2	0,7	5
		SO 04-20-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 261,607	v koleji 2	11. srpen 2022	-	2. říjen 2022	1,8	7,6	53
		SO 04-20-01.1 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 261,607, provizorní komunikace	odstranění	3. říjen 2022	-	7. říjen 2022	0,2	0,7	5
		SO 04-20-02 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 261,828	v koleji 2 dokončení	11. srpen 2022	-	25. listopad 2022	3,6	15,3	107
		SO 04-20-02.1 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 261,828, provizorní komunikace	odstranění	26. listopad 2022	-	30. listopad 2022	0,2	0,7	5
		SO 04-20-02.2 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 261,828, provizorní most přes Tichou Orlici	odstranění	26. listopad 2022	-	10. prosinec 2022	0,5	2,1	15
		SO 04-20-03 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 263,032	v koleji 2	3. říjen 2022	-	24. listopad 2022	1,8	7,6	53
		SO 04-20-04 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 263,057	v koleji 2	25. listopad 2022	-	1. prosinec 2022	0,2	1,0	7
		SO 04-20-05 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 263,594	v koleji 2 dokončení	11. srpen 2022	-	21. listopad 2022	3,4	14,7	103
		SO 04-20-05.1 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 263,594, provizorní úpravy komunikace	odstranění	22. listopad 2022	-	1. prosinec 2022	0,3	1,4	10
		SO 04-20-06 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 264,303	v koleji 2	11. srpen 2022	-	2. říjen 2022	1,8	7,6	53

Řádkový harmonogram výstavby

Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC

Délka stavby (dny), bez následné úpravy kolejí:
790

Legenda:

výluka
uzavírka/omezení PK

zabezpečovací a sdělovací zařízení
kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž)
mostní objekty (podchody vč.zastřešení)
objekty elektro
pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice
potrubní sítě

hlavní milníky přípravy a výstavby
měsíce zimního období
délka dílčího stavebního postupu
přípravné a dokončovací práce
zkušební provoz
omezení silničního provozu

Stavební úsek	Postupy/etapy	Popis činnosti Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)		doba trvání od	(milníky) do	měs.	týdny	dny
Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC		DPSŘ (dopracování projektu souhmnného řešení) SZZ pro odbočku Bezpráví		2. leden 2021	7. duben 2021	3,0	13,6	95
		výroba SZZ pro odbočku Bezpráví		8. duben 2021	7. červenec 2021	3,0	12,9	90
		instalace a zkoušení SZZ v odbočce Bezpráví		8. červenec 2021	15. říjen 2021	3,3	14,1	99
		DPSŘ (dopracování projektu souhmnného řešení) SZZ pro žst. Brandýs nad Orlicí		2. leden 2021	27. květen 2021	3,0	20,7	145
		výroba SZZ pro žst. Brandýs nad Orlicí		28. květen 2021	20. říjen 2021	4,8	20,7	145
		instalace a zkoušení SZZ v žst. Brandýs nad Orlicí		21. říjen 2021	18. únor 2022	1,0	17,1	120
		zapnutí SZZ v odbočce Bezpráví		18. září 2021				
		zapnutí SZZ v žst. Brandýs nad Orlicí		1. červenec 2022				
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		1. květen 2021				
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		20. červen 2023				
		konec dokončovacích prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		30. červen 2023				
		zahájení stavby - přípravné práce v odbočce Bezpráví		21. květen 2021				
		ukončení hlavních stavebních prací v odbočce Bezpráví		18. prosinec 2022				
		konec dokončovacích prací v odbočce Bezpráví		28. prosinec 2022				
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		21. květen 2021				
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		18. prosinec 2022				
		konec dokončovacích prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		28. prosinec 2022				
		zahájení přípravných a stavebních prací v žst. Brandýs nad Orlicí		21. květen 2021				
		ukončení hlavních stavebních prací v žst. Brandýs nad Orlicí		18. prosinec 2022				
		konec dokončovacích prací v žst. Brandýs nad Orlicí		28. prosinec 2022				
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		16. říjen 2021				
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		10. srpen 2022				
		konec dokončovacích prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		20. srpen 2022				
		SO 04-21-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční propustek v ev. km 264,840	v koleji 2	3. říjen 2022	3. prosinec 2022	2,1	8,9	62
		SO 04-24-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, zárubní zdi km 263,12 - 263,49 vpravo	provedení	11. srpen 2022	9. říjen 2022	2,0	8,6	60
		SO 04-66-01 Sudislav nad Orlicí, oplocení pozemku č. 105	provedení	26. listopad 2022	10. prosinec 2022	0,5	2,1	15
		SO 04-71-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, trakční vedení	rekonstrukce nad TK 2	4. prosinec 2022	18. prosinec 2022	0,5	2,1	15
		SO 04-76-21 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, úprava rozvodu VN 6kV	přeložky podle úprav spodku	11. srpen 2022	8. listopad 2022	3,0	12,9	90
		SO 04-77-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, ukolejnění	v koleji 2	14. prosinec 2022	18. prosinec 2022	0,2	0,7	5
	ZP2	**zimní přestávka 2**		**19. prosinec 2022**	**31. leden 2023**	**1,5**	**6,3**	**44**
	3/3a	**rekonstrukce traťové koleje 1**		1. únor 2023	11. duben 2023	**2,3**	10,0	**70**
		traťová kolej 2 (4 hodiny v noci)		7. březen 2023	8. březen 2023	0,0	0,1	1
		traťová kolej 1		8. březen 2023	11. duben 2023	1,2	5,0	35
		traťová kolej 2 (4 hodiny v noci)		11. duben 2023	12. duben 2023	0,0	0,1	1
		SO 04-10-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční svršek + SO 04-11-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční spodek	kolej 1: průjezd sanační linky	8. březen 2023	11. duben 2023	1,2	5,0	35
	3/3b	**rekonstrukce traťové koleje 2**		12. duben 2023	20. červen 2023	**2,3**	10,0	**70**
		traťová kolej 1 (4 hodiny v noci)		16. květen 2023	17. květen 2023	0,0	0,1	1
		traťová kolej 2		17. květen 2023	20. červen 2023	1,2	5,0	35
		traťová kolej 1 (4 hodiny v noci)		20. červen 2023	21. červen 2023	0,0	0,1	1
		SO 04-10-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční svršek + SO 04-11-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční spodek	kolej 2: průjezd sanační linky	17. květen 2023	20. červen 2023	1,2	5,0	35
	NÚK	**následná úprava koleje 1**		11. září 2023	11. září 2023	**0,0**	0,1	**1**
		traťová kolej 1 (10ti hodinové výluky)		11. září 2023	11. září 2023	0,0	0,1	1
		SO 04-10-01.1 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, následná úprava koleje	kolej 1	11. září 2023	11. září 2023	0,0	0,1	1
		následná úprava koleje 2		16. září 2023	16. září 2023	**0,0**	0,1	**1**
		traťová kolej 2 (10ti hodinové výluky)		16. září 2023	16. září 2023	0,0	0,1	1
		SO 04-10-01.1 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, následná úprava koleje	kolej 2	16. září 2023	16. září 2023	0,0	0,1	1

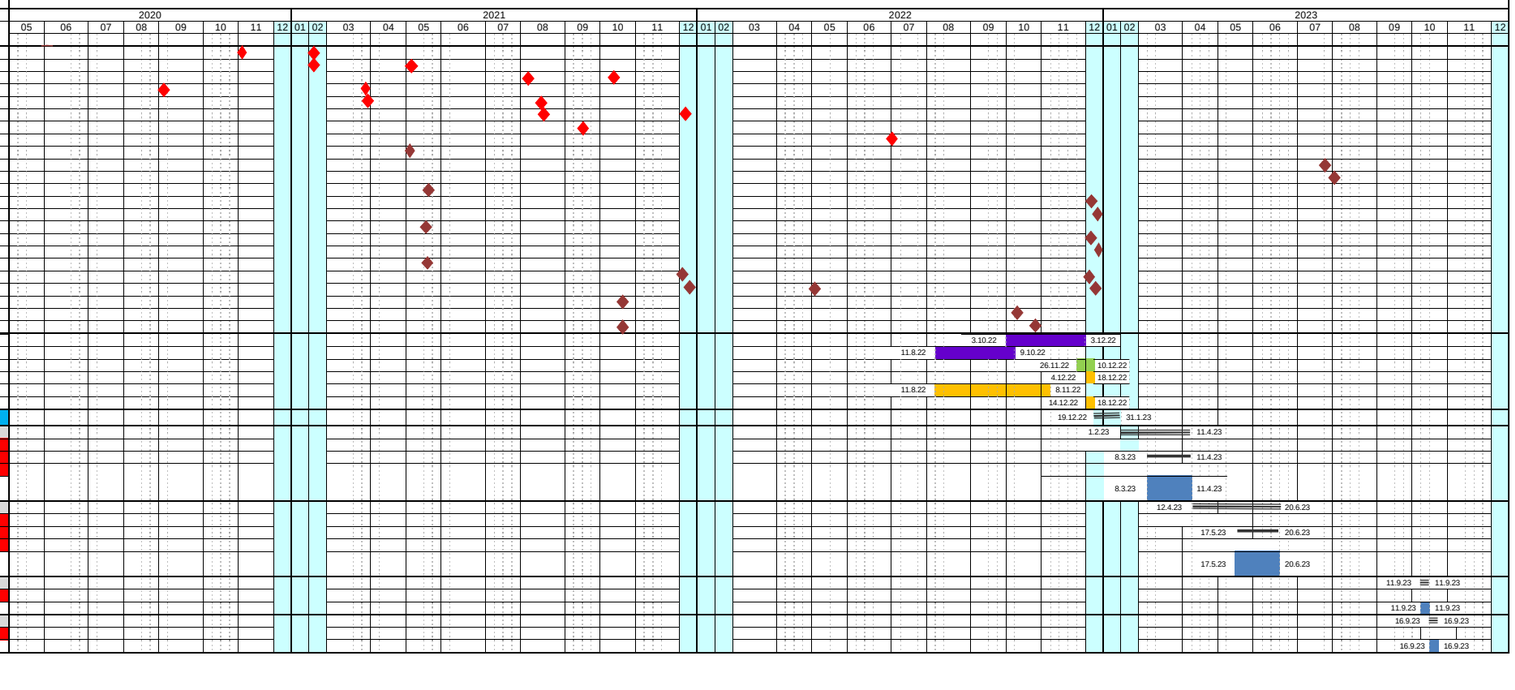

Rádkový harmonogram výstavby

Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC

Délka stavby (dny), bez následné úpravy kolejí:
790

Legenda:

- výluka
- uzavírka/omezení PK
- zabezpečovací a sdělovací zařízení
- kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž)
- mostní objekty (podchody vč.zastřešení)
- objekty elektro
- pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice
- potrubní sítě
- hlavní milníky přípravy a výstavby
- měsíce zimního období
- délka dílčího stavebního postupu
- přípravné a dokončovací práce
- zkušební provoz
- omezení silničního provozu

Stavební úsek	Postupy/etapy	Popis činnosti		doba trvání od	-	(milníky) do	měs.	týdny	dny
Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC		DPSŘ (dopracování projektu souhmnného řešení) SZZ pro odbočku Bezpráví		2. leden 2021	-	7. duben 2021	3,0	13,6	95
		výroba SZZ pro odbočku Bezpráví		8. duben 2021	-	7. červenec 2021	3,0	12,9	90
		instalace a zkoušení SZZ v odbočce Bezpráví		8. červenec 2021	-	15. říjen 2021	3,3	14,1	99
		DPSŘ (dopracování projektu souhmnného řešení) SZZ pro žst. Brandýs nad Orlicí		2. leden 2021	-	27. květen 2021	3,0	20,7	145
		výroba SZZ pro žst. Brandýs nad Orlicí		28. květen 2021	-	20. říjen 2021	4,8	20,7	145
		instalace a zkoušení SZZ v žst. Brandýs nad Orlicí		21. říjen 2021	-	18. únor 2022	1,0	17,1	120
		zapnutí SZZ v odbočce Bezpráví		18. září 2021					
		zapnutí SZZ v žst. Brandýs nad Orlicí		1. červenec 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		1. květen 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		20. červen 2023					
		konec dokončovacích prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		30. červen 2023					
		zahájení stavby - přípravné práce v odbočce Bezpráví		21. květen 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v odbočce Bezpráví		18. prosinec 2022					
		konec dokončovacích prací v odbočce Bezpráví		28. prosinec 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		21. květen 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		18. prosinec 2022					
		konec dokončovacích prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		28. prosinec 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v žst. Brandýs nad Orlicí		21. květen 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v žst. Brandýs nad Orlicí		18. prosinec 2022					
		konec dokončovacích prací v žst. Brandýs nad Orlicí		28. prosinec 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		16. říjen 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		10. srpen 2022					
		konec dokončovacích prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		20. srpen 2022					
	0	**přípravné práce**		1. květen 2021	-	20. květen 2021	**1,0**	2,9	**20**
		staniční kolej 4 (podpěry TV)		1. květen 2021	-	20. květen 2021	0,7	2,9	20
		staniční kolej 6		1. květen 2021	-	20. květen 2021	0,7	2,9	20
		přístupy, kácení, plochy ZS, vytýčení IS		1. květen 2021	-	20. květen 2021	0,7	2,9	20
		PS 05-01-11 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, staniční zabezpečovací zařízení	realisační dokumentace, výroba	1. květen 2021	-	20. květen 2021	0,7	2,9	20
		PS 10-32-01 Brandýs nad Orlicí, most přes Tichou Orlici ev. č. 3155-2, zajištění kabelů ČD Telematika a. s.	provedení	1. květen 2021	-	20. květen 2021	0,7	2,9	20
		PS 00-02-51 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, úprava DOK ČD-Telematika a.s.	dočasná trasa podél koleje 2:	1. květen 2021	-	20. květen 2021	0,7	2,9	20
		PS 00-02-52 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, úprava TK	zřízení	1. květen 2021	-	20. květen 2021	0,7	2,9	20
		SO 05-10-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, železniční svršek	demontáž koleje 6 (výhybka 5 mimo - stávající zaráždělo)	1. květen 2021	-	10. květen 2021	0,3	1,4	10
		SO 05-22-01 Brandýs nad Orlicí, most přes Tichou Orlici u svatého Jana	zahájení	1. květen 2021	-	20. květen 2021	0,7	2,9	20
		SO 05-65-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, demolice č.p. 215 Brandýs nad Orlicí	provedení	1. květen 2021	-	20. květen 2021	0,7	2,9	20
		SO 05-65-02 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, demolice technologického objektu u přejezdu na pozemku 754 a 755	demolice zbytné části objektu (mimo prostor s technologií)	1. květen 2021	-	20. květen 2021	0,7	2,9	20
		SO 05-65-03 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, demolice skladu ČD na pozemku 276	provedení	1. květen 2021	-	20. květen 2021	0,7	2,9	20
		SO 05-71-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, trakční vedení	podpěry u SK 4 + u TK 2 směr Choceň	1. květen 2021	-	20. květen 2021	0,7	2,9	20
		přípravné práce		21. květen 2021	-	27. září 2021	**1,0**	18,6	**130**
		staniční koleje 1, 3 (stavba opevnění břehu + podpěr TV)		21. květen 2021	-	16. srpen 2021	2,9	12,6	88
		staniční kolej 3		17. srpen 2021	-	27. září 2021	1,4	6,0	42
		staniční koleje 2, 4 (montáž nových bran + převěšování TV): 6 hodin v noci		21. červen 2021	-	22. červen 2021	0,0	0,1	1
				22. červen 2021	-	23. červen 2021	0,0	0,1	1
				23. červen 2021	-	24. červen 2021	0,0	0,1	1
				24. červen 2021	-	25. červen 2021	0,0	0,1	1
				26. červen 2021	-	27. červen 2021	0,0	0,1	1
				27. červen 2021	-	28. červen 2021	0,0	0,1	1
				28. červen 2021	-	29. červen 2021	0,0	0,1	1
				29. červen 2021	-	30. červen 2021	0,0	0,1	1
				1. červenec 2021	-	2. červenec 2021	0,0	0,1	1
				2. červenec 2021	-	3. červenec 2021	0,0	0,1	1
				3. červenec 2021	-	4. červenec 2021	0,0	0,1	1
				4. červenec 2021	-	5. červenec 2021	0,0	0,1	1
				6. červenec 2021	-	7. červenec 2021	0,0	0,1	1
				7. červenec 2021	-	8. červenec 2021	0,0	0,1	1
				8. červenec 2021	-	9. červenec 2021	0,0	0,1	1
				9. červenec 2021	-	10. červenec 2021	0,0	0,1	1
				11. červenec 2021	-	12. červenec 2021	0,0	0,1	1
				12. červenec 2021	-	13. červenec 2021	0,0	0,1	1
				13. červenec 2021	-	14. červenec 2021	0,0	0,1	1
				14. červenec 2021	-	15. červenec 2021	0,0	0,1	1
		staniční koleje 2, 4 (montáž nových bran + převěšování TV): 6 hodin v noci		9. srpen 2021	-	10. srpen 2021	0,0	0,1	1
				10. srpen 2021	-	11. srpen 2021	0,0	0,1	1
				11. srpen 2021	-	12. srpen 2021	0,0	0,1	1
				12. srpen 2021	-	13. srpen 2021	0,0	0,1	1
		staniční koleje 2, 4 (demontáž původních bran): 6 hodin v noci		16. červenec 2021	-	17. červenec 2021	0,0	0,1	1
				17. červenec 2021	-	18. červenec 2021	0,0	0,1	1
				18. červenec 2021	-	19. červenec 2021	0,0	0,1	1
				19. červenec 2021	-	20. červenec 2021	0,0	0,1	1
				21. červenec 2021	-	22. červenec 2021	0,0	0,1	1
				22. červenec 2021	-	23. červenec 2021	0,0	0,1	1
				23. červenec 2021	-	24. červenec 2021	0,0	0,1	1
				24. červenec 2021	-	25. červenec 2021	0,0	0,1	1
				26. červenec 2021	-	27. červenec 2021	0,0	0,1	1
				27. červenec 2021	-	28. červenec 2021	0,0	0,1	1
		staniční koleje 1, 2, 4 (demontáž původních bran): 6 hodin v noci		14. srpen 2021	-	15. srpen 2021	0,0	0,1	1
				15. srpen 2021	-	16. srpen 2021	0,0	0,1	1
		traťová kolej 2 (budoucí staniční kolej 2a/b) pažení mostu v km 265,536: 6 hodin v noci		21. červen 2021	-	22. červen 2021	0,0	0,1	1
				22. červen 2021	-	23. červen 2021	0,0	0,1	1
				23. červen 2021	-	24. červen 2021	0,0	0,1	1
				24. červen 2021	-	25. červen 2021	0,0	0,1	1
				26. červen 2021	-	27. červen 2021	0,0	0,1	1
				27. červen 2021	-	28. červen 2021	0,0	0,1	1
				28. červen 2021	-	29. červen 2021	0,0	0,1	1
				29. červen 2021	-	30. červen 2021	0,0	0,1	1
				1. červenec 2021	-	2. červenec 2021	0,0	0,1	1
		traťové koleje 1 + 2 (budoucí staniční koleje 1b + 2b) zabezpečení stability štěrkového lože na mostě v km 265,816: 6 hodin v noci		2. červenec 2021	-	3. červenec 2021	0,0	0,1	1
				3. červenec 2021	-	4. červenec 2021	0,0	0,1	1
				4. červenec 2021	-	5. červenec 2021	0,0	0,1	1
				6. červenec 2021	-	7. červenec 2021	0,0	0,1	1
		traťové koleje 1 + 2 (budoucí staniční koleje 1b + 2b) zabezpečení stability štěrkového lože na mostě v km 265,926: 6 hodin v noci		9. srpen 2021	-	10. srpen 2021	0,0	0,1	1
				10. srpen 2021	-	11. srpen 2021	0,0	0,1	1
		traťové koleje 1 + 2 (budoucí staniční koleje 1b + 2b) zabezpečení stability štěrkového lože na propustku v km 266,078: 6 hodin v noci		11. srpen 2021	-	12. srpen 2021	0,0	0,1	1
				12. srpen 2021	-	13. srpen 2021	0,0	0,1	1
		traťové koleje 1 + 2 (budoucí staniční koleje 1b + 2b) pažení mostu v km 266,134: 6 hodin v noci		7. červenec 2021	-	8. červenec 2021	0,0	0,1	1
				8. červenec 2021	-	9. červenec 2021	0,0	0,1	1
				9. červenec 2021	-	10. červenec 2021	0,0	0,1	1
				11. červenec 2021	-	12. červenec 2021	0,0	0,1	1
				12. červenec 2021	-	13. červenec 2021	0,0	0,1	1
				13. červenec 2021	-	14. červenec 2021	0,0	0,1	1
				14. červenec 2021	-	15. červenec 2021	0,0	0,1	1
				16. červenec 2021	-	17. červenec 2021	0,0	0,1	1

Rádkový harmonogram výstavby

Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC

Délka stavby (dny), bez následné úpravy kolejí:
790

Legenda:

- výluka
- uzavírka/omezení PK
- zabezpečovací a sdělovací zařízení
- kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž)
- mostní objekty (podchody vč.zastřešení)
- objekty elektro
- pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice
- potrubní sítě
- hlavní milníky přípravy a výstavby
- měsíce zimního období
- délka dílčího stavebního postupu
- přípravné a dokončovací práce
- zkušební provoz
- omezení silničního provozu

Stavební úsek	Postupy/etapy	Popis činnosti – Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)		doba trvání od		(milníky) do	měs.	týdny	dny
Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC		DPSŘ (dopracování projektu souhmnného řešení) SZZ pro odbočku Bezpráví		2. leden 2021	-	7. duben 2021	3,0	13,6	95
		výroba SZZ pro odbočku Bezpráví		8. duben 2021	-	7. červenec 2021	3,0	12,9	90
		instalace a zkoušení SZZ v odbočce Bezpráví		8. červenec 2021	-	15. říjen 2021	3,3	14,1	99
		DPSŘ (dopracování projektu souhmnného řešení) SZZ pro žst. Brandýs nad Orlicí		2. leden 2021	-	27. květen 2021	3,0	20,7	145
		výroba SZZ pro žst. Brandýs nad Orlicí		28. květen 2021	-	20. říjen 2021	4,8	20,7	145
		instalace a zkoušení SZZ v žst. Brandýs nad Orlicí		21. říjen 2021	-	18. únor 2022	1,0	17,1	120
		zapnutí SZZ v odbočce Bezpráví		18. září 2021					
		zapnutí SZZ v žst. Brandýs nad Orlicí		1. červenec 2022					
		zahájení připravných a stavebních prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		1. květen 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		20. červen 2023					
		konec dokončovacích prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		30. červen 2023					
		zahájení stavby - přípravné práce v odbočce Bezpráví		21. květen 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v odbočce Bezpráví		18. prosinec 2022					
		konec dokončovacích prací v odbočce Bezpráví		28. prosinec 2022					
		zahájení připravných a stavebních prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		21. květen 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		18. prosinec 2022					
		konec dokončovacích prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		28. prosinec 2022					
		zahájení připravných a stavebních prací v žst. Brandýs nad Orlicí		21. květen 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v žst. Brandýs nad Orlicí		18. prosinec 2022					
		konec dokončovacích prací v žst. Brandýs nad Orlicí		28. prosinec 2022					
		zahájení připravných a stavebních prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		16. říjen 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		10. srpen 2022					
		konec dokončovacích prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		20. srpen 2022					
	1/1a	staniční koleje 1 + 2 pažení mostu v km 266,594: 6 hodin v noci		17. červenec 2021	-	18. červenec 2021	0,0	0,1	1
				18. červenec 2021	-	19. červenec 2021	0,0	0,1	1
				19. červenec 2021	-	20. červenec 2021	0,0	0,1	1
				21. červenec 2021	-	22. červenec 2021	0,0	0,1	1
				22. červenec 2021	-	23. červenec 2021	0,0	0,1	1
				23. červenec 2021	-	24. červenec 2021	0,0	0,1	1
				24. červenec 2021	-	25. červenec 2021	0,0	0,1	1
				26. červenec 2021	-	27. červenec 2021	0,0	0,1	1
				27. červenec 2021	-	28. červenec 2021	0,0	0,1	1
		staniční kolej 6		21. květen 2021	-	27. září 2021	4,3	18,6	130
		PS 05-01-11 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, staniční zabezpečovací zařízení	realisační dokumentace, výroba	21. květen 2021	-	27. září 2021	4,3	18,6	130
		PS 00-01-52 Ústí nad Orlicí - Choceň, úprava ETCS	vypnutí	21. květen 2021					
		PS 00-02-51 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, úprava DOK ČD-Telematika a.s.	definitivní trasa podél koleje 1:	9. srpen 2021	-	27. září 2021	1,7	7,1	50
		PS 00-02-52 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, úprava TK	zřízení	9. srpen 2021	-	27. září 2021	1,7	7,1	50
		PS 00-02-53 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, DOK a TK	provedení	9. srpen 2021	-	27. září 2021	1,7	7,1	50
		PS 00-02-81 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, úprava GSM-R	provedení	21. květen 2021	-	27. září 2021	4,3	18,6	130
		PS 00-02-91 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, přenosový systém	provedení	21. květen 2021	-	27. září 2021	4,3	18,6	130
		PS 05-02-92 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, dálková diagnostika technologických systémů (včetně odbočky Bezpráví)	napojení odbočky Bezpráví	9. srpen 2021	-	27. září 2021	1,7	7,1	50
		PS 05-02-11 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, místní kabelizace	zahájení	21. květen 2021	-	27. září 2021	4,3	18,6	130
		PS 05-03-51 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, technologie trafostanice 35/0,4kV	provedení	10. červenec 2021	-	17. září 2021	2,3	10,0	70
		SO 05-10-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, železniční svršek	dočasná demontáž části koleje 3 pro stavbu opevnění břehu	21. květen 2021	-	30. květen 2021	0,3	1,4	10
		SO 05-10-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, železniční svršek	zprovoznění koleje 1	9. srpen 2021	-	12. srpen 2021	0,1	0,6	4
		SO 05-11-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, železniční spodek	opevnění břehu v km 266,691 - 266,727 + 267,130 - 267,290	21. květen 2021	-	8. srpen 2021	2,7	11,4	80
		SO 05-20-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, železniční most v ev. km 265,536	pažení (9 x 6 hodin v noci, dvě noci bez činnosti)	21. červen 2021	-	1. červenec 2021	0,4	1,6	11
		SO 05-20-01.1 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, železniční most v ev. km 265,536, provizorní komunikace	zřízení části vlevo trati	6. červen 2021	-	20. červen 2021	0,5	2,1	15
		SO 05-20-02 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, železniční most v ev. km 265,816	zabezpečení stability štěrkového lože (4 x 6 hodin v noci, jedna noc bez činnosti)	2. červenec 2021	-	7. červenec 2021	0,2	0,7	5
		SO 05-20-03 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, žel. most v ev. km 265,926	zabezpečení stability štěrkového lože (2 x 6 hodin v noci)	9. srpen 2021	-	11. srpen 2021	0,1	0,3	2
		SO 05-20-04 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, železniční most v ev. km 266,134 - podchod	pažení (9 x 6 hodin v noci, dvě noci bez činnosti)	7. červenec 2021	-	18. červenec 2021	0,4	1,6	11
		SO 05-20-05 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, železniční most v ev. km 266,594	pažení (8 x 6 hodin v noci, dvě noci bez činnosti)	18. červenec 2021	-	28. červenec 2021	0,3	1,4	10
		SO 05-21-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, železniční propustek v ev. km 266,078	zabezpečení stability štěrkového lože (2 x 6 hodin v noci)	11. srpen 2021	-	13. srpen 2021	0,1	0,3	2
		SO 05-22-01 Brandýs nad Orlicí, most přes Tichou Orlici u svatého Jana	dokončení	21. květen 2021	-	19. červen 2021	1,0	4,3	30
		SO 05-40-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, kabelovod	úsek vpravo trati	21. květen 2021	-	9. červenec 2021	1,7	7,1	50
		SO 05-53-01 Brandýs nad Orlicí, úprava a ochrana rozvodů CETIN	provedení	21. květen 2021	-	27. září 2021	4,3	18,6	130
		SO 05-51-01 Brandýs nad Orlicí, zrušení vodovodu VaK Jablonné n.O. v km 266,563	provedení	31. květen 2021	-	9. červen 2021	0,3	1,4	10
		SO 05-50-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, odvodnění stanice	přípravné práce mimo kolejiště a v prostoru opevňování břehu Tiché Orlice	21. květen 2021	-	27. září 2021	4,3	18,6	130
		SO 05-50-02 Brandýs nad Orlicí, přeložka souběžné jednotné kanalizace VaK Jablonné n.O. v km 265,985	provedení	20. červen 2021	-	9. červenec 2021	0,7	2,9	20
		SO 05-50-03 Brandýs nad Orlicí, přeložka souběžné výtlačné kanalizace VaK Jablonné n.O. v km 265,986	provedení	31. květen 2021	-	19. červen 2021	0,7	2,9	20
		SO 05-50-04 Brandýs nad Orlicí, přeložka výtlačné kanalizace VaK Jablonné n.O. v km 266,562	provedení	20. červen 2021	-	9. červenec 2021	0,7	2,9	20
		SO 05-52-01 Brandýs nad Orlicí, úprava STL plynovodu GasNet v km 266,562	provedení	20. červen 2021	-	9. červenec 2021	0,7	2,9	20
		SO 05-61-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, technologický objekt	provedení	21. květen 2021	-	27. září 2021	4,3	18,6	130
		SO 05-61-01.1 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, technologický objekt, zpevněné plochy	provedení	21. květen 2021	-	19. červen 2021	1,0	4,3	30
		SO 05-63-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, ochrana objektů SŽDC proti hluku	provedení	10. červen 2021	-	19. červen 2021	0,3	1,4	10
		SO 05-71-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, trakční vedení	podpěry u SK 3 + TK 1 směr Choceň, demontáž stávajícího TV SK 1 + 3	21. květen 2021	-	9. červen 2021	0,7	2,9	20
		SO 05-71-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, trakční vedení	nové brány + převěšení TV, 20 x 6 hodin v noci + 4 noci bez činnosti: v místech mimo opevňování břehu Tiché Orlice	21. červen 2021	-	15. červenec 2021	0,8	3,4	24
		SO 05-71-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, trakční vedení	demontáž stávajících bran, 10 x 6 hodin v noci + 2 noci bez činnosti	16. červenec 2021	-	24. červenec 2021	0,3	1,1	8
		SO 05-71-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, trakční vedení	nové brány + převěšení TV, 4 x 6 hodin v noci: v místech opevňování břehu Tiché Orlice	9. srpen 2021	-	12. srpen 2021	0,1	0,6	4
		SO 05-71-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, trakční vedení	montáž dočasného TV SK 1	9. srpen 2021	-	13. srpen 2021	0,1	0,6	4
		SO 05-71-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, trakční vedení	demontáž stávajících bran, 2 x 6 hodin v noci	14. srpen 2021	-	16. srpen 2021	0,1	0,3	2
		SO 05-76-12 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, venkovní osvětlení	demontáž stávajícího osvětlení na liché straně v úseku opevňování břehu Tiché Orlice	21. květen 2021	-	9. červen 2021	0,7	2,9	20
		SO 05-76-21 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, úprava rozvodu VN 6kV	příprava přeložek	21. květen 2021	-	27. září 2021	4,3	18,6	130

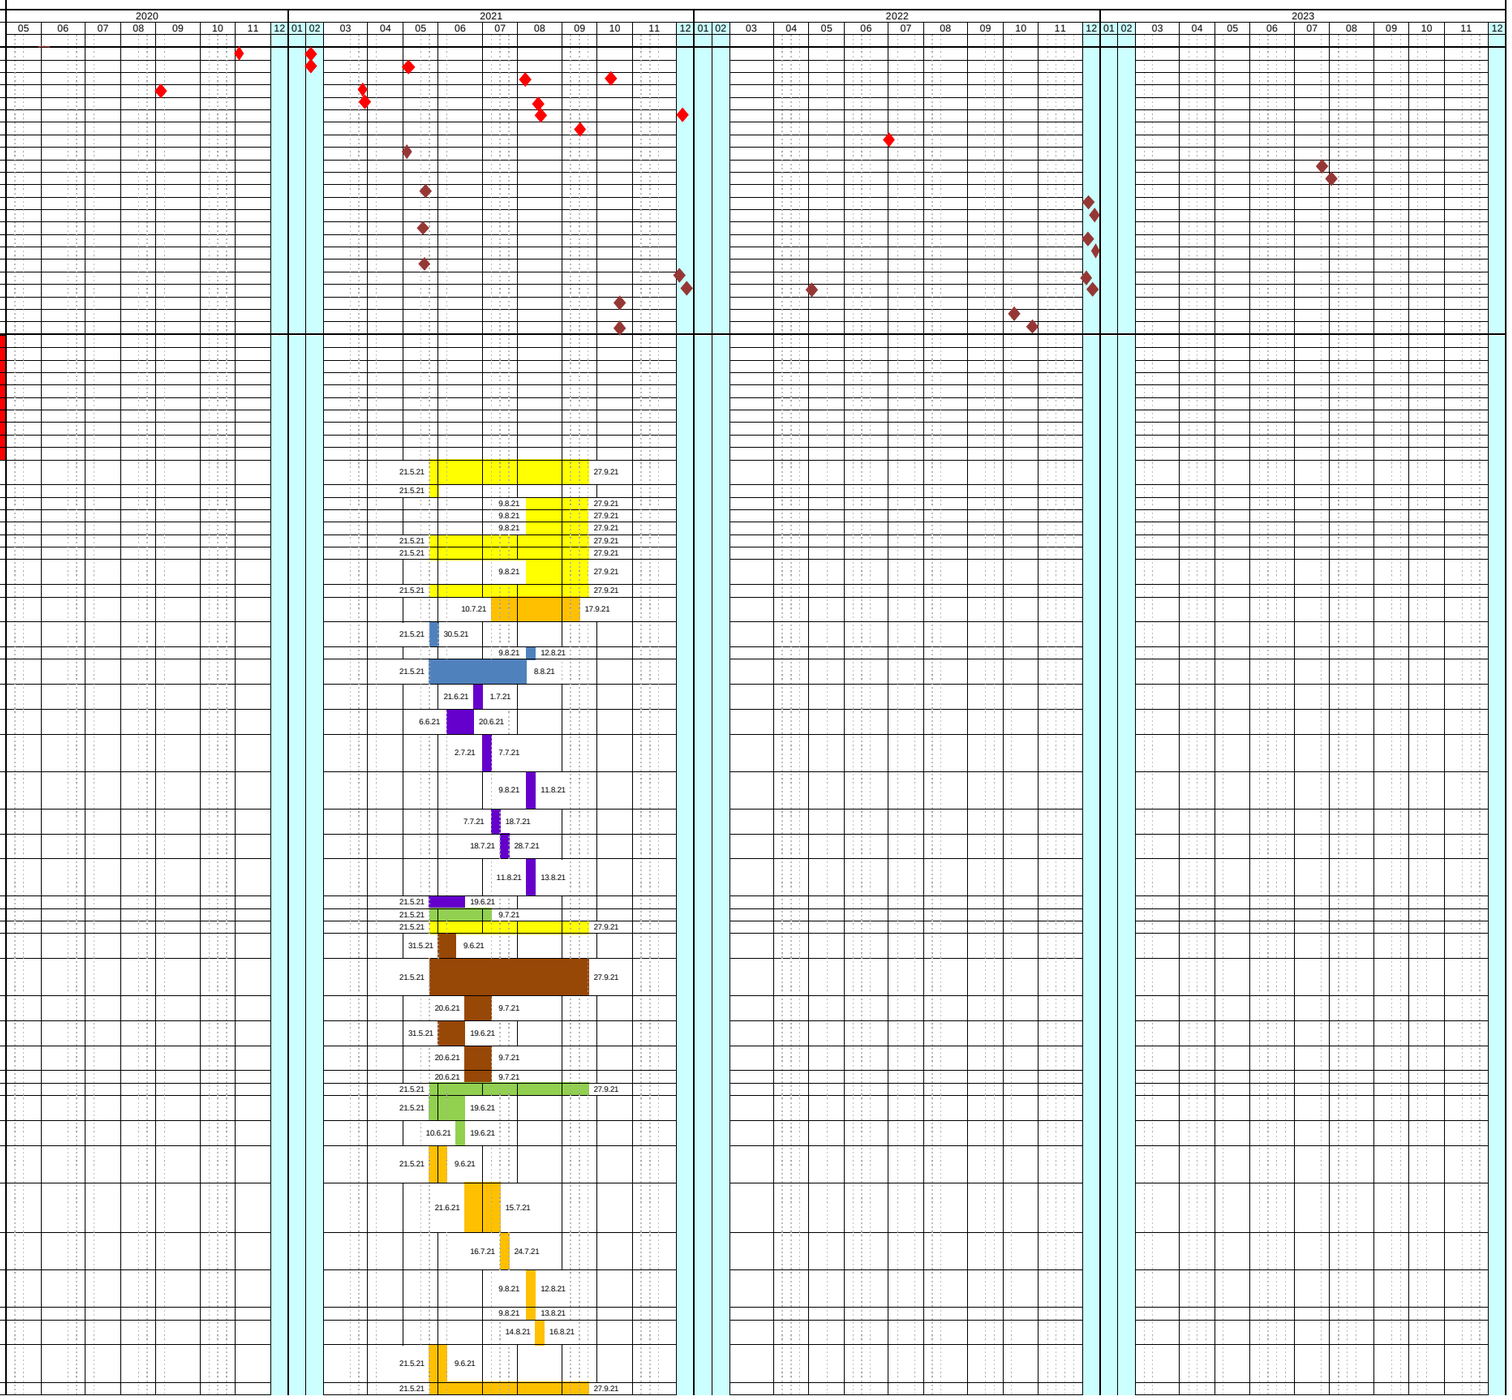

Řádkový harmonogram výstavby

Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC

Délka stavby (dny), bez následné úpravy kolejí:
790

Legenda:

- výluka
- uzavírka/omezení PK
- zabezpečovací a sdělovací zařízení
- kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž)
- mostní objekty (podchody vč.zastřešení)
- objekty elektro
- pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice
- potrubní sítě
- hlavní milníky přípravy a výstavby
- měsíce zimního období
- délka dílčího stavebního postupu
- přípravné a dokončovací práce
- zkušební provoz
- omezení silničního provozu

Stavební úsek	Postupy/etapy	Popis činnosti Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)		doba trvání od	-	(milníky) do	měs.	týdny	dny
Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC		DPSŘ (dopracování projektu souhmnného řešení) SZZ pro odbočku Bezpráví		2. leden 2021	-	7. duben 2021	3,0	13,6	95
		výroba SZZ pro odbočku Bezpráví		8. duben 2021	-	7. červenec 2021	3,0	12,9	90
		instalace a zkoušení SZZ v odbočce Bezpráví		8. červenec 2021	-	15. říjen 2021	3,3	14,1	99
		DPSŘ (dopracování projektu souhmnného řešení) SZZ pro žst. Brandýs nad Orlicí		2. leden 2021	-	27. květen 2021	3,0	20,7	145
		výroba SZZ pro žst. Brandýs nad Orlicí		28. květen 2021	-	20. říjen 2021	4,8	20,7	145
		instalace a zkoušení SZZ v žst. Brandýs nad Orlicí		21. říjen 2021	-	18. únor 2022	1,0	17,1	120
		zapnutí SZZ v odbočce Bezpráví		18. září 2021					
		zapnutí SZZ v žst. Brandýs nad Orlicí		1. červenec 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		1. květen 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		20. červen 2023					
		konec dokončovacích prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		30. červen 2023					
		zahájení stavby - přípravné práce v odbočce Bezpráví		21. květen 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v odbočce Bezpráví		18. prosinec 2022					
		konec dokončovacích prací v odbočce Bezpráví		28. prosinec 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		21. květen 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		18. prosinec 2022					
		konec dokončovacích prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		28. prosinec 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v žst. Brandýs nad Orlicí		21. květen 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v žst. Brandýs nad Orlicí		18. prosinec 2022					
		konec dokončovacích prací v žst. Brandýs nad Orlicí		28. prosinec 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		16. říjen 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		10. srpen 2022					
		konec dokončovacích prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		20. srpen 2022					
Brandýs nad Orlicí		SO 05-78-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, uzemnění technologického objektu	provedení	18. září 2021	-	27. září 2021	0,3	1,4	10
		SO 00-83-02 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, náhradní výsadba	provedení	14. srpen 2021	-	28. srpen 2021	0,5	2,1	15
	1/1b + 1/1c + ZP1	**technologická přestávka**		28. září 2021	-	31. leden 2022	**4,2**	18,0	**126**
		staniční koleje 3, 6		28. září 2021	-	31. leden 2022	4,2	18,0	126
		PS 05-01-11 ŽST Brandýs n. O. předjízdné koleje, staniční zabezpečovací zařízení	výroba	28. září 2021	-	31. leden 2022	4,2	18,0	126
		PS 05-02-11 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, místní kabelizace	pokračování	28. září 2021	-	31. leden 2022	4,2	18,0	126
		SO 05-20-05.1 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, železniční most v ev. km 266,594, provizorní komunikace	zřízení	12. leden 2022	-	31. leden 2022	0,7	2,9	20
		SO 05-50-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, odvodnění stanice	přípravné práce mimo kolejiště	28. září 2021	-	31. leden 2022	4,2	18,0	126
	2/2a	**rekonstrukce liché skupiny**		1. únor 2022	-	30. červen 2022	**5,0**	21,4	**150**
		staniční koleje 1, 3 (ústecké zhlaví - choceňské zhlaví mimo)		1. únor 2022	-	16. květen 2022	3,5	15,0	105
		staniční koleje 1, 3 (ústecké zhlaví - choceňské zhlaví včetně)		17. květen 2022	-	30. červen 2022	1,5	6,4	45
		napěťová výluka koleje 2 (odbočka Bezpráví mimo - žst. Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, čtyři hodiny v noci, činnosti na mostě v km 265,536)		6. únor 2022	-	7. únor 2022	0,0	0,1	1
				9. únor 2022	-	11. únor 2022	0,1	0,3	2
				3. březen 2022	-	5. březen 2022	0,1	0,3	2
				23. březen 2022	-	24. březen 2022	0,0	0,1	1
		staniční kolej 6		1. únor 2022	-	30. červen 2022	5,0	21,4	150
		MK (cyklostezka 18) přes přejezd v km 265,143		1. únor 2022	-	5. únor 2022	0,2	0,7	5
				25. červen 2022	-	29. červen 2022	0,2	0,7	5
		silnice III/3155 přes přejezd v km 266,580		1. únor 2022	-	5. únor 2022	0,2	0,7	5
				25. červen 2022	-	29. červen 2022	0,2	0,7	5
		PS 05-01-11 ŽST Brandýs n. O. předjízdné koleje, staniční zabezpečovací zařízení	instalace, zkoušky	1. únor 2022	-	30. červen 2022	5,0	21,4	150
		PS 05-02-11 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, místní kabelizace	pokračování	1. únor 2022	-	30. červen 2022	5,0	21,4	150
		PS 05-02-21 Zastávka Brandýs nad Orlicí, rozhlasové zařízení	demontáž na nástupišti 1	1. únor 2022	-	5. únor 2022	0,2	0,7	5
		PS 05-02-41 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, elektrická zabezpečovací signalizace	provedení	2. květen 2022	-	26. květen 2022	0,8	3,6	25
		PS 05-02-42 Zastávka Brandýs nad Orlicí, kamerový systém	demontáž na nástupišti 1	1. únor 2022	-	5. únor 2022	0,2	0,7	5
		PS 05-02-43 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, kamerový systém	lichá skupina	6. červen 2022	-	30. červen 2022	0,8	3,6	25
		PS 05-02-71 Zastávka Brandýs nad Orlicí, informační systém	demontáž na nástupišti 1	1. únor 2022	-	5. únor 2022	0,2	0,7	5
		PS 05-02-91 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, sdělovací zařízení	zahájení	6. červen 2022	-	30. červen 2022	0,8	3,6	25
		PS 05-02-92 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, dálková diagnostika technologických systémů (včetně odbočky Bezpráví)	zahájení	6. červen 2022	-	30. červen 2022	0,8	3,6	25
		PS 05-03-11 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, DŘT	zahájení	6. červen 2022	-	30. červen 2022	0,8	3,6	25
		SO 05-10-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, železniční svršek	demontáž stávajícího svršku liché skupiny vč. výhybek 1, 6, 7, 11	1. únor 2022	-	5. únor 2022	0,2	0,7	5
		SO 05-10-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, železniční svršek	demontáž stávajícího svršku liché skupiny vč. výhybek 12, 13	17. květen 2022	-	21. květen 2022	0,2	0,7	5
		SO 05-10-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, železniční svršek	lichá skupina, výhybky 1, 4, 5	6. červen 2022	-	20. červen 2022	0,5	2,1	15
		SO 05-10-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, železniční svršek	lichá skupina, výhybky 10, 11, 12	21. červen 2022	-	25. červen 2022	0,2	0,7	5
		SO 05-11-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, železniční spodek	lichá skupina, štěrkové piliře, výhybky 1, 4, 5 + dokončení opevnění břehu Tiché Orlice v km 266,960 - 267,140	6. únor 2022	-	5. červen 2022	4,0	17,1	120
		SO 05-11-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, železniční spodek	lichá skupina, štěrkové piliře, výhybky 10, 11, 12	22. květen 2022	-	20. červen 2022	1,0	4,3	30
		SO 00-14-01 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, výstroj trati	lichá skupina žst. Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje	26. červen 2022	-	30. červen 2022	0,2	0,7	5
		SO 05-12-01 Zastávka Brandýs nad Orlicí, nástupiště + SO 05-12-01.1 (podpůrná konstrukce)	nástupiště u koleje 1	29. duben 2022	-	7. červen 2022	1,3	5,7	40
		SO 05-13-11 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, odstranění přejezdu P4888 ev. km 265,143	kolej 1	1. únor 2022	-	5. únor 2022	0,2	0,7	5
		SO 05-13-12 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, odstranění přejezdu P4889 ev. km 266,580	kolej 1	1. únor 2022	-	5. únor 2022	0,2	0,7	5
		SO 05-13-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, železniční přejezd P4888 ev. km 265,143	kolej 1	25. červen 2022	-	29. červen 2022	0,2	0,7	5
		SO 05-13-02 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, úprava místní komunikace u železničního přejezdu P4888 ev. km 265,143	u koleje 1	25. červen 2022	-	29. červen 2022	0,2	0,7	5
		SO 05-13-03 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, železniční přejezd P4889 ev. km 266,580	lichá skupina	25. červen 2022	-	29. červen 2022	0,2	0,7	5
		SO 05-13-04 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, úprava silnice III/3155 u železničního přejezdu P4889 ev. km 266,580	vlevo	25. červen 2022	-	29. červen 2022	0,2	0,7	5
		SO 05-13-05 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, úprava místních komunikací u železničního přejezdu P4889 ev. km 266,580	vlevo	25. červen 2022	-	29. červen 2022	0,2	0,7	5
		SO 05-13-11 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, odstranění přejezdů	lichá skupina	1. únor 2022	-	5. únor 2022	0,2	0,7	5
		SO 05-20-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, železniční most v ev. km 265,536	v koleji 1	6. únor 2022	-	31. květen 2022	3,8	16,4	115
		SO 05-20-01.1 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, železniční most v ev. km 265,536, provizorní komunikace	odstranění vlevo trati	1. červen 2022	-	5. červen 2022	0,2	0,7	5
		SO 05-20-02 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, žel. most v ev. km 265,816	v koleji 1	6. únor 2022	-	30. březen 2022	1,8	7,6	53
		SO 05-20-03 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, žel. most v ev. km 265,926	v koleji 1	31. březen 2022	-	13. duben 2022	0,5	2,0	14
		SO 05-20-04 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, žel. most v ev. km 266,134 - podchod	v liché skupině	6. únor 2022	-	6. květen 2022	3,0	12,9	90
		SO 05-20-05 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, žel. most v ev. km 266,594	v liché skupině	6. únor 2022	-	9. květen 2022	3,1	13,3	93
		SO 05-21-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, žel. propustek v ev. km 266,078	v liché skupině	14. duben 2022	-	28. duben 2022	0,5	2,1	15
		SO 05-40-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, kabelovod	obě křížení kolejiště, pod sudou skupinou protlakem	6. únor 2022	-	7. březen 2022	1,0	4,3	30
		SO 05-40-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, kabelovod	úseky vlevo trati	29. duben 2022	-	7. červen 2022	1,3	5,7	40

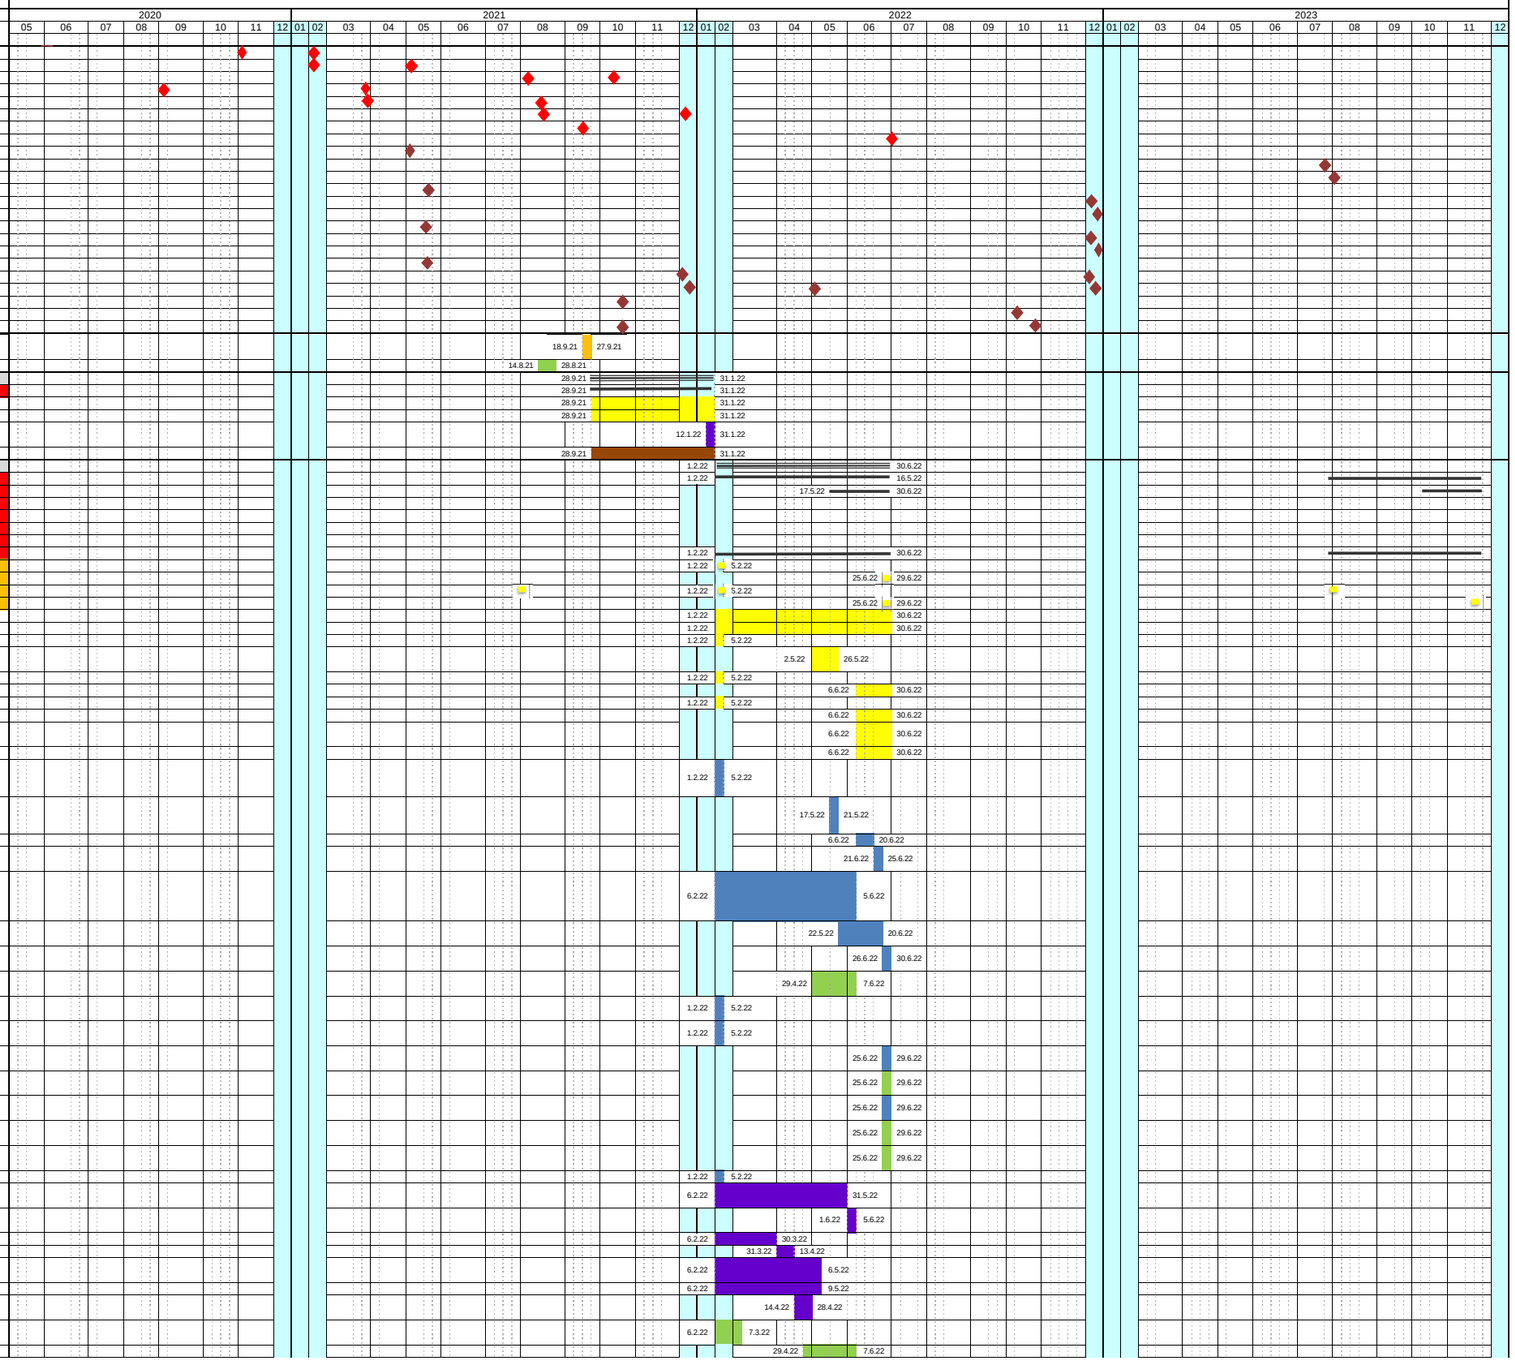

Řádkový harmonogram výstavby

Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC

Délka stavby (dny), bez následné úpravy kolejí:
790

Legenda:

- výluka
- uzavírka/omezení PK
- zabezpečovací a sdělovací zařízení
- kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž)
- mostní objekty (podchody vč.zastřešení)
- objekty elektro
- pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice
- potrubní sítě
- hlavní milníky přípravy a výstavby
- měsíce zimního období
- délka dílčího stavebního postupu
- přípravné a dokončovací práce
- zkušební provoz
- omezení silničního provozu

Stavební úsek	Postupy/etapy	Popis činnosti Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)		doba trvání od	-	(milníky) do	měs.	týdny	dny
Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC		DPSŘ (dopracování projektu souhmnného řešení) SZZ pro odbočku Bezpráví		2. leden 2021	-	7. duben 2021	3,0	13,6	95
		výroba SZZ pro odbočku Bezpráví		8. duben 2021	-	7. červenec 2021	3,0	12,9	90
		instalace a zkoušení SZZ v odbočce Bezpráví		8. červenec 2021	-	15. říjen 2021	3,3	14,1	99
		DPSŘ (dopracování projektu souhmnného řešení) SZZ pro žst. Brandýs nad Orlicí		2. leden 2021	-	27. květen 2021	3,0	20,7	145
		výroba SZZ pro žst. Brandýs nad Orlicí		28. květen 2021	-	20. říjen 2021	4,8	20,7	145
		instalace a zkoušení SZZ v žst. Brandýs nad Orlicí		21. říjen 2021	-	18. únor 2022	1,0	17,1	120
		zapnutí SZZ v odbočce Bezpráví		18. září 2021					
		zapnutí SZZ v žst. Brandýs nad Orlicí		1. červenec 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		1. květen 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		20. červen 2023					
		konec dokončovacích prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		30. červen 2023					
		zahájení stavby - přípravné práce v odbočce Bezpráví		21. květen 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v odbočce Bezpráví		18. prosinec 2022					
		konec dokončovacích prací v odbočce Bezpráví		28. prosinec 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		21. květen 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		18. prosinec 2022					
		konec dokončovacích prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		28. prosinec 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v žst. Brandýs nad Orlicí		21. květen 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v žst. Brandýs nad Orlicí		18. prosinec 2022					
		konec dokončovacích prací v žst. Brandýs nad Orlicí		28. prosinec 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		16. říjen 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		10. srpen 2022					
		konec dokončovacích prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		20. srpen 2022					
	2/2b	SO 05-54-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, železniční most v ev. km 266,594, úprava veřejného osvětlení	demontáž stávajícího osvětlení	1. únor 2022	-	5. únor 2022	0,2	0,7	5
		SO 05-50-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, odvodnění stanice	v liché skupině	1. únor 2022	-	26. květen 2022	3,8	16,4	115
		SO 05-62-01 Zastávka Brandýs nad Orlicí, přístřešky na nástupištích	nástupiště u koleje 1	7. květen 2022	-	5. červen 2022	1,0	4,3	30
		SO 05-62-02 Zastávka Brandýs nad Orlicí, zastřešení výstupů z podchodu	nástupiště u koleje 1	7. květen 2022	-	5. červen 2022	1,0	4,3	30
		SO 05-64-01 Zastávka Brandýs nad Orlicí, orientační systém	nástupiště u koleje 1	7. květen 2022	-	5. červen 2022	1,0	4,3	30
		SO 05-66-01 Zastávka Brandýs nad Orlicí, drobná architektura	nástupiště u koleje 1	7. květen 2022	-	5. červen 2022	1,0	4,3	30
		SO 05-71-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, trakční vedení	rekonstrukce nad lichou skupinou	11. červen 2022	-	30. červen 2022	0,7	2,9	20
		SO 05-74-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, elektrický ohřev výměn	v liché skupině	7. květen 2022	-	26. květen 2022	0,7	2,9	20
		SO 05-76-11 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, rozvod NN	zahájení	1. únor 2022	-	26. květen 2022	3,8	16,4	115
		SO 05-76-12 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, venkovní osvětlení	rekonstrukce v liché skupině	6. červen 2022	-	30. červen 2022	0,8	3,6	25
		SO 05-76-21 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, úprava rozvodu VN 6kV	přeložky podle úprav spodku	6. únor 2022	-	16. květen 2022	3,3	14,3	100
		SO 05-76-31 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, dálkové ovládání odpojovačů	v liché skupině	6. červen 2022	-	30. červen 2022	0,8	3,6	25
		SO 05-77-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, ukolejnění	v liché skupině	26. červen 2022	-	30. červen 2022	0,2	0,7	5
		aktivace SZZ Brandýs nad Orlicí		1. červenec 2022	-	21. červenec 2022	**0,7**	3,0	**21**
		staniční koleje 1, 3 (ústecké zahlaví - choceňské zahlaví včetně)		1. červenec 2022	-	21. červenec 2022	0,7	3,0	21
		staniční kolej 6		1. červenec 2022	-	21. červenec 2022	0,7	3,0	21
		MK (cyklostezka 18) přes přejezd v km 265,143		1. červenec 2022	-	5. červenec 2022	0,2	0,7	5
		silnice III/3155 přes přejezd v km 266,580		1. červenec 2022	-	5. červenec 2022	0,2	0,7	5
		PS 05-01-11 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, staniční zabezpečovací zařízení	aktivace liché skupiny	1. červenec 2022	-	21. červenec 2022	0,7	3,0	21
		PS 00-01-51 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení	žst. Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje	1. červenec 2022	-	21. červenec 2022	0,7	3,0	21
		PS 05-02-11 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, místní kabelizace	pokračování	1. červenec 2022	-	21. červenec 2022	0,7	3,0	21
		PS 05-02-21 Zastávka Brandýs nad Orlicí, rozhlasové zařízení	montáž na nástupišti 1	1. červenec 2022	-	21. červenec 2022	0,7	3,0	21
		PS 05-02-42 Zastávka Brandýs nad Orlicí, kamerový systém	montáž na nástupišti 1	1. červenec 2022	-	21. červenec 2022	0,7	3,0	21
		PS 05-02-71 Zastávka Brandýs nad Orlicí, informační systém	montáž na nástupišti 1	1. červenec 2022	-	21. červenec 2022	0,7	3,0	21
		PS 05-02-91 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, sdělovací zařízení	pokračování	1. červenec 2022	-	21. červenec 2022	0,7	3,0	21
		PS 05-02-92 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, dálková diagnostika technologických systémů (včetně odbočky Bezpráví)	pokračování	1. červenec 2022	-	21. červenec 2022	0,7	3,0	21
		PS 05-03-11 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, DŘT	pokračování	1. červenec 2022	-	21. červenec 2022	0,7	3,0	21
		SO 05-76-11 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, rozvod NN	pokračování	1. červenec 2022	-	21. červenec 2022	0,7	3,0	21
		zahájení rekonstrukce sudé části choceňského zhlaví		22. červenec 2022	-	10. srpen 2022	**1,0**	2,9	**20**
		staniční koleje 2, 4, 6		22. červenec 2022	-	10. srpen 2022	0,7	2,9	20
		staniční koleje 1+1b, 2+2b (převázání pažení podchodu v km 266,134 + mostu v km 266,594, 4 hodiny v noci)		23. červenec 2022	-	25. červenec 2022	0,1	0,4	3
		staniční kolej 6		22. červenec 2022	-	10. srpen 2022	0,7	2,9	20
		MK (cyklostezka 18) přes přejezd v km 265,143		1. srpen 2022	-	5. srpen 2022	0,2	0,7	5
		silnice III/3155 přes přejezd v km 266,580		1. srpen 2022	-	5. srpen 2022	0,2	0,7	5
		PS 05-01-11 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, staniční zabezpečovací zařízení	aktivace sudé skupiny, vypnutí stávajícího SZZ	22. červenec 2022	-	10. srpen 2022	0,7	2,9	20
		PS 05-02-11 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, místní kabelizace	dokončení	22. červenec 2022	-	10. srpen 2022	0,7	2,9	20
		PS 05-02-91 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, sdělovací zařízení	dokončení	22. červenec 2022	-	10. srpen 2022	0,7	2,9	20
		PS 05-02-92 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, dálková diagnostika technologických systémů (včetně odbočky Bezpráví)	dokončení	22. červenec 2022	-	10. srpen 2022	0,7	2,9	20
		PS 05-03-11 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, DŘT	dokončení	22. červenec 2022	-	10. srpen 2022	0,7	2,9	20
		PS 01-02-91 ŽST Ústí nad Orlicí, úpravy dálkové diagnostiky technologických systémů	provedení	22. červenec 2022	-	10. srpen 2022	0,7	2,9	20
		PS 91-02-91 CDP Praha, doplnění dálkové diagnostiky technologických systémů	žst. Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje	22. červenec 2022	-	10. srpen 2022	0,7	2,9	20
		PS 91-02-92 ED Pardubice, doplnění dálkové diagnostiky technologických systémů		22. červenec 2022	-	10. srpen 2022	0,7	2,9	20
		PS 91-03-11 ED Pardubice, doplnění DŘT		22. červenec 2022	-	10. srpen 2022	0,7	2,9	20
		SO 05-10-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, železniční svršek	sudá skupina: montáž výhybky 13	22. červenec 2022	-	31. červenec 2022	0,3	1,4	10
	2/2c	SO 05-10-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, železniční svršek	sudá skupina mimo výhybek 9, 13: demontáž stávajícího svršku	1. srpen 2022	-	10. srpen 2022	0,3	1,4	10
		SO 05-11-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, železniční spodek	sudá skupina: výhybka 13	22. červenec 2022	-	31. červenec 2022	0,3	1,4	10
		SO 05-13-11 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, odstranění přejezdů	sudá skupina	1. srpen 2022	-	10. srpen 2022	0,3	1,4	10
		SO 05-20-01.1 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, železniční most v ev. km 265,536, provizorní komunikace	zřízení vpravo trati	22. červenec 2022	-	10. srpen 2022	0,7	2,9	20
		SO 05-20-04 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, železniční most v ev. km 266,134 - podchod	převázání pažení	23. červenec 2022	-	25. červenec 2022	0,1	0,4	3
		SO 05-20-05 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, žel. most v ev. km 266.594	převázání pažení	23. červenec 2022	-	25. červenec 2022	0,1	0,4	3
		SO 05-65-02 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, demolice technologického objektu u přejezdu na pozemku 754 a 755	dokončení	22. červenec 2022	-	31. červenec 2022	0,3	1,4	10
		SO 05-66-02 Brandýs nad Orlicí, oplocení pozemku č. 20/1	dočasné oplocení	22. červenec 2022	-	24. červenec 2022	0,1	0,4	3
		SO 05-66-03 Brandýs nad Orlicí, oplocení pozemku č. 21/2	dočasné oplocení	22. červenec 2022	-	24. červenec 2022	0,1	0,4	3
		SO 05-71-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, trakční vedení	rekonstrukce nad choceňským zhlavím sudé skupiny	22. červenec 2022	-	31. červenec 2022	0,3	1,4	10
		SO 05-74-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, elektrický ohřev výměn	výhybka 13	22. červenec 2022	-	31. červenec 2022	0,3	1,4	10
		SO 05-76-11 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, rozvod NN	pokračování	22. červenec 2022	-	10. srpen 2022	0,7	2,9	20
		SO 05-76-12 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, venkovní osvětlení	rekonstrukce v choceňském zhlaví sudé skupiny	22. červenec 2022	-	31. červenec 2022	0,3	1,4	10
		SO 05-76-21 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, úprava rozvodu VN 6kV	přeložky podle úprav spodku	22. červenec 2022	-	31. červenec 2022	0,3	1,4	10
		SO 05-76-31 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, dálkové ovládání odpojovačů	v sudé části choceňského zhlaví	22. červenec 2022	-	31. červenec 2022	0,3	1,4	10
		SO 05-77-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, ukolejnění		22. červenec 2022	-	31. červenec 2022	0,3	1,4	10

Řádkový harmonogram výstavby

Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC

Délka stavby (dny), bez následné úpravy kolejí:
790

Legenda:

výluka
uzavírka/omezení PK

zabezpečovací a sdělovací zařízení
kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž)
mostní objekty (podchody vč.zastřešení)
objekty elektro
pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice
potrubní sítě
hlavní milníky přípravy a výstavby
měsíce zimního období
délka dílčího technologického postupu
přípravné a dokončovací práce
zkušební provoz
omezení silničního provozu

Stavební úsek	Postupy/etapy	Popis činností Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)		doba trvání od	-	(milníky) do	měs.	týdny	dny
Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC		DPSŘ (dopracování projektu souhmnného řešení) SZZ pro odbočku Bezpráví		2. leden 2021	-	7. duben 2021	3,0	13,6	95
		výroba SZZ pro odbočku Bezpráví		8. duben 2021	-	7. červenec 2021	3,0	12,9	90
		instalace a zkoušení SZZ v odbočce Bezpráví		8. červenec 2021	-	15. říjen 2021	3,3	14,1	99
		DPSŘ (dopracování projektu souhmnného řešení) SZZ pro žst. Brandýs nad Orlicí		2. leden 2021	-	27. květen 2021	3,0	20,7	145
		výroba SZZ pro žst. Brandýs nad Orlicí		28. květen 2021	-	20. říjen 2021	4,8	20,7	145
		instalace a zkoušení SZZ v žst. Brandýs nad Orlicí		21. říjen 2021	-	18. únor 2022	1,0	17,1	120
		zapnutí SZZ v odbočce Bezpráví		18. září 2021					
		zapnutí SZZ v žst. Brandýs nad Orlicí		1. červenec 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		1. květen 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		20. červen 2023					
		konec dokončovacích prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		30. červen 2023					
		zahájení stavby - přípravné práce v odbočce Bezpráví		21. květen 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v odbočce Bezpráví		18. prosinec 2022					
		konec dokončovacích prací v odbočce Bezpráví		28. prosinec 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		21. květen 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		18. prosinec 2022					
		konec dokončovacích prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		28. prosinec 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v žst. Brandýs nad Orlicí		21. květen 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v žst. Brandýs nad Orlicí		18. prosinec 2022					
		konec dokončovacích prací v žst. Brandýs nad Orlicí		28. prosinec 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		16. říjen 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		10. srpen 2022					
		konec dokončovacích prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		20. srpen 2022					
		rekonstrukce sudé skupiny		11. srpen 2022	-	18. prosinec 2022	**1,0**	18,6	**130**
		staniční koleje 2 (ústecké záhlaví - km cca 265,700		11. srpen 2022	-	18. prosinec 2022	4,3	18,6	130
		staniční koleje 2 (km cca 265,7 - výhybka 13 mimo), 4, 6 kolejově		11. srpen 2022	-	18. listopad 2022	3,3	14,3	100
		staniční koleje 2 (km cca 265,7 - výhybka 13 mimo), 4, 6 napěťově		19. listopad 2022	-	18. prosinec 2022	1,0	4,3	30
		napěťová výluka koleje 1 (odbočka Bezpráví mimo - žst. Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, čtyři hodiny v noci, činnosti na mostě v km 265,536)		16. srpen 2022	-	17. srpen 2022	0,0	0,1	1
				10. září 2022	-	12. září 2022	0,1	0,3	2
				30. září 2022	-	1. říjen 2022	0,0	0,1	1
		staniční kolej 6		11. srpen 2022	-	18. listopad 2022	3,3	14,3	100
		MK (cyklostezka 18) přes přejezd v km 265,143		9. listopad 2022	-	13. listopad 2022	0,2	0,7	5
		silnice III/3155 přes přejezd v km 266,580		9. listopad 2022	-	13. listopad 2022	0,2	0,7	5
		PS 00-01-52 Ústí nad Orlicí - Choceň, úprava ETCS	úprava podle nového stavu + zapnutí	11. srpen 2022	-	18. prosinec 2022	4,3	18,6	130
		PS 05-02-21 Zastávka Brandýs nad Orlicí, rozhlasové zařízení	demontáž + montáž na nástupišti	11. srpen 2022	-	23. listopad 2022	3,5	15,0	105
		PS 05-02-42 Zastávka Brandýs nad Orlicí, kamerový systém	2	11. srpen 2022	-	23. listopad 2022	3,5	15,0	105
		PS 05-02-43 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, kamerový systém	sudá skupina	14. listopad 2022	-	23. listopad 2022	0,3	1,4	10
		PS 05-02-71 Zastávka Brandýs nad Orlicí, informační systém	demontáž + montáž na nástupišti 2	11. srpen 2022	-	23. listopad 2022	3,5	15,0	105
		SO 05-11-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, železniční spodek	sudá skupina mimo výhybky 13 (štěrkové pilíře)	11. srpen 2022	-	8. listopad 2022	3,0	12,9	90
		SO 05-10-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, železniční svršek	sudá skupina od km 265,7 před výhybku 13: montáž nového svršku	9. listopad 2022	-	18. listopad 2022	0,3	1,4	10
		SO 05-10-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, železniční svršek	sudá skupina dokončení	4. prosinec 2022	-	13. prosinec 2022	0,3	1,4	10
		SO 00-14-01 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, výstroj trati	sudá skupina žst. Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje	9. prosinec 2022	-	13. prosinec 2022	0,2	0,7	5
		SO 05-12-01 Zastávka Brandýs nad Orlicí, nástupiště + SO 05-12-01.1 (podpůrná konstrukce)	nástupiště u koleje 2	20. září 2022	-	29. říjen 2022	1,3	5,7	40
		SO 05-13-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, železniční přejezd P4888 ev. km 265,143	kolej 2	9. listopad 2022	-	13. listopad 2022	0,2	0,7	5
		SO 05-13-02 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, úprava místní komunikace u železničního přejezdu P4888 ev. km 265,143	u koleje 2	9. listopad 2022	-	13. listopad 2022	0,2	0,7	5
		SO 05-13-03 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, žel. přejezd P4889 ev. km 266,580	sudá skupina	9. listopad 2022	-	13. listopad 2022	0,2	0,7	5
		SO 05-13-04 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, úprava silnice III/3155 u železničního přejezdu P4889 ev. km 266,580	vpravo	9. listopad 2022	-	13. listopad 2022	0,2	0,7	5
		SO 05-13-05 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, úprava místních komunikací u železničního přejezdu P4889 ev. km 266,580	vpravo	9. listopad 2022	-	13. listopad 2022	0,2	0,7	5
	2/2d	SO 05-20-01 ŽST Brandýs n. O. předjízdné koleje, železniční most v ev. km 265,536	v koleji 2	11. srpen 2022	-	3. prosinec 2022	3,8	16,4	115
		SO 05-20-01.1 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, železniční most v ev. km 265,536, provizorní komunikace	odstranění vpravo trati	4. prosinec 2022	-	8. prosinec 2022	0,2	0,7	5
		SO 05-20-02 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, žel. most v ev. km 265,816	v koleji 2	11. srpen 2022	-	2. říjen 2022	1,8	7,6	53
		SO 05-20-03 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, žel. most v ev. km 265,926	v koleji 2	3. říjen 2022	-	16. říjen 2022	0,5	2,0	14
		SO 05-20-04 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, žel. most v ev. km 266,134 - podchod	v sudé skupině	11. srpen 2022	-	8. listopad 2022	3,0	12,9	90
		SO 05-20-04.1 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, železniční most v ev. km 266,134 - podchod, osvětlení	provedení	9. listopad 2022	-	23. listopad 2022	0,5	2,1	15
		SO 05-20-05 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, žel. most v ev. km 266,594	v sudé skupině	11. srpen 2022	-	11. listopad 2022	3,1	13,3	93
		SO 05-20-05.1 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, železniční most v ev. km 266,594, provizorní komunikace	odstranění	12. listopad 2022	-	26. listopad 2022	0,5	2,1	15
		SO 05-21-01 ŽST Brandýs n. O. předjízdné koleje, žel. propustek v ev. km 266,078	v sudé skupině	11. srpen 2022	-	19. září 2022	1,3	5,7	40
		SO 05-23-01 ŽST Brandýs n. O. předjízdné koleje, opěrná zeď km 265,96 - 266,01	provedení	11. srpen 2022	-	9. říjen 2022	2,0	8,6	60
		SO 05-54-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, žel. most v ev. km 266,594, úprava veřejného osvětlení	montáž nového osvětlení	12. listopad 2022	-	26. listopad 2022	0,5	2,1	15
		SO 05-50-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, odvodnění stanice	v sudé skupině	11. srpen 2022	-	8. listopad 2022	3,0	12,9	90
		SO 05-31-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, žel. most v ev. km 266,594, chodník	provedení	12. listopad 2022	-	26. listopad 2022	0,5	2,1	15
		SO 05-27-01 Protihluková stěna Brandýs nad Orlicí, ulice Žerotínova	provedení	10. září 2022	-	19. říjen 2022	1,3	5,7	40
		SO 05-62-01 Zastávka Brandýs nad Orlicí, přístřešky na nástupištích	nástupiště u koleje 2	30. říjen 2022	-	28. listopad 2022	1,0	4,3	30
		SO 05-62-02 Zastávka Brandýs nad Orlicí, zastřešení výstupů z podchodu	nástupiště u koleje 2	9. listopad 2022	-	23. listopad 2022	0,5	2,1	15
		SO 05-64-01 Zastávka Brandýs nad Orlicí, orientační systém	nástupiště u koleje 2	9. listopad 2022	-	23. listopad 2022	0,5	2,1	15
		SO 05-66-01 Zastávka Brandýs nad Orlicí, drobná architektura	nástupiště u koleje 2	9. listopad 2022	-	23. listopad 2022	0,5	2,1	15
		SO 05-66-02 Brandýs nad Orlicí, oplocení pozemku č. 20/1	definitivní oplocení	9. listopad 2022	-	23. listopad 2022	0,5	2,1	15
		SO 05-66-03 Brandýs nad Orlicí, oplocení pozemku č. 21/2	definitivní oplocení	9. listopad 2022	-	23. listopad 2022	0,5	2,1	15
		SO 05-71-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, trakční vedení	rekonstrukce nad zbytkem sudé skupiny	9. listopad 2022	-	18. prosinec 2022	1,3	5,7	40
		SO 05-74-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, elektrický ohřev výměn	v sudé skupině mimo výhybky 13	9. listopad 2022	-	23. listopad 2022	0,5	2,1	15
		SO 05-76-11 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, rozvod NN	dokončení	9. listopad 2022	-	23. listopad 2022	0,5	2,1	15
		SO 05-76-12 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, venkovní osvětlení	rekonstrukce ve zbytku sudé skupiny	9. listopad 2022	-	23. listopad 2022	0,5	2,1	15
		SO 05-76-21 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, úprava rozvodu VN 6kV	přeložky podle úprav spodku	11. srpen 2022	-	8. listopad 2022	3,0	12,9	90
		SO 05-76-31 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, dálkové ovládání odpojovačů	v sudé skupině	9. listopad 2022	-	23. listopad 2022	0,5	2,1	15
		SO 05-77-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, ukolejnění	v sudé skupině	9. listopad 2022	-	18. prosinec 2022	1,3	5,7	40
	ZP2	**zimní přestávka 2**		**19. prosinec 2022**	-	**31. leden 2023**	**1,5**	**6,3**	**44**
	3/3a	**rekultivace**		1. únor 2023	-	7. březen 2023	**1,2**	5,0	**35**
		SO 00-83-03 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, rekultivace	žst. Brandýs n. O. předj. koleje	1. únor 2023	-	7. březen 2023	1,2	5,0	35
	NÚK	**následná úprava liché kolejové skupiny**		12. září 2023	-	13. září 2023	**0,1**	0,3	**2**
		staniční koleje 1, 3 (10ti hodinové výluky)		12. září 2023	-	13. září 2023	0,1	0,3	2
		SO 05-10-01.1 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, následná úprava koleje	koleje 1, 3	12. září 2023	-	13. září 2023	0,1	0,3	2
		následná úprava koleje 2		14. září 2023	-	15. září 2023	**0,1**	0,3	**2**
		traťová kolej 2 (10ti hodinové výluky)		14. září 2023	-	15. září 2023	0,1	0,3	2
		SO 05-10-01.1 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, následná úprava koleje	koleje 2, 4	14. září 2023	-	15. září 2023	0,1	0,3	2

Řádkový harmonogram výstavby

Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC

Délka stavby (dny), bez následné úpravy kolejí:
790

Legenda:

- výluka
- uzavírka/omezení PK
- zabezpečovací a sdělovací zařízení
- kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž)
- mostní objekty (podchody vč.zastřešení)
- objekty elektro
- pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice
- potrubní sítě
- hlavní milníky přípravy a výstavby
- měsíce zimního období
- délka dílčího stavebního postupu
- přípravné a dokončovací práce
- zkušební provoz
- omezení silničního provozu
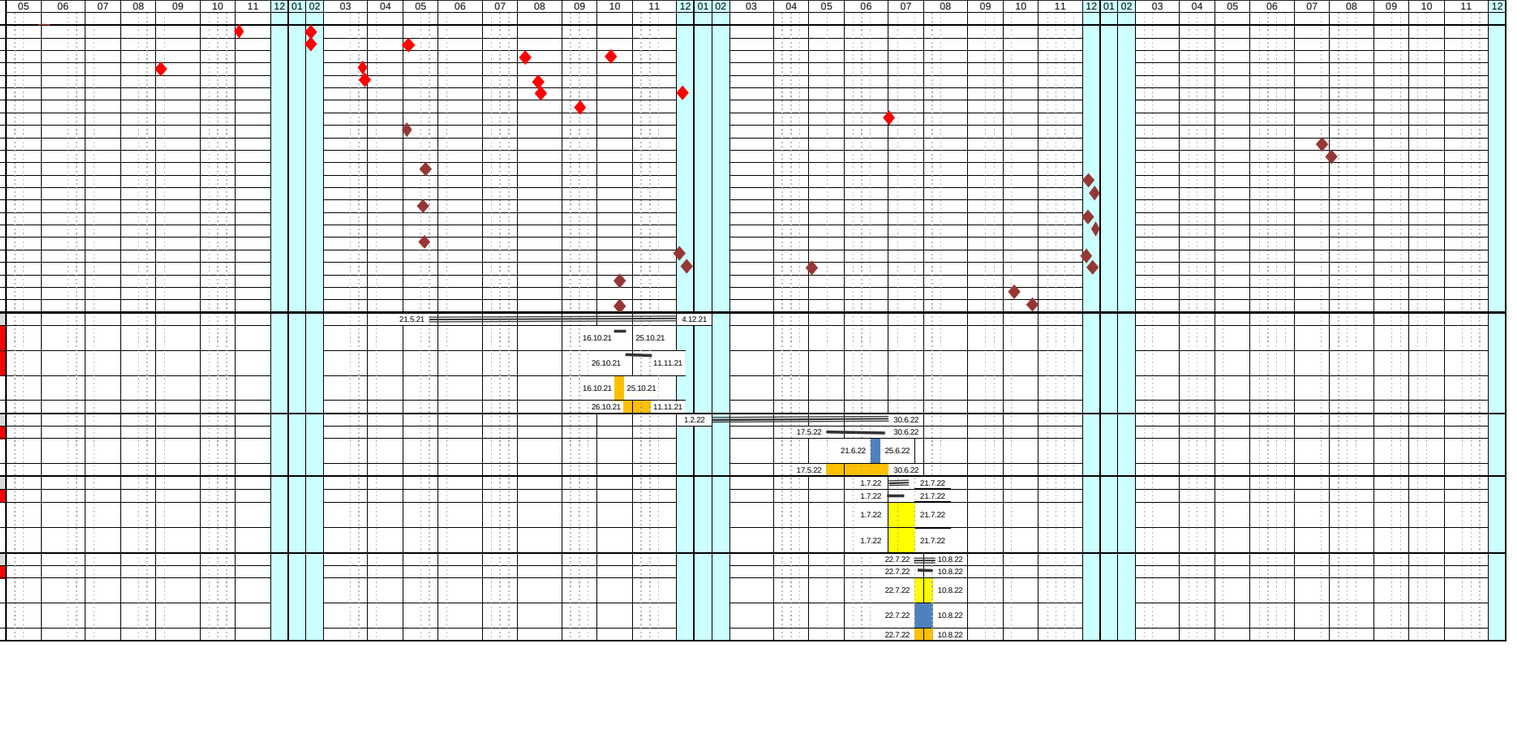
Stavební úsek	Postupy/etapy	Popis činností Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)		doba trvání od	-	(milníky) do	měs.	týdny	dny
Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC		DPSŘ (dopracování projektu souhmnného řešení) SZZ pro odbočku Bezpráví		2. leden 2021	-	7. duben 2021	3,0	13,6	95
		výroba SZZ pro odbočku Bezpráví		8. duben 2021	-	7. červenec 2021	3,0	12,9	90
		instalace a zkoušení SZZ v odbočce Bezpráví		8. červenec 2021	-	15. říjen 2021	3,3	14,1	99
		DPSŘ (dopracování projektu souhmnného řešení) SZZ pro žst. Brandýs nad Orlicí		2. leden 2021	-	27. květen 2021	3,0	20,7	145
		výroba SZZ pro žst. Brandýs nad Orlicí		28. květen 2021	-	20. říjen 2021	4,8	20,7	145
		instalace a zkoušení SZZ v žst. Brandýs nad Orlicí		21. říjen 2021	-	18. únor 2022	1,0	17,1	120
		zapnutí SZZ v odbočce Bezpráví		18. září 2021					
		zapnutí SZZ v žst. Brandýs nad Orlicí		1. červenec 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		1. květen 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		20. červen 2023					
		konec dokončovacích prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		30. červen 2023					
		zahájení stavby - přípravné práce v odbočce Bezpráví		21. květen 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v odbočce Bezpráví		18. prosinec 2022					
		konec dokončovacích prací v odbočce Bezpráví		28. prosinec 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		21. květen 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		18. prosinec 2022					
		konec dokončovacích prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		28. prosinec 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v žst. Brandýs nad Orlicí		21. květen 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v žst. Brandýs nad Orlicí		18. prosinec 2022					
		konec dokončovacích prací v žst. Brandýs nad Orlicí		28. prosinec 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		16. říjen 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		10. srpen 2022					
		konec dokončovacích prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		20. srpen 2022					
Brandýs nad Orlicí mimo - Choceň mimo		**přípravné práce**		21. květen 2021	-	4. prosinec 2021	**6,6**	28,3	**198**
	1	traťová kolej 1 choceňské záhlaví žst. Brandýs nad Orlicí - konec stavby (základy TV, vždy noc 6 hodin), v zákrytu s výlukami v úseku odb. Bezpráví - Brandýs n. O.		16. říjen 2021	-	25. říjen 2021	0,3	1,4	10
		traťová kolej 2 choceňské záhlaví žst. Brandýs nad Orlicí - konec stavby (podpěry TV, vždy noc 6 hodin), v zákrytu s výlukami v úseku odb. Bezpráví - Brandýs n. O.		26. říjen 2021	-	11. listopad 2021	0,6	2,4	17
		SO 05-71-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, trakční vedení	základy podpěr u TK 1 směr Choceň	16. říjen 2021	-	25. říjen 2021	0,3	1,4	10
		SO 05-71-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, trakční vedení	podpěry u TK 2 směr Choceň	26. říjen 2021	-	11. listopad 2021	0,6	2,4	17
	2/2a	**rekonstrukce koleje 1**		1. únor 2022	-	30. červen 2022	**1,0**	21,4	**150**
		traťová kolej 1 choceňské záhlaví žst. Brandýs nad Orlicí - konec stavby		17. květen 2022	-	30. červen 2022	1,5	6,4	45
		SO 05-10-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, žel. svršek	směrová a výšková úprava koleje 1	21. červen 2022	-	25. červen 2022	0,2	0,7	5
		SO 05-71-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, trakční vedení	rekonstrukce nad kolejí 1	17. květen 2022	-	30. červen 2022	1,5	6,4	45
	2/2b	**uvázání TZZ Brandýs nad Orlicí - Choceň do nového SZZ Brandýs ad Orlicí**		1. červenec 2022	-	21. červenec 2022	**1,0**	3,0	**21**
		traťová kolej 1 choceňské záhlaví žst. Brandýs nad Orlicí - konec stavby		1. červenec 2022	-	21. červenec 2022	0,7	3,0	21
		PS 05-01-11 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, staniční zabezpečovací zařízení	aktivace liché skupiny	1. červenec 2022	-	21. červenec 2022	0,7	3,0	21
		PS 06-01-21 Brandýs nad Orlicí - Choceň, úprava traťového zabezpečovacího zařízení	kolej 1	1. červenec 2022	-	21. červenec 2022	0,7	3,0	21
	2/2c	**rekonstrukce koleje 2**		22. červenec 2022	-	10. srpen 2022	**1,0**	2,9	**20**
		traťová kolej 2 choceňské záhlaví žst. Brandýs nad Orlicí - konec stavby		22. červenec 2022	-	10. srpen 2022	0,7	2,9	20
		PS 06-01-21 Brandýs nad Orlicí - Choceň, úprava traťového zabezpečovacího zařízení	kolej 2	22. červenec 2022	-	10. srpen 2022	0,7	2,9	20
		SO 05-10-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, žel. svršek	směrová a výšková úprava koleje 2	22. červenec 2022	-	10. srpen 2022	0,7	2,9	20
		SO 05-71-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, trakční vedení	rekonstrukce nad kolejí 2	22. červenec 2022	-	10. srpen 2022	0,7	2,9	20
