03	...		
02	...		
01	Odevzdání dokumentace po připomínkách	28. 08. 2021	
REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS

OBJEDNATEL

SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE
DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1

STAVEBNÍ SPRÁVA ZÁPAD, SOKOLOVSKÁ 1955/278, 190 00 PRAHA 9

SPRÁVA ŽELEZNIC

ZHOTOVITEL

S A G A S T A s.r.o.
SÍDLO: NOVODVORSKÁ 1010/14, 142 00 PRAHA 4
IČ: 045 98 555 DIČ: CZ045 98 555

SAGASTA

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP
ING. TOMAŠ BURDA	ING. TOMAŠ BURDA	ING. MICHAL KUDLÍK	ING. EMIL ŠPAČEK
PODPIS	PODPIS	PODPIS	PODPIS

JTSK	Bpv
ČÍSLO SOUPRAVY	

OBSAH

Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily
Zásady organizace výstavby

ČÍSLO ZAKÁZKY	120 025
DOKUMENTACE	DUSP+PDPS
MĚŘÍTKO	-
DATUM	08/2021
POČET FORMÁTŮ	-

NÁZEV PŘÍLOHY

Harmonogram

ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY
B.8	3

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA, s.r.o.

„Rekonstrukce ŽST Semily“

Harmonogram výstavby

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Názvy zdrojů
1	**"ŽST Semily"**	**383 dny**	**13.04. 22**	**30.04. 23**		
2						
3	Zahájení prací	0 dny	13.04. 22	13.04. 22		
4	Ukončení prací	0 dny	30.04. 23	30.04. 23		
5						
6	**Výluky**					
7						
8						
9	**Stavební postupy**					
10	Stavební postup č. 1 + přípravné práce	151 dny	13.04. 22	10.09. 22		
11	Stavební postup č. 2A	35 dny	10.09. 22	14.10. 22		
12	Stavební postup č. 2B	63 dny	14.10. 22	15.12. 22		
13	Stavební postup č. 3 + dokončovací práce	59 dny	03.03. 23	30.04. 23		
14						
15	**Stavební práce po stavebních postupech**					
16	**Stavební postup č. 1 + přípravné práce**	**151 dny**	**13.04. 22**	**10.09. 22**		
17	Zahájení výluky	0 dny	13.04. 22	13.04. 22		
18	Demontáž kolejí č. 3,5	5 dny	13.04. 22	17.04. 22		
19	Demontáž koleje č. 4	5 dny	13.04. 22	17.04. 22		
20	Demolice objektu	30 dny	13.04. 22	12.05. 22		
21	Demolice podchodu	25 dny	13.04. 22	07.05. 22	18	
22	Přeložka plynu - příprava dokladů	30 dny	13.04. 22	12.05. 22		
23	Pažení pro podchod mezi kolejí 1 a 2; 1 a 3	4 dny	20.04. 22	23.04. 22		
24	Podchod 1.část	110 dny	24.04. 22	11.08. 22	23	
25	Nástupiště č.2 a opěrná stěna, přístup	50 dny	18.04. 22	06.06. 22	19	
26	Kabelovod 1.část	50 dny	18.04. 22	06.06. 22	19	
27	Odvodnění	25 dny	18.04. 22	12.05. 22	19	
28	Spodek koleje č. 4	15 dny	12.08. 22	26.08. 22	24	
29	Svršek koleje č. 4	10 dny	27.08. 22	05.09. 22	28	
30	Zabezpečovací a sdělovací zařízení	151 dny	13.04. 22	10.09. 22		
31	Konec výluky	0 dny	10.09. 22	10.09. 22		
32						
33	**Stavební postup č. 2A**	**35 dny**	10.09. 22	14.10. 22		
34	Zahájení výluky	0 dny	10.09. 22	10.09. 22		
35	Plyn - přeložka	30 dny	10.09. 22	09.10. 22	34	
36	Demontáž přejezdu	5 dny	10.09. 22	14.09. 22	34;47	
37	Demontáž výhybek V1 a V2	5 dny	10.09. 22	14.09. 22	34;47	
38	Nástupiště č.1	30 dny	15.09. 22	14.10. 22		
39	Podchod 2.část	30 dny	14.10. 22	12.11. 22	34;47	
40	Kabelovod 2.část	35 dny	14.10. 22	17.11. 22	34;47	
41	Přejezd P3083	15 dny	15.09. 22	29.09. 22	36	
42	Zkoušení ZabZař	5 dny	10.10. 22	14.10. 22	43;54	
43	Zabezpečovací a sdělovací zařízení	30 dny	10.09. 22	09.10. 22	34;47	
44	Konec výluky	0 dny	14.10. 22	14.10. 22		
45						
46	**Stavební postup č. 2B**	63 dny	14.10. 22	15.12. 22		
47	Zahájení výluky	0 dny	14.10. 22	14.10. 22		
48	Demolice původního nástupiště 2	10 dny	14.10. 22	23.10. 22	47	
49	Nástupiště č.1 - vč. Přístřešku	40 dny	15.10. 22	23.11. 22	38	
50	Podchod 2.část	63 dny	14.10. 22	15.12. 22		
51	Spodek koleje č. 1 a 3	15 dny	24.10. 22	07.11. 22	48	
52	Svršek koleje č. 1 a 3 vč. V3	8 dny	08.11. 22	15.11. 22	51	
53	Silnoproud	63 dny	14.10. 22	15.12. 22		
54	Zabezpečovací a sdělovací zařízení	63 dny	14.10. 22	15.12. 22		
55	Konec výluky	0 dny	15.12. 22	15.12. 22		
56						
57	**Stavební postup č. 3 + dokončovací práce**	**59 dny**	**03.03. 23**	**30.04. 23**		
58	Zahájení výluky	0 dny	03.03. 23	03.03. 23		
59	Demontáž výhybek V4 a V5	5 dny	03.03. 23	07.03. 23	58	
60	Propojení podchodu + dokončení	30 dny	03.03. 23	01.04. 23	58	
61	Spodek pod V2 a V4	5 dny	02.04. 23	06.04. 23	60	
62	Svršek V2 a V4	5 dny	07.04. 23	11.04. 23	61	
63	Zkoušení ZabZař celé žst	10 dny	12.04. 23	21.04. 23	62	
64	Dokončení všech PS a SO	9 dny	22.04. 23	30.04. 23	63	
65	Odstranění zařízení staveniště	9 dny	22.04. 23	30.04. 23	63	
66	Úklid a úpravy ploch po zařízení staveniště	9 dny	22.04. 23	30.04. 23	63	
67	Konec výluky	0 dny	30.04. 23	30.04. 23		
68						
69						
70						
71						
72						
73						

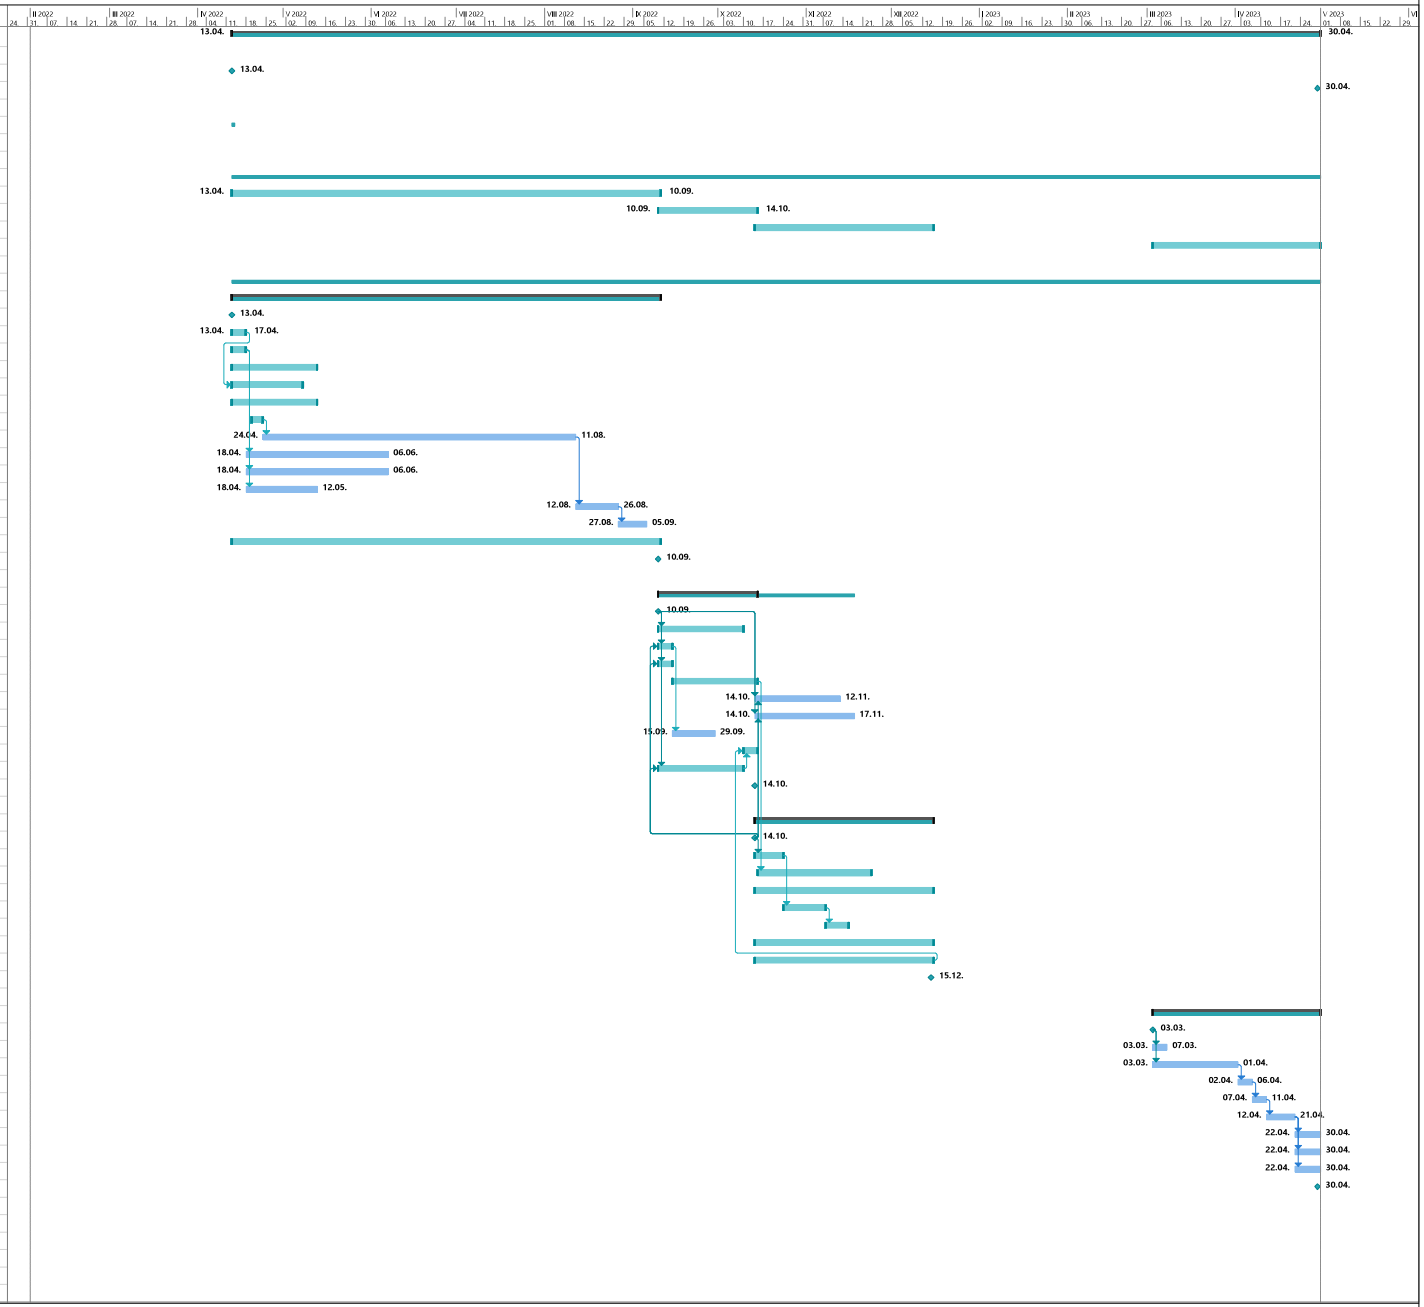

SAGASTA

Vypracoval: Ing. Ondřej Lemmermann
Část: B.8 Číslo přílohy: 3.

Úkol | Souhrnný | Neaktivní milník | Pouze s dobou trvání | Pouze zahájení | Vnější milník | Průběh ručně zadaného úkolu
Rozdělení | Souhrn projektu | Neaktivní souhrn | Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu | Pouze s datem dokončení | Konečný termín
Milník | Neaktivní úkol | Ruční úkol | Ruční souhrn | Vnější úkoly | Průběh
