


VÝKRES POSTUPU VÝSTAVBY - 2. ČÁST

3. ETAPA - STAVEBNÍ POSTUP Č. 2, M 1:500

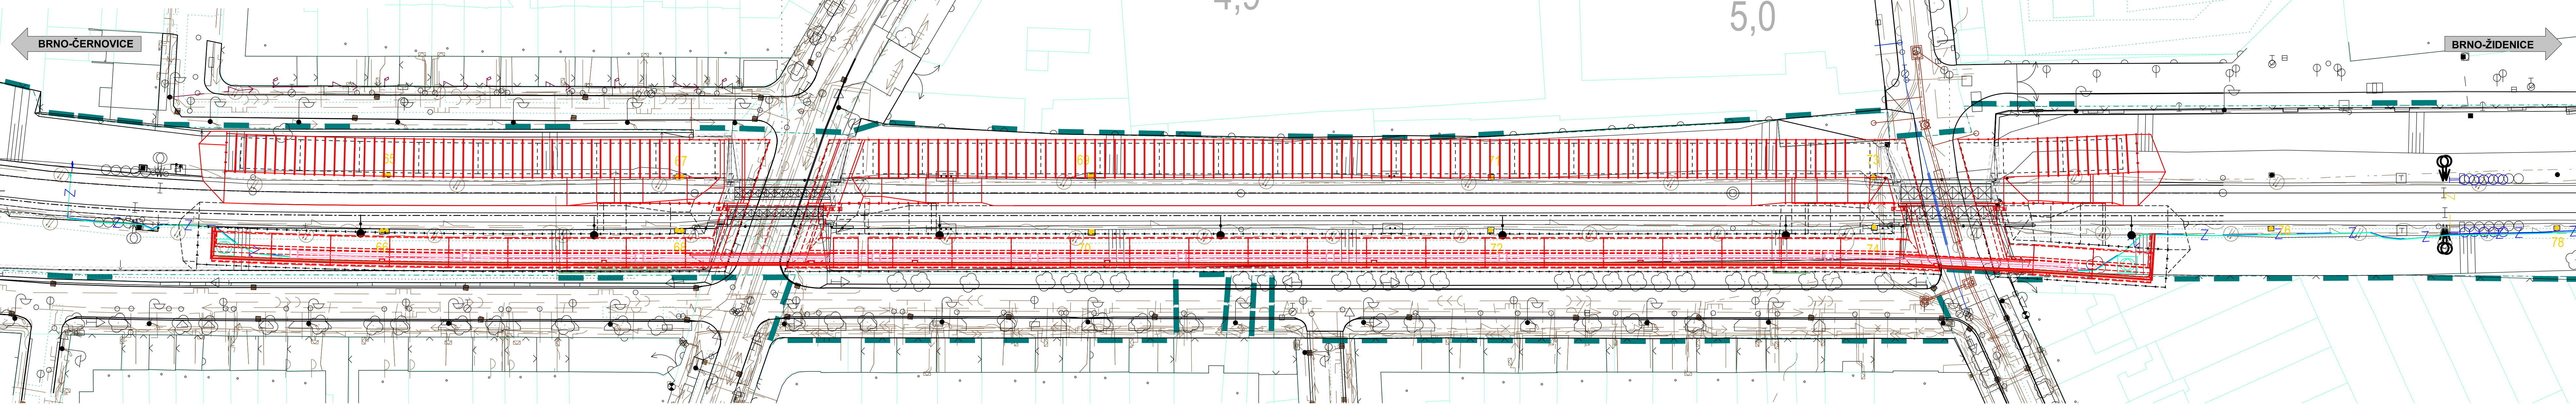

3. ETAPA - POPIS PRACÍ (280 DNÍ)

1. ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO TV V TK Č. 1 VČ. STÁVAJÍCÍCH STOŽÁRŮ TV Č. 65, 67, 73, 75 A 77
2. SNESENÍ STÁVAJÍCÍHO VJEZDOVÉHO NÁVĚSTIDLA DO ŽST BRNO-ŽIDENICE 1CL
3. SNESENÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ POD TRATÍVOU KOLEJÍ Č. 1 U ŽEL. MOSTŮ V UL. JILKOVÁ A V UL. FILIPÍNSKÉHO POMOCÍ SILNÍČNÍCH JERÁBŮ
4. ZŘÍZENÍ PAŽENÍ 2. STAVEBNÍHO POSTUPU V ROZSAHU MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ
5. POSTUPNÉ ODTĚŽOVÁNÍ TĚLESA, OSAZOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH PAŽIN A ODBOURÁVÁNÍ STÁVAJÍCÍ SPODNÍ STAVBY POD TK Č. 1
6. VRTÁNÍ ZAPOR VNITŘNÍ RADY PAŽENÍ ZA RUBEM BUDOUCÍCH OPĚRNÝCH STĚN
7. NÁSLEDNÉ POSTUPNÉ ODTĚŽOVÁNÍ TĚLESA DO KOTVENÍ ÚROVNĚ VNITŘNÍ PAŽICÍ STĚNY VČETNĚ POSTUPJICÍ DEMOLICE STÁVAJÍCÍ SPODNÍ STAVBY
8. KOMPLETNÍ ODTĚŽENÍ STÁVAJÍCÍHO TĚLESA VČETNĚ DEMOLICE STÁVAJÍCÍ SPODNÍ STAVBY PO ÚROVNĚ PŘÍLEHLÉHO TERÉNU
9. VRTÁNÍ ZAPOR VNĚJŠÍ PAŽICÍ STĚNY KOLEM ZÁKLADŮ BUDOUCÍCH MOSTŮ, U KTERÝCH JE NEJPRVE NUTNÉ ODTĚŽIT TERÉN AŽ PO ZÁKLADOVOU SPÁRU STÁVAJÍCÍ SPODNÍ STAVBY, KTERÁ SE NACHÁZÍ POD ÚROVNÍ VRTÁNÍ PILOT A PO JEJÍ DEMOLICI JE NUTNÉ VÝKOP ZNOVU ZASYPAT DO PŮVODNÍ ÚROVNĚ TERÉNU
10. VRTÁNÍ A BETONÁŽ VELKOPRŮMĚROVÝCH PILOT Z ÚROVNĚ TERÉNU PRO ZÁKLADY NOVÝCH ZDI A MOSTŮ S NÁSLEDNÝM ZASYPÁVÁNÍM HLUCHÉ DELKY VRTÁNÍ
11. VRTÁNÍ ZAPOR VNĚJŠÍ PAŽICÍ STĚNY PODÉL VŠECH ZÁKLADŮ
12. POSTUPNÉ ODTĚŽOVÁNÍ AŽ NA ÚROVĚN PODKLADNÍHO BETONU POD ZÁKLADY S VYPLŇOVÁNÍM ZAPOR PAŽINAMI A ZŘÍZENÍM ROZPER PAŽICÍCH KONSTRUKCÍ
13. VÝSTAVBA ZÁKLADŮ NOVÝCH ZDI A NOVÝCH ŽEL. MOSTŮ POD TK Č. 1 (BEDNĚNÍ, ARMOVÁNÍ A BETONÁŽ)
14. VÝSTAVBA DŘÍKŮ OPĚR, KŘÍDEL I OPĚRNÝCH ZDI A BUDOVNÍ PODPĚRNÝCH SKRUŽÍ PRO BETONÁŽ RÁMOVÝCH PŘÍČLI (BEDNĚNÍ, ARMOVÁNÍ A BETONÁŽ)
15. VÝSTAVBA HORNÍ ČÁSTI DŘÍKŮ A RÁMOVÉ PŘÍČLE (BEDNĚNÍ, ARMOVÁNÍ A BETONÁŽ)
16. VÝSTAVBA ŘÍMS NA MOSTECH I ZDECH (BEDNĚNÍ, ARMOVÁNÍ A BETONÁŽ)
17. ZŘÍZENÍ IZOLACE
18. POSTUPNÉ ZASYPÁNÍ RUBOVÉ OBLASTI ZÁKLADŮ PO ÚROVNĚ PODKLADNÍCH BETONŮ RUBOVÉ DRENÁŽE A ZASYP. JAM Z ČELNÍ STRANY PO ÚROVNĚ HORNÍ PLOCHY ZÁKLADŮ
19. VÝSTAVBA PODKLADNÍCH A SPADOVÝCH BETONŮ A RUBOVÉ DRENÁŽE ZA OPĚRAMI A ZDI VČETNĚ NÁPOJENÍ NA PŘÍLEHLOU KANALIZACI
20. POSTUPNÉ ZASYPÁVÁNÍ PO ROZHRAŇÍ MEZI INŽENÝRSKÝMI OBJEKTY A OBJEKTEM ŽELEZNIČNÍHO SPODKU
21. VÝSTAVBA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU POD TK Č. 1 VČ. ODVODNĚNÍ
22. VÝSTAVBA NOVÉHO KABELOVODU PODÉL TK Č. 1
23. VÝSTAVBA NOVÉ TK Č. 1
24. VÝSTAVBA NOVÉHO NÁVĚSTIDLA 1CL (KM POLOHA NÁVĚSTIDLA ZŮSTANE ZACHOVÁNA)
25. VÝSTAVBA PROTIHLUKOVÉ STĚNY (PHS)
26. NA KONCI STAVEBNÍHO POSTUPU SNESENÍ PROVIZORNÍCH TV STOŽÁRŮ 68P, 68P, 70P, 72P, 74P, 76P A 78P V OSE BUDOUCÍ TK Č. 4, VÝSTAVBA NOVÝCH TV BRAN A PŘEVĚŠENÍ TV VEDENÍ NA TV NOVÉ BRÁNY

4. ETAPA - POPIS PRACÍ (269 DNÍ)

1. ÚPRAVA A OPRAVA KOMUNIKACÍ PONIČENÝCH STAVBOU
2. ÚPRAVA KOMUNIKACÍ POD NOVÝ BUDOVANÝM MOSTY
3. ÚPRAVY TERÉNU
4. NÁHRADNÍ VÝSADBA APOD.
5. PODBÍTÍ KOLEJE

SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY

- PS 31-28-01.5 BRNO OS. NÁDR. - BRNO-ŽIDENICE, PŘELOŽKY KABELŮ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ, ČÁST ŽIDENICE - ČERNOVICE
PS 31-14-01 BRNO OS. NÁDR. - BRNO-MALOMĚŘICE, DOK. ČÁST ŽIDENICE - ČERNOVICE
PS 31-14-06 BRNO OS. NÁDR. - BRNO-ŽIDENICE, TK, ČÁST ŽIDENICE - ČERNOVICE
SO 31-16-01 BRNO OS. NÁDR. - BRNO-ŽIDENICE, ŽELEZNIČNÍ SPODEK, ČÁST ŽIDENICE - ČERNOVICE
SO 31-16-01.1 BRNO OS. NÁDR. - BRNO-ŽIDENICE, ŽELEZNIČNÍ SPODEK, ČÁST ŽIDENICE - ČERNOVICE - NÁPOJENÍ NA KANALIZACI
SO 31-17-01 BRNO OS. NÁDR. - BRNO-ŽIDENICE, ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK, ČÁST ŽIDENICE - ČERNOVICE
SO 31-17-01.1 BRNO OS. NÁDR. - BRNO-ŽIDENICE, ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK - ZAJIŠTĚNÍ PPK, ČÁST ŽIDENICE - ČERNOVICE
SO 31-17-01.2 BRNO OS. NÁDR. - BRNO-ŽIDENICE, ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK - NÁSLEDNÉ PODBÍTÍ KOLEJE, ČÁST ŽIDENICE - ČERNOVICE
SO 31-17-07 MODERNIZACE PRŮJEZDU, VÝSTROJ TRATÍ, ČÁST ŽIDENICE - ČERNOVICE
SO 31-19-06 BRNO OS. NÁDR. - BRNO-ŽIDENICE, ŽEL. MOST V EV.KM 4,804-FILIPÍNSKÉHO (NOVÝ KM 145,082)
SO 31-19-07 BRNO OS. NÁDR. - BRNO-ŽIDENICE, ŽEL. MOST V EV.KM 5,046-FILIPÍNSKÉHO (NOVÝ KM 145,318)
SO 31-19-23 BRNO OS. N. - BRNO-ŽIDENICE, OPĚRNÁ ZED VLEVO TRATÍ V N. KM 144,928-145,070, ČÁST ŽIDENICE - ČERNOVICE
SO 31-19-24 BRNO OS. N. - BRNO-ŽIDENICE, OPĚRNÁ ZED VLEVO TRATÍ V N. KM 145,096-145,304
SO 31-19-29 BRNO OS. N. - BRNO-ŽIDENICE, OPĚRNÁ ZED VPRÁVO TRATÍ V N. KM 144,833-145,066, ČÁST ŽIDENICE - ČERNOVICE
SO 31-19-30 BRNO OS. N. - BRNO-ŽIDENICE, OPĚRNÁ ZED VPRÁVO TRATÍ V N. KM 145,093-145,308
SO 31-19-31 BRNO OS. N. - BRNO-ŽIDENICE, OPĚRNÁ ZED VPRÁVO TRATÍ V N. KM 145,334-145,651, ČÁST ŽIDENICE - ČERNOVICE

- SO 31-15-51 BRNO OS. NÁDR. - BRNO-ŽIDENICE, PHS V KM 143,871-145,135 VLEVO, ČÁST ŽIDENICE - ČERNOVICE
SO 31-15-55 BRNO OS. NÁDR. - BRNO-ŽIDENICE, PHS V KM 144,862-146,024 VPRÁVO, ČÁST ŽIDENICE - ČERNOVICE
SO 31-18-05 BRNO OS. NÁDR. - BRNO-ŽIDENICE, ÚPRAVA KOMUNIKACE - MOST JILKOVA
SO 31-22-01.5 BRNO OS. NÁDR. - BRNO-ŽIDENICE, OCHRANA VODOVODU DN 100 V UL. JILKOVA
SO 31-22-01.6 BRNO OS. NÁDR. - BRNO-ŽIDENICE, PŘELOŽKA VODOVODU DN 100 V UL. FILIPÍNSKÉHO
SO 31-27-01.6 BRNO OS. NÁDR. - BRNO-ŽIDENICE, OCHRANA KANALIZACE V UL. JILKOVA
SO 31-27-01.7 BRNO OS. NÁDR. - BRNO-ŽIDENICE, OCHRANA KANALIZACE V UL. FILIPÍNSKÉHO
SO 31-06-16 MOST UL. JILKOVA, OSVĚTLENÍ SILNÍČNÍHO PROSTORU
SO 31-06-17 MOST UL. FILIPÍNSKÉHO, OSVĚTLENÍ SILNÍČNÍHO PROSTORU
SO 31-06-51 BRNO OS. NÁDR. - BRNO-ŽIDENICE, PŘELOŽKY KABELŮ VN A VN ČD, ČÁST ŽIDENICE - ČERNOVICE
SO 31-33-01 MODERNIZACE PRŮJEZDU - OPLOČENÍ, ČÁST ŽIDENICE - ČERNOVICE
SO 31-61-01 MODERNIZACE PRŮJEZDU - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, ČÁST ŽIDENICE - ČERNOVICE
SO 31-01-01 BRNO OS. NÁDR. - BRNO-ŽIDENICE, TRAKČNÍ VEDENÍ, ČÁST ŽIDENICE - ČERNOVICE
SO 31-01-02 BRNO OS. NÁDR. - BRNO-ŽIDENICE, UKOLEJNĚNÍ, ČÁST ŽIDENICE - ČERNOVICE
SO 31-01-14 MODERNIZACE PRŮJEZDU - ÚPRAVY ŽOK, ČÁST ŽIDENICE - ČERNOVICE
SO 31-38-01 MODERNIZACE PRŮJEZDU, VEGETAČNÍ ÚPRAVY, ČÁST ŽIDENICE - ČERNOVICE
SO 31-41-01 BRNO - ŽIDENICE - BRNO - ČERNOVICE, ÚPRAVA POVRCHU STÁVAJÍCÍCH KOMUNIKACÍ
SO 31-41-01.1 BRNO - ŽIDENICE - BRNO - ČERNOVICE, ÚPRAVA POVRCHU STÁVAJÍCÍCH KOMUNIKACÍ, ÚČELOVÁ KOMUNIKACE
SO 31-42-01 MODERNIZACE PRŮJEZDU, DOPRAVNÍ OPATŘENÍ
REKONSTRUKCE ULIC KLUNY A NEVKLOVA (INV. STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO)

LEGENDA TYPU ČAR

- | | | | |
|-----------|------------------------|-----------|---------------------------|
| — — — — — | KOLEJE NOVÉ | — — — — — | OSVĚTLENÍ |
| — — — — — | ÚPRAVA GPK | — — — — — | TRAKČNÍ VEDENÍ |
| — — — — — | KOLEJE STÁVAJÍCÍ | — — — — — | KABELOVOD |
| — — — — — | ODVODNĚNÍ | — — — — — | OPLOČENÍ |
| — — — — — | ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ | — — — — — | STÁVAJÍCÍ SÍTĚ |
| — — — — — | SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ | — — — — — | STÁVAJÍCÍ STAV |
| — — — — — | MOSTY, PROPUSTKY, ZDI | — — — — — | HRANICE DRAŽNÍHO POZEMKU |
| — — — — — | PHS | — — — — — | HRANICE POZEMKŮ Z KN MAPY |
| — — — — — | VODOVOD | — — — — — | SOUVISEJÍCÍ STAVBY |
| — — — — — | KANALIZACE | — — — — — | DEMOLICE |
| — — — — — | SILNOPRŮLIDÉ ROZVODY | | |

LEGENDA VYPLNĚNÝCH PLOCH

- | | |
|---|----------------------|
| ■ | OCHRANNÉ PÁSMO DRÁHY |
| ■ | VĚCNÁ BŘEMENA |
| ■ | DEMOLICE |
| ■ | VEGETAČNÍ ÚPRAVY |

POZNÁMKY

1. DETAILNÍ POPIS STAVEBNÉ MONTÁŽNÍCH POSTUPŮ UVEDEN V ČÁSTI DOKUMENTACE B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
2. VŠEOBECNÉ INFORMACE JSOU UVEDENY V PŘÍLOZE Č. 1.001 - TECHNICKÁ ZPRÁVA
3. VŠEKERÉ STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČÍTÍM STAVEBNÍCH PRACÍ VYTÝČENY A OCHRÁNĚNY
4. OCHRANA STÁVAJÍCÍHO STŘEDOTLAKÉHO PLYNOVODU PROCHÁZĚJÍCÍHO ŽELEZNIČNÍM TĚLESEM ZA BUDOUCÍ OPĚROU OP2 (SO 31-19-06) A OCHRANA HORKOVODOU VEDOUČÍHO POD POVRCHEM POZEMNÍ KOMUNIKACE BUDE ŘEŠENA V KOOPERACI S DOTČENÝM SPRÁVCEM (GASNET A TEPLÁRNY BRNO)
5. TVARY ZÁKLADŮ SO 31-19-06, SO 31-19-24 A SO 31-19-30 V PŘÍMÉ BLÍZKOSTI STÁVAJÍCÍHO PLYNOVODU BUDOU ÚPRAVENY NA ZÁKLADĚ FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PŘED STAVBOU

Ministerstvo dopravy Státní fond dopravní infrastruktury	
Jméno ověřitel:	
Příjmení:	
Orientační schéma:	
Razítko oprávněné osoby:	
Podpis:	
Datum:	
Revize:	Datum:
000	21.6.2023
Popis:	Zpracování přílohy
Kontrola:	Ing. Petr Jančík
Stavebník/Investor: Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Stavební správa východ
Adresa:	Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc
Zhotovitel díla: Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Kontakt:	T: +420 972 235 830 E: O9sek@spravazeleznici.cz
Zhotovitel objektu: Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Kontakt:	T: +420 972 235 830 E: O9sek@spravazeleznici.cz
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Peter Lastovecky
Specialista:	Ing. Jan Bartaloš
Název stavby/akce:	Modernizace tratěvého úseku Brno-Židenice (mimo) - odb. Brno-Černovice
Označení investora:	5622.100218
Označení zhotovitele:	5622.100218
Název části:	Mosty, propustky a zdi
Označení části:	D.2.1.4
Název objektu/dílní části:	Brno os. nádr. - Brno-Židenice, opěrná zed vlevo tratí v n. km 144,928 - 145,070, část Židenice - Černovice
Označení objektu/komplektu:	SO 31-19-23
Název přílohy:	Výkres postupu výstavby
Označení přílohy:	2. 602
Název dílní části přílohy:	2. část
Odpovědný projektant:	Ing. Jan Bartaloš
Měřítko:	1:500
Formát:	16 x A4
TUDU:	2005 06
Kraj:	Židenice 611115
Jihomoravský:	21.6.2023
Stupeň dokumentace:	Číslo
Podpis:	Podpis
Revize:	Revize
(Převzato z přílohy 1.001)	
