


VÝKRES POSTUPU VÝSTAVBY - 1. ČÁST

1. ETAPA - PŘÍPRAVNÉ PRÁCE, M 1:500

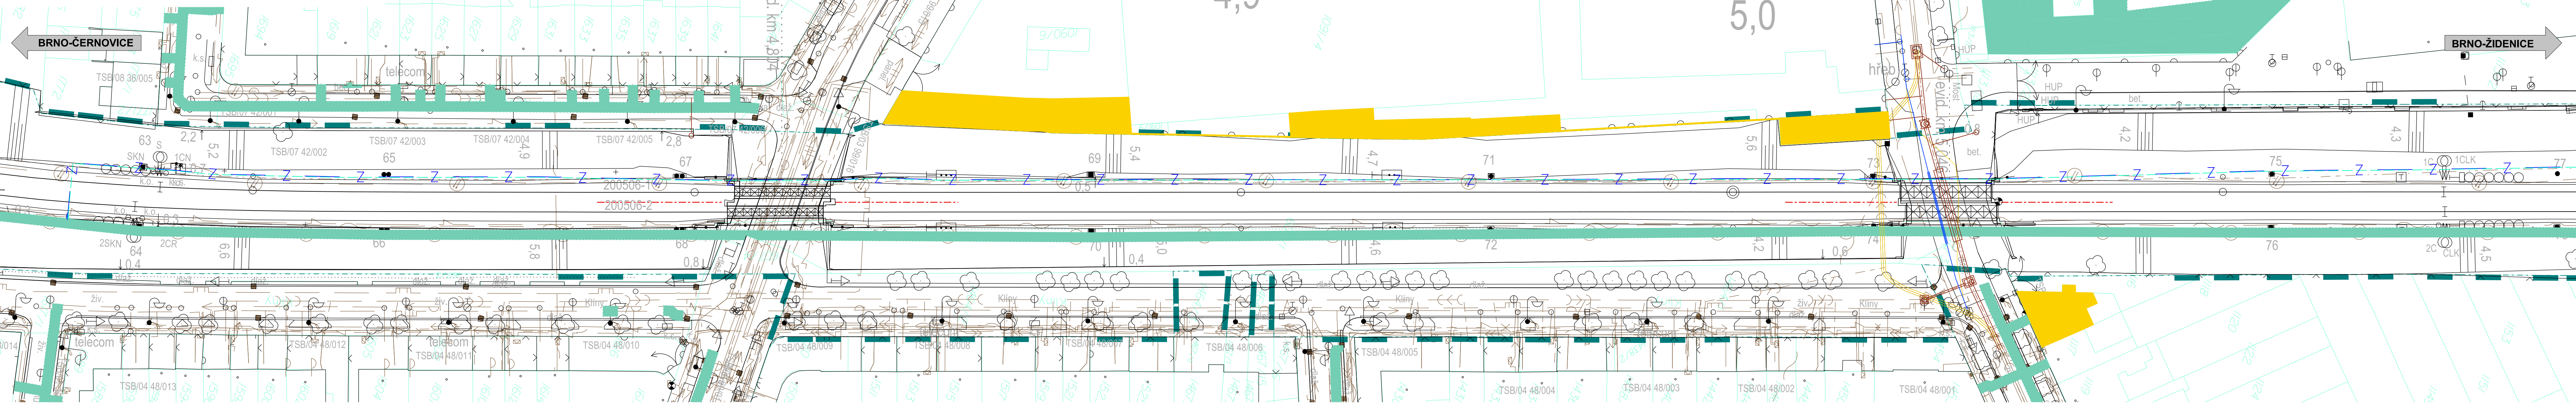

1. ETAPA - POPIS PRACÍ (168 DNÍ)


- PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ
- DEMOLICE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ PŘEKÁŽEJÍCÍCH VE VÝSTAVBĚ
- VRTÁNÍ ŽÁPOROVÉHO PAŽENÍ MEZI TRATOVOU KOLEJÍ Č. 1 A Č. 2 U MOSTŮ V UL. JILKOVA A V UL. FILIPÍNSKÉHO
- PŘELOŽKY A OCHRANA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V UL. JILKOVA, FILIPÍNSKÉHO, ALE I V UL. KLINY A V. UL. NEVRKLOVA (PŘELOŽENÍ DO BEZKOLIZNÍ POLOHY S VÝKOPY STAVBNÍCH JAM)
- VÝSTAVBA PROVIZORNÍ KABELOVÉ TRASY PODÉL TRATOVÉ KOLEJE Č. 1
- PŘELOŽKY DRAŽNÍCH KABELŮ LEŽÍCÍCH PODÉL TRATOVÉ KOLEJE Č. 2 DO NOVĚ ZŘÍZENÉ PROVIZORNÍ TRASY U TRATOVÉ KOLEJE Č. 1
- KÁZENÍ VZROSTLÉ A NÁLETOVÉ ZELENÉ V POŽADOVANÉM ROZSAHU

SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY

- PS 31-28-01.5 BRNO OS. NÁDR. - BRNO-ZIDENICE, PŘELOŽKY KABELŮ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ, ČÁST ZIDENICE - ČERNOVICE  
PS 31-14-01 BRNO OS. NÁDR. - BRNO-MALOMĚŘICE, DOK. ČÁST ZIDENICE - ČERNOVICE  
PS 31-14-06 BRNO OS. NÁDR. - BRNO-ZIDENICE, TK, ČÁST ZIDENICE - ČERNOVICE  
SO 31-16-01 BRNO OS. NÁDR. - BRNO-ZIDENICE, ŽELEZNIČNÍ SPODEK, ČÁST ZIDENICE - ČERNOVICE  
SO 31-16-01.1 BRNO OS. NÁDR. - BRNO-ZIDENICE, ŽELEZNIČNÍ SPODEK, ČÁST ZIDENICE - ČERNOVICE - NÁPOJENÍ NA KANALIZACI  
SO 31-17-01 BRNO OS. NÁDR. - BRNO-ZIDENICE, ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK, ČÁST ZIDENICE - ČERNOVICE  
SO 31-17-01.1 BRNO OS. NÁDR. - BRNO-ZIDENICE, ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK - ZAJIŠTĚNÍ PPK, ČÁST ZIDENICE - ČERNOVICE  
SO 31-17-01.2 BRNO OS. NÁDR. - BRNO-ZIDENICE, ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK - NÁSLEDNÉ PODBITÍ KOLEJE, ČÁST ZIDENICE - ČERNOVICE  
SO 31-17-07 MODERNIZACE PRŮJEZDU, VÝSTROJ TRATI, ČÁST ZIDENICE - ČERNOVICE  
SO 31-19-06 BRNO OS. NÁDR. - BRNO-ZIDENICE, ŽEL. MOST V EV.KM 4,804-JILKOVA (NOVÝ KM 145,082)  
SO 31-19-07 BRNO OS. NÁDR. - BRNO-ZIDENICE, ŽEL. MOST V EV.KM 5,046-FILIPÍNSKÉHO (NOVÝ KM 145,318)  
SO 31-19-23 BRNO OS. N. - BRNO-ZIDENICE, OPĚRNÁ ZĚD VLEVO TRATI V N. KM 144,928-145,070, ČÁST ZIDENICE - ČERNOVICE  
SO 31-19-24 BRNO OS. N. - BRNO-ZIDENICE, OPĚRNÁ ZĚD VLEVO TRATI V N. KM 145,096-145,304  
SO 31-19-29 BRNO OS. N. - BRNO-ZIDENICE, OPĚRNÁ ZĚD VPRÁVO TRATI V N. KM 144,833-145,066, ČÁST ZIDENICE - ČERNOVICE  
SO 31-19-30 BRNO OS. N. - BRNO-ZIDENICE, OPĚRNÁ ZĚD VPRÁVO TRATI V N. KM 145,093-145,308  
SO 31-19-31 BRNO OS. N. - BRNO-ZIDENICE, OPĚRNÁ ZĚD VPRÁVO TRATI V N. KM 145,334-145,651, ČÁST ZIDENICE - ČERNOVICE

- SO 31-15-51 BRNO OS. NÁDR. - BRNO-ZIDENICE, PHS V KM 143,871-145,135 VLEVO, ČÁST ZIDENICE - ČERNOVICE  
SO 31-15-55 BRNO OS. NÁDR. - BRNO-ZIDENICE, PHS V KM 144,862-146,024 VPRÁVO, ČÁST ZIDENICE - ČERNOVICE  
SO 31-18-05 BRNO OS. NÁDR. - BRNO-ZIDENICE, ÚPRAVA KOMUNIKACE - MOST JILKOVA  
SO 31-22-01.5 BRNO OS. NÁDR. - BRNO-ZIDENICE, OCHRANA VODOVODU DN 100 V UL. JILKOVA  
SO 31-22-01.6 BRNO OS. NÁDR. - BRNO-ZIDENICE, PŘELOŽKA VODOVODU DN 100 V UL. FILIPÍNSKÉHO  
SO 31-27-01.6 BRNO OS. NÁDR. - BRNO-ZIDENICE, OCHRANA KANALIZACE V UL. JILKOVA  
SO 31-27-01.7 BRNO OS. NÁDR. - BRNO-ZIDENICE, OCHRANA KANALIZACE V UL. FILIPÍNSKÉHO  
SO 31-06-16 MOST UL. JILKOVA, OSVĚTLENÍ SILNIČNÍHO PROSTORU  
SO 31-06-17 MOST UL. FILIPÍNSKÉHO, OSVĚTLENÍ SILNIČNÍHO PROSTORU  
SO 31-06-51 BRNO OS. NÁDR. - BRNO-ZIDENICE, PŘELOŽKY KABELŮ VN A VN ČD, ČÁST ZIDENICE - ČERNOVICE  
SO 31-33-01 MODERNIZACE PRŮJEZDU - OPLOČENÍ, ČÁST ZIDENICE - ČERNOVICE  
SO 31-61-01 MODERNIZACE PRŮJEZDU - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, ČÁST ZIDENICE - ČERNOVICE  
SO 31-01-01 BRNO OS. NÁDR. - BRNO-ZIDENICE, TRAKČNÍ VEDENÍ, ČÁST ZIDENICE - ČERNOVICE  
SO 31-01-02 BRNO OS. NÁDR. - BRNO-ZIDENICE, UKOLEJNĚNÍ, ČÁST ZIDENICE - ČERNOVICE  
SO 31-01-14 MODERNIZACE PRŮJEZDU - ÚPRAVY ŽOK, ČÁST ZIDENICE - ČERNOVICE  
SO 31-38-01 MODERNIZACE PRŮJEZDU, VEGETAČNÍ ÚPRAVY, ČÁST ZIDENICE - ČERNOVICE  
SO 31-41-01 BRNO - ZIDENICE - BRNO - ČERNOVICE, ÚPRAVA POVRCHU STÁVAJÍCÍCH KOMUNIKACÍ  
SO 31-41-01.1 BRNO - ZIDENICE - BRNO - ČERNOVICE, ÚPRAVA POVRCHU STÁVAJÍCÍCH KOMUNIKACÍ, ÚČELOVÁ KOMUNIKACE  
SO 31-42-01 MODERNIZACE PRŮJEZDU, DOPRAVNÍ OPATŘENÍ  
REKONSTRUKCE ULIC KLINY A NEVRKLOVA (OV. STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO)

2. ETAPA - STAVEBNÍ POSTUP Č. 1, M 1:500

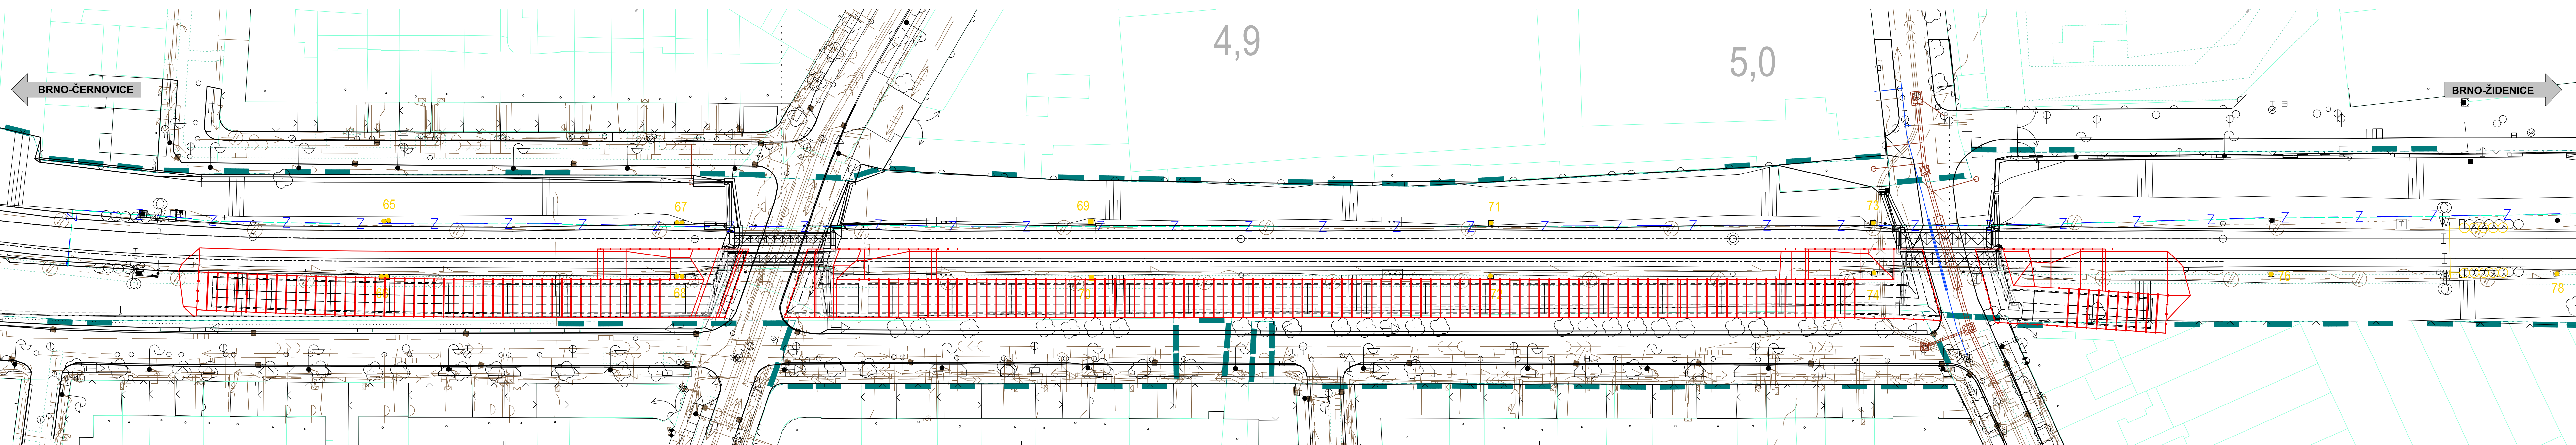

2. ETAPA - POPIS PRACÍ (281 DNÍ)

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO TV V TK Č. 2 VČ. STÁVAJÍCÍCH STOŽARŮ TV Č. 66, 68, 70, 72, 74, 76 A 78
- SNESENÍ STÁVAJÍCÍHO VJEZDOVÉHO NÁVĚSTIDLA DO ŽST BRNO-ZIDENICE ZCL
- SNESENÍ KOLEJE Č. 2 VČ. ODTĚŽENÍ KOLEJOVÉHO LOŽE
- SNESENÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ POD TRATOVOU KOLEJÍ Č. 2 U ŽEL. MOSTŮ V UL. JILKOVA A V UL. FILIPÍNSKÉHO POMOCÍ SILNIČNÍCH JERÁBŮ
- POSTUPNÉ ODTĚŽOVÁNÍ TĚLESA, OSAZOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH PAŽIN A ODBOŘOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ SPONNÍ STAVBY POD TK Č. 2
- VRTÁNÍ ŽÁPOR VNITŘNÍ RADY PAŽENÍ ZA RUBEM BUDOUCÍCH OPĚRNÝCH STĚN
- NÁSLEDNÉ POSTUPNÉ ODTĚŽOVÁNÍ TĚLESA DO KOTVENÍ VNITŘNÍ PAŽICÍ STĚNY VČETNĚ POSTUPJÍCÍ DEMOLICE STÁVAJÍCÍ SPONNÍ STAVBY
- KOMPLETNÍ ODTĚŽENÍ STÁVAJÍCÍHO TĚLESA VČETNĚ DEMOLICE STÁVAJÍCÍ SPONNÍ STAVBY PO ÚROVNĚ PŘÍLEHLÉHO TERÉNU
- VRTÁNÍ ŽÁPOR VNĚJŠÍ PAŽICÍ STĚNY KOLEM ZÁKLADŮ BUDOUCÍCH MOSTŮ, U KTERÝCH JE NEJPRVE NUTNÉ ODTĚŽIT TERÉN AŽ PO ZÁKLADOVOU SPÁRU STÁVAJÍCÍ SPONNÍ STAVBY, KTERÁ SE NACHÁZÍ POD ÚROVNÍ VRTÁNÍ PILOT A PO JEJÍ DEMOLICI JE NUTNÉ VÝKOP ZNOVU ZASYPAT DO PŮVODNÍ ÚROVNĚ TERÉNU
- VRTÁNÍ A BETONÁŽ VELKOPRŮMĚROVÝCH PILOT Z ÚROVNĚ TERÉNU PRO ZÁKLADY NOVÝCH ZDI A MOSTU S NÁSLEDNÝM ZASYPÁVÁNÍM HLUBŠÍ DÉLKOU VRTÁNÍ
- VRTÁNÍ ŽÁPOR VNĚJŠÍ PAŽICÍ STĚNY PODÉL VŠECH ZÁKLADŮ
- POSTUPNÉ ODTĚŽOVÁNÍ AŽ NA ÚROVNĚ PODKLADNÍHO BETONU POD ZÁKLADY S VYPLŇOVÁNÍM ŽÁPOR PAŽINAMI A ZŘÍZENÍM ROZPĚR PAŽICÍCH KONSTRUKCÍ
- VÝSTAVBA ZÁKLADŮ NOVÝCH ZDI A NOVÝCH ŽEL. MOSTŮ POD TK Č. 2 (BEDNĚNÍ, ARMOVÁNÍ A BETONÁŽ)
- VÝSTAVBA DRÁKŮ OPĚR, KŘÍDEL I OPĚRNÝCH ZDI A BUDOVNÍ PODPĚRNÝCH SKRŽÍ PRO BETONÁŽ RAMOVÝCH PŘÍČLI (BEDNĚNÍ, ARMOVÁNÍ A BETONÁŽ)
- VÝSTAVBA HORNÍ ČÁSTI DRÁKŮ A RAMOVÉ PŘÍČLE (BEDNĚNÍ, ARMOVÁNÍ A BETONÁŽ)
- VÝSTAVBA ŘÍMS NA MOSTECH I ZDECH (BEDNĚNÍ, ARMOVÁNÍ A BETONÁŽ)
- ZŘÍZENÍ IZOLACE
- POSTUPNÉ ZASYPÁNÍ RUBOVÉ OBLASTI ZÁKLADŮ PO ÚROVNĚ PODKLADNÍCH BETONŮ RUBOVÉ DRENÁŽE A ZÁSYP JAM Z ČELNÍ STRANY PO ÚROVNĚ HORNÍ PLOCHY ZÁKLADŮ
- VÝSTAVBA PODKLADNÍCH A SPÁDOVÝCH BETONŮ A RUBOVÉ DRENÁŽE ZA OPERAMI A ZDMI VČETNĚ NÁPOJENÍ NA PŘÍLEHLOU KANALIZACI
- POSTUPNÉ ZASYPÁVÁNÍ PO ROZHRANÍ MEZI INŽENÝRSKÝMI OBJEKTY A OBJEKTEM ŽELEZNIČNÍHO SPODKU
- VÝSTAVBA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU POD TK Č. 2 VČ. ODVODNĚNÍ
- VÝSTAVBA NOVOHO KABELOVODU PODÉL TK Č. 2
- VÝSTAVBA NOVÉ TK Č. 2
- VÝSTAVBA PROVIZORNÍCH TV STOŽARŮČ. 66P, 68P, 70P, 72P, 74P, 76P A 78P V OSE BUDOUCÍ TK Č. 4
- VÝSTAVBA PROTIHLUKOVÉ STĚNY (PHS) A UNIKOVÝCH SCHODŮ
- VÝSTAVBA NOVOHO NÁVĚSTIDLA ZCL (KM POLOHA NÁVĚSTIDLA ZŮSTANE ZACHOVÁVANA)
- VÝSTAVBA DEFINITIVNÍCH PŘELOŽEK DRAŽNÍCH KABELŮ VČ. JEJICH ZPROVOZNĚNÍ (VŠECHNY DRAŽNÍ SÍTĚ BUDOU PŘELOŽENY DO NOVĚ ZŘÍZENÉHO KABELOVODU PODÉL TK Č. 2)

LEGENDA TYPU ČAR

- |           |                        |           |                           |
|-----------|------------------------|-----------|---------------------------|
| — — — — — | KOLEJE NOVÉ            | — — — — — | OSVĚTLENÍ                 |
| — — — — — | ÚPRAVA GPK             | — — — — — | TRAKČNÍ VEDENÍ            |
| — — — — — | KOLEJE STÁVAJÍCÍ       | — — — — — | KABELOVOD                 |
| — — — — — | ODVODNĚNÍ              | — — — — — | OPLOČENÍ                  |
| — — — — — | ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ | — — — — — | STÁVAJÍCÍ SÍTĚ            |
| — — — — — | SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ     | — — — — — | STÁVAJÍCÍ STAV            |
| — — — — — | PHS                    | — — — — — | HRANICE DRAŽNÍHO POZEMKU  |
| — — — — — | VODOVOD                | — — — — — | HRANICE POZEMKŮ Z KM MAPY |
| — — — — — | KANALIZACE             | — — — — — | SOUVISEJÍCÍ STAVBY        |
| — — — — — | SILNOPRŮMĚRÉ ROZVODY   | — — — — — | DEMOLICE                  |

LEGENDA VYPLNĚNÝCH PLOCH

- |   |                      |
|---|----------------------|
| ■ | OCHRANNÉ PÁSMO DRÁHY |
| ■ | VĚCNÁ BŘEMENA        |
| ■ | DEMOLICE             |
| ■ | VEGETAČNÍ ÚPRAVY     |

POZNÁMKY

- DETALNÍ POPIS STAVEBNÍ MONTÁŽNÍCH POSTUPŮ UVEDEN V ČÁSTI DOKUMENTACE B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- VŠEOBECNÉ INFORMACE JSOU UVEDENY V PŘÍLOZE Č. 1.001 - TECHNICKÁ ZPRÁVA
- VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČÍTÍM STAVEBNÍCH PRACÍ VYTYPYČENY A OCHRÁNĚNY
- OCHRANA STÁVAJÍCÍHO STŘEDOTLAKÉHO PLYNOVODU PROCHÁZEJÍCÍHO ŽELEZNIČNÍM TĚLESEM ZA BUDOUCÍ OPEŘOU OP2 (SO 31-19-06) A OCHRANA HORKOVODŮ VEDOUČÍCH POD POVRCHEM POZEMNÍ KOMUNIKACE BUDE ŘEŠENA V KOOPERACI S DŮČETNÝM SPRÁVCEM (GASNET A TEPLÁRNY BRNO)
- TVARY ZÁKLADŮ SO 31-19-06, SO 31-19-24 A SO 31-19-30 V PŘÍMÉ BLÍZKOSTI STÁVAJÍCÍHO PLYNOVODU BUDOU ÚPRAVENY NA ZÁKLADĚ FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PŘED STAVBOU

Místní ověřitel:	
Předmět:	
Orientační schéma:	
Raziskový oprávněný osobou:	
Podpis: Datum:	
Revize:	Datum:
000	21.6.2023
Popis: Zpracování přílohy	
Kontrola: Ing. Petr Jančík	
Stavebník/Investor: Správa železnic, státní organizace	
Adresa: Diázná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora: Stavební správa východ	
Adresa: Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc	
Zhotovitel díla: Správa železnic, státní organizace	
Adresa: Diázná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Kontakt: T: +420 972 235 830	
E: Osek@spravazeleznici.cz	
Zhotovitel objektu: Správa železnic, státní organizace	
Adresa: Diázná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Kontakt: T: +420 972 235 830	
E: Osek@spravazeleznici.cz	
Hlavní projektant (HIP): Ing. Peter Lastovecky	
Specialista: Ing. Jan Bartaloš	
Název stavby/akce:	Modernizace tratěového úseku Brno-Zidenice (mimo) - odb. Brno-Cernovice
Označení investora:	5622.100218
Označení zhotovitele:	5622.100218
Název části:	Mosty, průprasky a zdi
Označení části:	D.2.1.4
Název objektu/dílny části:	Brno os. nádr. - Brno-Zidenice, žel. most v ev.km 4,804 - JilkoVA (nový km 145,082)
Označení objektu/návrhu:	SO 31-19-06
Název přílohy:	1. část
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:
Ing. Jan Bartaloš	Ing. Jan Bartaloš
Kraj:	Katastrální území:
Jihomoravský	Zidenice 611115
Číslo stavby:	21.6.2023
Stavba:	21.6.2023
Projekt:	21.6.2023
Pracovní den:	21.6.2023
