

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 25119/2021-SŽ-ORŮ OVA-NPI
Listů/příloh 3/0

Vyřizuje Pavlína Bauerová
Telefon +420 972 766 812
Mobil +420 702 211 435
E-mail BauerovaP@spravazeleznic.cz

Datum 20. října 2021

Profil zadavatele:
<https://zakazky.spravazeleznic.cz/>

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel, Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČO: 70994234, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložce 48384, organizační jednotka Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava zadává tuto veřejnou zakázku jako podlimitní sektorovou veřejnou zakázku v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s § 158 odst. 1 zákona nepostupuje při zadávání této veřejné zakázky podle uvedeného zákona.

Zadavatel na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 19. 10. 2021 podané dodavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, týkající se veřejné zakázky s názvem:

„Svatoňovice zast.“

evidenční číslo VZ: 63521109

odpovídá

podle kapitoly 7. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace

a vysvětlení zadávací dokumentace

zveřejňuje na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/> v souladu s kapitolou 7. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace, čl. 7.1 až 7.4 Výzvy k podání nabídky.

Dotaz č. 1 účastníka zadávacího řízení:


1) HMG

B-8-3 -Harmonogram výstavby – žádáme zadavatele o kontrolu Harmonogramu stavby viz níže. Začátek a konec stavby v Harmonogramu se neshoduje s daty realizace stavby ze Zvláštních technických podmínek (Díl 2_3 Zvláštní technické podmínky).

Dále se v příloze B-8-3 -Harmonogram výstavby nevyskytují objekty PS 01 Zabezpečovací zařízení a PS 02 Sdělovací zařízení.

B-8-3 -Harmonogram výstavby

W016 B-8.3

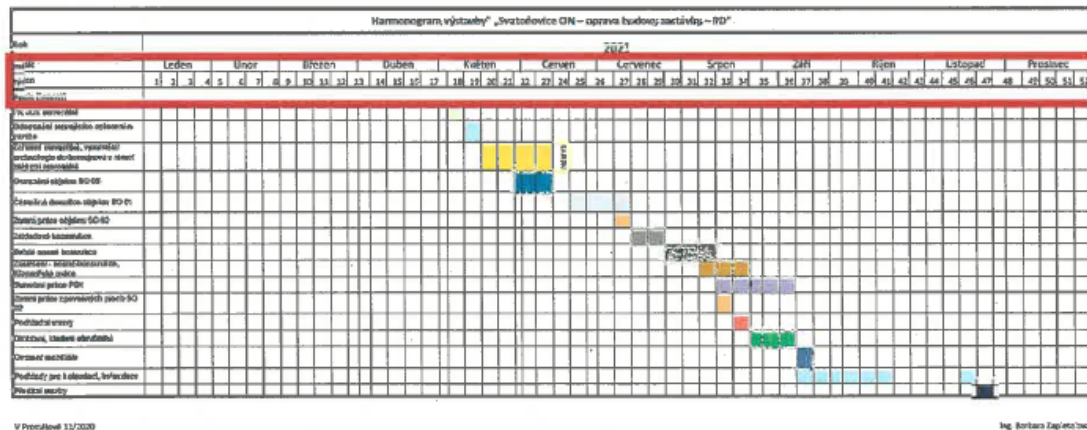

Zvláštní technické podmínky

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

5.1.1 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:

Postup	Činnosti	Typ výluky	Doba trvání
	Zahájení stavby (stavebních prací) – dnem předání staveniště ve smyslu čl. 3.7 SOD		do 5 pracovních dnů od účinnosti SOD (předpoklad konec října 2021 – začátek listopadu 2021)
	Dokončení stavby (stavebních prací)		do 8 měsíců ode dne zahájení stavby
	Dokončení díla		do 8 měsíců ode dne zahájení stavby

Žádáme zadavatele o soulad těchto dvou příloh zadání a případné jejich doplnění.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1:

Harmonogram výstavby (B-8-3), coby součást Projektové dokumentace pro společné povolení stavby (Díl 3 zadávací dokumentace) byl zpracován projektantem pro potřeby zadavatele za účelem stanovení předpokládané doby výstavby, která se v mnoha případech následně liší od skutečného požadavku zadavatele, který je závislý na zařazení stavby do plánu stavebních prací, přidělu finančních prostředků a na výběru zhotovitele. Tato část projektové dokumentace je pouze orientační a není pro dodavatele závazná.

Požadovaná a závazná doba realizace je uvedena primárně v čl. 3.7 Závazného vzoru smlouvy o dílo (Díl 2 zadávací dokumentace) a v bodu 5 Zvláštních technických podmínek (Díl 2 3 zadávací dokumentace), které stanoví závazné milníky pro dodavatele při tvorbě Harmonogramu postupu prací, který je požadován jako jeden z dokumentů tvořící obsah dodavatelem podané nabídky ve smyslu čl. 12.3 Výzvy k podání nabídky.

Přednost tedy má ustanovení smlouvy, které jednoznačně definuje zahájení stavby a dokončení stavby včetně dokončení díla a je rovněž v souladu s přílohou smlouvy, tj. Zvláštními technickými podmínkami.

Dotaz č. 2 účastníka zadávacího řízení:**2) SO 01 - Oprava železniční zastávky**

D.2.2.a.1 Architektonicko-stavební řešení – V soupisu prací tohoto objektu se nalézají položky viz níže. Tyto položky mají nulové množství.

936104213	Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby	kus	0,000
74910130.R	venkovní čtyřkoš pro tříděný odpad, antivandal, svařovaná kce, objem 3x32+1x50 lt, kotvení závit.tyčemi - ozn. OK	kus	0,000
936124113	Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby	kus	0,000
74910109.R	lavička s opěradlem 1500x500x800mm konstrukce- antivandal, sedák a opěradlo z ocelových tyčí, lak RAL dle zadavatele, kotvení do podkladní desky - ozn. L	kus	0,000
R-9-K-2	D+M Exteriérová vitrina pro oznámení aktuálních informací, jízni řády, výluky at.d - rozměr 1440/1000/60 mm - viz výpis spec. prvků - mobiliář - ozn. V	kus	0,000

Žádáme zadavatele o kontrolu těchto položek a pokud nejsou součástí zakázky, tak o odstranění ze soupisu prací.

Dotaz č. 3 účastníka zadávacího řízení:**3) SO 02 - Nové zpevněné plochy**

V soupisu prací "Ostatní konstrukce a práce, bourání" tohoto podobjektu se nalézá položka viz níže. Tato položka má nulové množství.

936174311.R	D+M stojanu na kola pro 1 kolo kotevními šrouby do betonového základu pod dlažbu -ocelová kce, povrch Zn+komaxit	kus	0,000
-------------	--	-----	-------

Žádáme zadavatele o kontrolu této položky a pokud není součástí zakázky, tak o odstranění ze soupisu prací.

Odpoověď zadavatele k dotazu č. 2 a č. 3:

V případě takto vymezených položek se jedná o mobiliář zastávky, tj. čtyřkoš pro tříděný odpad, lavička a stojan na kola včetně souvisejících montážních prací.

Po zhotovení projektové dokumentace a jejím předání zadavateli bylo provedeno Generálním ředitelstvím Správy železnic, státní organizace zadávací řízení na dodávku a montáž mobiliáře, jehož součástí byly i Vámi dotazované položky. Smlouva uzavřená na základě výsledku uvedeného celorepublikového zadávacího řízení stanoví podmínky pro dodávku těchto položek a jako jedna z provozních jednotek zadavatele jsme povinni se jimi řídit.

Protože tyto položky jsou uvedeny ve výkresech projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace (Díl 3 zadávací dokumentace), avšak nebudou součástí dodávky ani montážních prací na straně dodavatele v rámci této veřejné zakázky, jsou v soupisu prací s

výkazem výměr ponechány popisy a současně označeny nulovým množstvím. Dodávku a montáž takto vymezené části bude zajišťovat zadavatel samostatně.

Dodavatel na základě výše uvedeného vysvětlení předmětné položky označené nulovým množstvím ve výkazu výměr ponechá. Dodavatel tyto položky v rámci jím podávané nabídky jako součást vyplněného Soupisu prací s výkazem výměr (Díl 4 zadávací dokumentace) neocení.

Vzhledem k charakteru vysvětlení zadávací dokumentace, kdy zadavatel setrval na zadávacích podmínkách, neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek se nemění a je stanovena na termín do 26. 10. 2021 do 9:00 hodin.

.....
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
